




PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
Departamento de Projetos Estratégicos
(DPE/SNSH – MIDR)

Outubro / 2026


Avanços Físico e Ambiental das Obras

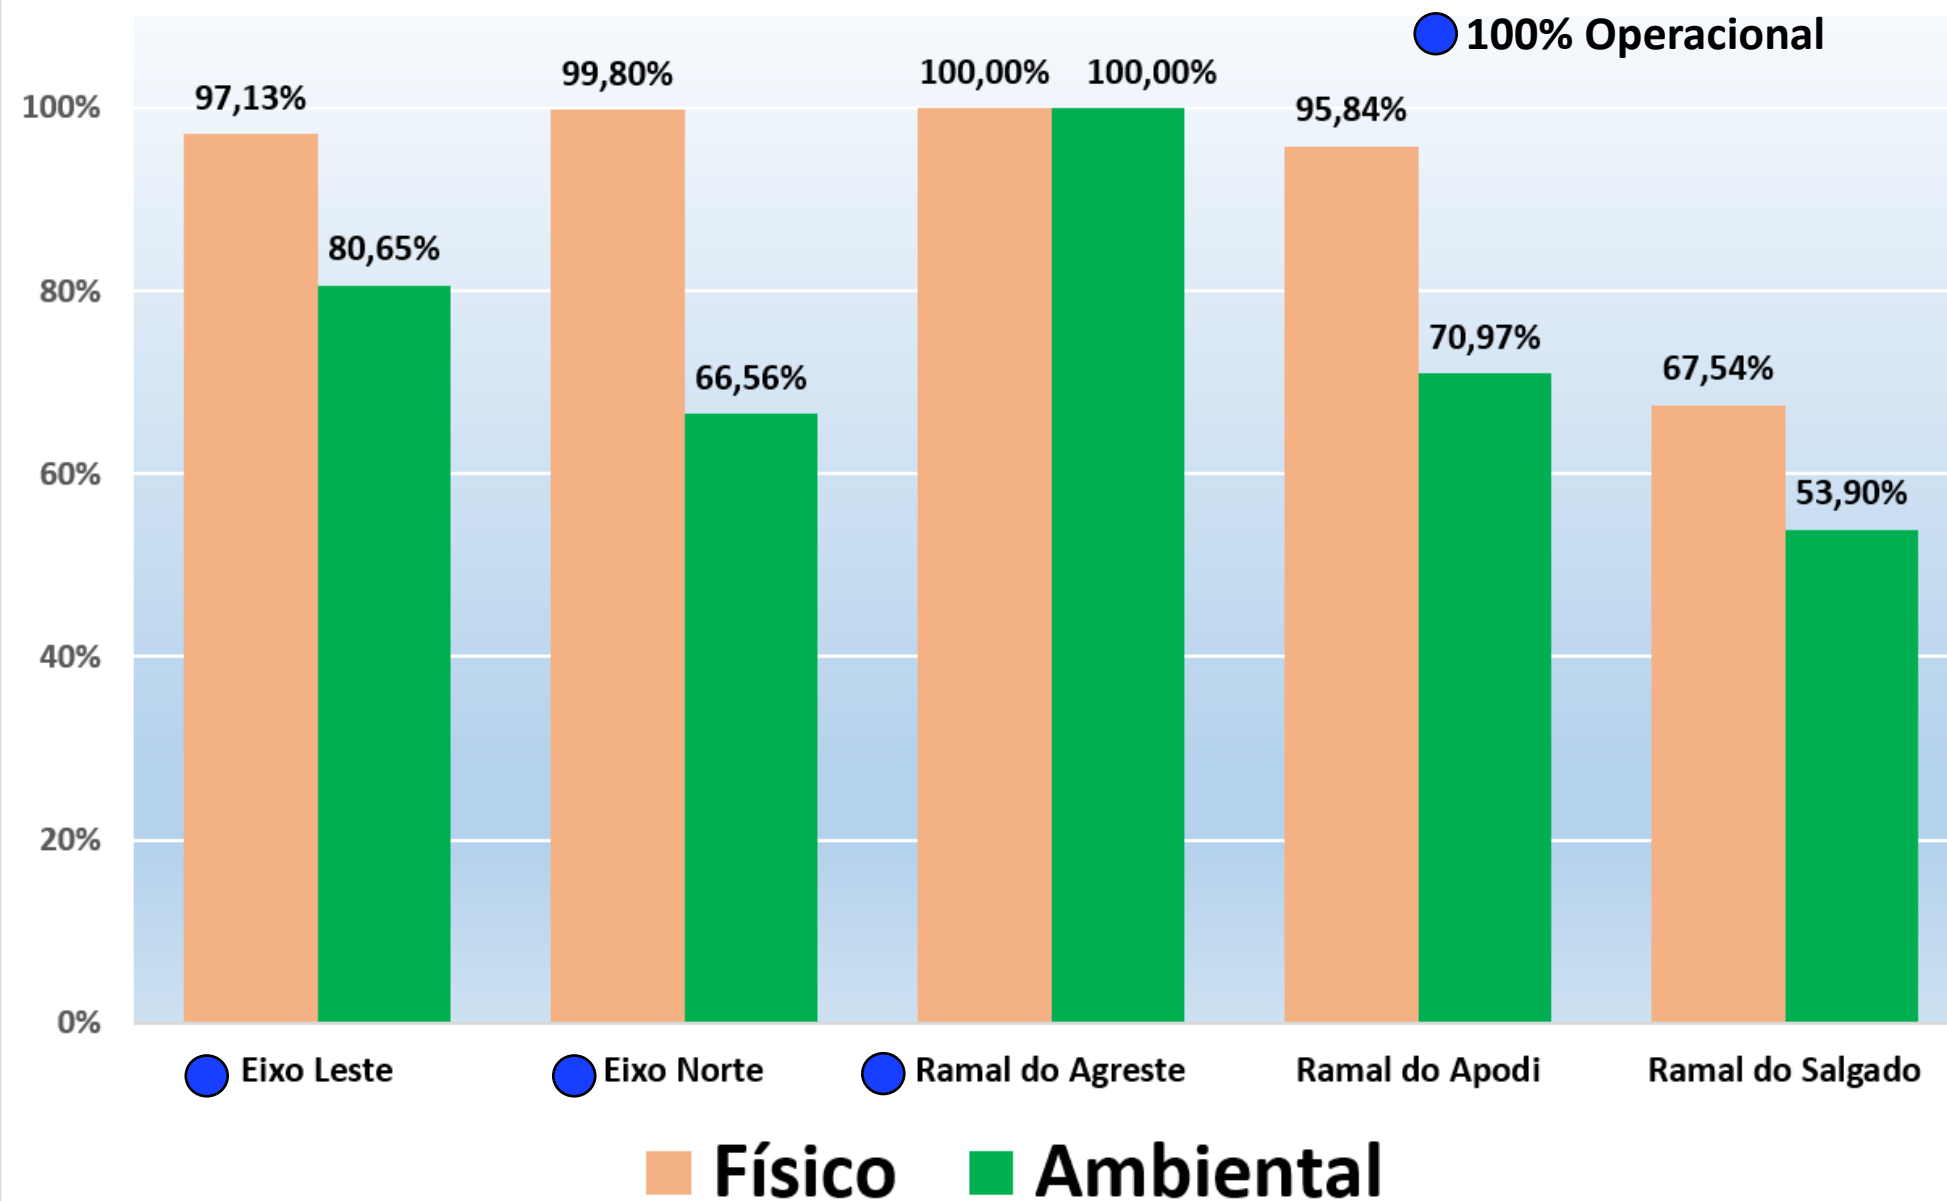

Ramal do Apodi



Avanço físico x Avanço financeiro Comparativo Obra

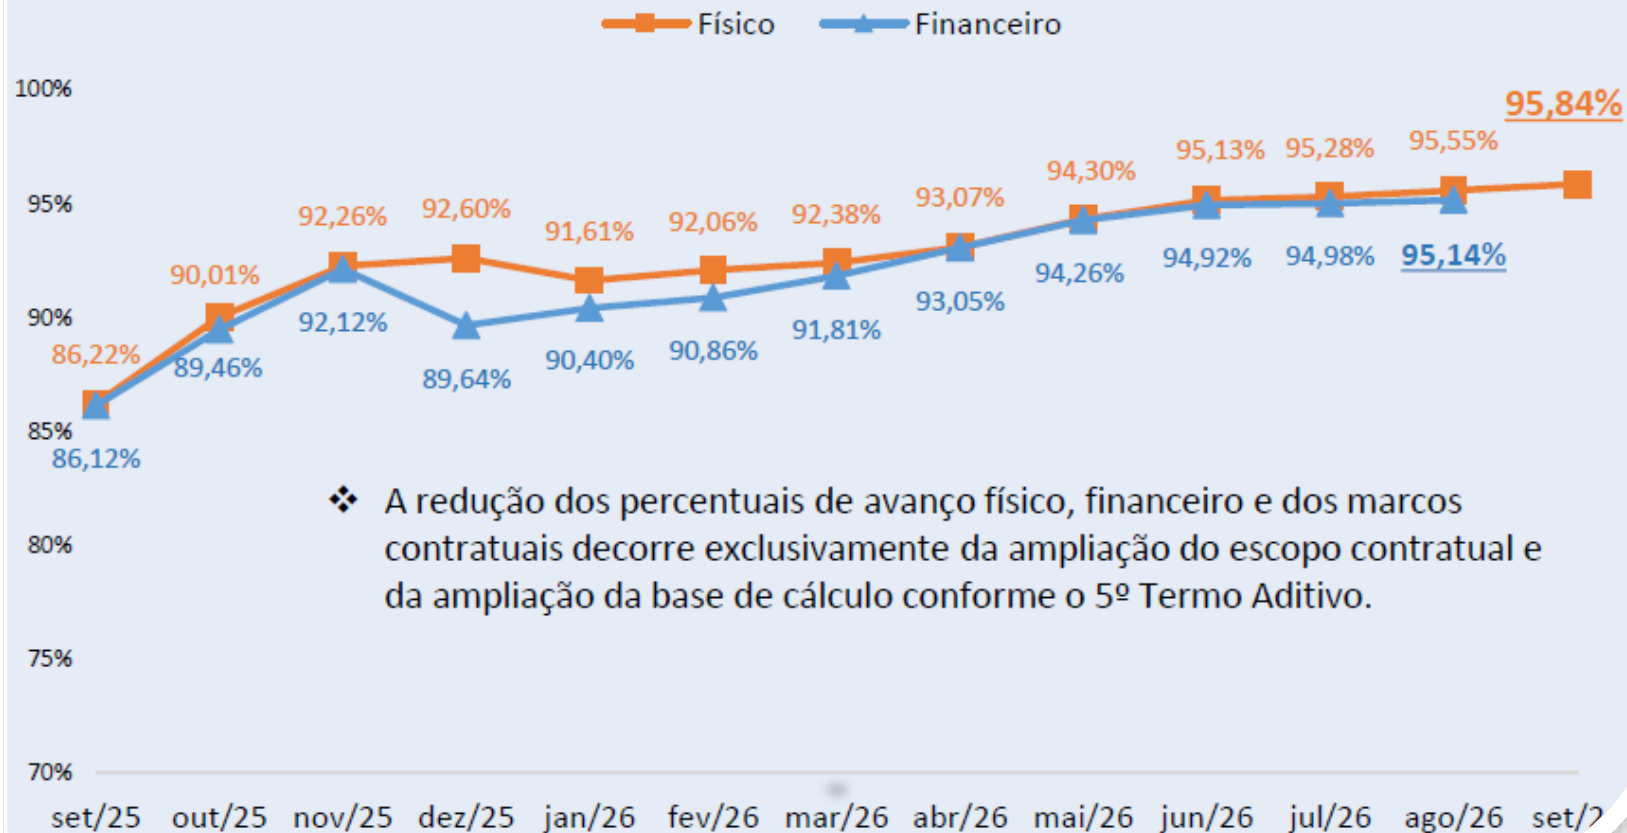


Ramal do Apodi




Evolução Física Mensal Segmento de Canal

(Avanço Financeiro = 98,33%)

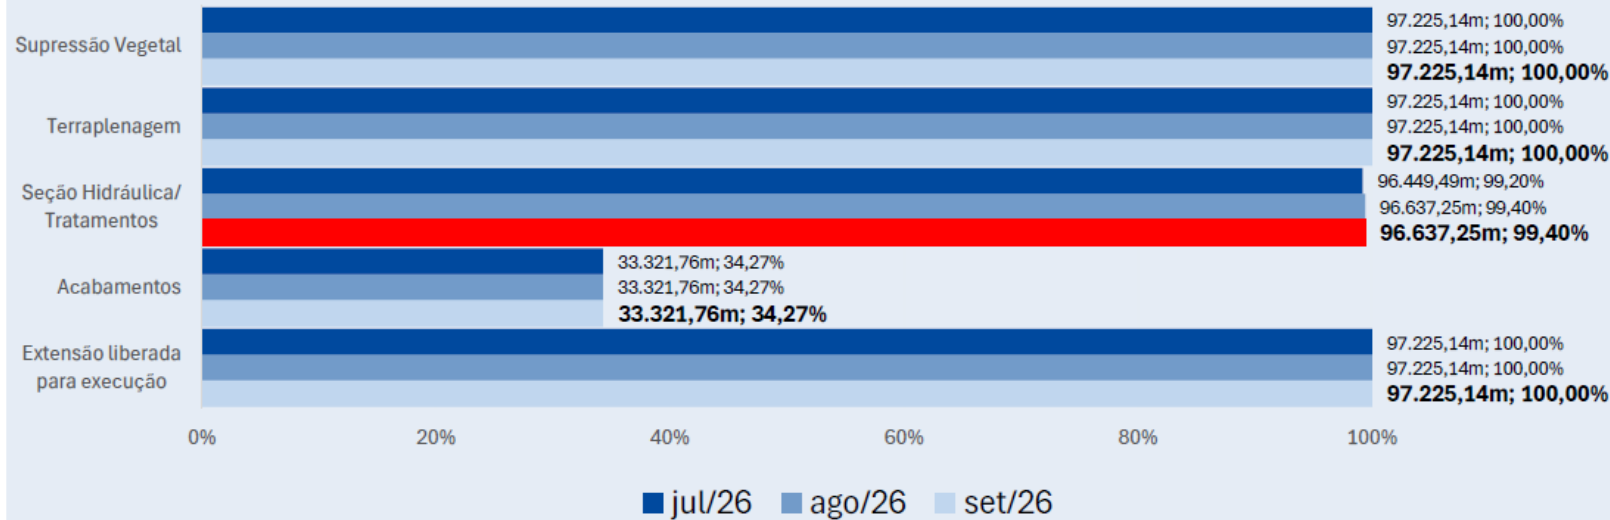


Estruturas de Concluídas

(Avanço Financeiro = 100%)

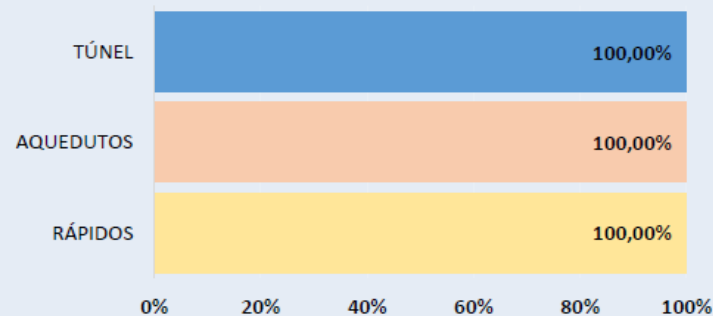


Sifões

(Avanço Financeiro = 98,94%)

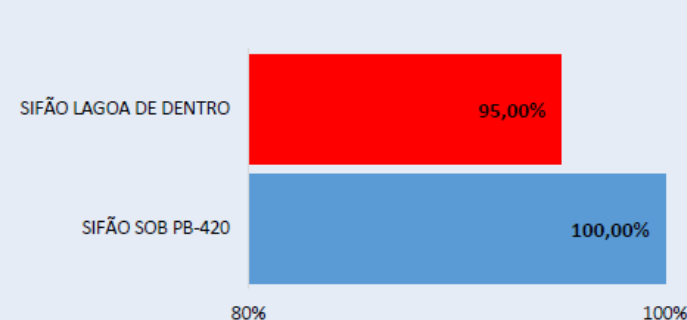

Estruturas de Controle


(Avanço Financeiro = 90,58%)

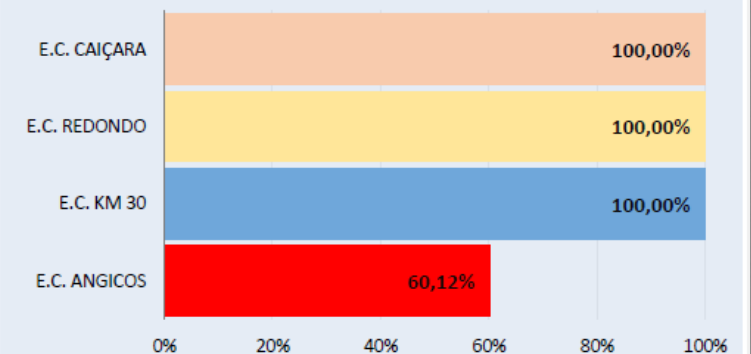


Ramal do Apodi




Avanço Físico Por Marco

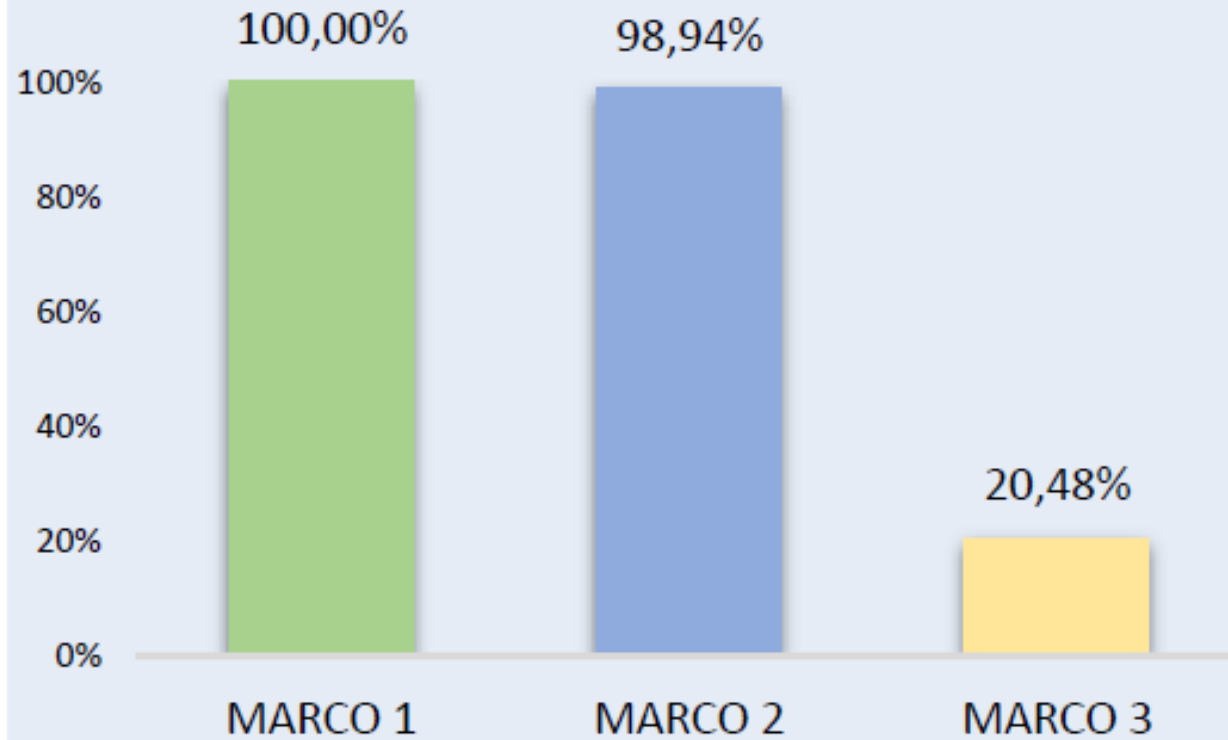

Mão de Obra

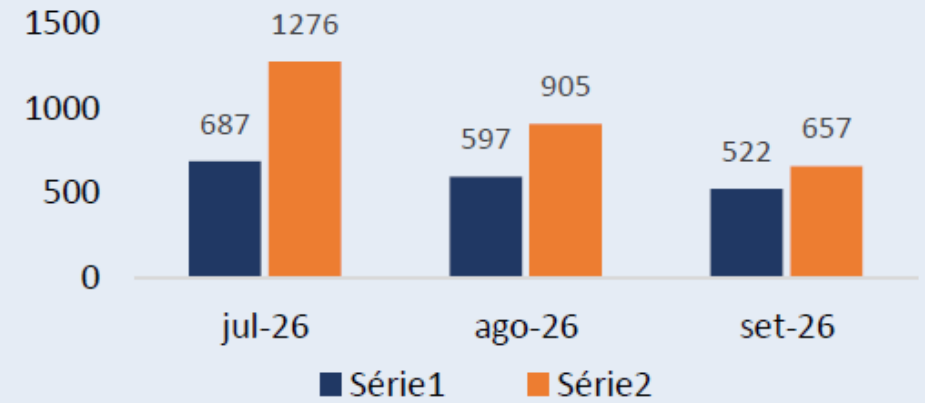

Equipamentos

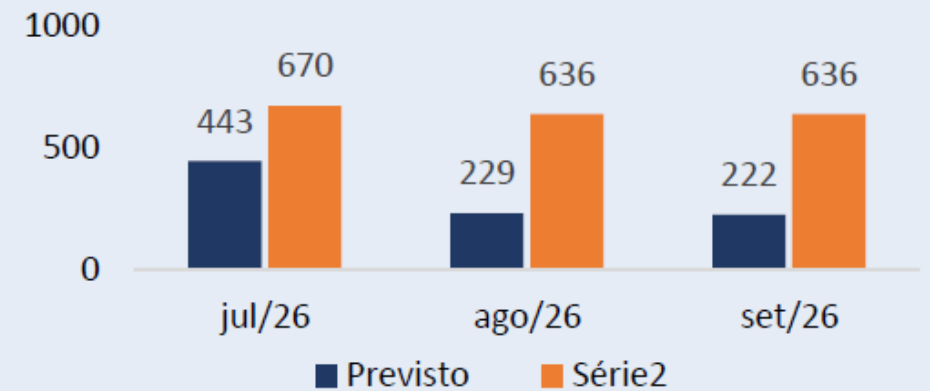


Ramal do Apodi



Trecho em teste com carga (sem paralizações)

INÍCIO DO TESTE: 01/08

INÍCIO DO TESTE : 02/08

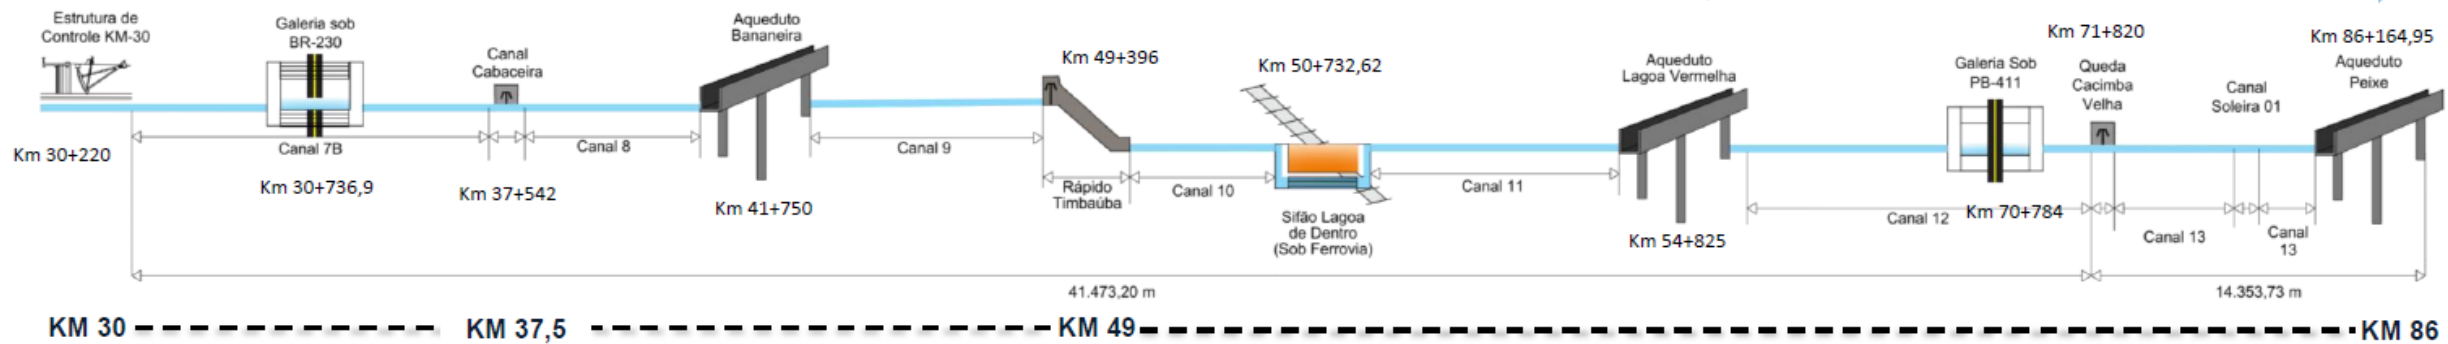

Legenda:

→ Trecho com água


Obs: A retomada dos testes iniciaram com a abertura da EC de Redondo às 8h30min do dia 01/08/2026.

Ramal do Apodi

Trecho em teste com carga (sem paralizações)

INÍCIO DO TESTE : 02/08

INÍCIO DO TESTE : 03/08

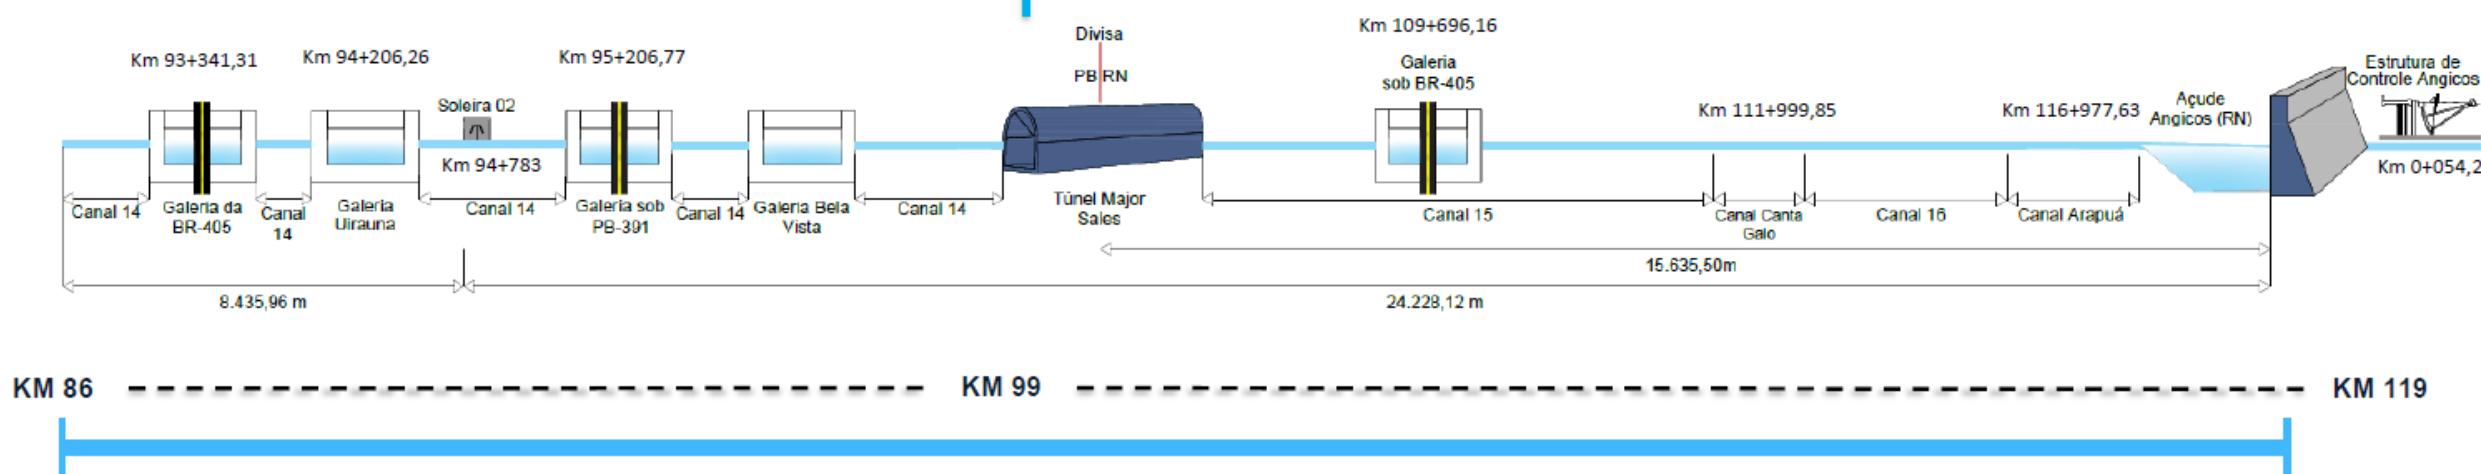

Legenda:

→ Trecho com água

Obs: A retomada dos testes iniciaram com a abertura da EC de Redondo às 8h30min do dia 01/08/2026.

Ramal do Apodi



WBS 4239 – CANAL 13



Foto 3: revestimento primário de berma e canaletas



Foto 4: revestimento primário de berma e canaletas

Ramal do Apodi



Foto 5: concretagem do medidor de vazão



Foto 6: concretagem de canaleta berma

Ramal do Apodi



WBS 4571 – PASSARELA 12



Foto 7: execução da superestrutura



Foto 8: içamento da armação



Foto 9: montagem das fôrmas



Foto 10: concretagem da superestrutura

Ramal do Apodi



WBS 4240 – CANAL 14



Foto 11: concretagem do medidor de vazão



Foto 12: envelopamento de tubo da canaleta



Foto 13: revestimento primário da berma LE



Foto 14: Execução do canal de restituição

Ramal do Apodi



WBS 4548 – PONTE MISTA 12



Foto 35: concretagem do bloco da sapata



Foto 36: Posicionamento das formas



Foto 37: nivelamento do terreno



Foto 38: Montagem das vigas longarinas

Ramal do Apodi

PBA 7 – Desapropriações de Terras e Benfeitorias do PISF e dos Ramais Associados

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO APODI – TRECHO IV DO PISF							28/09/2026	
Descrição	Processos		Imóveis		Área (ha)		Valor (R\$)	
Cadastro em análise (Checklist)	12	1,3%	14	1,3%	26,7500	0,7%	319.302,87	0,6%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	21	2,3%	22	2,0%	30,6000	0,8%	433.802,88	0,8%
Processos para ajuizamento com cadastro no SEI	11	1,2%	16	1,5%	52,9800	1,4%	262.750,30	0,5%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	344	37,3%	412	37,5%	1.501,4600	40,9%	19.519.998,03	36,8%
Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados	535	58,0%	636	57,8%	2.062,6400	56,1%	32.503.918,10	61,3%
TOTAIS:	923	100,0%	1.100	100,0%	3.674,4300	100,0%	53.039.772,18	100,0%

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO APODI – TRECHO IV DO PISF							06/05/2024	
Descrição	Processos		Imóveis		Área (ha)		Valor (R\$)	
Cadastro em análise (Checklist)	442	52,1%	527	52,1%	1.242,31	43,3%	57.609,95	0,1%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	79	9,3%	101	10,0%	463,07	16,1%	284.738,22	0,6%
Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI	131	15,4%	144	14,2%	283,76	9,9%	1.506.424,73	3,3%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	11	1,3%	12	1,2%	102,4	3,6%	24.880,07	0,1%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	141	16,6%	169	16,7%	592,22	20,6%	25.047.703,87	54,6%
Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados	44	5,2%	59	5,8%	187,65	6,5%	18.924.283,79	41,3%
TOTAIS:	848	100,0%	1.012	100,0%	2.871,41	100,0%	45.845.640,63	100,0%

Principais indicadores da produção de campo atualizada em 28/09/2026

- Cadastro em análise=====> São 12 processos de 14 propriedades c/ traçado alterado e complemento de VPR.
- Cadastro com pendências cartorárias=> Restam 21 processos de 22 propriedades c/ pendências cartorárias por traçado alterado + complemento VPR
- Processos pré-instruídos cadastrados no SEI===== São 11 processos de 16 propriedades pré-instruídos no SEI, em tramitação para AGU/PRU5.
- Processos ajuizados===== 879 ajuizados referentes a 1.048 propriedades. 19 processos suspensos por alteração de traçado.
- Há 106 processos com perícias em andamento, por discordância do valor indenizatório.

Ramal do Salgado

Execução das Obras de Implantação

- Contrato 28/2023 assinado em **19/12/2023**
- Ordem de Serviço emitida em **04/04/2024**.

Engenharia Consultiva

- Contrato 27/2024 assinado em **05/07/2024**.
- Emissão da Ordem de Serviço em **12/07/2024**).


Gestão Ambiental

- Contrato 27/2023 assinado em **19/12/2023**
- Emissão da Ordem de Serviço em **09/02/2024**).

INVESTIMENTO	VALOR ESTIMADO
TOTAL	R\$ 618.904.625,13





Ramal do Salgado - Perfil

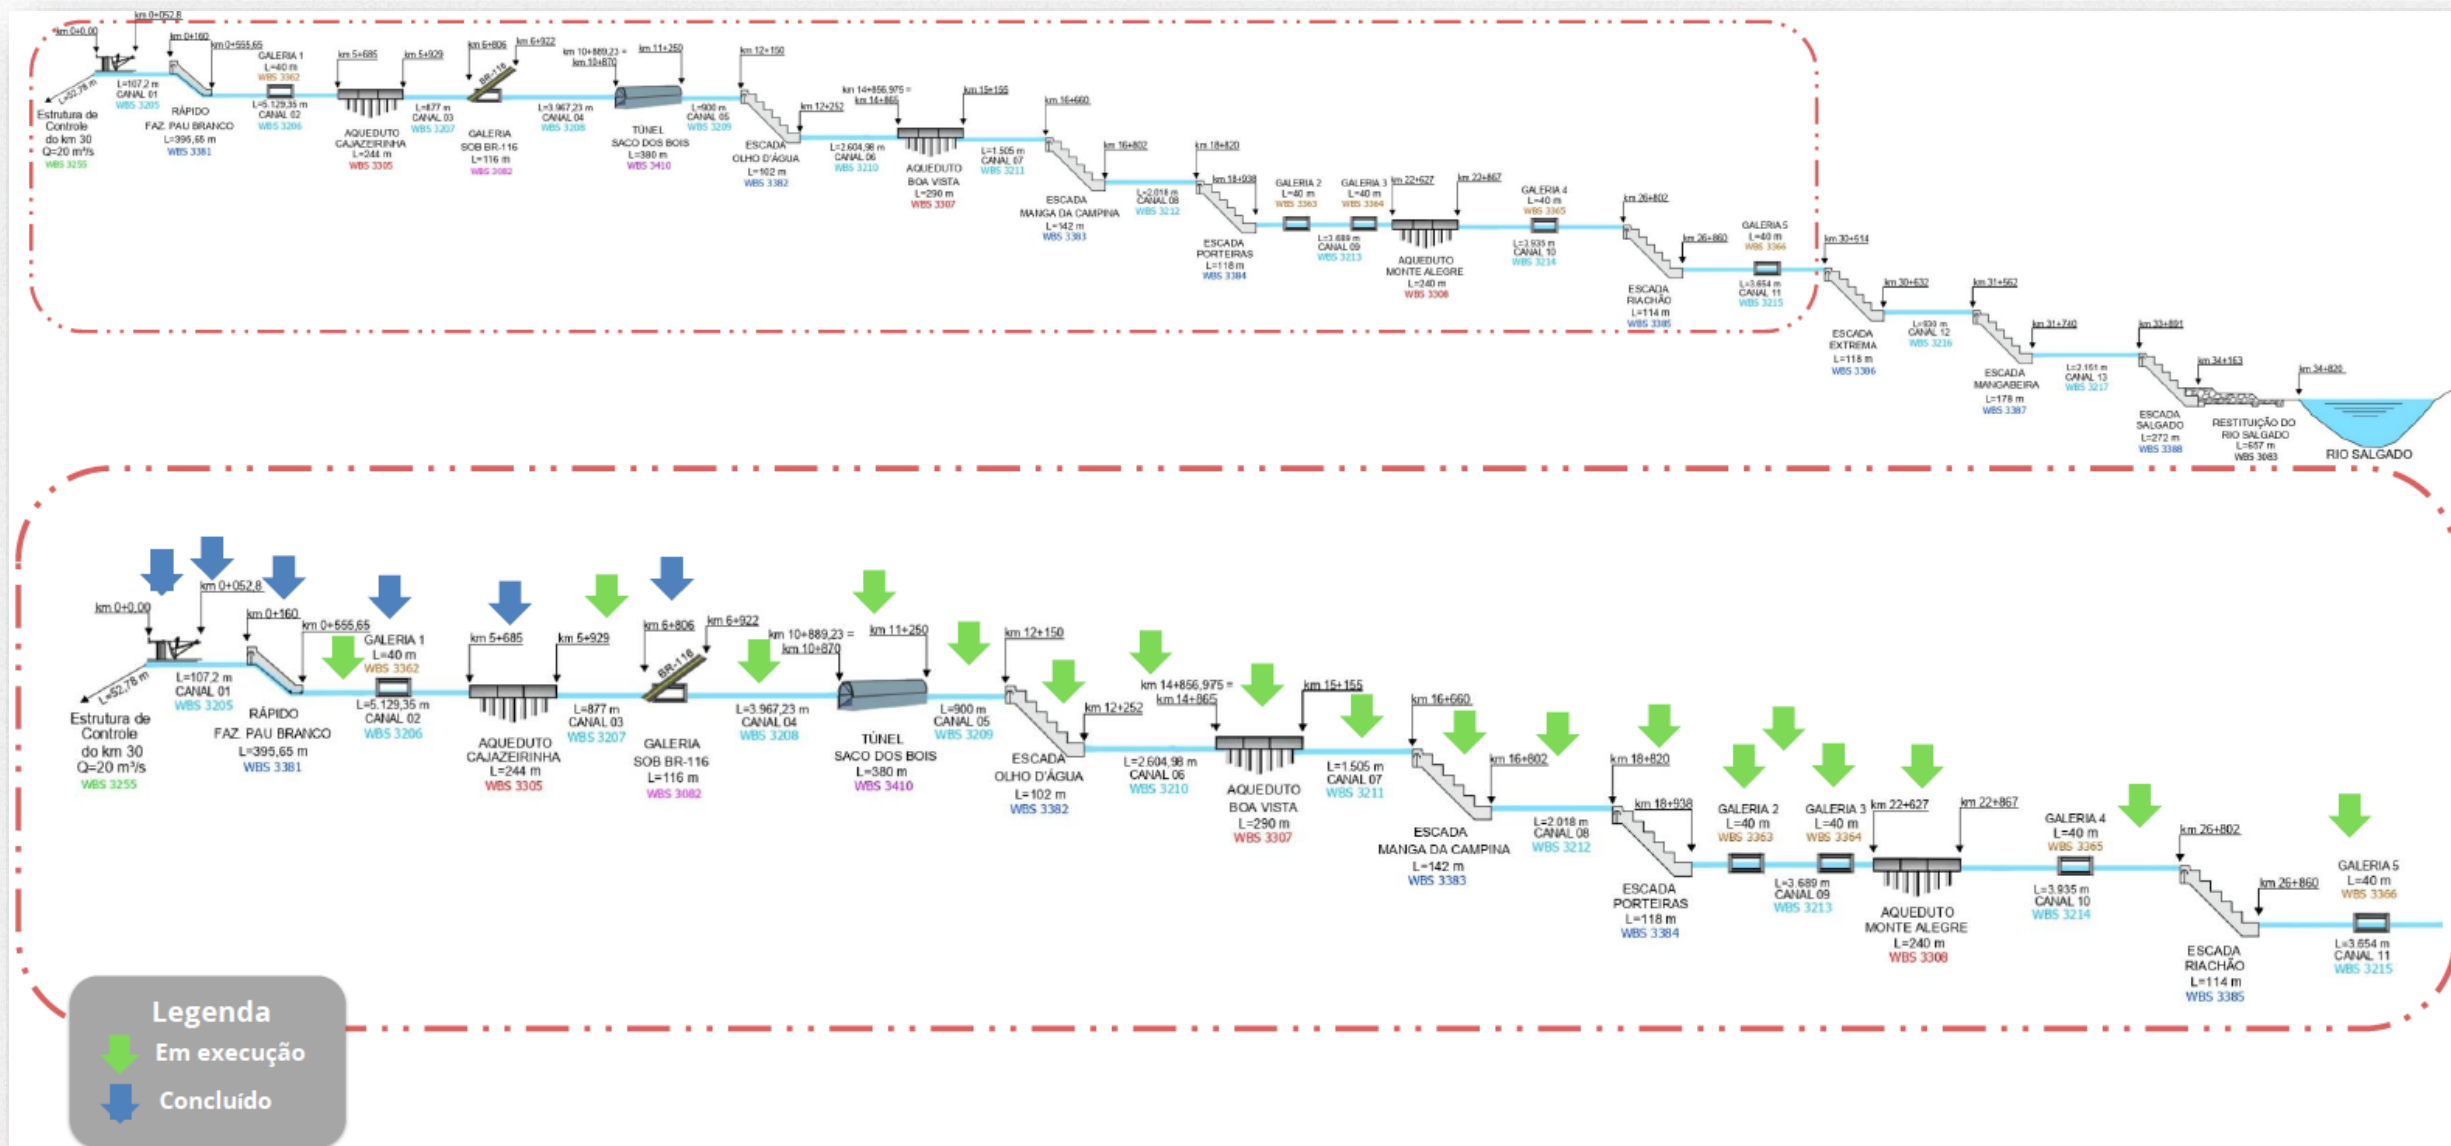

Ramal do Salgado - Obras

AVANÇO FÍSICO GERAL

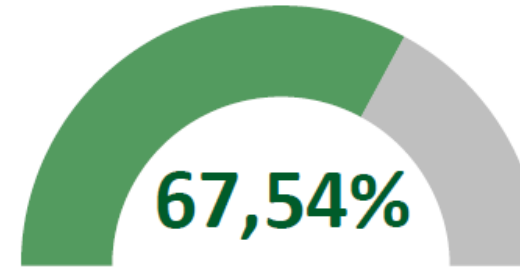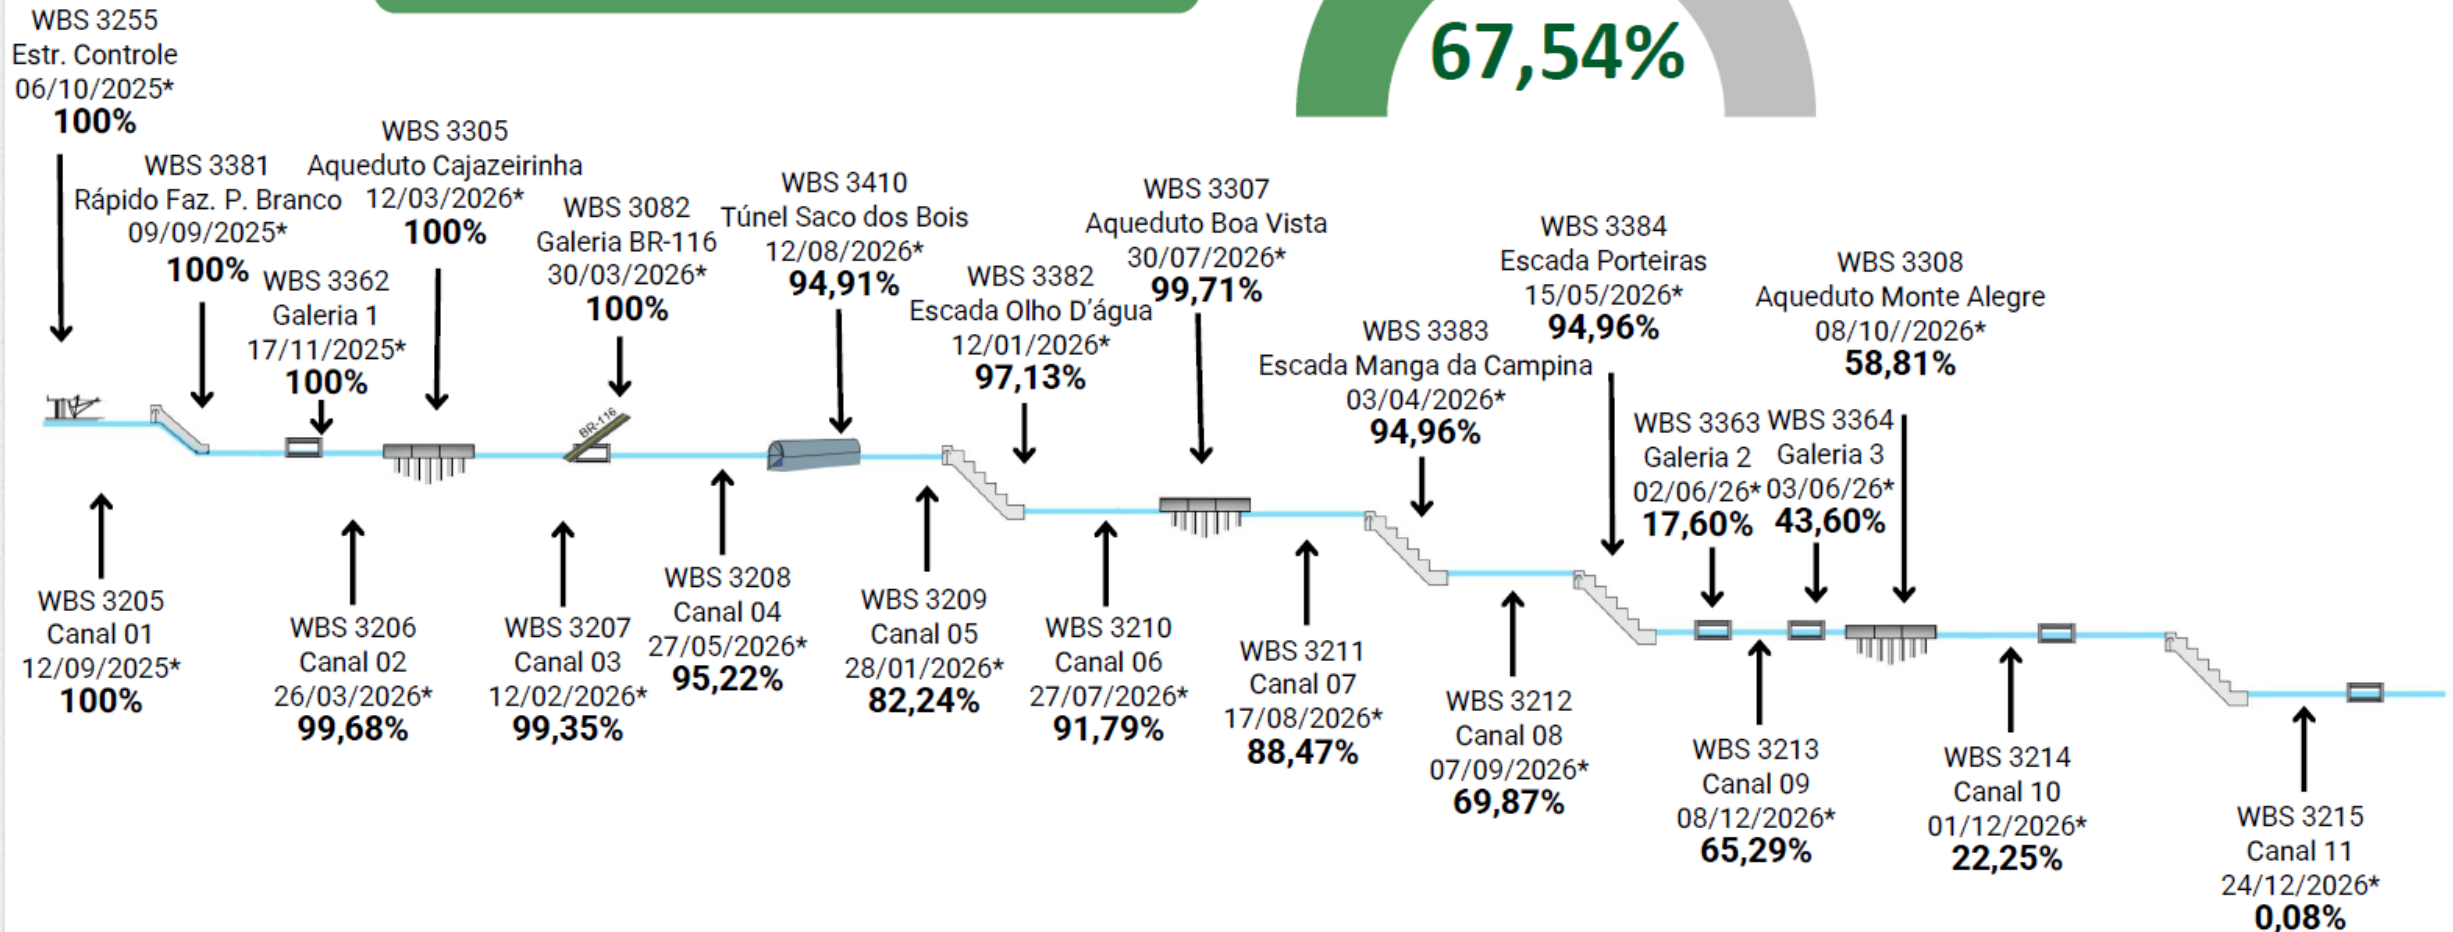

Ramal do Salgado



Ramal do Salgado





Ramal do Salgado



Ramal do Salgado

PBA 7 – Desapropriações de Terras e Benfeitorias do PISF e dos Ramais Associados


RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO SALGADO – TRECHO III DO PISF							28/09/2026	
Descrição	Processos		Imóveis		Área (ha)		Valor (R\$)	
Cadastro em análise (Checklist)	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	0	0,0%	0	0,0%	0,0000	0,0%	0,00	0,0%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	3	2,9%	3	2,4%	106,6240	13,1%	508.016,89	11,4%
Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados	99	97,1%	121	97,6%	706,5480	86,9%	3.940.865,84	88,6%
TOTAIS:	102	100,0%	124	100,0%	813,1720	100,0%	4.448.882,73	100,0%

RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO SALGADO – TRECHO III DO PISF							06/05/2024	
Descrição	Processos		Imóveis		Área (ha)		Valor (R\$)	
Cadastro em análise (Checklist)	28	28,0%	31	25,4%	241,16	34,1%	1.151.299,03	29,2%
Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)	16	16,0%	19	15,6%	185,15	26,2%	669.469,83	17,0%
Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI	9	9,0%	11	9,0%	9,13	1,3%	263.006,01	6,7%
Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial	6	6,0%	8	6,6%	5,71	0,8%	191.277,09	4,8%
Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará	41	41,0%	53	43,4%	265,75	37,6%	1.670.932,60	42,3%
Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,00	0,0%
TOTAIS:	100	100,0%	122	100,0%	706,90	100,0%	3.945.984,56	100,0%

Principais indicadores da produção atualizado em 28/09/2026


- Cadastro em análise===== Não há mais processo para ser analisado.
- Cadastro com pendências documental identificadas===== Não restam mais processos com pendências documentais (Cartório)
- Processos pré-instruídos em tramitação no SEI===== Não restam mais processos a instruir no momento, conforme informação da CGOF / Fiscalização
- Processos ajuizados===== Foram ajuizados no período 102 processos, referentes a 124 propriedades
- Resta 1 processo com perícia em andamento, por discordância do valor indenizatório; e 2 processos com pendencia de documentos de inventário.

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

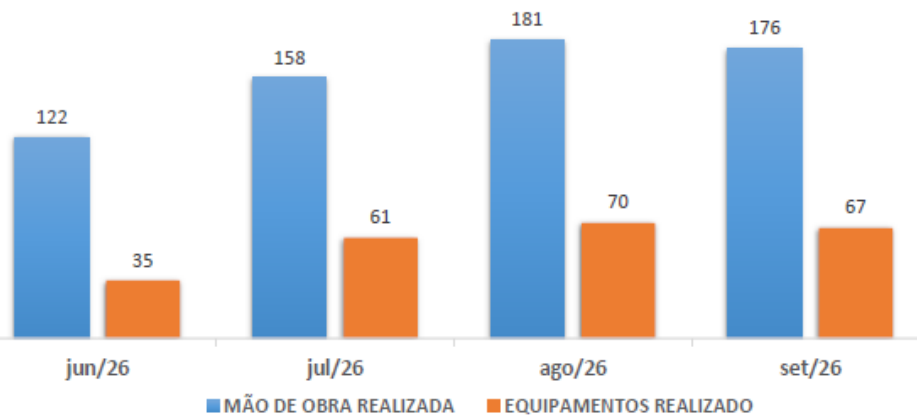


- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| TOTAL MEDIDO | ÚLTIMA MEDIÇÃO
BM 15 - AGO/26 |
| R\$ 181.455.212,55 | R\$ 27.171.736,17 |


Medições

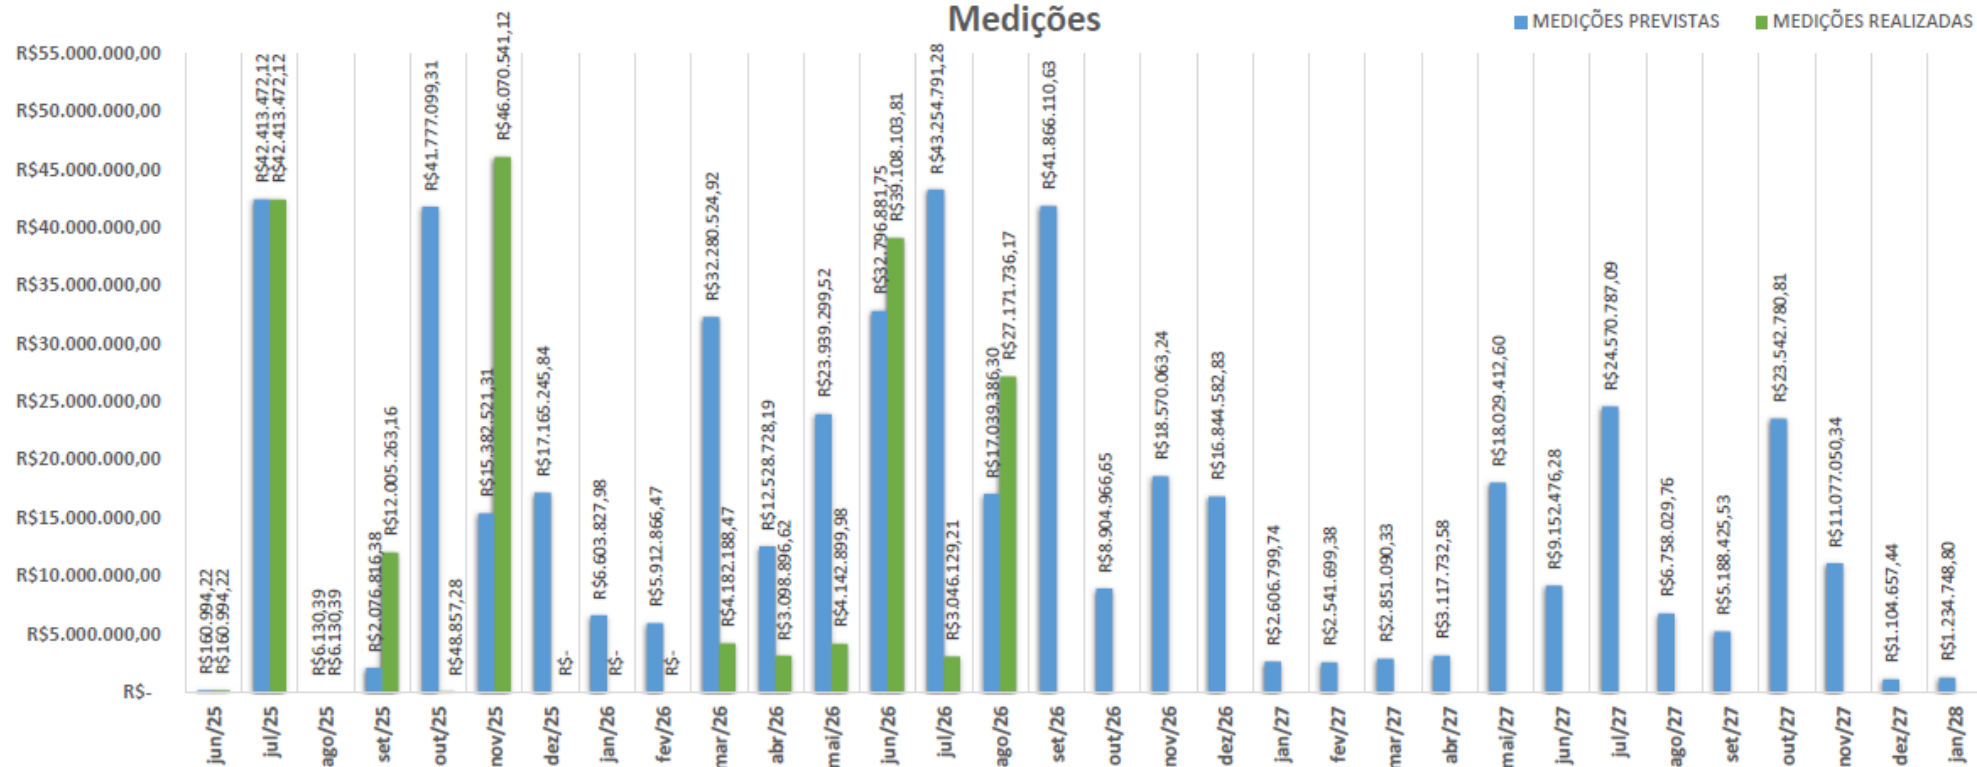


Ampliação do Bombeamento




% AVANÇO FÍSICO

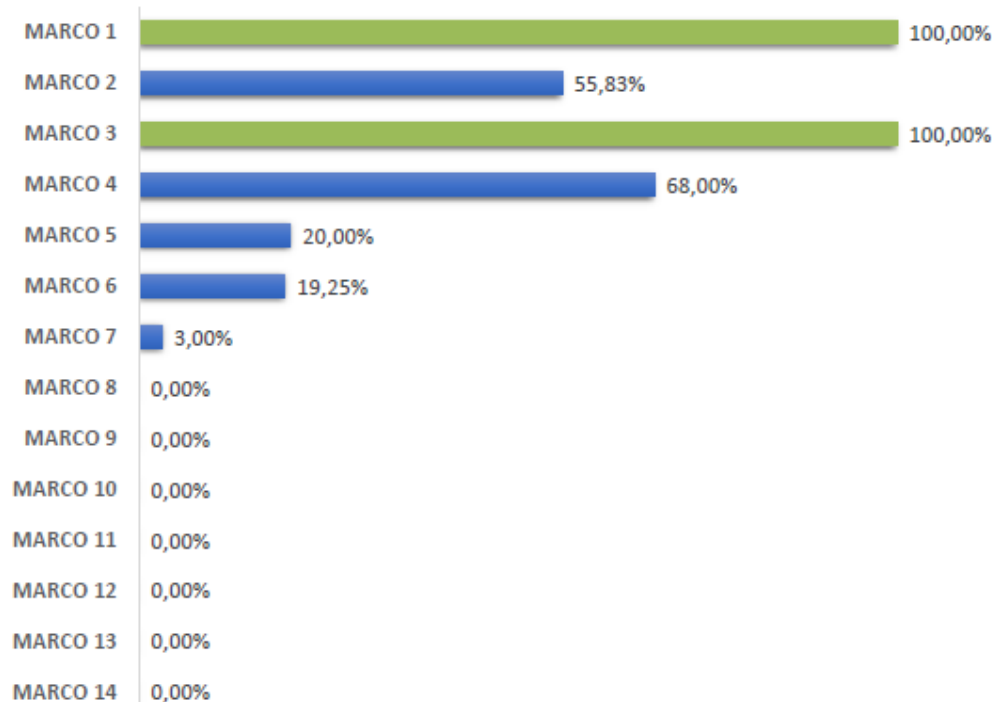

Marco concluído
Marco em andamento




% AVANÇO FINANCEIRO

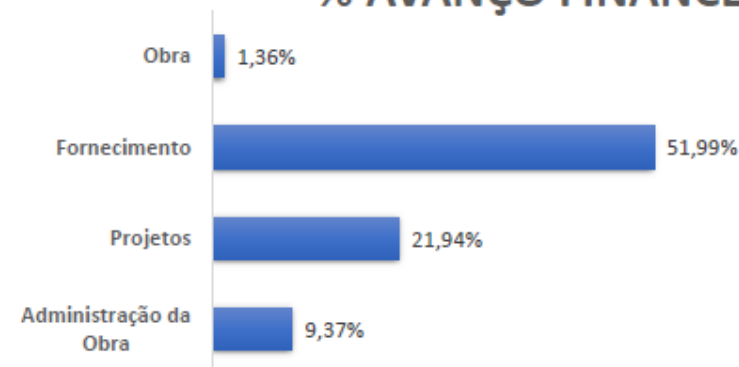

% AVANÇO ADM. OBRA



% AVANÇO OBRA

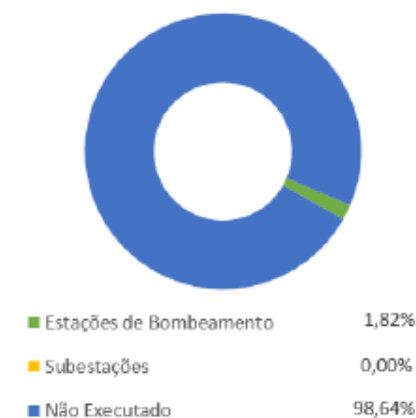

Ampliação do Bombeamento



Atividades realizadas:

- Posicionamento e soldagem dos condutos da EBI-1;
- Montagem das Fôrmas e Armação dos blocos de Ancoragem dos condutos na EBI-01;
- Escavação e Limpeza para mapeamento geológico do bloco de Ancoragem na EBI-02;
- Montagem de fôrmas e armação dos blocos de apoio na EBI-03.



Ampliação do Bombeamento



Atividades realizadas:

- Acompanhamento de ensaios para determinação do grau de compactação e o teor de umidade do aterro compactado na área da ampliação da SE-N3;
- Conferência e verificação topográfica do aterro compactado da SE-N3;
- Montagem da armação dos blocos de apoio na EBI-03.



Ampliação do Bombeamento



Atividades realizadas:

- Concretagem da base dos blocos de apoio da EBI-03;
- Inspeção em Fábrica da Hydrostec para verificação e liberação para embarque da comporta da EBI-03;
- Início da montagem do Ramal Provisório da SE-N1;
- Execução do aterro compactado na área da ampliação da SE-N3.



Ramal do Piancó

Inicia-se em Umburanas, Mauriti/CE. Estende-se até o rio Piancó, desaguando no Açude Condado.

Deverá beneficiar cerca de 36 municípios, com aproximadamente 350 mil habitantes.

- O EIA/RIMA aceito pelo IBAMA. ✓
- Publicado o recebimento do EIA/RIMA ✓
- Audiências Públicas realizadas no dia 10/03 em Mauriti/CE e 11/03 em Conceição/PB. (Nota Técnica emitida em Resposta ao parecer emitido pelo IBAMA depois das audiências.) ✓
- Orçamento concluído. ✓
- Concluído atendimento aos apontamentos da Conjur – MIDR, referente ao Edital. ✓
- Aguardando emissão do CERTOH pela ANA.
- Previsão de publicação: 2º semestre de 2026 (após CERTOH).

Denominação: **EBVIII-1**

Vazões (m³/s) 1ª etapa/2ª etapa: **2,00/4,00**


Altura manométrica (m.c.a.): **124,95**

Nº de conjuntos elevatórios (por etapa):

1ª etapa: **2+1** (reserva); 2ª etapa: **2**

Potência instalada (1ª/2ª etapa) (cv): **4800/9600**

Horas de funcionamento (h/dia): **20**

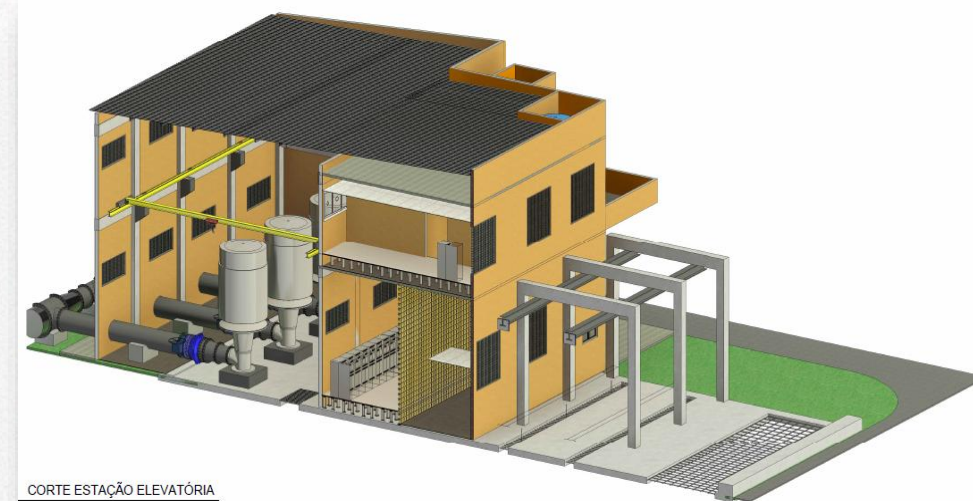



Recuperação Dique Negreiros



Recuperação e Execução das Lajes EBI-2

DADOS DO CONTRATO

Niemaia Serviços e Equipamentos

Contrato	25/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R\$ 2.360.000,00
Assinatura do Contrato	10/11/2025
Prazo de Vigência Contratual	17 meses - 09/04/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	08/05/2026
Prazo de Execução	8 meses - 06/01/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA



MARCOS CONTRATUAIS

Prazo	Marco	Descrição
08/06/26	MARCO 1	Conclusão da implantação dos Canteiros de Obra
08/07/26	MARCO 2	Entrega na obra dos itens de fornecimento
08/09/26	MARCO 3	Conclusão das obras de reforço no topo das paredes transversais e tratamento das fissuras
08/10/26	MARCO 4	Conclusão da execução das lajes sobre os poços de sucção 5 a 8

Atividades realizadas no período:

- Escarificação mecanizada do concreto no topo das paredes transversais da EBI-02.



Recuperação e Execução das Lajes EBI-3

DADOS DO CONTRATO

Niemaia Serviços e Equipamentos

Contrato	26/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R\$ 2.367.646,00
Assinatura do Contrato	10/11/2025
Prazo de Vigência Contratual	17 meses - 09/04/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	08/05/2026
Prazo de Execução	8 meses - 06/01/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA



MARCOS CONTRATUAIS

Prazo	Marco	Descrição
08/06/26	MARCO 1	Conclusão da implantação dos Canteiros de Obra
08/07/26	MARCO 2	Entrega na obra dos itens de fornecimento
08/09/26	MARCO 3	Conclusão das obras de reforço no topo das paredes transversais e tratamento das fissuras
08/10/26	MARCO 4	Conclusão da execução das lajes sobre os poços de sucção 5 a 8

Atividades realizadas no período:

- Escarificação mecanizada do concreto na área para Ancoragem das Lajes da Galeria de Válvulas da EBI-03;
- Fôrmas para as pré-lajes da Galeria de Válvulas da EBI-03.




Recuperação dos PVs da Galeria Monteiro

DADOS DO CONTRATO

Construtora W. V.

Contrato	42/2025-MIDR
Valor do Contrato (P0)	R\$ 10.988.000,00
Assinatura do Contrato	15/12/2025
Prazo de Vigência Contratual	15 meses - 15/03/2027
Assinatura da Ordem de Serviço	19/02/2026
Prazo de Execução	12 meses - 19/02/2027

AVANÇO GERAL DA OBRA

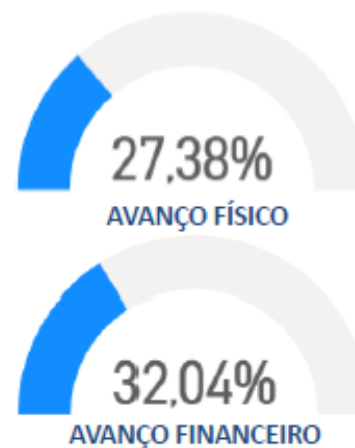

AVANÇO FÍSICO

POÇO DE VISITA - PV-05	32,05%
POÇO DE VISITA - PV-04	31,25%
POÇO DE VISITA - PV-03	26,99%
POÇO DE VISITA - PV-02	24,42%
POÇO DE VISITA - PV-01	24,05%

Atividades realizadas no período:

- Injeção de argamassa de solo-cimento para o preenchimento na interface chapas/solo no Tunnel Liner PV-04 e do PV-05;
- Conferência do alinhamento no PV-03;
- Escavação manual do Tunnel Liner no PV-05.



Agradecimentos do Time do DPE

