




# PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Secretaria Nacional de Segurança Hídrica  
Departamento de Projetos Estratégicos  
(DPE/SNSH – MIDR)

Setembro / 2026


# Avanços Físico e Ambiental das Obras

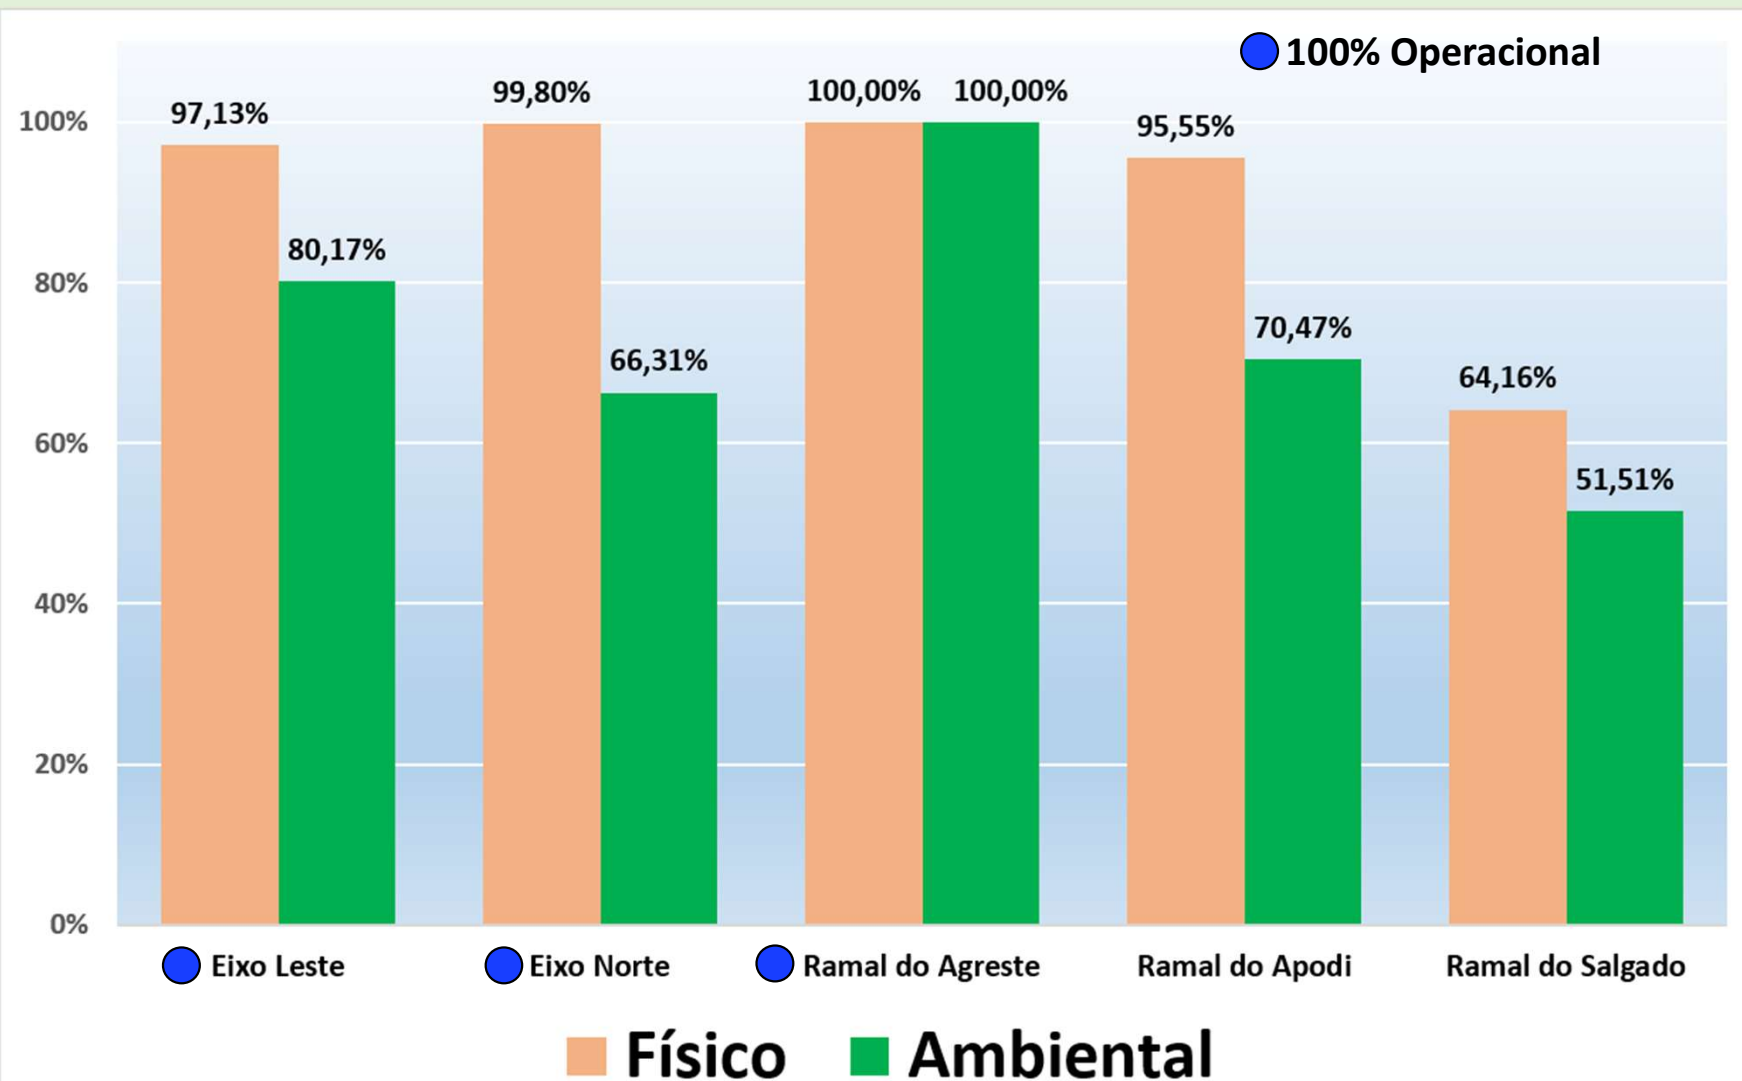

# Ramal do Apodi



## Avanço físico x Avanço financeiro Comparativo Obra

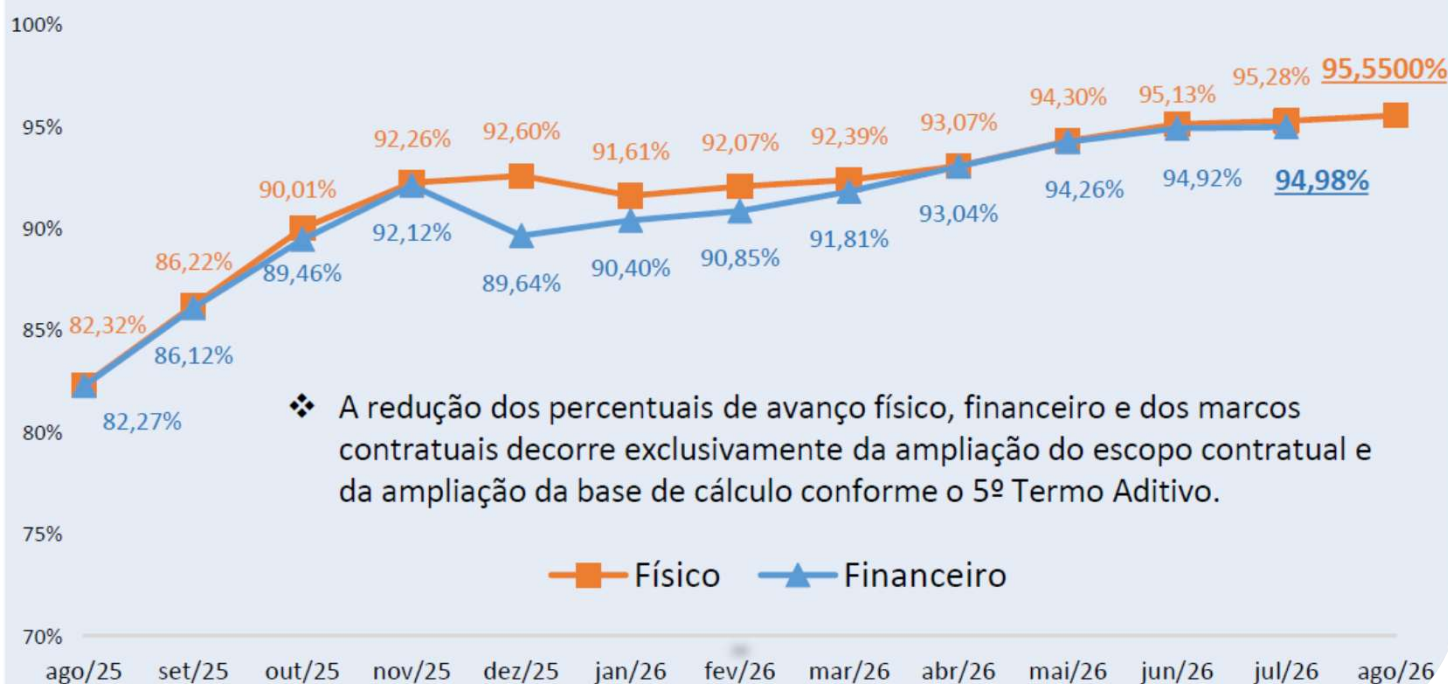


# Ramal do Apodi




## Evolução Física Mensal Segmento de Canal

(Avanço Financeiro = 98,33%)

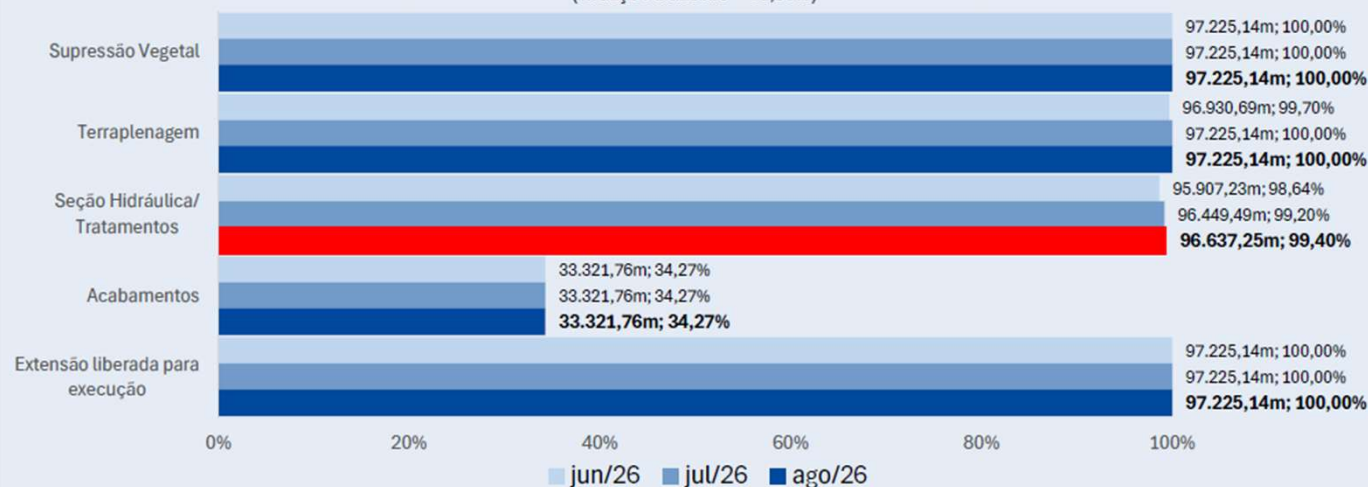


## Estruturas de Concluídas

(Avanço Financeiro = 100%)

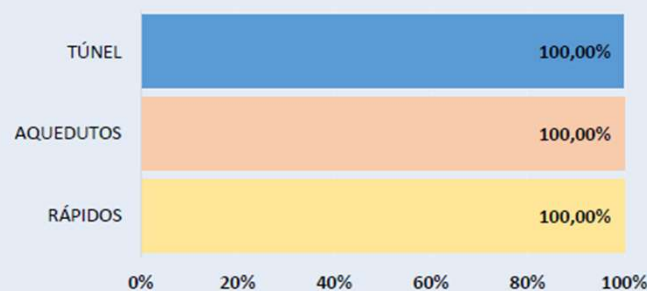


## Sifões

(Avanço Financeiro = 98,94%)

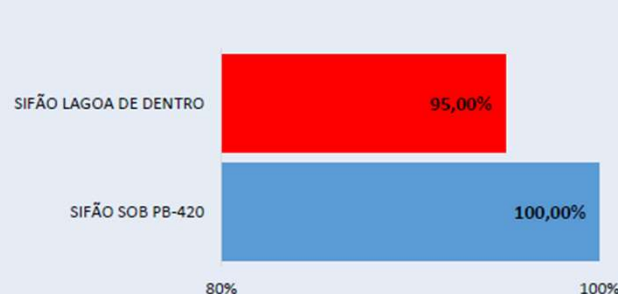

## Estruturas de Controle


(Avanço Financeiro = 90,58%)

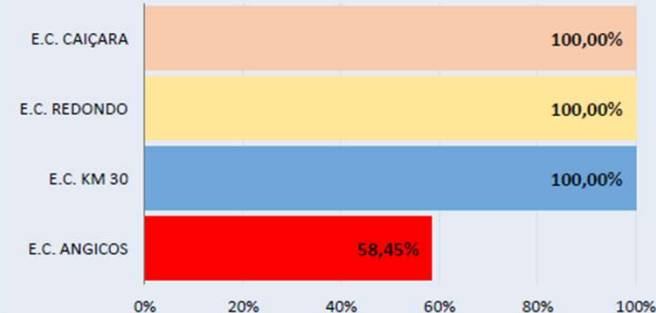

# Ramal do Apodi




## Avanço Físico Por Marco

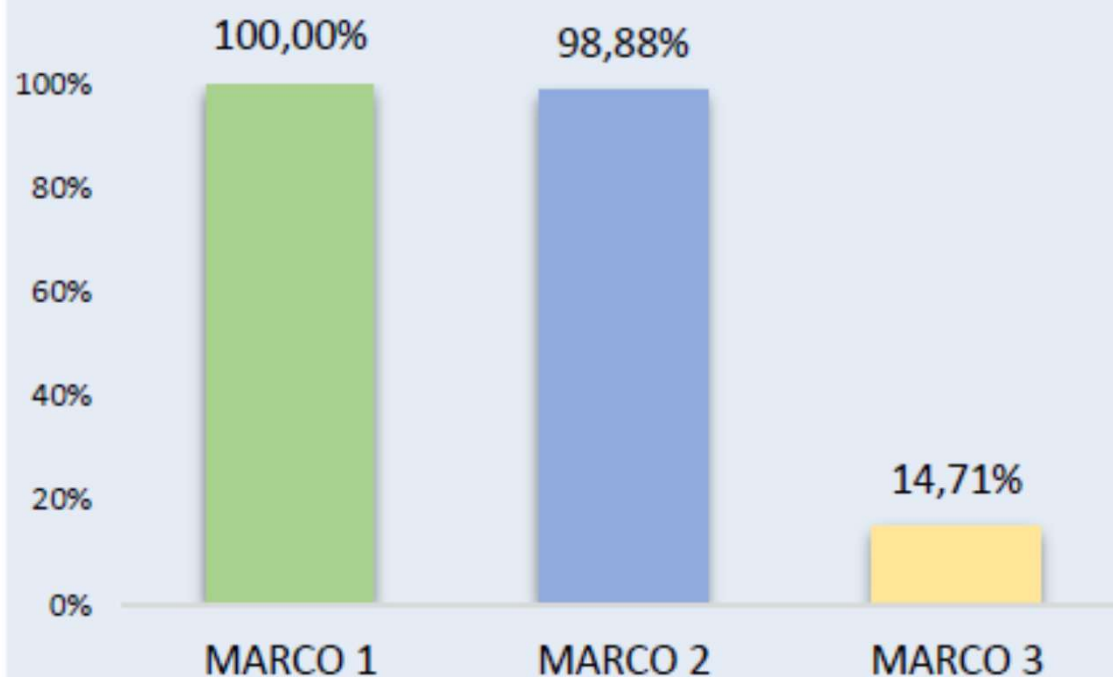

## Mão de Obra




## Equipamentos

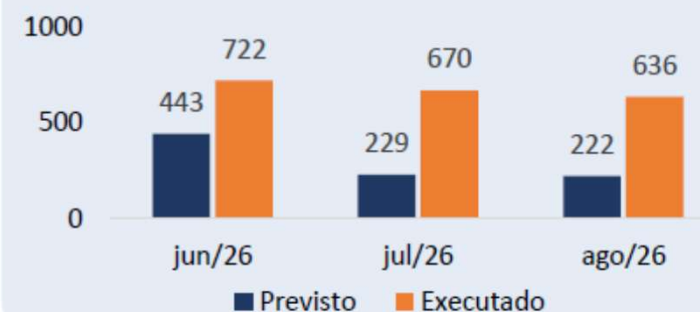



# Ramal do Apodi

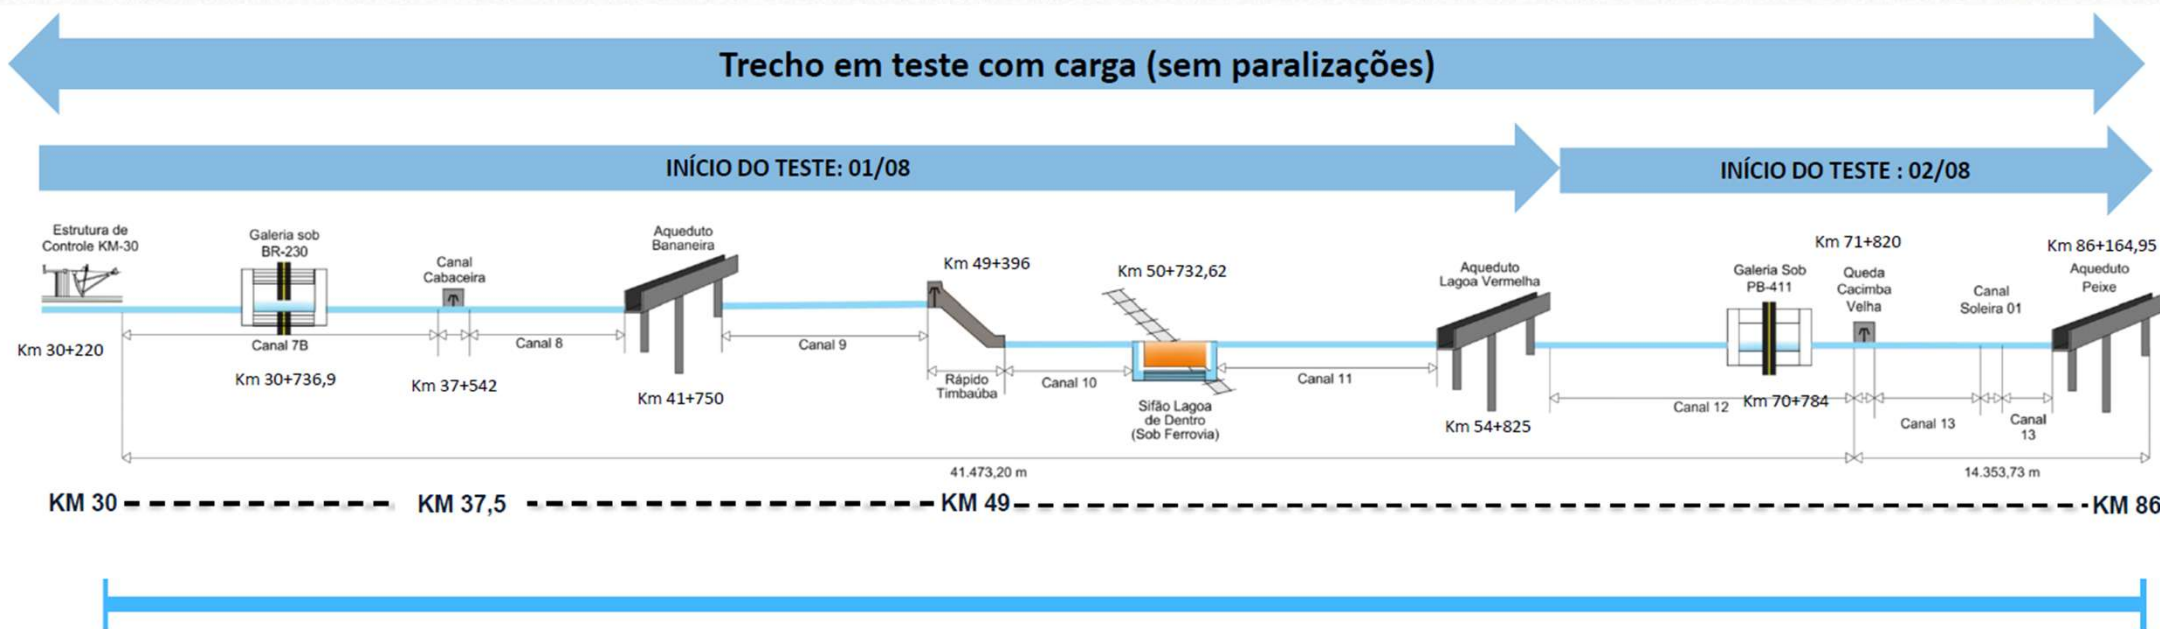

Legenda:

→ Trecho com água


**Obs:** A retomada dos testes iniciaram com a abertura da EC de Redondo às 8h30min do dia 01/08/2026;

# Ramal do Apodi

Trecho em teste com carga (sem paralizações)

INÍCIO DO TESTE : 02/08

INÍCIO DO TESTE : 03/08

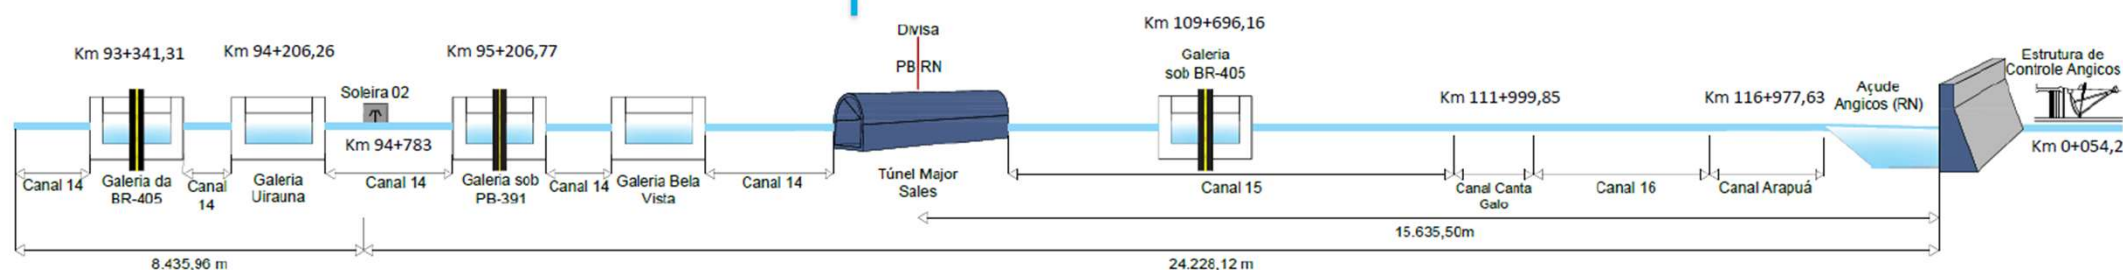

Legenda:

→ Trecho com água

**Obs:** A retomada dos testes iniciaram com a abertura da EC de Redondo às 8h30min do dia 01/08/2026;

# Ramal do Apodi



## WBS 4576 - PASSARELA 17 (CANAL 8)



Foto 1: execução das formas e armação



Foto 2: execução das formas e armação

# Ramal do Apodi



## WBS 4238 – CANAL 12



Foto 9: enrocamento do talude externo



Foto 10: execução de canaleta

## WBS 4239 – CANAL 13



Foto 11: revestimento primário de berma



Foto 12: revestimento primário de berma

# Ramal do Apodi



## WBS 4529 – GALERIA SOB A PB-391



Foto 13: armação da laje superior



Foto 14: armação da laje superior

## WBS 4240 – CANAL 14



Foto 15: enrocamento de talude externo



Foto 16: revestimento da berma

# Ramal do Apodi



## WBS 4574 – PASSARELA 15



Foto 17: reaterro na cortina



Foto 18: reaterro na cortina

## WBS 4546 – PONTE MISTA 6



Foto 19: forma e armação das cortinas



Foto 20: concretagem das cortinas

# Ramal do Apodi



## WBS 4241 – CANAL 15



Foto 27: concretagem da laje de transição – Overchute 02



Foto 28: armação das paredes de transição – Overchute 02



Foto 29: enrocamento nas paredes laterais – Overchute 01



Foto 30: enrocamento na seção hidráulica – Overchute 01

# Ramal do Apodi

## PBA 7 – Desapropriações de Terras e Benfeitorias do PISF e dos Ramais Associados

| RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO APODI – TRECHO IV DO PISF |            |               |              |               |                   |               | 31/08/2026           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Descrição                                                                          | Processos  |               | Imóveis      |               | Área (ha)         |               | Valor (R\$)          |               |
| Cadastro em análise (Checklist)                                                    | 12         | 1,3%          | 14           | 1,3%          | 26,7500           | 0,7%          | 319.302,87           | 0,6%          |
| Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)                              | 21         | 2,3%          | 22           | 2,0%          | 30,6000           | 0,8%          | 433.802,88           | 0,8%          |
| Processos para ajuizamento com cadastro no SEI                                     | 11         | 1,2%          | 16           | 1,5%          | 52,9800           | 1,4%          | 262.750,30           | 0,5%          |
| Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial                          | 0          | 0,0%          | 0            | 0,0%          | 0,0000            | 0,0%          | 0,00                 | 0,0%          |
| Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará                             | 344        | 37,3%         | 412          | 37,5%         | 1.501,4600        | 40,9%         | 19.519.998,03        | 36,8%         |
| Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados                                  | 535        | 58,0%         | 636          | 57,8%         | 2.062,6400        | 56,1%         | 32.503.918,10        | 61,3%         |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                     | <b>923</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.100</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.674,4300</b> | <b>100,0%</b> | <b>53.039.772,18</b> | <b>100,0%</b> |

| RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO APODI – TRECHO IV DO PISF |            |               |              |               |                 |               | 06/05/2024           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| Descrição                                                                          | Processos  |               | Imóveis      |               | Área (ha)       |               | Valor (R\$)          |               |
| Cadastro em análise (Checklist)                                                    | 442        | 52,1%         | 527          | 52,1%         | 1.242,31        | 43,3%         | 57.609,95            | 0,1%          |
| Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)                              | 79         | 9,3%          | 101          | 10,0%         | 463,07          | 16,1%         | 284.738,22           | 0,6%          |
| Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI                               | 131        | 15,4%         | 144          | 14,2%         | 283,76          | 9,9%          | 1.506.424,73         | 3,3%          |
| Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial                          | 11         | 1,3%          | 12           | 1,2%          | 102,4           | 3,6%          | 24.880,07            | 0,1%          |
| Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará                             | 141        | 16,6%         | 169          | 16,7%         | 592,22          | 20,6%         | 25.047.703,87        | 54,6%         |
| Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados                                  | 44         | 5,2%          | 59           | 5,8%          | 187,65          | 6,5%          | 18.924.283,79        | 41,3%         |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                     | <b>848</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.012</b> | <b>100,0%</b> | <b>2.871,41</b> | <b>100,0%</b> | <b>45.845.640,63</b> | <b>100,0%</b> |

### Principais indicadores da produção de campo atualizada em 31/08/2026

- Cadastro em análise=====> São 12 processos de 14 propriedades c/ traçado alterado e complemento de VPR.
- Cadastro com pendências cartorárias=> Restam 21 processos de 22 propriedades c/ pendências cartorárias por traçado alterado + complemento VPR
- Processos pré-instruídos cadastrados no SEI===== São 11 processos de 16 propriedades pré-instruídos no SEI, em tramitação para AGU/PRU5.
- Processos ajuizados===== 879 ajuizados referentes a 1.048 propriedades. 19 processos suspensos por alteração de traçado.
- Há 96 processos com perícias em andamento, por discordância do valor indenizatório.

# Ramal do Salgado



## Execução das Obras de Implantação

- Contrato 28/2023 assinado em **19/12/2023**
- Ordem de Serviço emitida em **04/04/2024**.

## Engenharia Consultiva

- Contrato 27/2024 assinado em **05/07/2024**.
- Emissão da Ordem de Serviço em **12/07/2024**).


## Gestão Ambiental

- Contrato 27/2023 assinado em **19/12/2023**
- Emissão da Ordem de Serviço em **09/02/2024**).

| Parcela do investimento             | Valor estimado            | Valor contratado / homologado |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Obras                               | R\$ 420.000.000,00        | R\$ 357.850.000,00            |
| Engenharia Consultiva               | R\$ 40.000.000,00         | R\$ 31.133.619,00             |
| Gestão Ambiental                    | R\$ 48.000.000,00         | R\$ 45.900.000,00             |
| Cadastro Fundiário / Desapropriação | R\$ 16.000.000,00         | R\$ 925.896,00                |
| Reajustamento                       | R\$ 76.365.582,22         |                               |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 600.365.582,22</b> | <b>R\$ 435.809.515,00</b>     |



# Ramal do Salgado - Perfil

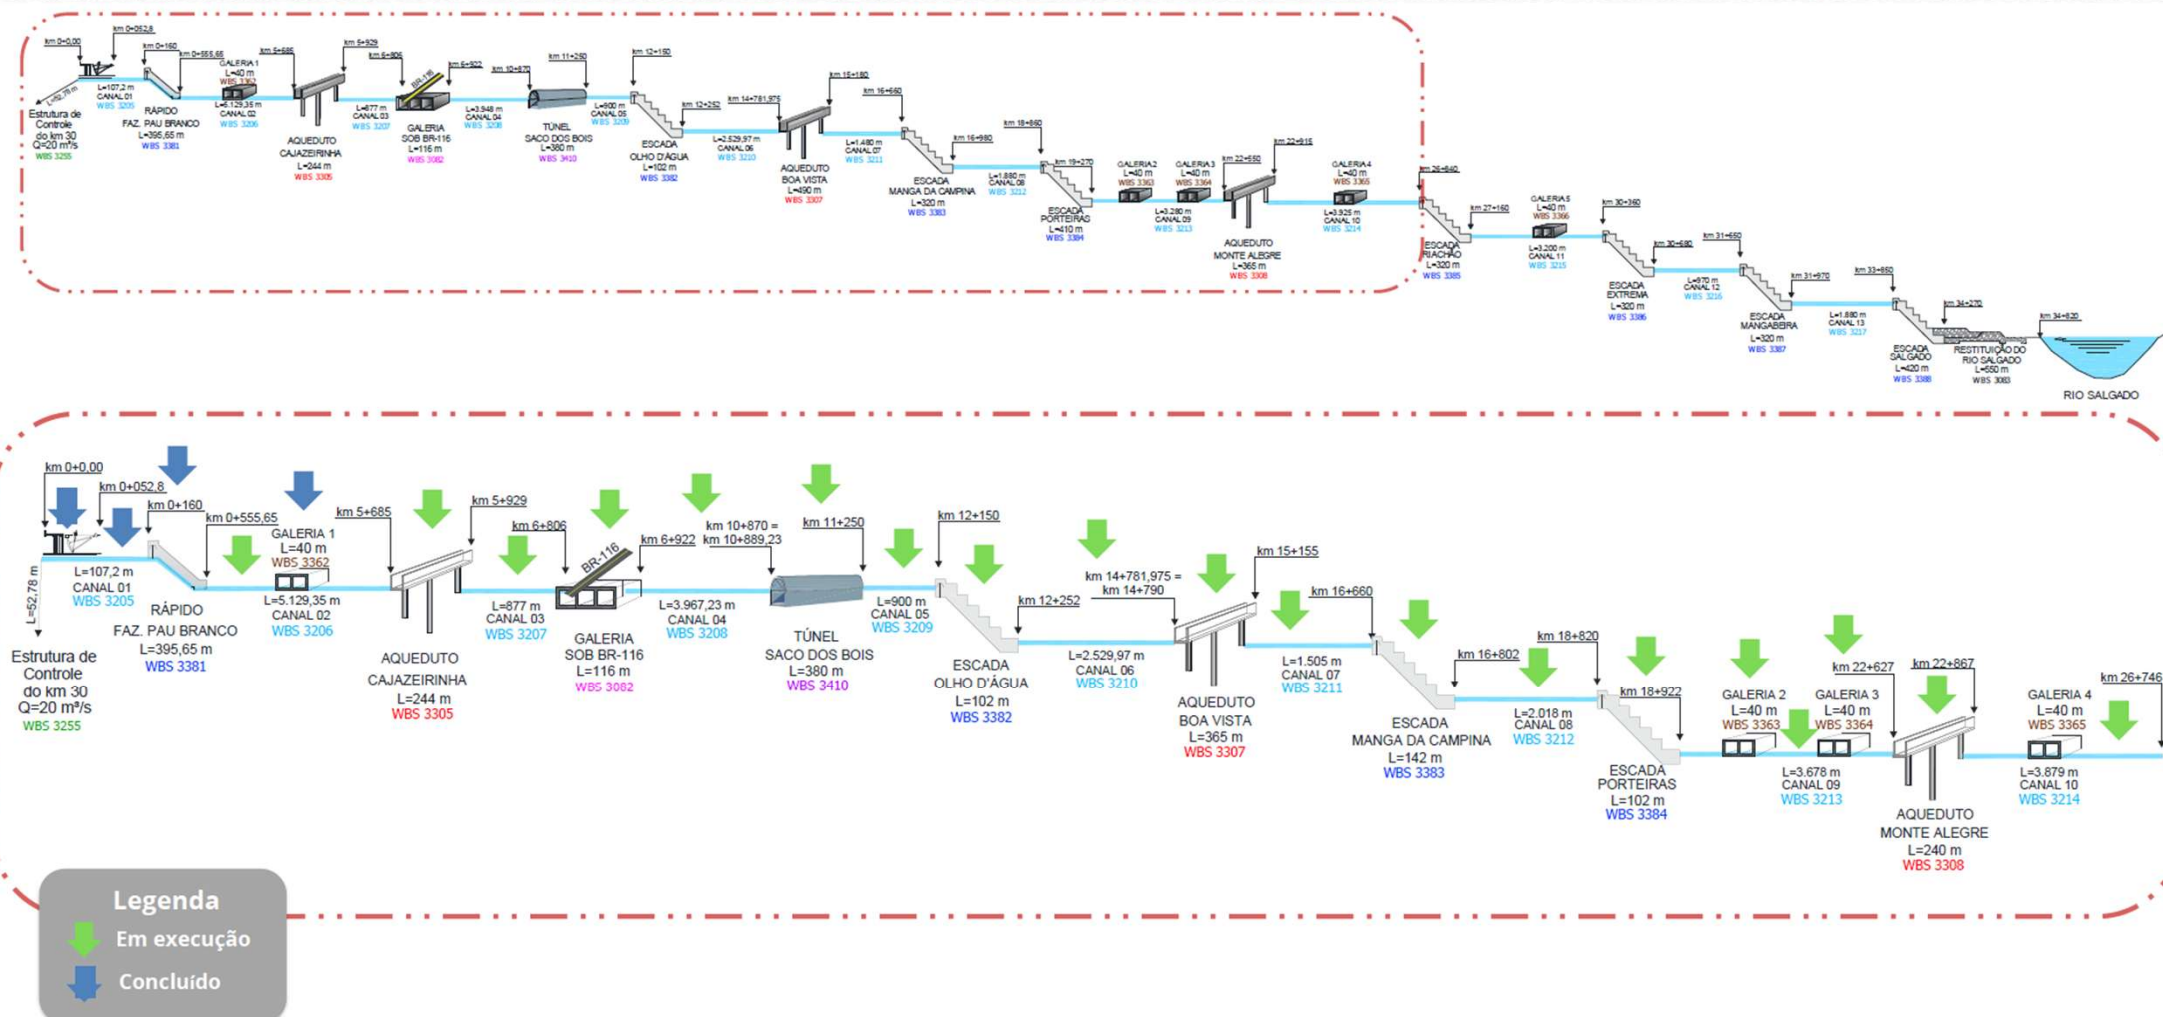




# Ramal do Salgado - Obras

## AVANÇO FÍSICO GERAL

64,16%

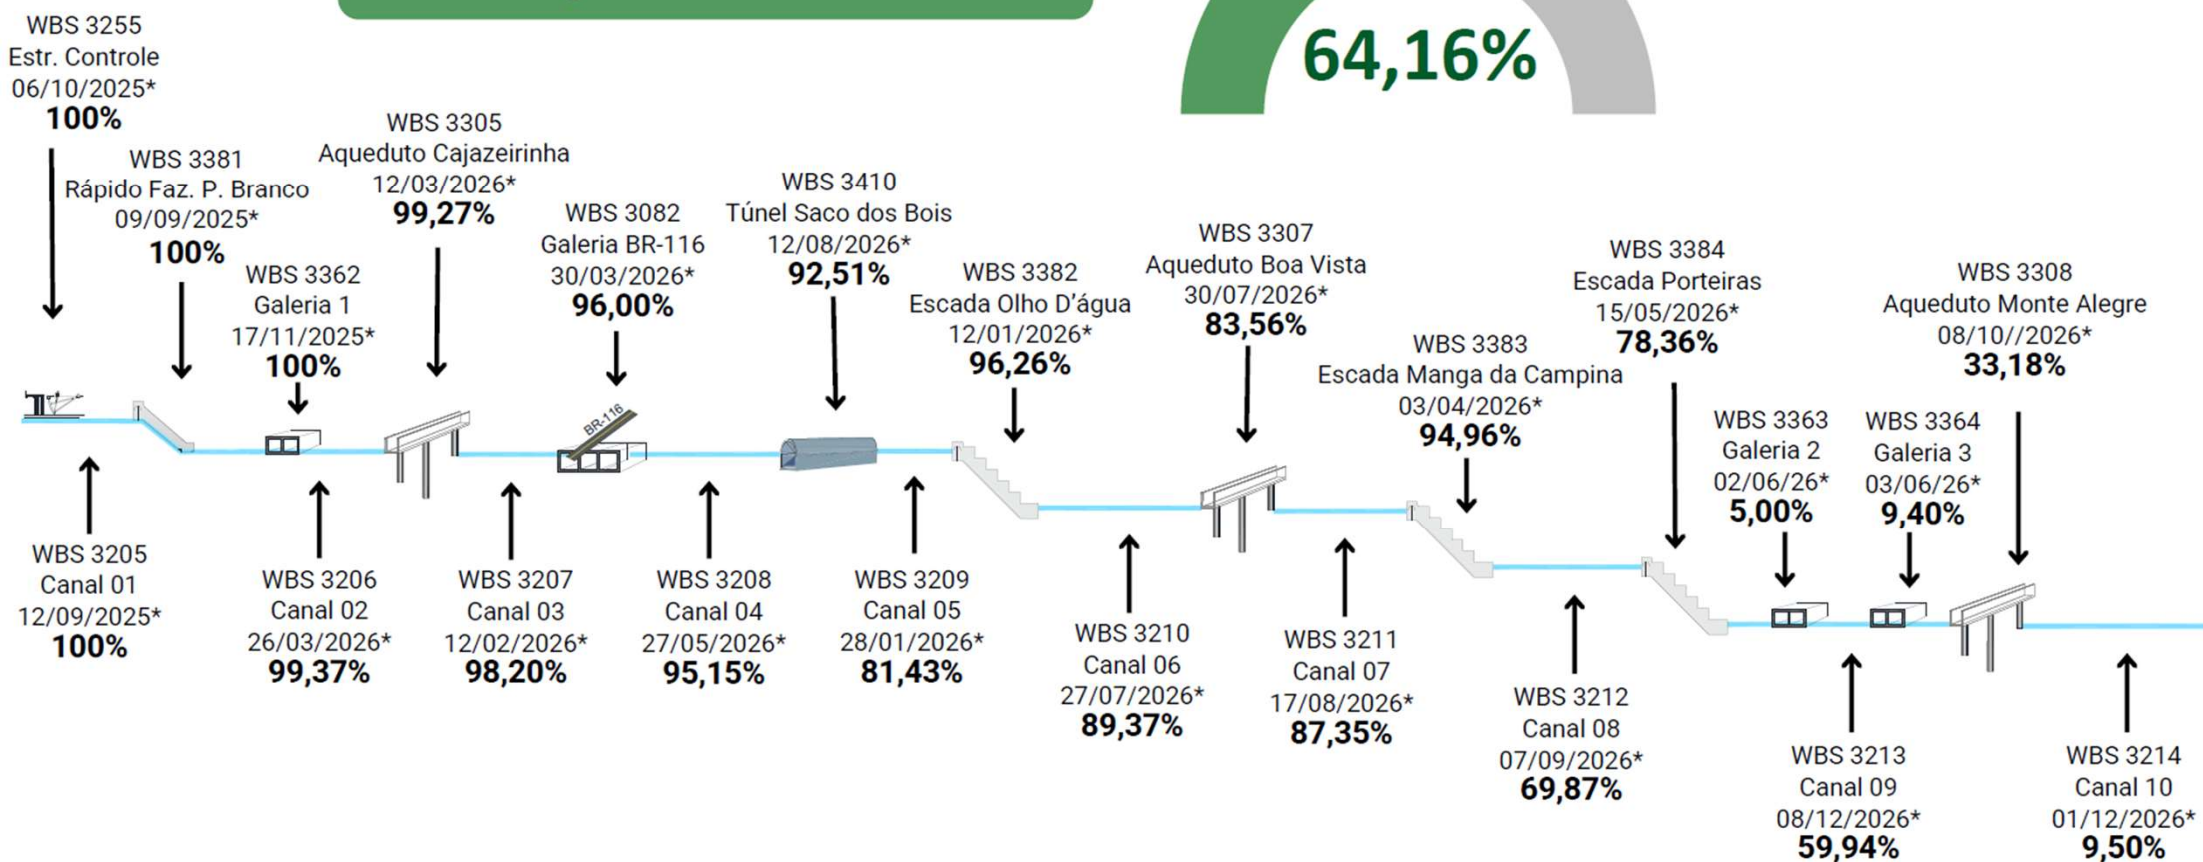

# Ramal do Salgado

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL





# Ramal do Salgado

## PBA 7 – Desapropriações de Terras e Benfeitorias do PISF e dos Ramais Associados

| RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO SALGADO – TRECHO III DO PISF |            |               |            |               |                 |               | 31/08/2026          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
| Descrição                                                                             | Processos  |               | Imóveis    |               | Área (ha)       |               | Valor (R\$)         |               |
| Cadastro em análise (Checklist)                                                       | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0,0000          | 0,0%          | 0,00                | 0,0%          |
| Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)                                 | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0,0000          | 0,0%          | 0,00                | 0,0%          |
| Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI                                  | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0,0000          | 0,0%          | 0,00                | 0,0%          |
| Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial                             | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0,0000          | 0,0%          | 0,00                | 0,0%          |
| Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará                                | 3          | 2,9%          | 3          | 2,4%          | 106,6240        | 13,1%         | 508.016,89          | 11,4%         |
| Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados                                     | 99         | 97,1%         | 121        | 97,6%         | 706,5480        | 86,9%         | 3.940.865,84        | 88,6%         |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                        | <b>102</b> | <b>100,0%</b> | <b>124</b> | <b>100,0%</b> | <b>813,1720</b> | <b>100,0%</b> | <b>4.448.882,73</b> | <b>100,0%</b> |

| RESUMO GERAL DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO DO RAMAL DO SALGADO – TRECHO III DO PISF |            |               |            |               |               |               | 06/05/2024          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| Descrição                                                                             | Processos  |               | Imóveis    |               | Área (ha)     |               | Valor (R\$)         |               |
| Cadastro em análise (Checklist)                                                       | 28         | 28,0%         | 31         | 25,4%         | 241,16        | 34,1%         | 1.151.299,03        | 29,2%         |
| Cadastro analisado c/ pendência documental (Cartório)                                 | 16         | 16,0%         | 19         | 15,6%         | 185,15        | 26,2%         | 669.469,83          | 17,0%         |
| Processos em fase de ajuizamento com cadastro no SEI                                  | 9          | 9,0%          | 11         | 9,0%          | 9,13          | 1,3%          | 263.006,01          | 6,7%          |
| Processos ajuizados pela AGU aguardando depósito judicial                             | 6          | 6,0%          | 8          | 6,6%          | 5,71          | 0,8%          | 191.277,09          | 4,8%          |
| Processos ajuizados pela AGU com depósito e sem alvará                                | 41         | 41,0%         | 53         | 43,4%         | 265,75        | 37,6%         | 1.670.932,60        | 42,3%         |
| Processos ajuizados pela AGU com alvará liberados                                     | 0          | 0,0%          | 0          | 0,0%          | 0             | 0,0%          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                        | <b>100</b> | <b>100,0%</b> | <b>122</b> | <b>100,0%</b> | <b>706,90</b> | <b>100,0%</b> | <b>3.945.984,56</b> | <b>100,0%</b> |


### Principais indicadores da produção atualizado em 31/08/2026

- Cadastro em análise===== Não há mais processo para ser analisado.
- Cadastro com pendências documental identificadas===== Não restam mais processos com pendências documentais (Cartório)
- Processos pré-instruídos em tramitação no SEI===== Não restam mais processos a instruir no momento, conforme informação da CGOF / Fiscalização
- Processos ajuizados===== Foram ajuizados no período 102 processos, referentes a 124 propriedades
- Resta 1 processo com perícia em andamento, por discordância do valor indenizatório; e 2 processos com pendencia de documentos de inventário.

MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL




- Contrato nº 03/2025-MIDR
- Data base: Abril/24
- Pacote: 1480
- Valor do Contrato (P0): R\$ 491.300.000,00
- Reajuste parcela Adm. da Obra / Mob. e Desmob. / Impl. e Manut. de Canteiros de Obras (Índice 9,6128%): R\$ 3.560.576,81
- Reajuste parcela de Projetos, Obras Cíveis, Fornecimentos, Montagens e Comissionamento (Índice 8,1301%): R\$ 36.931.795,91
- Assinatura do Contrato: 08/05/2025
- Prazo de Vigência Contratual: 36 meses - 08/05/2028
- Assinatura da Ordem de Serviço: 27/05/2025
- Prazo de Execução: 32 meses - 27/01/2028

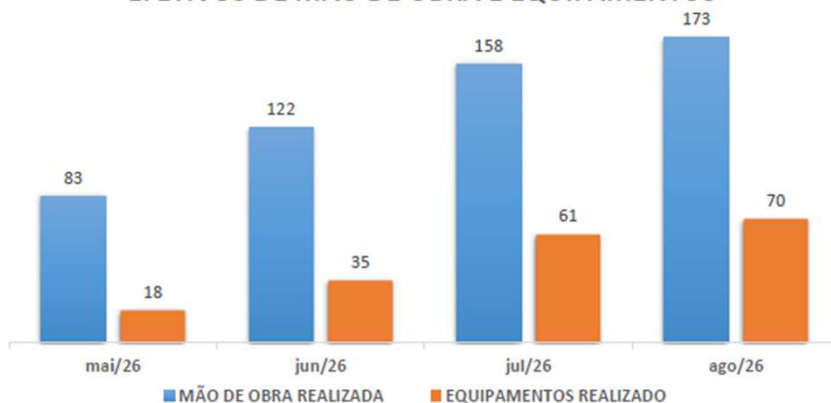


\* Efetivos atualizados conforme último RDO recebido do dia 23/08/26

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| TOTAL MEDIDO       | ÚLTIMA MEDIÇÃO<br>BM 14 - JUL/26 |
| R\$ 154.283.476,37 | R\$ 3.046.129,21                 |


## ■ MEDICÕES PREVISTAS ■ MEDICÕES REALIZADAS

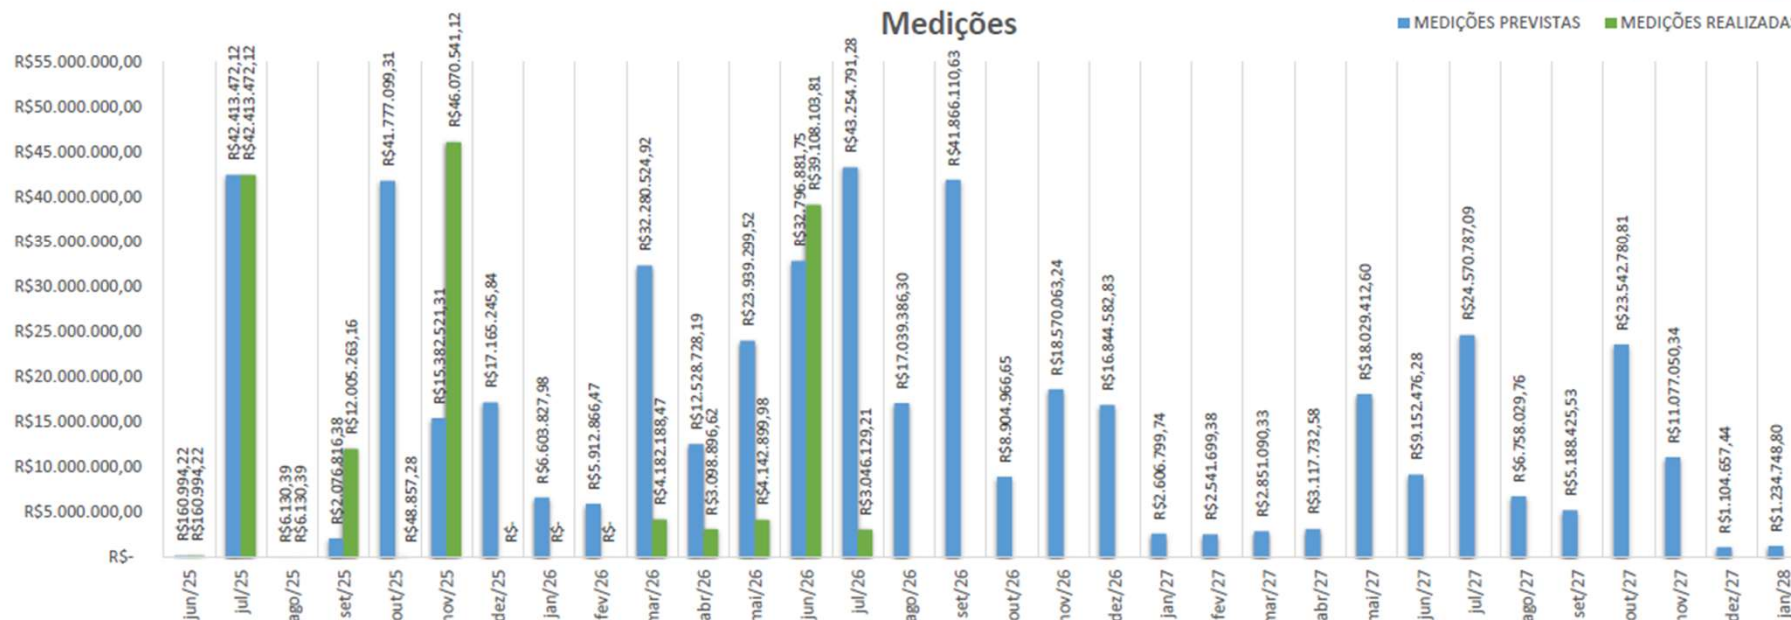


# Ampliação do Bombeamento




% AVANÇO FÍSICO

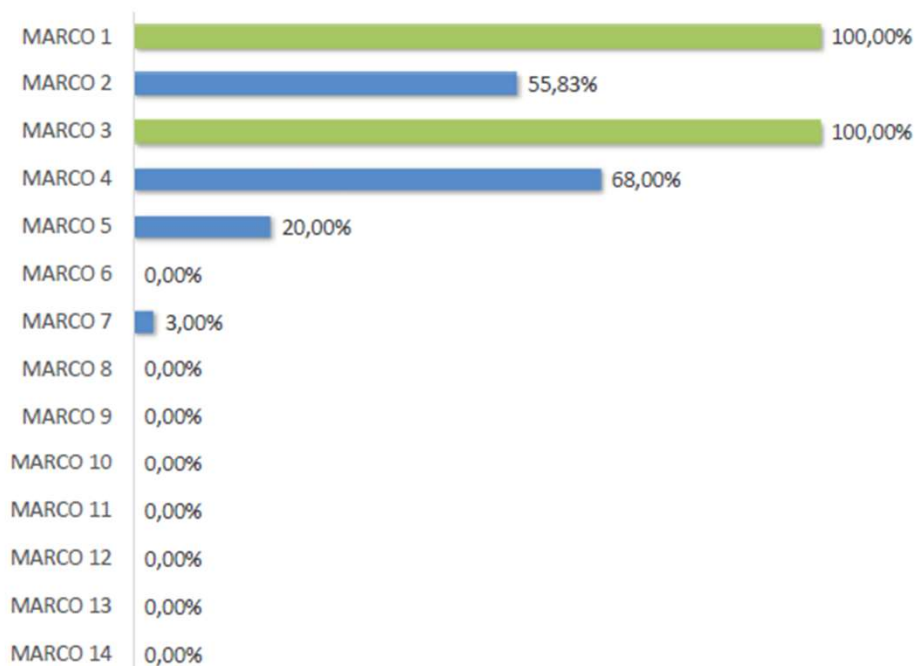

Marco concluído  
Marco em andamento



% AVANÇO FINANCEIRO

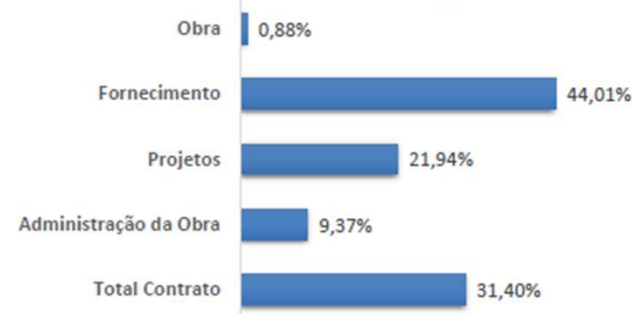

% AVANÇO ADM. OBRA



% AVANÇO OBRA



# Ampliação do Bombeamento



## Atividades realizadas:

- Acompanhamento de ensaios para determinação do grau de compactação e o teor de umidade do aterro compactado na área da ampliação da SE-N3;
- Montagem de fôrmas e armação dos blocos de apoio na EBI-01;
- Conferência e verificação topográfica dos pontos para execução dos serviços.



24 de ago. de 2026, 09:43:15  
Trecho 1 - EBI 1 - WBS 1610



24 de ago. de 2026, 10:05:44  
Trecho 1 - EBI 1 - WBS 1610



25 de ago. de 2026, 09:24:15  
Trecho 1 - EBI 1 - WBS 1610



25 de ago. de 2026, 10:36:38  
Trecho 1 - EBI 1 - WBS 1610

# Ramal do Piancó

- Previsão de publicação: 2º semestre de 2026.
- Inicia-se em Umburanos, Mauriti/CE. Estende-se até o rio Piancó, desaguando no Açude Condado.
- Deverá beneficiar cerca de 36 municípios, com aproximadamente 350 mil habitantes.
- **O EIA/RIMA aceito pelo IBAMA.**
- **Publicado o recebimento do EIA/RIMA**
- **Audiências Públicas** realizadas no dia **10/03 em Mauriti/CE e 11/03 em Conceição/PB.** (Nota Técnica emitida em Resposta ao parecer emitido pelo IBAMA depois das audiências.)
- **Aguardando emissão do CERTOH pela ANA.**
- **Orçamento em revisão.**
- **Atendimento aos apontamentos da Conjur – MIDR, referente ao Edital.**

Denominação: **EBVIII-1**

Vazões (m<sup>3</sup>/s) 1ª etapa/2ª etapa: **2,00/4,00**


Altura manométrica (m.c.a.): **124,95**

Nº de conjuntos elevatórios (por etapa):

1ª etapa: **2+1** (reserva); 2ª etapa: **2**

Potência instalada (1ª/2ª etapa) (cv): **4800/9600**

Horas de funcionamento (h/dia): **20**

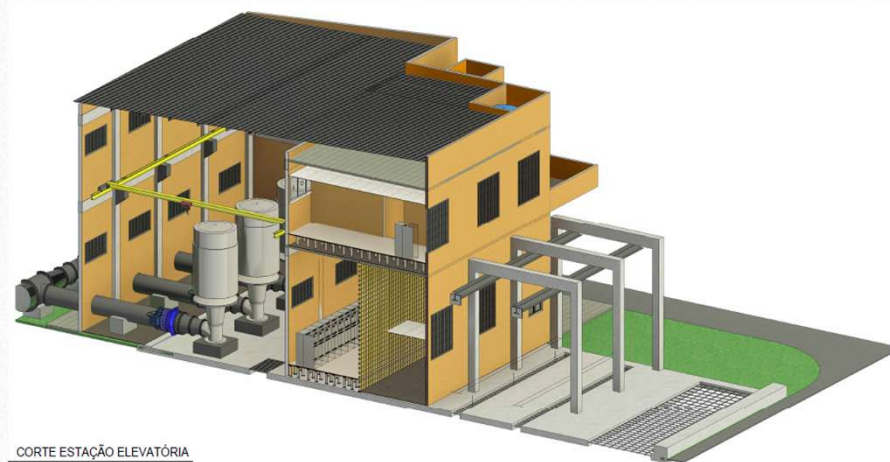

CORTE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

# Recuperação Dique Negreiros



### DADOS DO CONTRATO

**Consórcio Negreiros**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Contrato                       | 24/2025-MIDR          |
| Valor do Contrato (P0)         | R\$ 22.500.000,00     |
| Assinatura do Contrato         | 07/11/2025            |
| Prazo de Vigência Contratual   | 21 meses - 07/08/2027 |
| Assinatura da Ordem de Serviço | 14/05/2026            |
| Prazo de Execução              | 18 meses - 14/11/2027 |

## AVANÇO GERAL DA OBRA



## MARCOS CONTRATUAIS

| Prazo    | Marco   | Descrição                                       |
|----------|---------|-------------------------------------------------|
| 14/07/26 | MARCO 1 | Conclusão da mobilização                        |
| 14/11/26 | MARCO 2 | Conclusão das ensecadeiras de montante laterais |
| 14/02/27 | MARCO 3 | Conclusão da ensecadeira de montante central    |
| 14/06/27 | MARCO 4 | Conclusão dos aterros                           |
| 14/08/27 | MARCO 5 | Conclusão das injeções                          |
| 14/10/27 | MARCO 6 | Recomposição da berma do Dique                  |

**Atividades realizadas no período:**

- Carga e transporte de material 3ª categoria do Estoque (CN12 LD) para execução da ensecadeira de montante;
- Construção da ensecadeira de montante central a partir da ombreira direita, Estaca 6 até a Estaca 8+0,00;
- Construção da ensecadeira de montante ombreira esquerda até a Estaca 14+0,00.





# Recuperação e Execução das Lajes EBI-2

## DADOS DO CONTRATO

### Niemaia Serviços e Equipamentos

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Contrato                       | 25/2025-MIDR          |
| Valor do Contrato (P0)         | R\$ 2.360.000,00      |
| Assinatura do Contrato         | 10/11/2025            |
| Prazo de Vigência Contratual   | 17 meses - 09/04/2027 |
| Assinatura da Ordem de Serviço | 08/05/2026            |
| Prazo de Execução              | 8 meses - 06/01/2027  |

## AVANÇO GERAL DA OBRA



## MARCOS CONTRATUAIS

| Prazo    | Marco   | Descrição                                                                                 |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/06/26 | MARCO 1 | Conclusão da implantação dos Canteiros de Obra                                            |
| 08/07/26 | MARCO 2 | Entrega na obra dos itens de fornecimento                                                 |
| 08/09/26 | MARCO 3 | Conclusão das obras de reforço no topo das paredes transversais e tratamento das fissuras |
| 08/10/26 | MARCO 4 | Conclusão da execução das lajes sobre os poços de sucção 5 a 8                            |

## Atividades realizadas no período:

- Processo de implantação do canteiro e mobilização.






# Recuperação dos PVs da Galeria Monteiro

## DADOS DO CONTRATO

### Construtora W. V.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Contrato                       | 42/2025-MIDR          |
| Valor do Contrato (P0)         | R\$ 10.988.000,00     |
| Assinatura do Contrato         | 15/12/2025            |
| Prazo de Vigência Contratual   | 15 meses - 15/03/2027 |
| Assinatura da Ordem de Serviço | 19/02/2026            |
| Prazo de Execução              | 12 meses - 19/02/2027 |

## AVANÇO GERAL DA OBRA

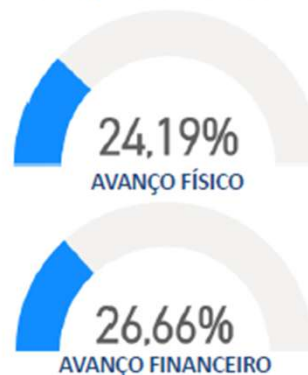

## AVANÇO FÍSICO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| POÇO DE VISITA - PV-05 | 24,47% |
| POÇO DE VISITA - PV-04 | 20,97% |
| POÇO DE VISITA - PV-03 | 26,99% |
| POÇO DE VISITA - PV-02 | 24,42% |
| POÇO DE VISITA - PV-01 | 24,05% |

## Atividades realizadas no período:

- Início da montagem do Tunnel Liner no PV-04;
- Escavação mecanizada do Tunnel Liner no PV-04.





# Agradecimentos do Time do DPE
