


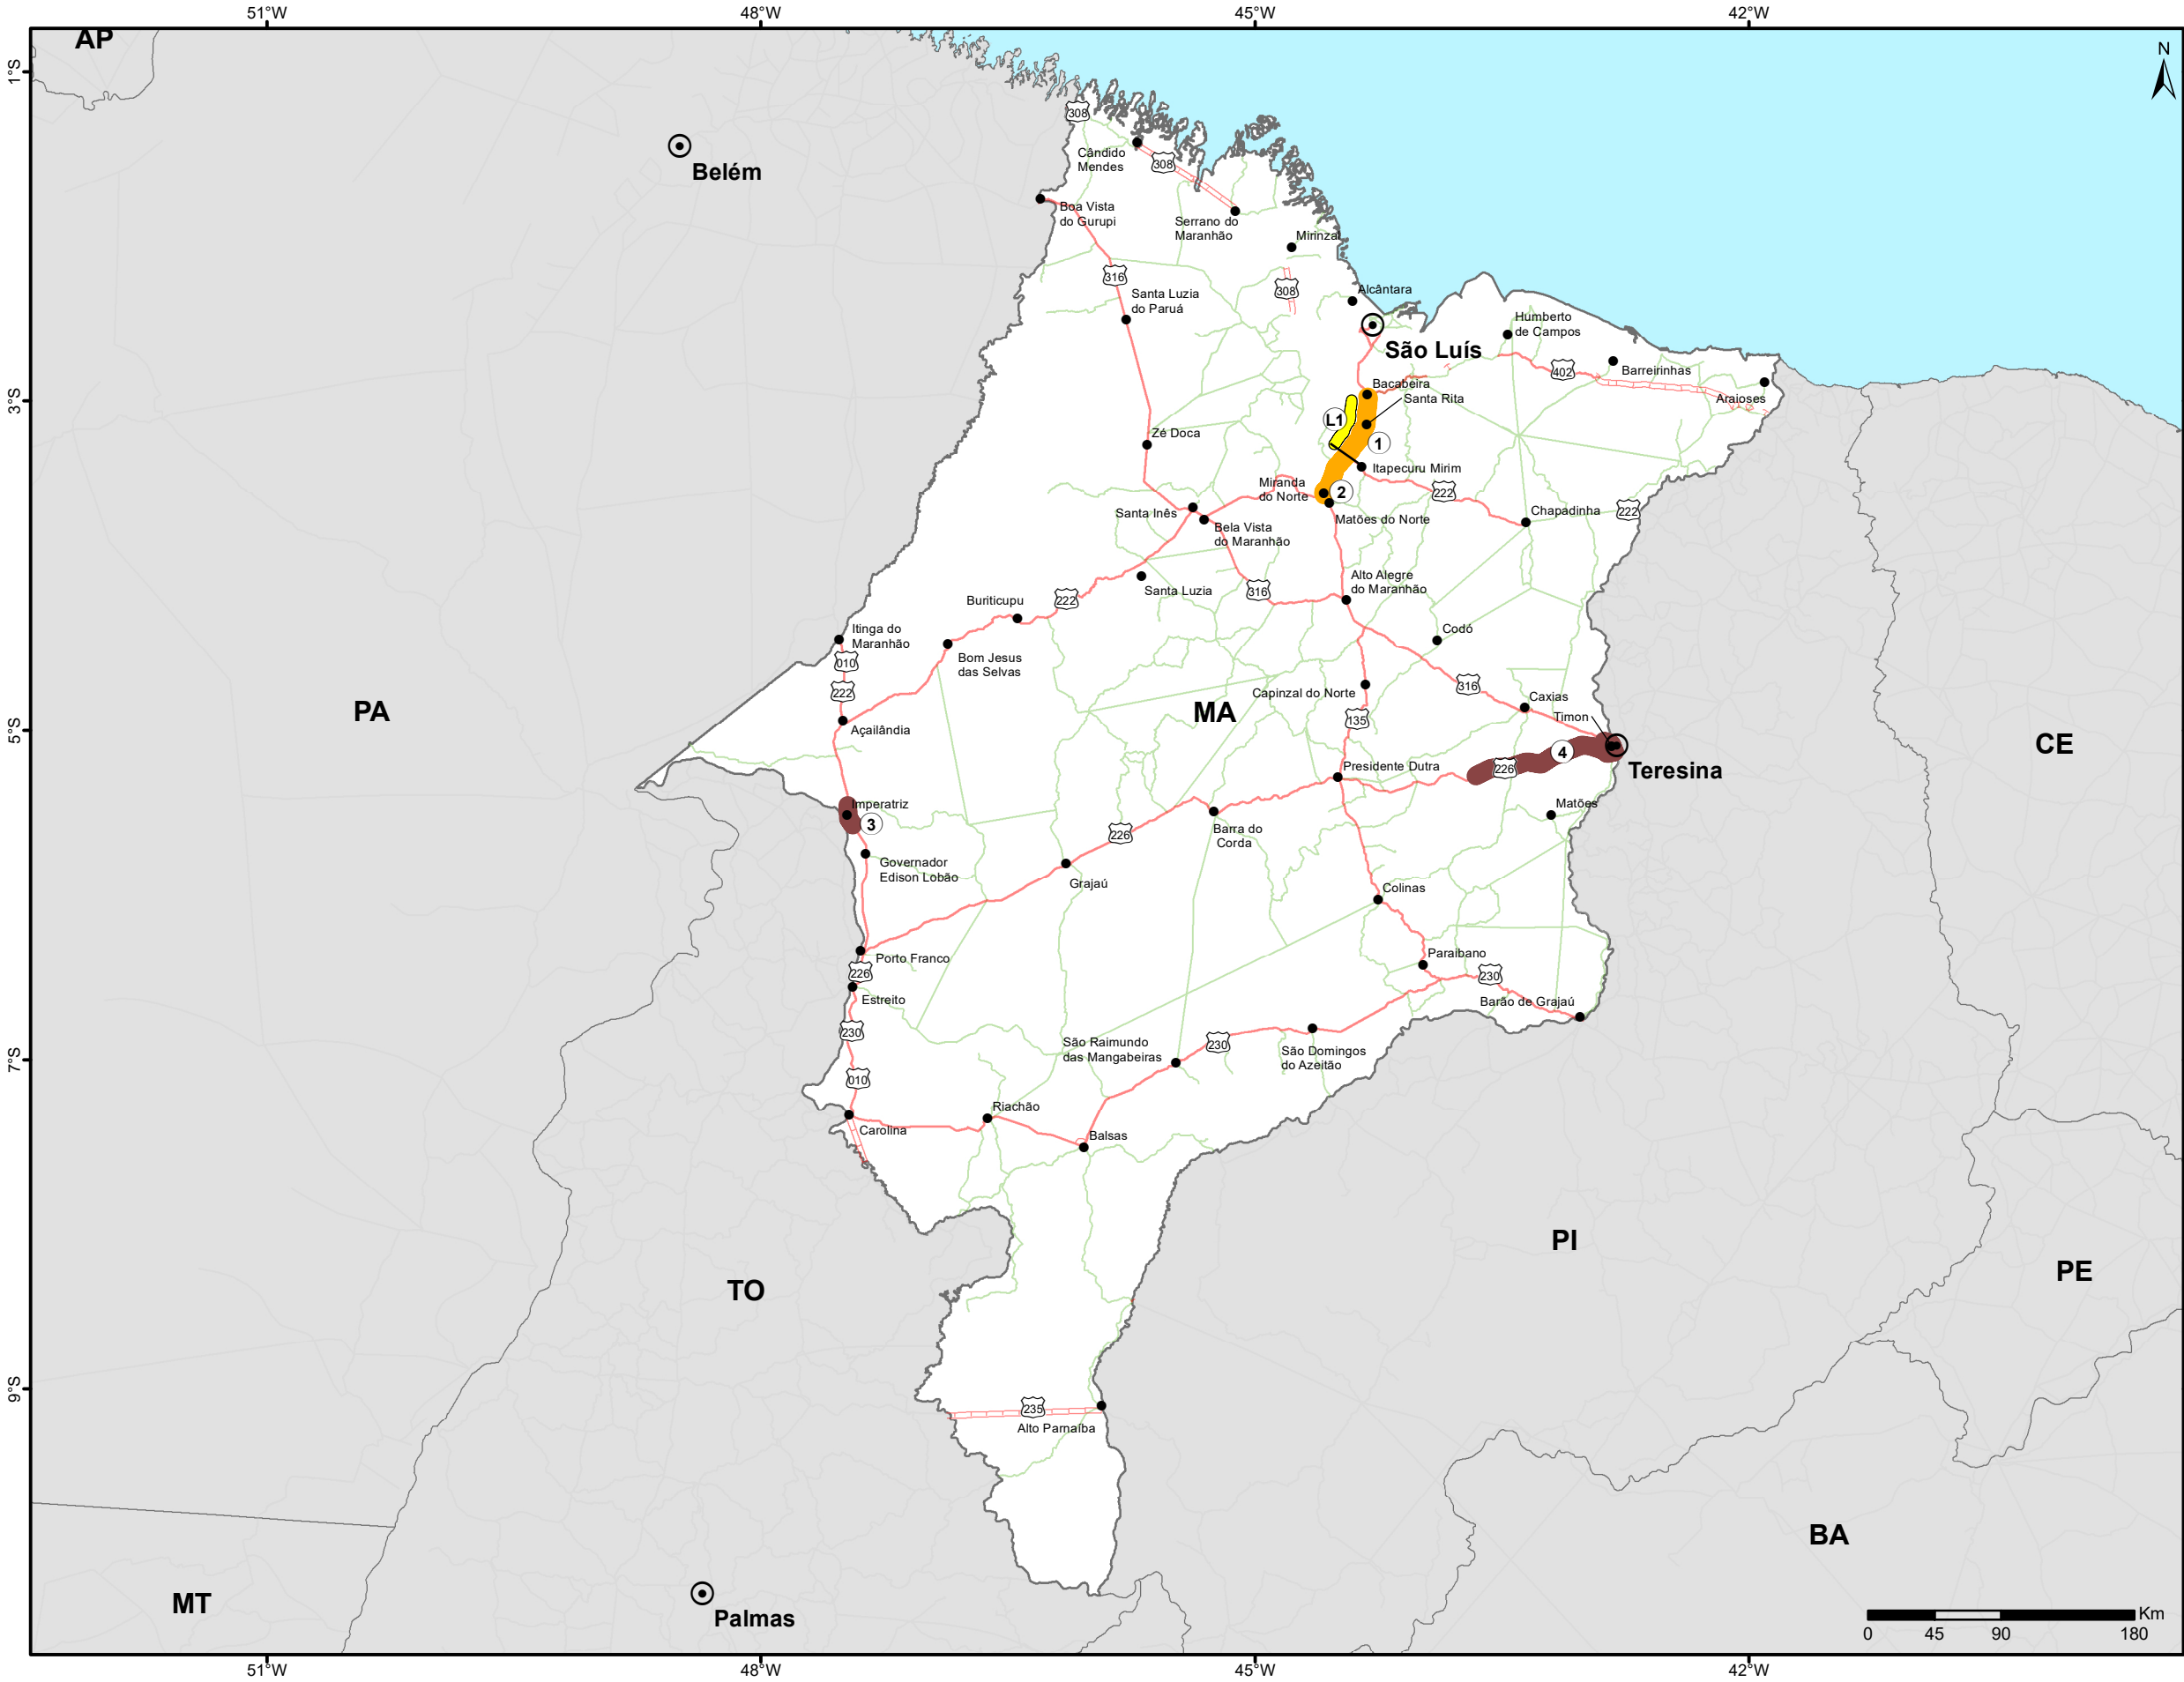

- Legenda:
- Sede municipal

⊙

Capital Estadual

—

Limite de contrato

—

Rodovia Estadual

—



Rodovia Federal

—

Pavimentada

—

Planejada

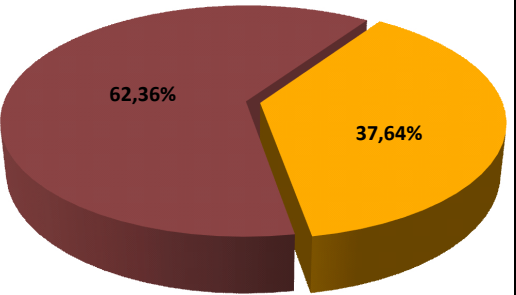

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras Diretas													
OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	2	15 00387/2017	CONSÓRCIO EDECONSIL - AMORIM COUTINHO	BR-135	51,30 95,00	44,30	Duplicação da BR135/MA	09/06/2017	29/06/2023	R\$ 170.130.932,15	32,78%	15 00536/2022	Vigência expirada. Contrato sem condições de recebimento. Supervisora aponta existência de não conformidades (SEI 16230066)
2	3	15 00627/2023	CONSÓRCIO BR-135/MA	BR-135	95,60 127,75	32,15	Duplicação da BR135/MA	12/12/2023	12/10/2026	R\$ 133.827.499,47	0,00%		Extrato do contrato publicado no DOU em 15/12/2023
3	Único	15 00441/2014	EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	BR-010	246,40 260,80	14,40	Travessia Urbana de Imperatriz	16/09/2014	30/03/2024	R\$ 280.263.283,33	53,47%	15 00537/2022	Obra em execução, com frentes de ataque no Viduto 2 e reparos das marginais.
4	Único	15 00039/2023	CONSÓRCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-316	609,40 620,90	11,50	Contorno de Timon	03/04/2023	24/10/2024	R\$ 153.409.781,53	59,26%	15 00459/2022	Obra em execução, com frentes de serviços de terraplenagem, drenagem e revestimento asfáltico entre o km 40,0 e km 65,1.
4	Único	15 00039/2023	CONSÓRCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-226	0,00 100,00	100,00	Implantação da BR-226/MA	03/04/2023	24/10/2024	R\$ 153.409.781,53	59,26%	15 00459/2022	Obra em execução, com frentes de serviços de terraplenagem, drenagem e revestimento asfáltico entre o km 40,0 e km 65,1.

Obras a licitar									
A LICITAR	BR	SEGMENTO		OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-135	51,3	95,60	Ação 7W84 - Remanescente Lote 2				Em andamento o estudo da componente quilombola, com previsão de contratar o remanescente da obra (28 km) até junho de 2024	0284/22-15

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
