



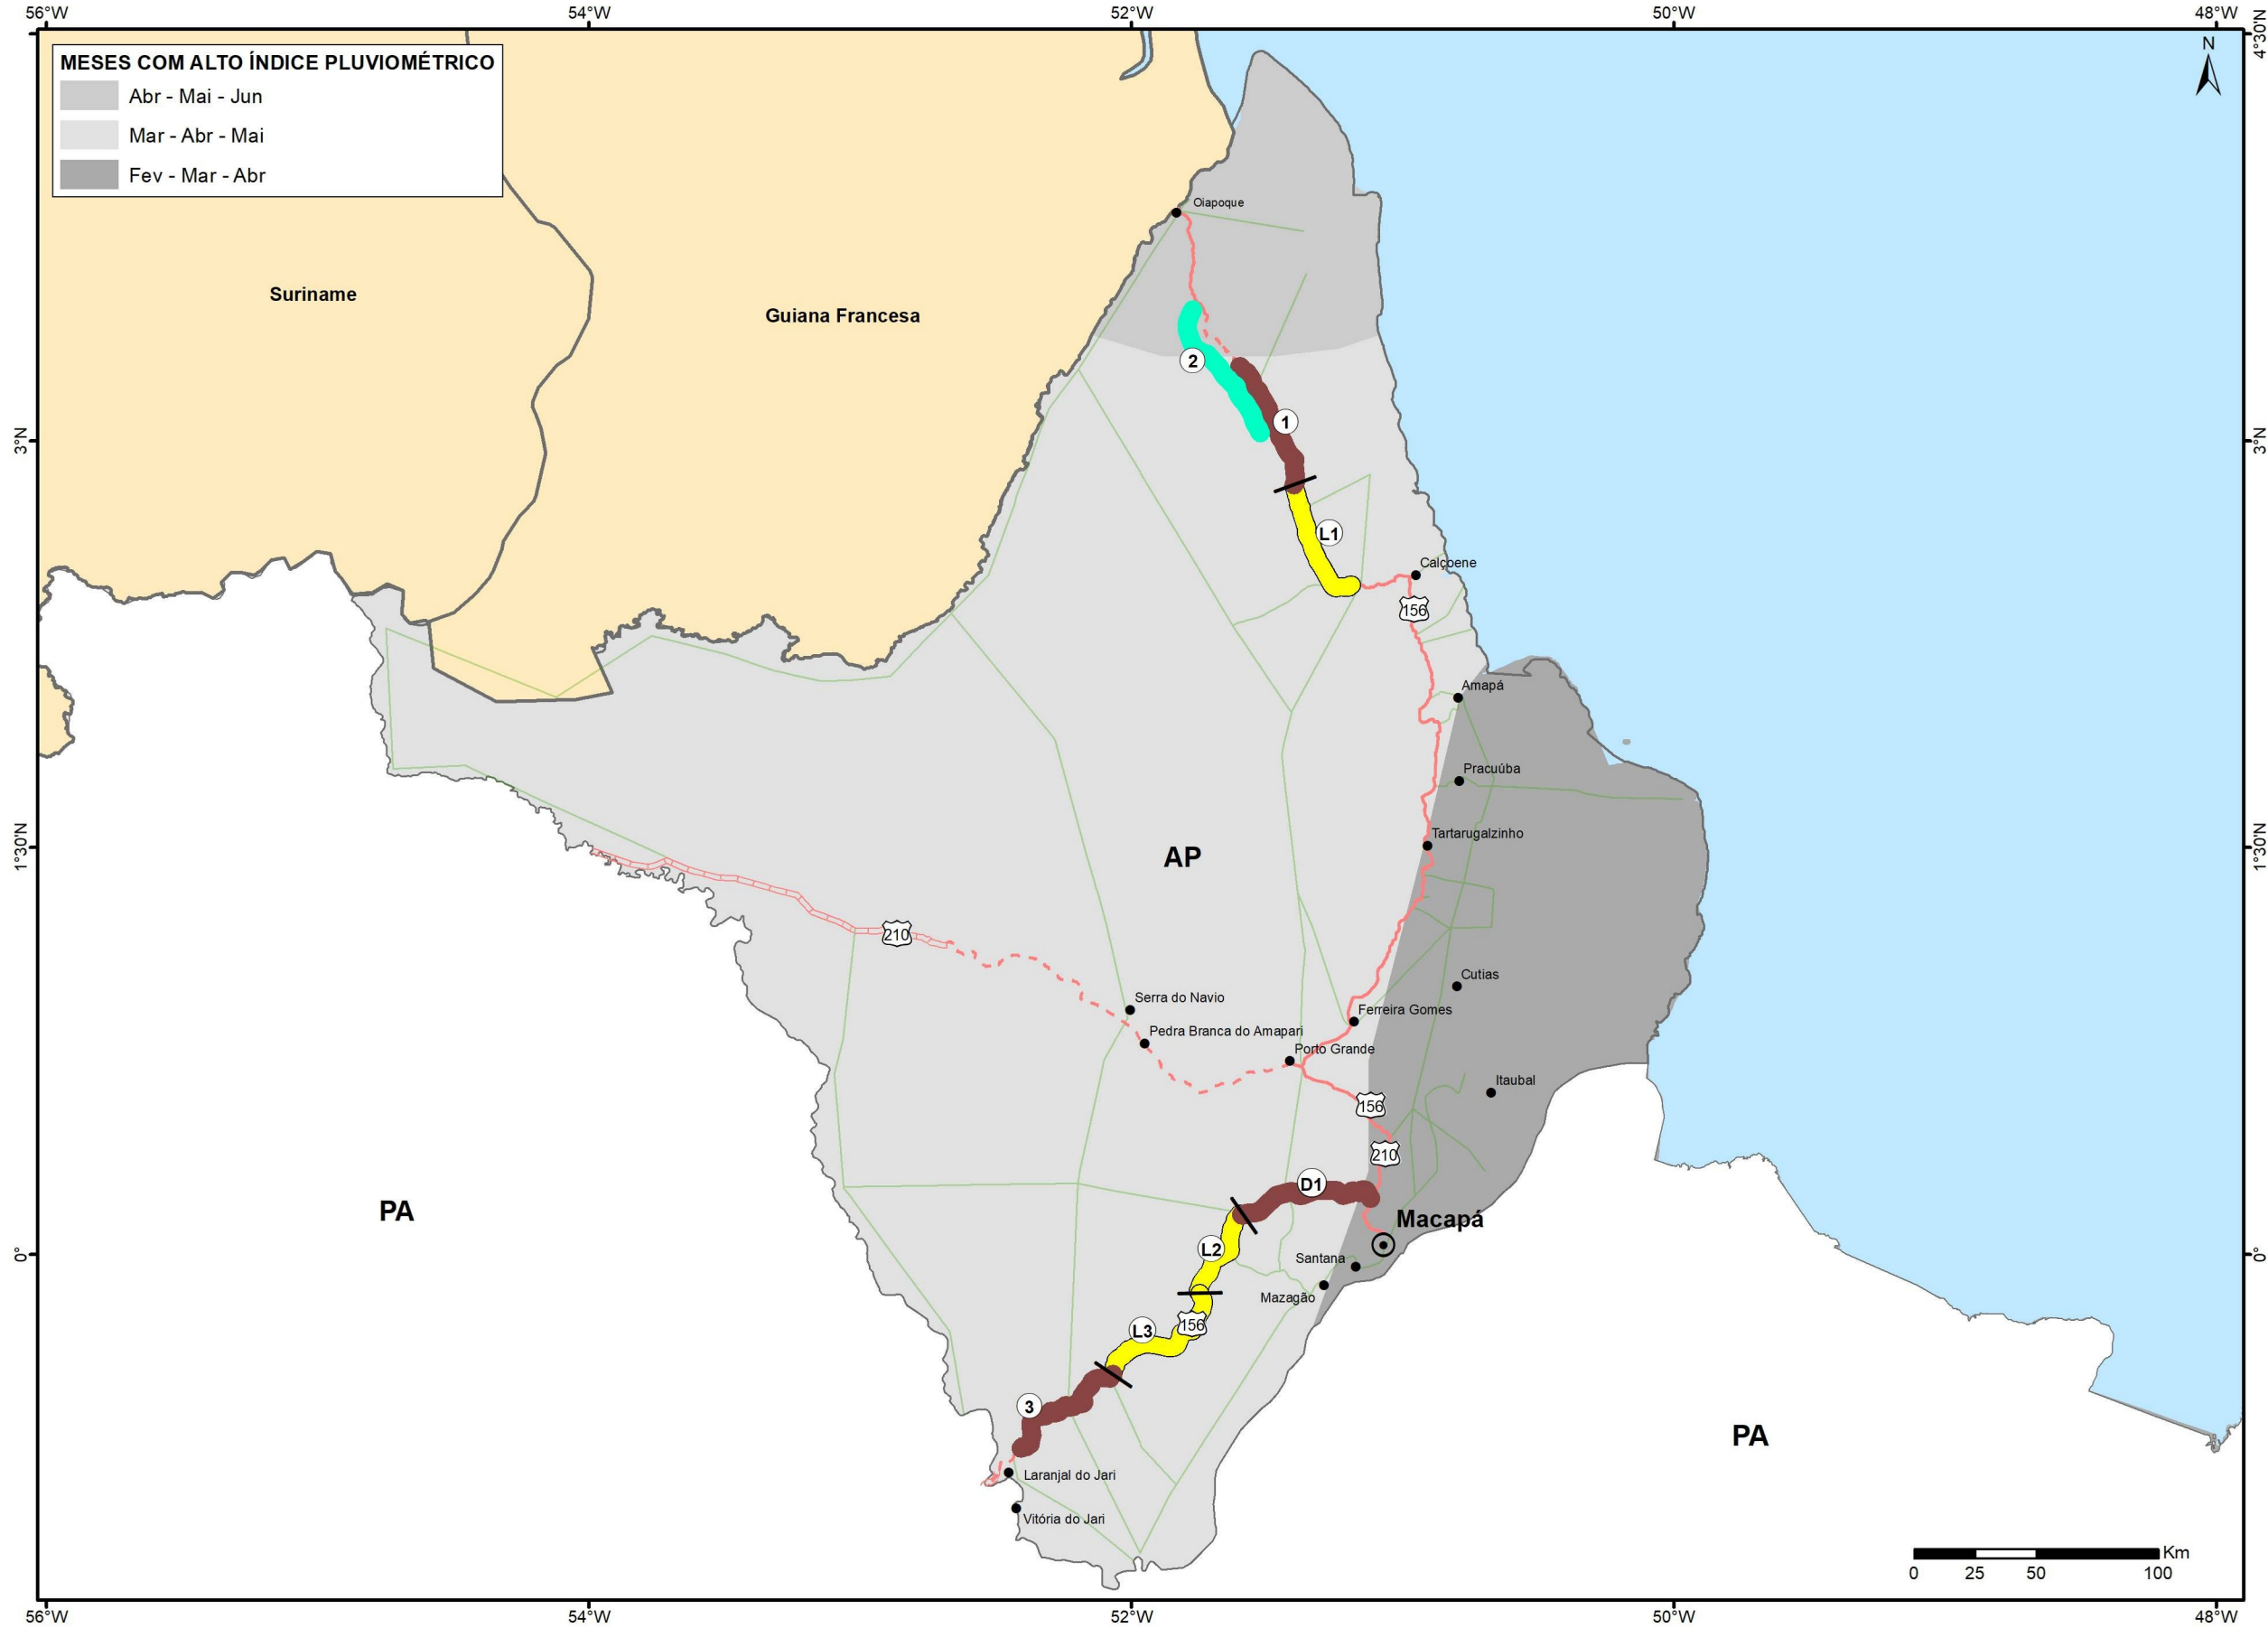


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

- IMPLANTAÇÃO 177,20 Km
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- A LICITAR

Total 177,20 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.¹	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	1989	1418	2-3-7	3 - Norte	00 00719/2023	CONSÓRCIO LB / METROPOLITANA	BR-156	687,73 743,73	56	Rem. pavimentação do lote 3 - Tronco Norte	23/12/2023	01/12/2026	R\$ 270.967.070,31	1,81%	Há frente de serviço de 5 km com plano de ataque para 3 OAE e drenagem, mas as chuvas têm impactado o andamento das atividades.	00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
2	1418	2-3-7	Único		25 00246/2024	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	BR-156	714,73 770,73	0	Realocação de aldeias indígenas	23/04/2024	12/01/2026	R\$ 65.696.779,14	0%	Obra em andamento. Conclusão prevista para o 1º semestre de 2026.	00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
3	2493	13YK	3-7	1 - Sul	00 00402/2024	L B CONSTRUÇÕES LTDA	BR-156	27,00 87,10	60,1	Implantação e pavimentação do Lote 1 - Tronco Sul	19/09/2024	19/03/2028	R\$ 283.939.120,21	0%	Obras não iniciadas em função de entraves com a renovação e retificação da licença de instalação. Sem previsões oficiais para resolução.	Edital 236/2024	STE- SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	2491	13YK	3-7	TED-884/2020	Estado do Amapá	BR-156	210,10 271,20	61,1	Implantação do lote 4	10/12/2020	18/12/2025	R\$ 158.229.045,24	R\$ 0,00	R\$ 158.229.045,24	27%	Obra avança conforme aprovação parcial de projetos, mas há pendência de ensaios em solo mole, o que impacta o detalhamento e prazo final do projeto executivo.	00 00512/2022	TRAFECON ENGENHARIA LTDA

Obras a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	1989	1418	2-3-7	BR-156	633,68 687,73	Rem. pavimentação do lote 2 - Tronco Norte	50600.032702/2023-66		Em pendência a entrega dos projetos do remanescente para realização da licitação. Sem previsões oficiais para recebimento final dos projetos.	00 00459/2024	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA
L2	2493	13YK	3-7	BR-156	149,12 210,18	Implantação e pavimentação do Lote 3 - Tronco Sul			Em andamento o projeto executivo. Previsão de licitação até o final do ano de 2025.	00 00512/2022	TRAFECON ENGENHARIA LTDA
L3	2493	13YK	3-7	BR-156	87,10 149,12	Implantação e pavimentação do Lote 2 - Tronco Sul	50600.004862/2025-87		Fase interna da licitação concluída. Continuidade do processo licitatório aguardando parecer da Diretoria Geral	00 00512/2022	TRAFECON ENGENHARIA LTDA

¹ Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
