


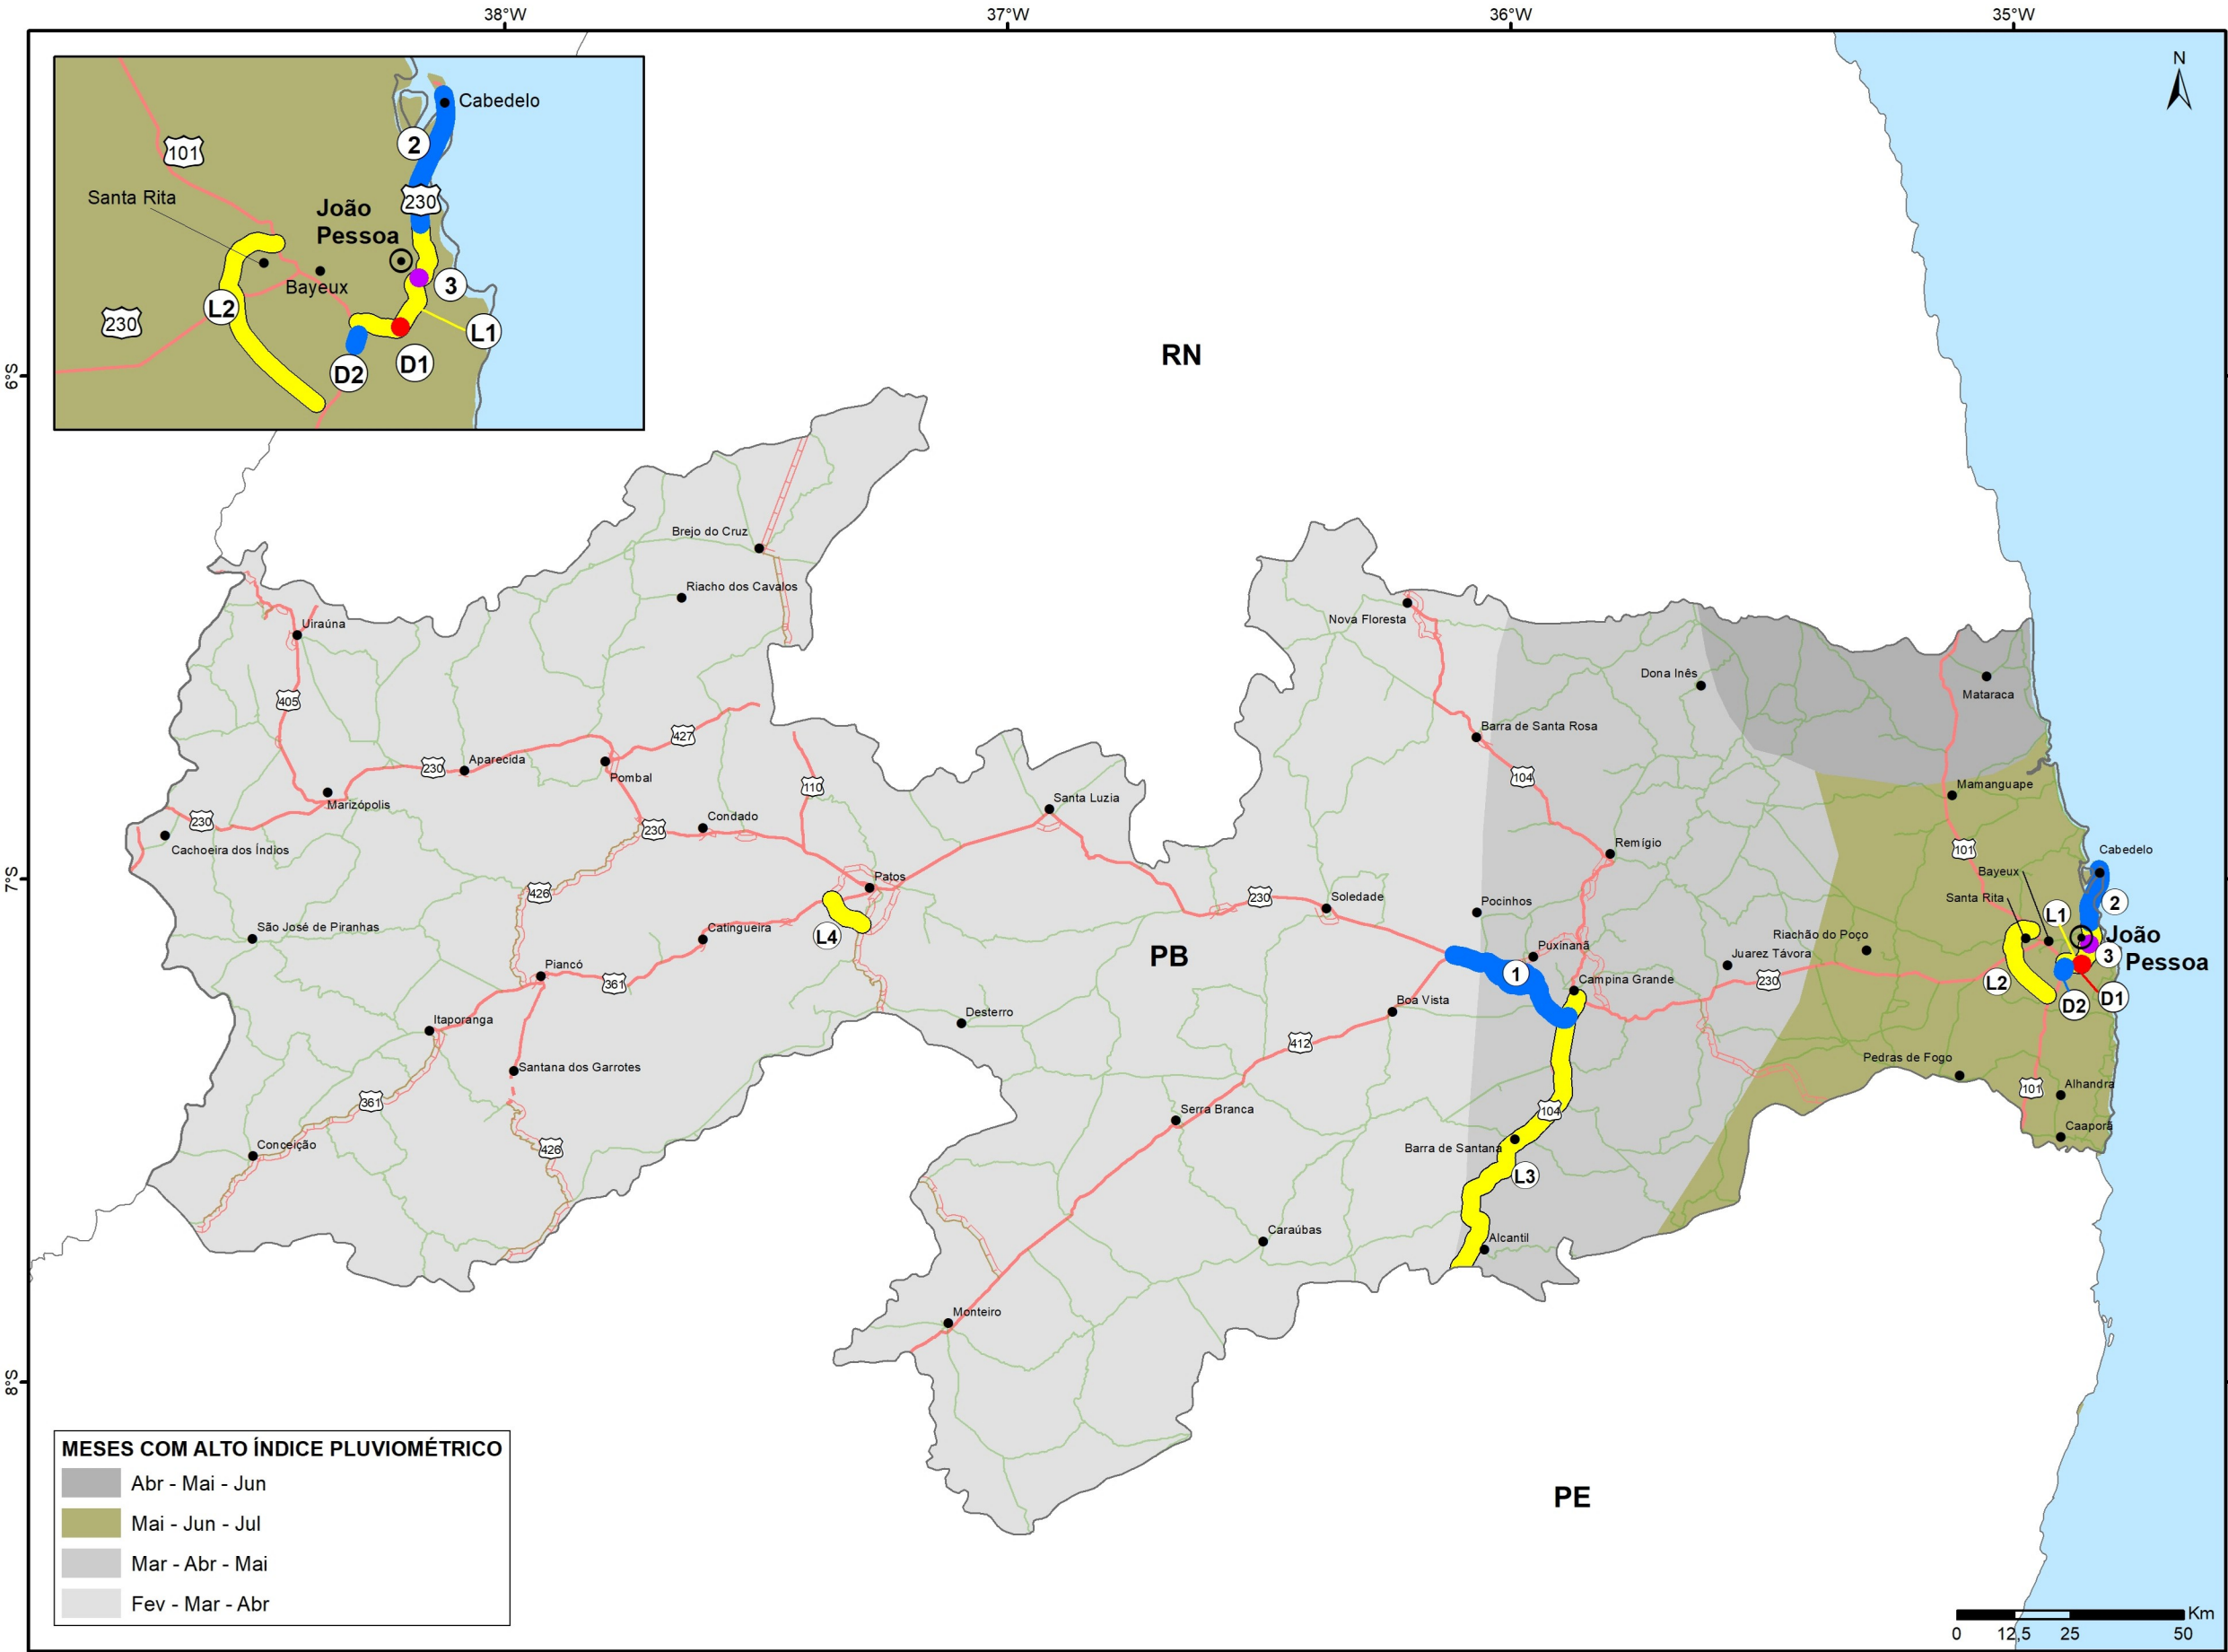

Obra Direta														38°W				37°W				36°W				35°W			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA									
1	2048	13YE	2-3	Único	13 00938/2017	CONSORCIO LOM/CCL/PRODEC BR 230/PB	BR-230	152,30	183,90	31,6	Adequação de capacidade	01/02/2018	29/11/2025	R\$ 545.405.767,12	26,5%	Executando terraplenagem, pavimentação, OAE's e obras complementares. Há interferências com a CAGEPA e com a ENERGISA que não impactam serviços previstos para 2025.				13 00425/2018	JBR ENGENHARIA LTDA								
2	2049	7T98	2-3-7	Único	13 00434/2023	CONSORCIO CLC / CONSERVA	BR-230	2,00	13,38	11,38	Remanescente do contrato 13 00919/2016	29/08/2023	10/11/2026	R\$ 164.522.888,72	37,67%	Executando pavimentação, restauração e OAE. Há previsão de RPFO para corrigir falhas de drenagem em trechos executados por instrumentos anteriores.				13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA								
3	2049	7T98	2-3-7	Único	13 00685/2023	CONSORCIO PLINIO CAVALCANTI - PONTUAL	BR-230	19,00	19,00	0	Obra de Contenção do Talude no Km 19	19/12/2023	01/05/2025	R\$ 8.221.118,95	87,26%	Obra concluída.				13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA								

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1				ACT-109/2022	Estado da Paraíba	BR-230	24,32	24,32	0	Construção do Viaduto de Água Fria (estaca 1216, Km 24,32)	31/03/2022	01/08/2025	R\$ 0,00	R\$ 28.711.428,32	R\$ 28.711.428,32	0%	Viaduto concluído, aguardando termo de encerramento para publicação.			
D2				ACT-181/2024	Estado da Paraíba	BR-101	89,70	90,10	0,4	Construção do Viaduto do Bairro das Indústrias e vias marginais	05/08/2024	22/01/2027	R\$ 0,00	R\$ 19.843.717,19	R\$ 19.843.717,19	0%	Obra delegada. Mesoestrutura em execução.			

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2049	7T98	2-3-7	BR-230	13,38	28,10	Ação 7T98 - km 13 ao km 28			Anteprojeto encaminhado para reanálise.	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
L2	4641			BR-230		Construção do Arco Metropolitano de João Pessoa				Projeto das interseções aprovado. Aguardando assinatura de ACT.		
L4	3871	161Q	2	BR-230/361		Prev Alça Oeste de Patos				Previsão de publicar o edital de obra (já com projeto executivo aprovado) em agosto/2025.	A LICITAR	A LICITAR
L3	4123	7G66	2	BR-104		Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE- SUL				Previsão de publicar o edital de obra (já com projeto executivo aprovado) em dezembro/2025.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
