


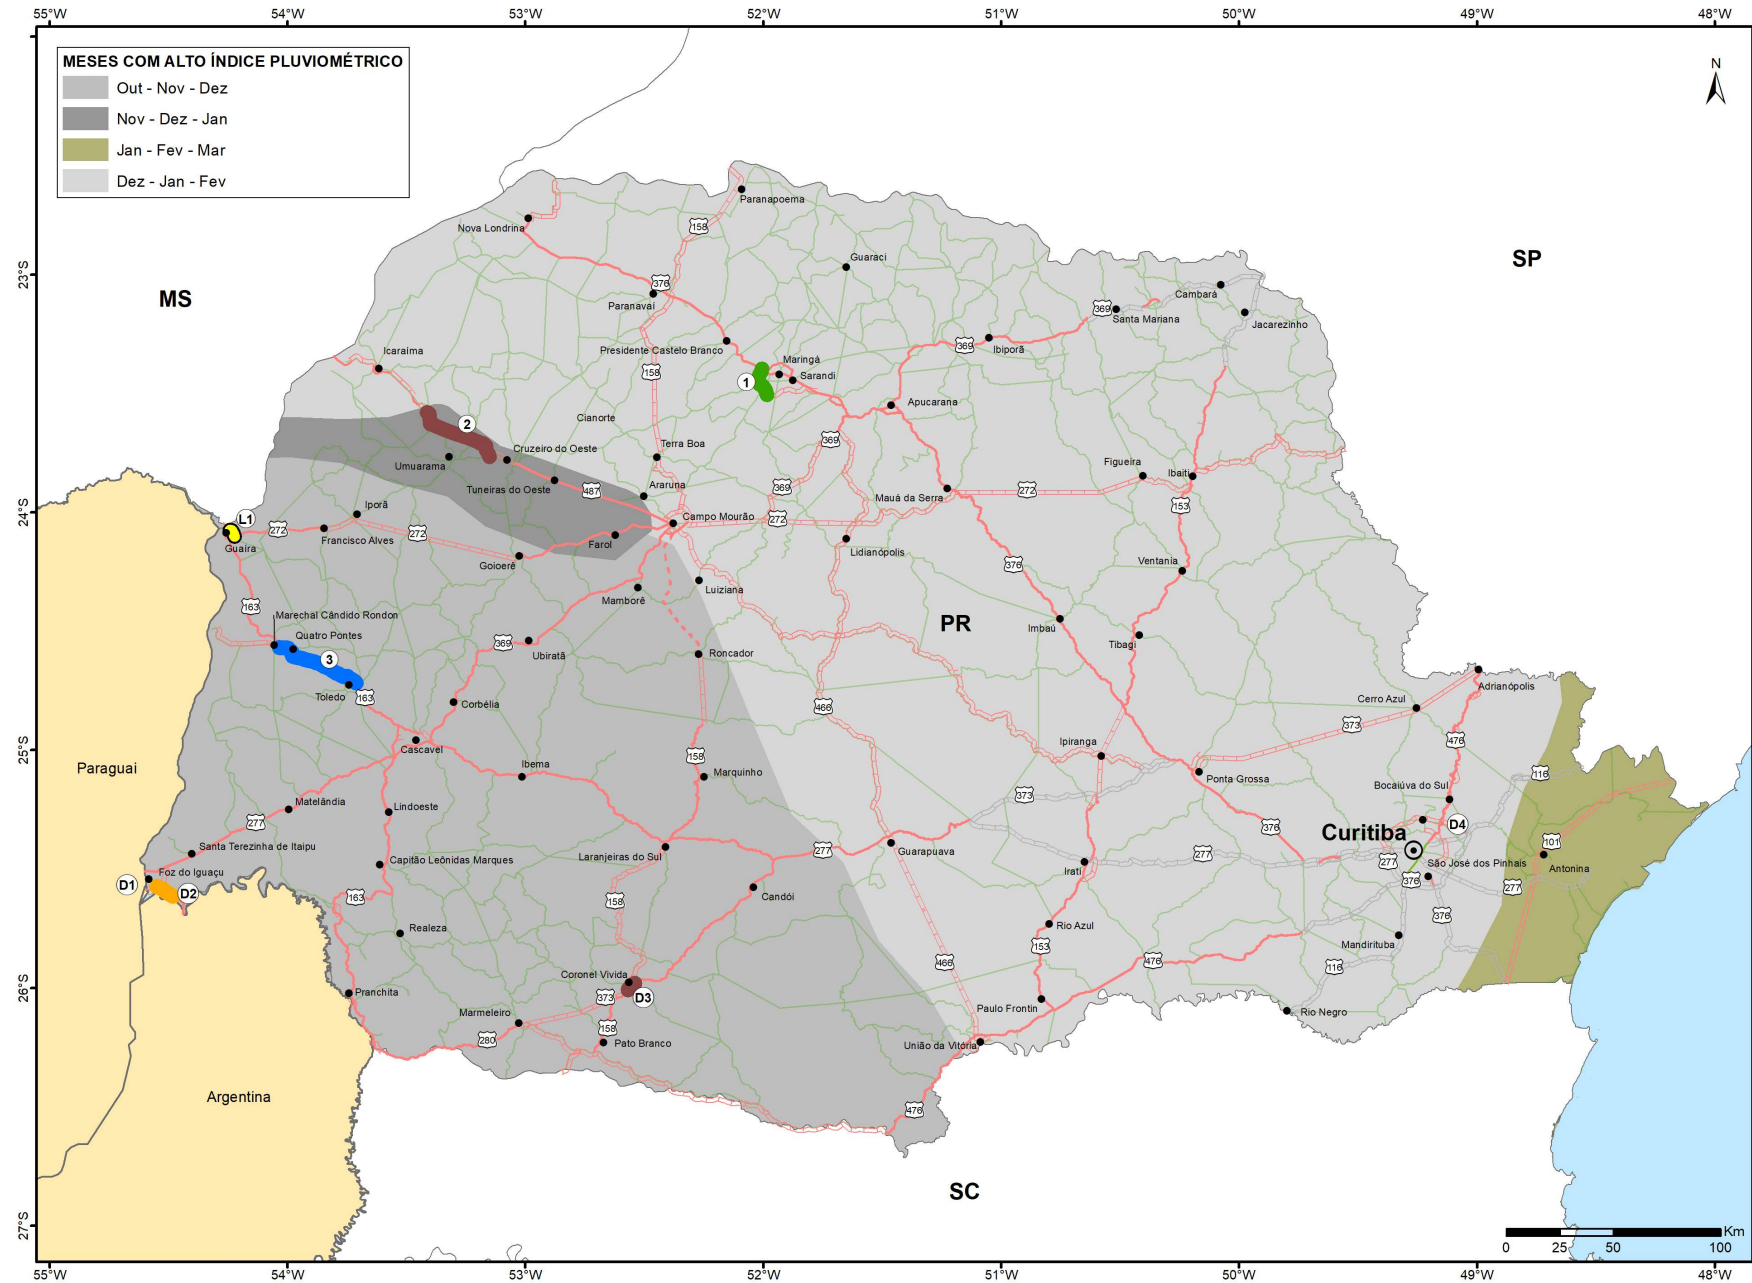

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
PARANÁ

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	38,90 Km
IMPLANTAÇÃO	42 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	13,18 Km
DUPLICAÇÃO	8,70 Km
OAE	
Total	102,78 Km

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.
Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2062	7/25-7/8/1	2-7	Único	09.0007/2022	CONSORCIO BANDERANTES - TUCUMANN - ENGENM	BR-376	0,00	13,18	13,18	Implantação do Contorno Sul de Maringá.	01/06/2022	26/01/2027	R\$ 328.634.472,57	0,29%	Os estudos e projetos estão em atraso, com expectativa de aprovação até novembro, e o início das obras para dezembro/2025.	09.0007/2022	CONSORCIO ASTEP / JBR
2	2055	7/6/3	2-3-7	Único	09.00397/2021	CONSORCIO NEIVA- CASTILHO- SITE	BR-467	56,41	93,80	37,39	Implantação e Pavimentação.	17/04/2023	31/12/2025	R\$ 321.189.531,75	0,17%	Em fase de projeto com previsão de conclusão em agosto/2025. Pendente licença de instalação. Desapropriação travada por divergência com DER e pendências com proprietários da região.	09.0047/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
3	2059	12/JL	2	Único	09.00837/2014	CONSORCIO CASTILHO/ TECNICA VIARIA	BR-163	235,50	274,40	38,9	Duplicação de Toledo a Mar. Candido Rondon.	07/10/2014	07/02/2025	R\$ 461.460.700,01	98,23%	Obra finalizada com RPFO em andamento. Pedido de extensão de prazo por exigência da CGU.	09.0049/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA

Obras Delegadas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2061	CD-211/2019			Governo do Paraná	BR-277	15,00	15,76	0,76	2ª Ponte de Foz do Iguaçu	10/05/2019	25/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 448.863.562,80	R\$ 448.863.562,80	0%	A ponte está concluída desde 2023. Obra dos acessos em andamento com previsão de conclusão em dezembro/2025.		
D2	2063	CD-599/2020			Governo do Paraná	BR-469	10,70	19,40	8,7	Duplicação e Manutenção	13/11/2020	03/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 139.477.766,41	R\$ 139.477.766,41	0%	A obra está paralisada devido à não liberação de área pela concessionária do aeroporto de Foz do Iguaçu. Há interferência fundiária sem prazo definido para resolução.		
D3		ACT-366/2023			Município de Coronel Vivida	BR-158	507,00	508,12	1,12	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	02/07/2023	01/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obra em andamento. Sem ônus ao DNIT.		
D3		ACT-366/2023			Município de Coronel Vivida	BR-373	477,89	481,50	3,61	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	02/07/2023	01/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obra em andamento. Sem ônus ao DNIT.		
D4		ACT-352/2022			Município de Colombo	BR-476	112,00	112,50	0,5	Implantação de interseção em nível	<Null>	<Null>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	Convênio se encontra com a prefeitura há dois anos para ser assinado.		

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2597	1631	3	BR-163	338,60	343,20	Contorno de Guaíra		Em decisão pelo Ministério se obra e projeto serão feitos pelo DNIT ou serão um a concessão.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
