


DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA


MAPA GERENCIAL TOCANTINS

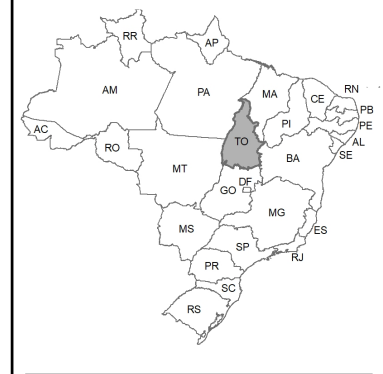

- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - ⋯ Planejada

Tipos de Intervenção

- OAE 9,11 Km
- IMPLANTAÇÃO
- A LICITAR **Total 9,11 Km**



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2109	7L92	2-3	Único	23 00662/2025	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	BR-153	151,56	151,87	0,31	Remanescente do acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	28/10/2025	16/05/2026	R\$ 17.300.842,35	74,84%	Acessos provisórios concluídos. Com 1º RPFO aprovada com inclusão de escopo	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
1	2109	7L92	2-3	Único	23 00662/2025	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	BR-153	1,20	2,90	1,7	Remanescente do acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	28/10/2025	16/05/2026	R\$ 17.300.842,35	74,84%	Acessos provisórios concluídos. Com 1º RPFO aprovada com inclusão de escopo	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
2	2109	7L92	2-3	Único	23 00217/2017	CONS. A GASPAR RARTELESTEV GARAMBONE	BR-153	0,00	1,73	1,73	Ponte sobre o rio Araguaia (Xambioá)	05/10/2017	11/10/2025	R\$ 204.232.366,46	98,96%	Contrato finalizado. Aguardando emissão de Termo de Recebimento Provisório (TRP)	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA
3	167Q	3	Único	00	00 00958/2024	CONSORCIO PONTE DO ESTREITO	BR-226	0,00	1,70	1,7	Projeto e execução da reconstrução de ponte (Rio Tocantins)	31/12/2024	22/12/2025	R\$ 174.645.406,42	99,81%	Obra concluída. Com TRP emitido em Mar/26 e previsão de emissão de TRD em Abr/26	00 00063/2025	CONSORCIO GEOSISTEMAS-PROSULL
4	152W	3	Único	23	00426/2024	MCDR EDIFICAÇÕES LTDA	BR-010	134,60	141,70	7,1	Remanescente de Implantação	07/04/2024	26/10/2025	R\$ 16.299.465,70	94,55%	Obra concluída. Aguardando Termo de Recebimento Definitivo (TRD)	23 00456/2024	NEOCONS TEC CONSULTORIA TÉCNICA

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2502			BR-239		Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153)			Projetos em elaboração, na DFP. Previsão de licitação da obra em 2027.		
L2		5E15	3	BR-242		Implantação do Lote 5			Tratativas ambientais e ajustes de projeto em andamento. Com previsão de contratação integrada até Set/26.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
