

ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Em vinte e dois de novembro do ano de dois mil e três hora e trinta e quatro minutos, no Hotel Max Savassi R. Antônio de Albuquerque, 335 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30112-010- Teve início a 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14:00h às 15:00h foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 15h34min às 18h28min – Dia 22/11/2023.

Andreia Mendes (Comissão de Barra Longa), Antônio Áureo (Rio Doce), Bárbara Lais (Renova), Bruna da Silva Lopes (Rio Doce), Carlos Sena (Renova), Caroline Braga (Flacso), Francine Aparecida Souza (SETRANS), Helen Roberta de Oliveira Araújo (SEMAD), Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros (SEINFRA), Marcelo Mol (Samarco), Mariana Valadão (EY), Pedro Ivo (Renova), Sergio Ferreira Lima Filho (Renova), Thiago Fernandes dos Santos (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e Vaneide Carvalho (SEINFRA).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 71ª

1.2) Aprovação do Calendário 2024.

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, saudou a todos os presentes e os consultou ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 71ª Reunião Ordinária que colocada em votação foi aprovada, sem objeções.

A Sra. Juliana, apresentou o calendário para as reuniões ordinárias 2024 e uma previsão das visitas técnicas no mesmo formato como realizado em 2023. Calendário aprovado em concordância com a Fundação Renova e a Samarco.

Discussão


Reuniões 2024 (C)-Infra Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura			
Reunião	Data	Local	Local
73ª	01/02/2024 Quarta-feira	Belo Horizonte	Belo Horizonte
74ª	20/03/2024 Quarta-feira	Mariana	Vistorias Mariana - Vistoria PG08 PG10 21/03/2024 Quinta-feira
75ª	08/05/2024 Quarta-feira	Barra Longa	Barra Longa - Vistoria PG10 09/05/2024 Quinta-feira
76ª	19/06/2024 Quarta-feira	Belo Horizonte	Belo Horizonte
77ª	23/07/2024 terça-feira	Rio Doce	Rio Doce - Vistoria PG09 PG10 24/07/2024 Quarta-feira
78ª	11/09/2024 Quarta-feira	Mariana	Mariana
79ª	23/10/2024 Quarta-feira	Belo Horizonte	Belo Horizonte
80ª	27/11/2024 Quarta-feira	Belo Horizonte	Belo Horizonte
Obs:	Para as Vistorias serão essas datas, no dia seguinte a RO. Vistorias Mariana - Vistoria PG08 PG10 21/03/2024 Quinta-feira Barra Longa - Vistoria PG10 09/05/2024 Quinta-feira Rio Doce - Vistoria PG09 PG10 25/07/2024 Quarta-feira		

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8.

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3 nº 1042050-07.2020.4.01.3800: O Sr Thiago Fernandes dos Santos, representante da Fundação Renova, rememorou o contexto das famílias para o reassentamento em Gesteira que era um processo que vinha sendo conduzido desde 2020 com a adesão de 31 famílias no reassentamento familiar, 05 para o reassentamento coletivo e 01 família não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial.

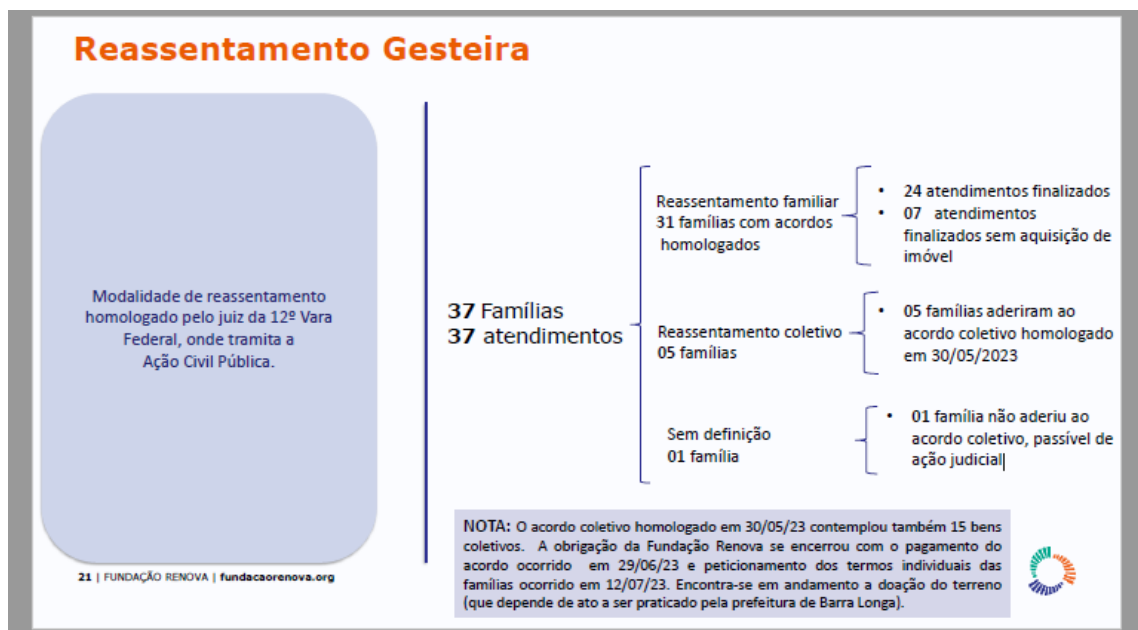

Discussão

NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 e petição dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Encontra-se em andamento a doação do terreno (que depende de ato a ser praticado pela prefeitura de Barra Longa). Segue link MP que esteve à frente do acordo com todos os detalhes “**Caso Samarco: acordo coletivo garante reconstrução e recuperação da comunidade de Gesteira**” <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/caso-samarco-acordo-coletivo-garante-reconstrucao-e-recuperacao-da-comunidade-de-gesteira.shtml>

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08: Sr Thiago Fernandes dos Santos, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2023): previsão para 2023, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:

Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues: Previsão de conclusão:- 5 Casas; 02 Bens Coletivos em novembro; 01 Lote em dezembro. **Paracatu de Baixo:** Previsão de conclusão:01 casa; - 02 Bens Coletivos em novembro, não há previsão de entregas para a dezembro. **Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar:** Previsão de conclusão de 03 casas em novembro e 04 casas em dezembro.

iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas. Avanço real em **03.11.23 88,17% Universo de Atendimento 249** - Status em 03/11/2023: **Concluído:** 8 Bens Coletivos;146 Casas/Comércio/Misto;20Lotes. **Habite-se:**137 Casas/Comércio/Misto/Coletivo. **Obra em Andamento:** 33 Casa/Comércio/Misto/Coletivo **TRR:** 79 Casas/Comércio/Misto/Coletivo– Relatório fotográfico

III) Status de Edificações Paracatu e Entregas **Avanço de obra real em 01.11.23 = 88,34%** Universo de Atendimento: 94 Status em 03/11/2023: **Concluído:** 8 Bens Coletivos; 60 Casas/Comércio/Misto/Sítio; Concluído: 2 Lote. **Habite-se:** 44 Casas/Comércio/Misto/Coletivos; **Obra em Andamento:** 10 Casa/Comércio/Misto/Sítio/Coletivo. **TRR:** 31 Casas/Comércio – Relatório fotográfico.

- Atendimentos sem assinatura de TOR (Termo de opção ao reassentamento)

Bento rodrigues: 34 Coletivo – Familiar 5 – Pecúnia 1; Paracatu de Baixo 08 Coletivo – Familiar 02 – Pecúnia 07; Outras Comunidades Rurais:– Familiar 4 – Pecúnia 4

3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5-

Responsável: Fundação Renova

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de Condicionantes Ambientais; Prazo de entrega de equipamentos. Responsável: SAMARCO S/A.


3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga.

Responsável: SAMARCO S/A.

Discussão

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: A Sra. Úrsula Vasconcelos, representante da Samarco, informou que além de manifestações irrelevantes não houve decisão do processo no período e que por isso a Fundação Renova também não enviou um representante para esse ponto de pauta.

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de Condicionantes Ambientais; Prazo de entrega de equipamentos. Sr. Marcelo Mol, representante da Samarco, realizou a apresentação dos pontos de pauta. Destaques da Apresentação com fotos para as obras em Rio do doce e Santa Cruz do Escalvado, Campo de Futebol da Comunidade de Santana do deserto, pavimentação, Centro de fisioterapia, Passeio Portal e Gruta. Pavimentação de Merengo, Policlínica Santa Cruz do Escalvado, Taludes Críticos e pavimentação Pedra do Escalvado.

LOC 1496/2020 _ CRONOGRAMA DAS OBRAS


OBRAS COM EXECUÇÃO EM ANDAMENTO

Item	Cond.	MARCOS
1	65	Construção Centro de Fisio. - R. Doce
2	28	Implantação da Policlínica de -Sta. Cruz
3	55.56	Revitalização Parque Expo. -Sta Cruz
4	67.1	Implantação Projeto Passeio - R. Doce
6	59.9	Campo Fut. Santana Deserto - R. Doce
7	12.4.2	Reforma Pavimento S. Deserto - R. Doce
8	55.72	Pavimentação 14km Merengo - Sta. Cruz
10	PSCE07.1.3	Reforma da escola N. Soberbo - Sta. Cruz
11	12.2.2	ETA Santana Deserto - R. Doce
12	11.3	ETE Santana Deserto - R. Doce
13	55.49.5	Cemitério Novo Soberbo - Sta. Cruz
14	55.32.4	Rev. Posto Saúde Porto Plácido - Sta. Cruz
15	55.32.3	Rev. Posto Saúde Novo Soberbo - Sta. Cruz
16	PSCE03.4	Taludes Críticos - Sta. Cruz
17	17	Pavimentação Pedra do Escalvado - Sta. Cruz
18	55.32.5	Rev. Posto Saúde Vargem Alegre - Sta. Cruz
19	55.46.1	Academia ao ar livre de Gonge - Sta. Cruz
20	55.11.3	Academia ao ar livre de Jorge - Rio Doce
21	55.11.2	Academia ao ar livre de Tapera - Rio Doce
22	55.29	Torre de celular de Matadouro - Sta. Cruz
23	55.81	Torre de celular de S.J.Vargem Alegre -Sta. Cruz

Total de Condicionantes obras em andamento: 23

- 8 Rio Doce
- 15 Santa Cruz do Escalvado

NÃO OBRAS DE CONTRAPARTIDA SOCIALEM ANDAMENTO (sociais e ambientais)

Item	Cond.	MARCOS
1	1	Capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Rio Doce
2	27	Capacitar os servidores públicos do Município de Santa Cruz do Escalvado
3	55.6	Programa de capacitação profissional Rio Doce
4	55.39	Programa de capacitação profissional Santa Cruz Escalvado
5	12.13	Compensação Ambiental das APP no município de Rio Doce
6	11.1	Recuperação do Córrego das Lajes
7	12.11	Elaboração e implementação do Plano de Arborização
8	55.82	Compensação Ambiental das APPs (Áreas de Preservação Permanente) no município de Santa Cruz do Escalvado
9	14	Plano de Desenvolvimento da Economia local no município de Rio Doce
10	31	Plano de Desenvolvimento da Economia local do Município de Santa Cruz do Escalvado
11	39	Programa de Educação Ambiental Unificado
12	30	Plano de Controle da febre maculosa
13	61	Custeio da Revisão do Plano Diretor de Rio Doce
14	40	Projeto de Coleta Seletiva
15	26	Plano Municipal de Turismo
16	PSCE08	Revitalização das propriedades rurais da margem direita

Total de Condicionantes não obras em andamento:

- 7 Rio Doce
- 8 Santa Cruz do Escalvado
- 1 Rio Doce + Santa Cruz

3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga. representante da Samarco, realizou a apresentação do ponto de pauta, apresentação em detalhes consta no final da Ata

3

PROJETO: CANDONGA – UHE RISOLETA NEVES MOVIMENTO DE MASSA SETOR 11		ANO 2023												
Item	Atividade	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez			
1	Emissão da O.S.	■												
2	Término da Mobilização Equipamentos / Mão de obra		■											
3	Início das atividades			■										
4	Termino do Contrato								■					
5	Mobilizações	■	■											
6	Disposição de Sedimentos em Bacias	■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Empilhamento 98% P.N	■	■	■	■	■	■	■	■					
8	Estabilização Estruturas Setor 11				■	■	■	■	■					
9	Descomissionamento Setor 5B			■	■	■	■	■	■					
10	Sistema de drenagem				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Desmobilizações									■	■	■	■	■

Legenda
■ A iniciar
■ Em andamento
■ Concluído

PROJETO: CANDONGA – UHE RISOLETA NEVES SISTEMA DE DRENAGEM COMPLEMENTAR SETOR 11		ANO 2024													
Item	Atividade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
1	Emissão da O.S.	■	■												
2	Término da Mobilização Equipamentos / Mão de obra			■											
3	Início das atividades				■										
4	Termino do Contrato														
5	Mobilizações		■	■									■		
6	Sistema de drenagem Complementar			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Desmobilizações													■	■

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.

4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.

Discussão

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4 1000398-10.2020.4.01.3800: O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, lembrou que com a suspensão do Sistema Novel Infraestrutura em 17/07/23 para eixo 4, as famílias continuam em moradias temporárias, onde a Fundação é responsável pelos pagamentos de água, luz, aluguel e manutenção dos imóveis.


4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, apresentou ESCOPO PG10: CLÁUSULA 82 A 88 TTAC. **Em recorte a informação da Nota Técnica nº 24/2023** incluído a referência a qual item da Taxonomia do PG10. Destaques para as obras concluídas com fotos. **Obras em Execução:** PF8100 – Drenagem da ADME (Área Deposição de Material Excedente) e RCC (Resíduos de Construção Civil) – IC 84ª Implantação de aterro de resíduos de construção civil na Fazenda Vista Alegre no município de Barra Longa. Início: Set/2023 | Término previsto: Jan/2024; **Manutenção de Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas – IC 84ª** Serviços de manutenção corretiva, serviços de urgência e melhorias, como construções e reparações dos dispositivos do corpo estradal e fortuita movimentação de terra em vias pavimentadas e vias não pavimentadas. Início: Jan/2017 | Término previsto: Nov./2024; **Manutenção de Edificações – IC 84m, 84n** Obras de construção civil relativas a manutenções em de moradias temporárias dos imóveis sob responsabilidade da Fundação Renova, bem como obras de infraestrutura (esgoto, rede elétrica e outros) localizadas nos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG e seus distritos/subdistritos. Início: Jan/2017 | Término previsto: Nov./2024. **Obras a Iniciar:** PF0152 - Reforma da Quadra Volta da Capela – Município: Barra Longa Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Dez/2024; PF0152 - Reconstrução do Campo Municipal (Rodoviários) – Município: Barra Longa Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Dez/2024; PF0152 - Reconstrução do Campo de Pedras – Município: Mariana Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Fev/2025.

4.3) A Fundação Renova acrescentou dentro da pauta do PG10 uma explicação sobre o **EIXO 8** - Judicializado na ACP155Bi Econômico, foi apresentado Status de acompanhamento de itens PF0038 - Estruturas Rurais Complexas (Eixo 8) Escopo: 193 Estruturas rurais complexas, sendo 20 estruturas pertencente ao PG10 e 173 estruturas atendidas pelo PG17.

PG10: EIXO 8

PF0038 - Estruturas Rurais Complexas (Eixo 8)

Escopo: 193 Estruturas rurais complexas, sendo 20 estruturas pertencente ao PG10 e 173 estruturas atendidas pelo PG17.
Status:

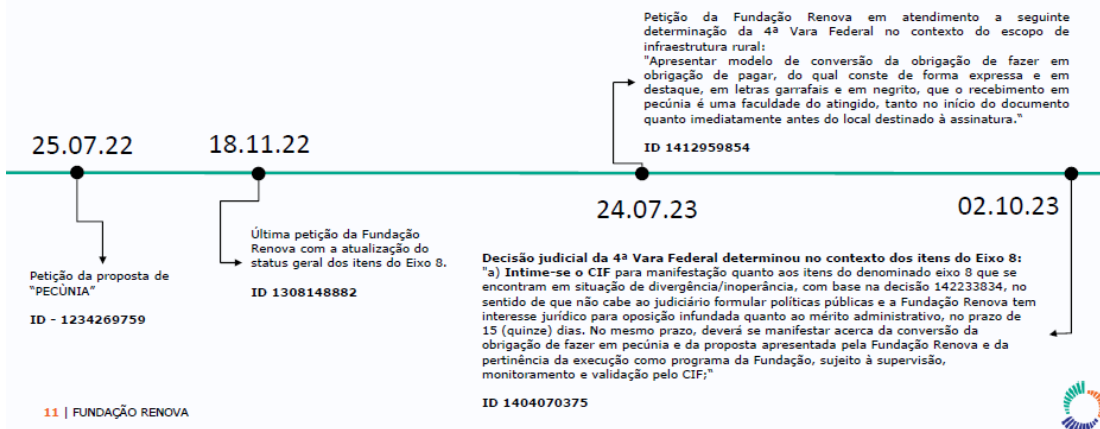

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA DA FUNDAÇÃO RENOVA

A Fundação Renova e o PG10, reforçam à CT-Infra a importância de apresentação de manifestação nos autos do Eixo 8 sobre a proposta da conversão da obrigação de fazer por "Pecúnia" das Estruturas Complexas, com base no detalhamento de valores na tabela ID **1412959856** protocolada como anexo na petição ID **1412959850**, em atendimento ao indicador **I01, I02, I03 e I04, da cláusula do TTAC 84, alínea f, como em atendimento a decisão 1000417-16.2020.4.01.3800 – 02/10/2023.**

A Fundação Renova acredita que a conversão em "pecúnia" dará definitividade ao objetivo do Programa de executar a reparação das infraestruturas impactadas pelo evento do rompimento.

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra pontuou que a CT iria analisar as informações fornecidas, e quando fosse solicitado a manifestação pela SECEX a da CT-Infra iria dar um posicionamento.

Todas as Apresentações estão anexas a Ata.

Por fim, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros agradeceu a presença de todos. A 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura que encerrou-se às dezoito horas e vinte oito minutos

Ata aprovada por todos os presentes na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 31 de janeiro de 2024



Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros
Coordenação da CT-INFRA

