



Aprender
CONECTADO

ESCOLAS
CONECTADAS

DA ESCOLA PARA O FUTURO.
DO BRASIL PARA O MUNDO.

EACE em números

2025

4.058 km

de fibra óptica implantada

+49 mil

Access points Instalados

68%

Escolas concluídas
Rede Externa, Rede Interna e Gerador Solar
(Piloto, Fase 2&3 e Fase 4.1)

173 Mbps

Velocidade média contratada
(Terrestre)

82

Escolas/dia
(última semana)


+47

Equipes
distribuídos em todas
estados do Brasil

43 Mbps

Velocidade média contratada
(Satélite)

EACE no Brasil

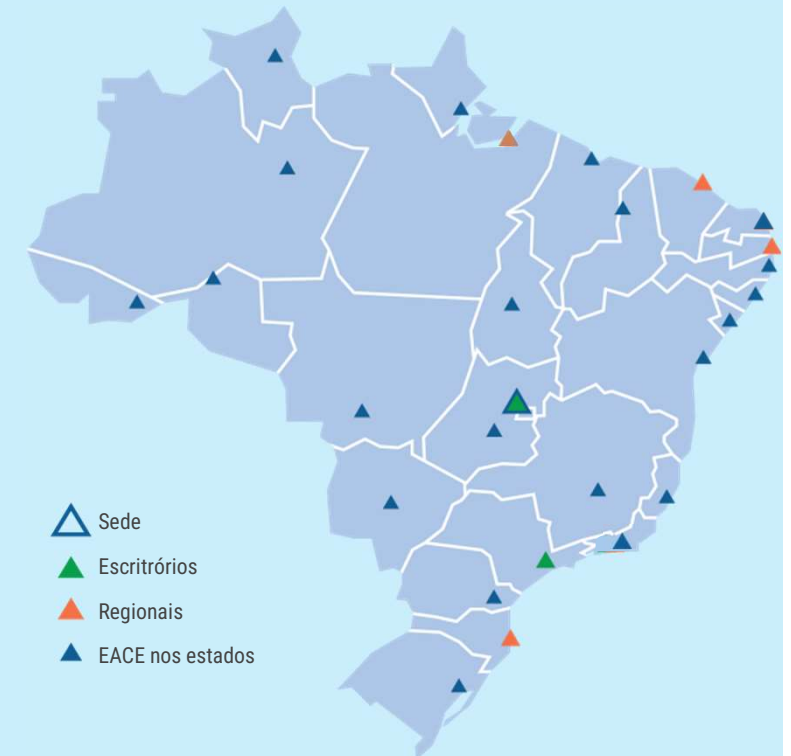

FONTE: DOP

+1.104 mil estudantes




Municípios
1.194
contemplados




Escolas rurais
8.484
escolas rurais



Escolas Indígenas
560
escolas em área
indígena

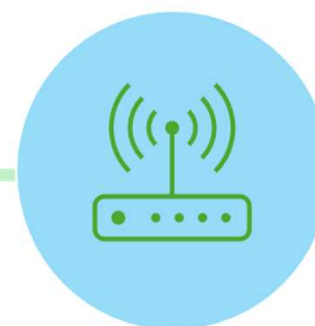

Média de
velocidade
176 Mbps
download
183 Mbps
upload



Energia Solar
5.467
kWh/dia
instalados


	NORTE	NORDESTE	CENTRO OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
 REDE EXTERNA	3.131	5.120	195	908	1.331	10.685
 REDE INTERNA	5.879	6.013	267	1.016	1.475	14.650
 GERADOR SOLAR	1.248	36	2	-	-	1.286
 ESCOLAS CONCLUÍDAS	3.133	4.819	193	850	1.291	10.286

(*) Inclui Piloto. Fase 2&3 e Fase 4.1




10.685 Escolas conectadas


EVOLUÇÃO - Acumulado

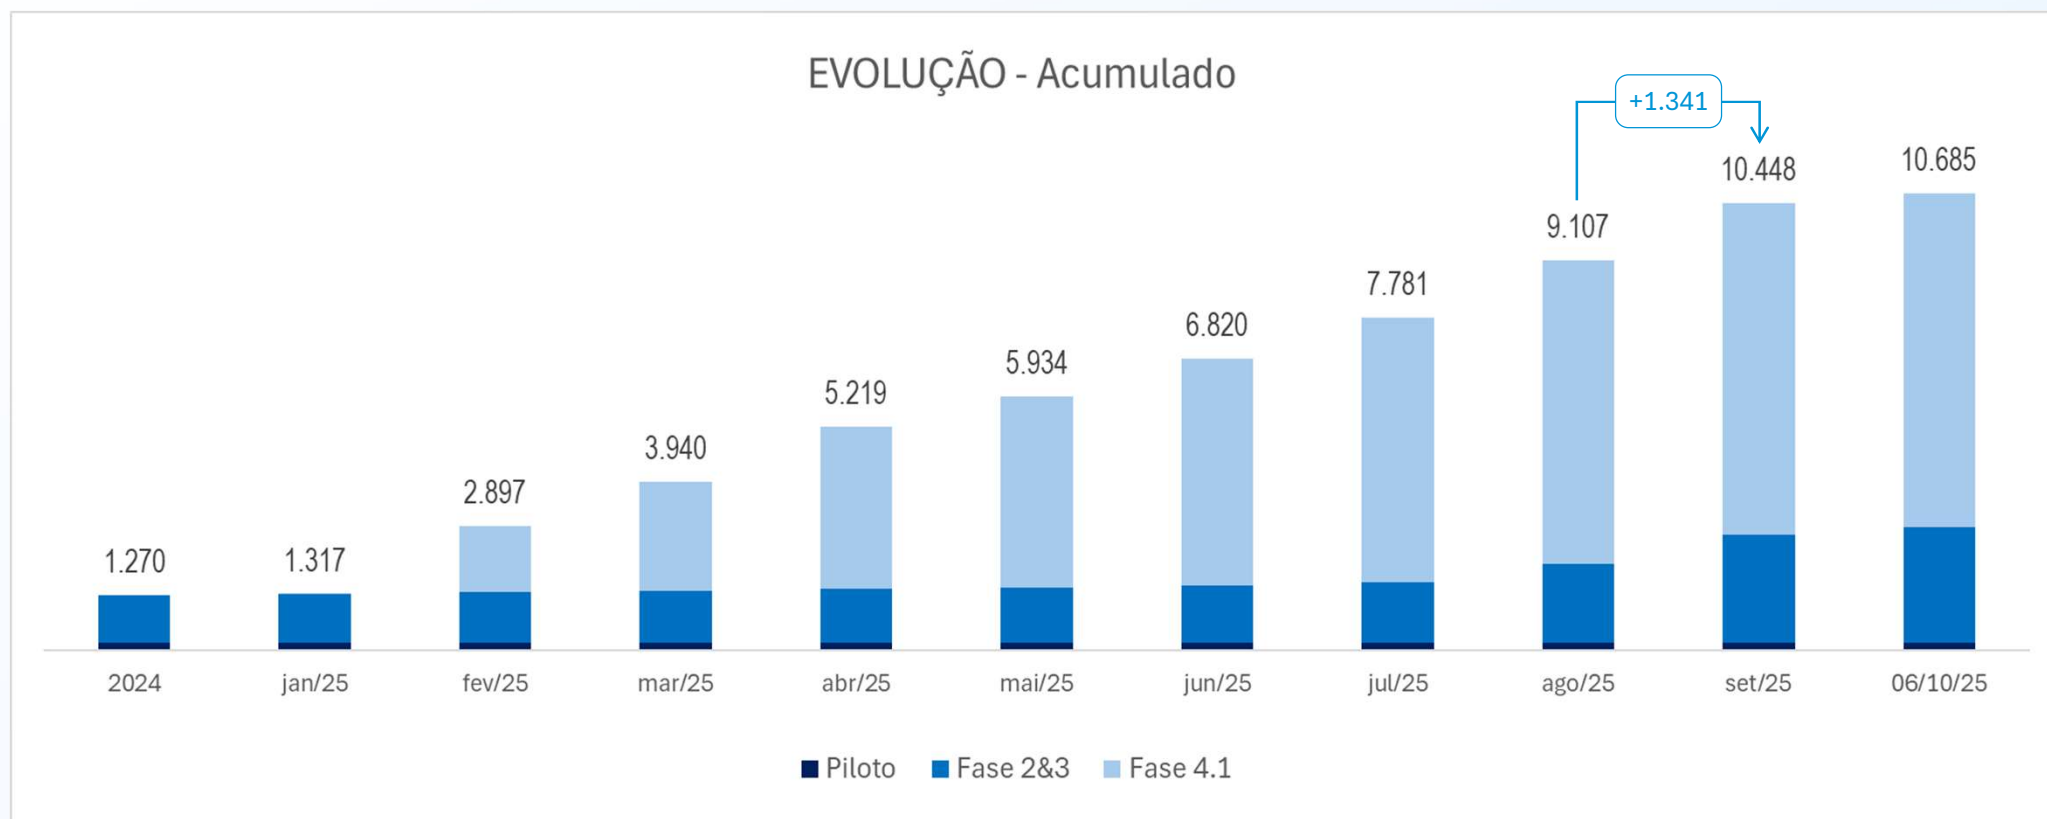

Planejado x Realizado

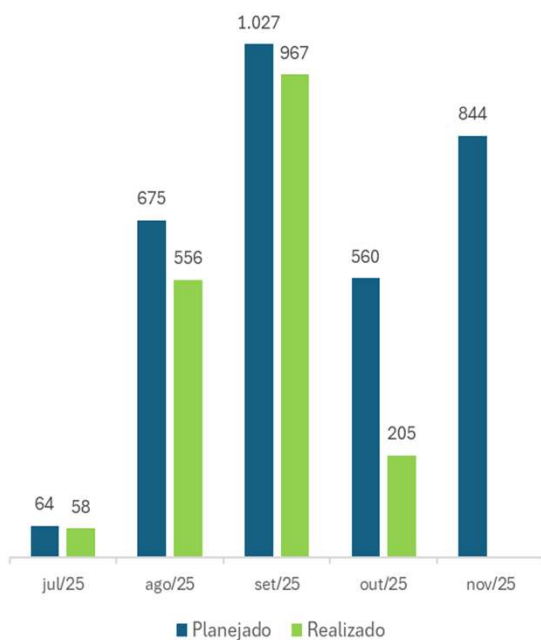


EVOLUÇÃO - Acumulado

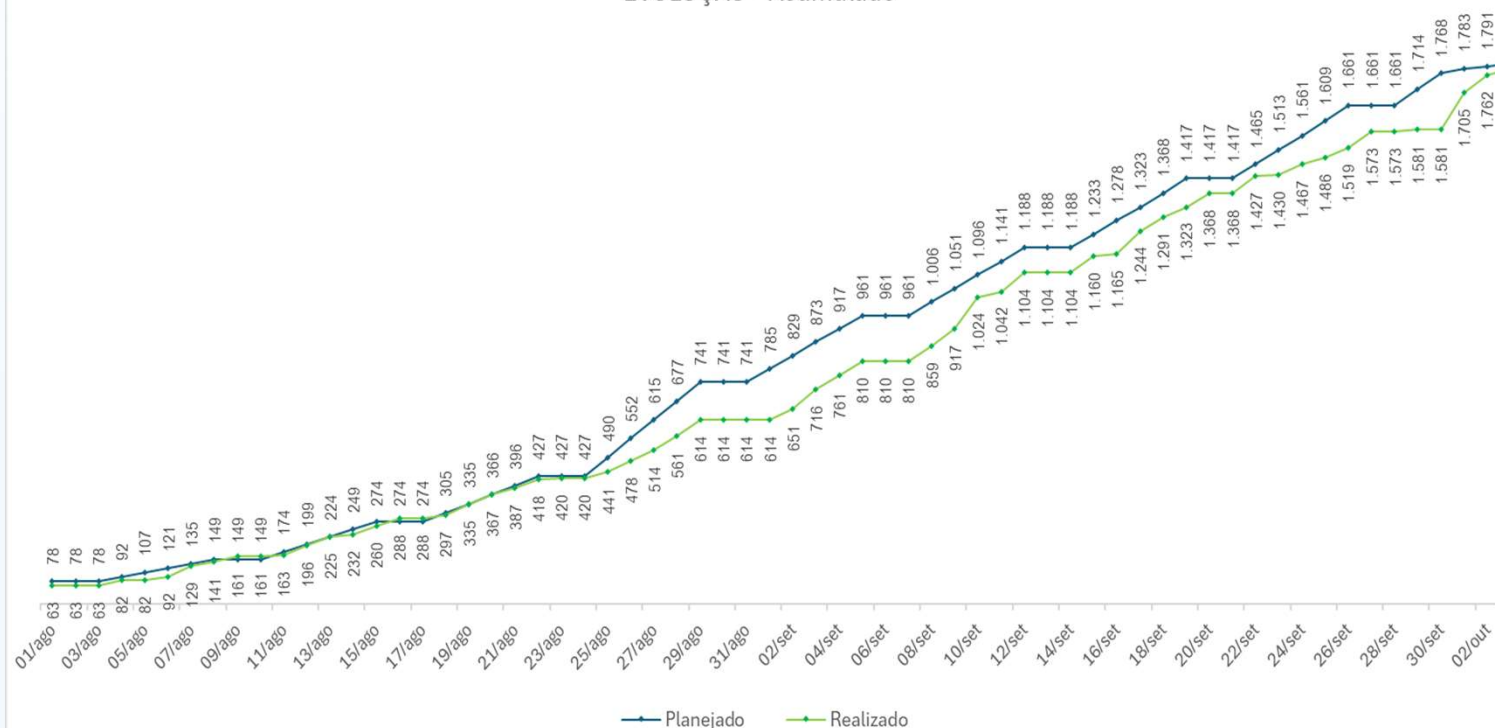




14.650 escolas com Wi-Fi Instalados

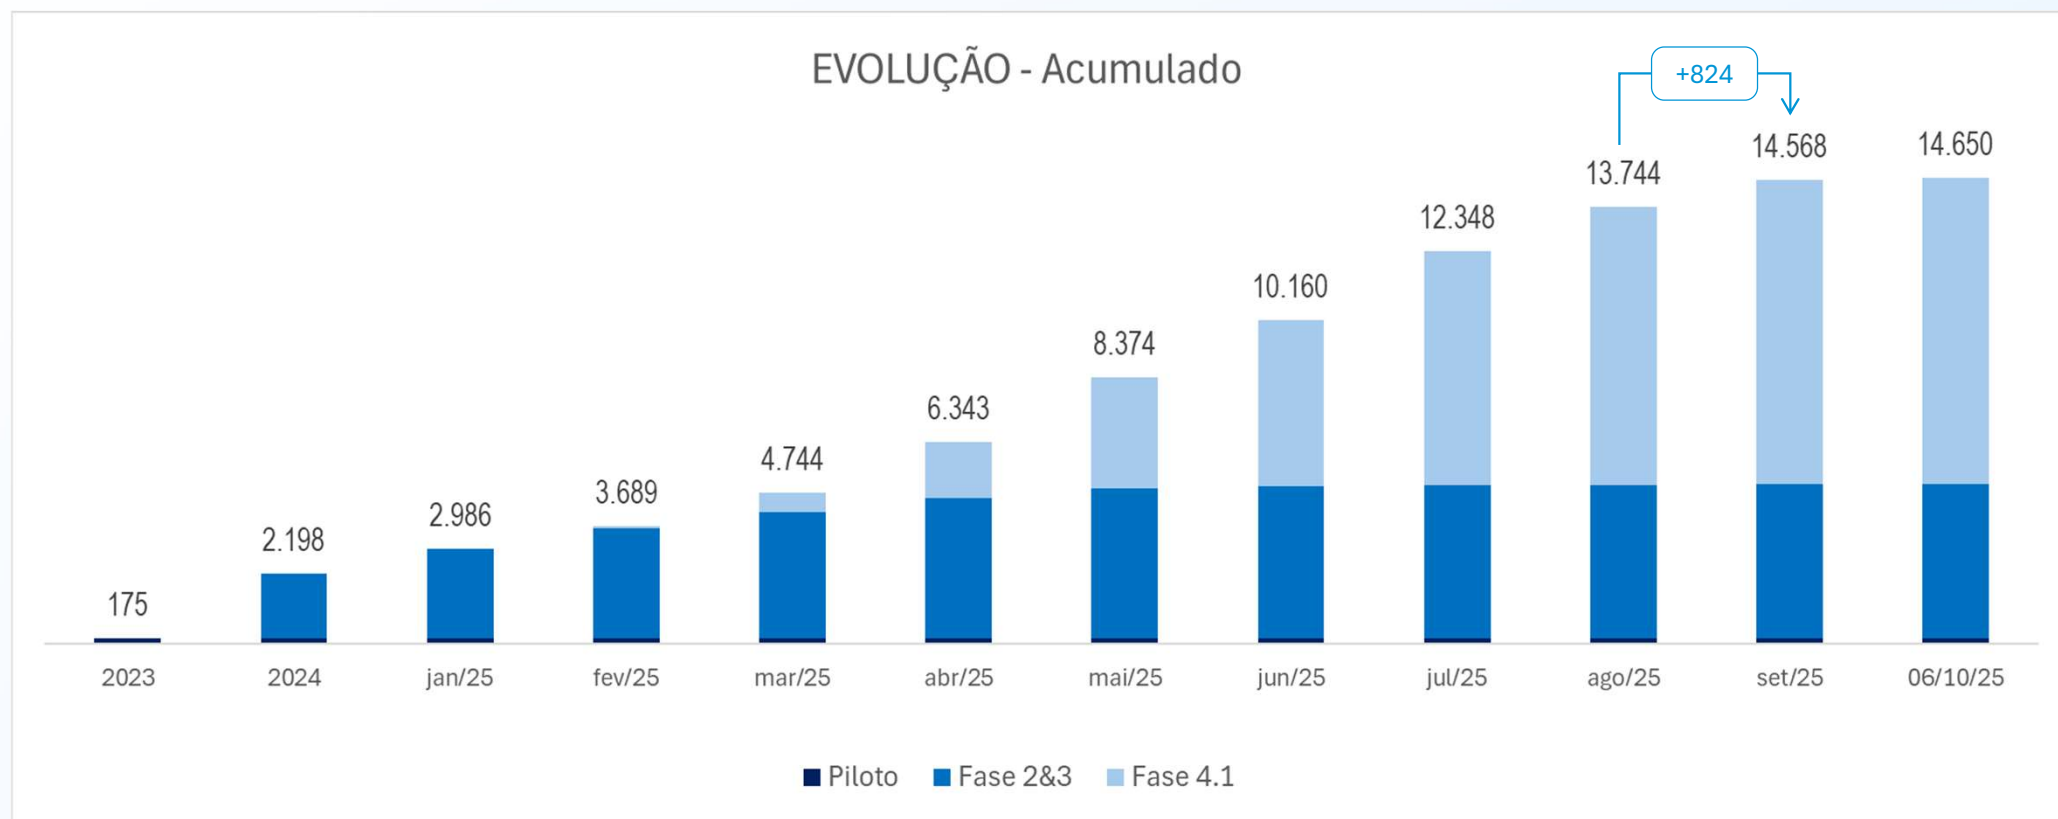




1.286 escolas com Gerador Solar Instalado

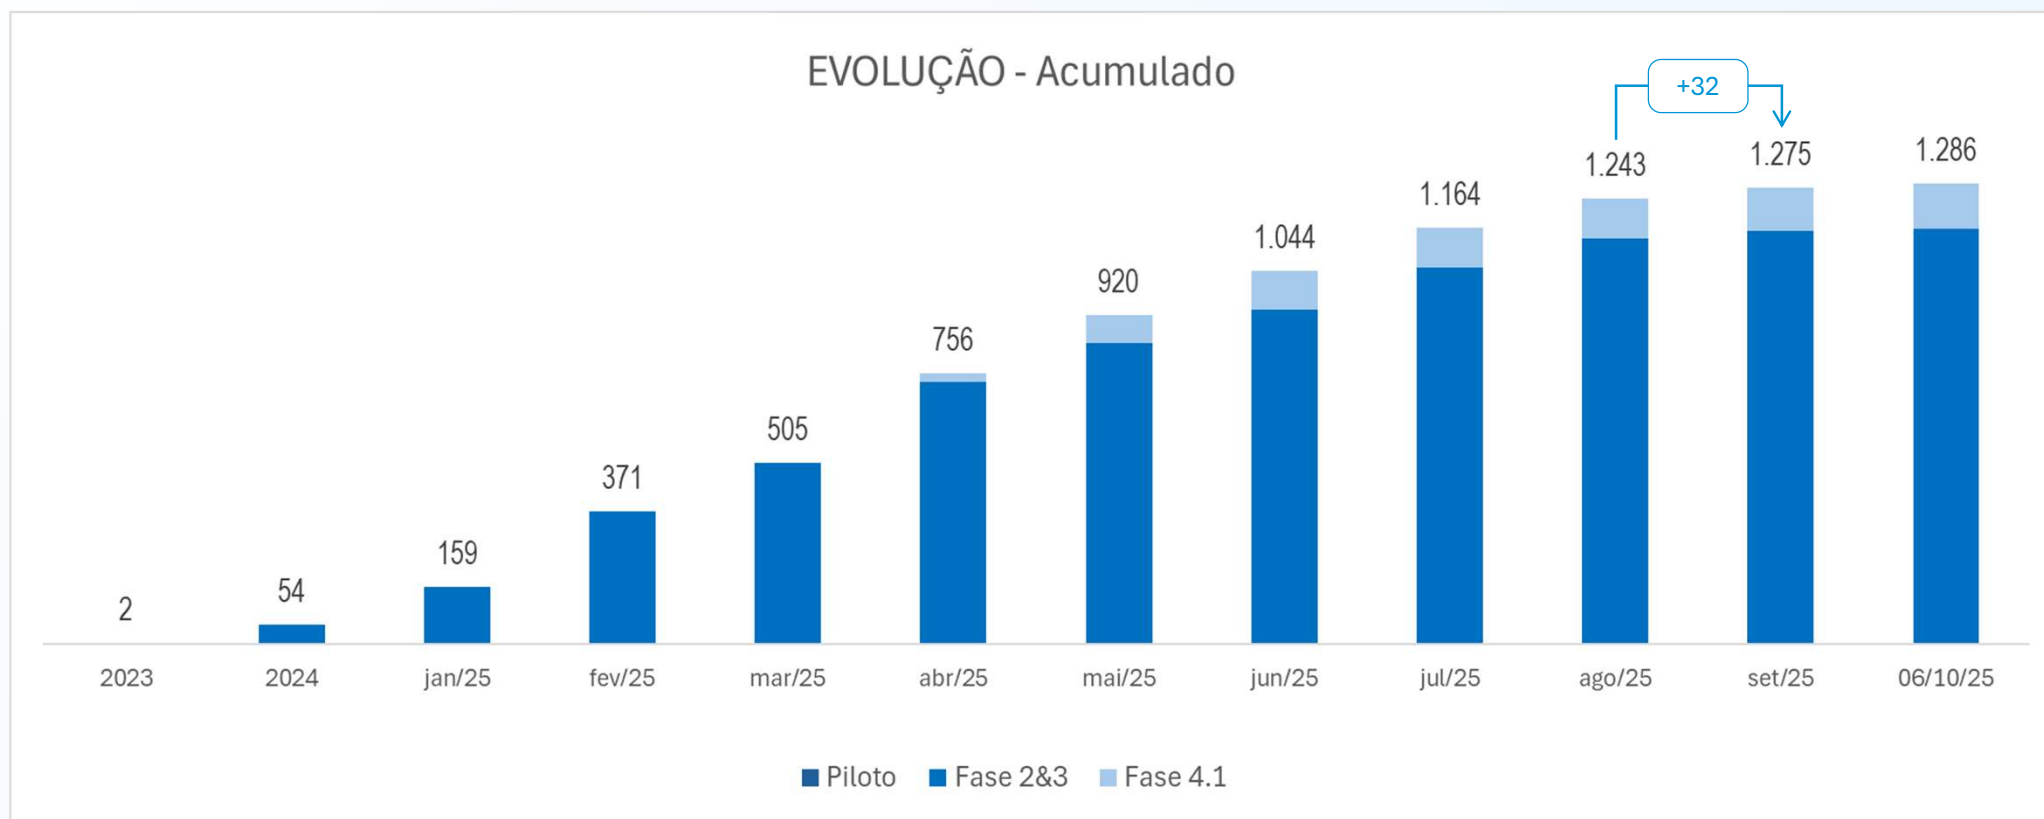



10.286 escolas concluídas

EVOLUÇÃO - Acumulado

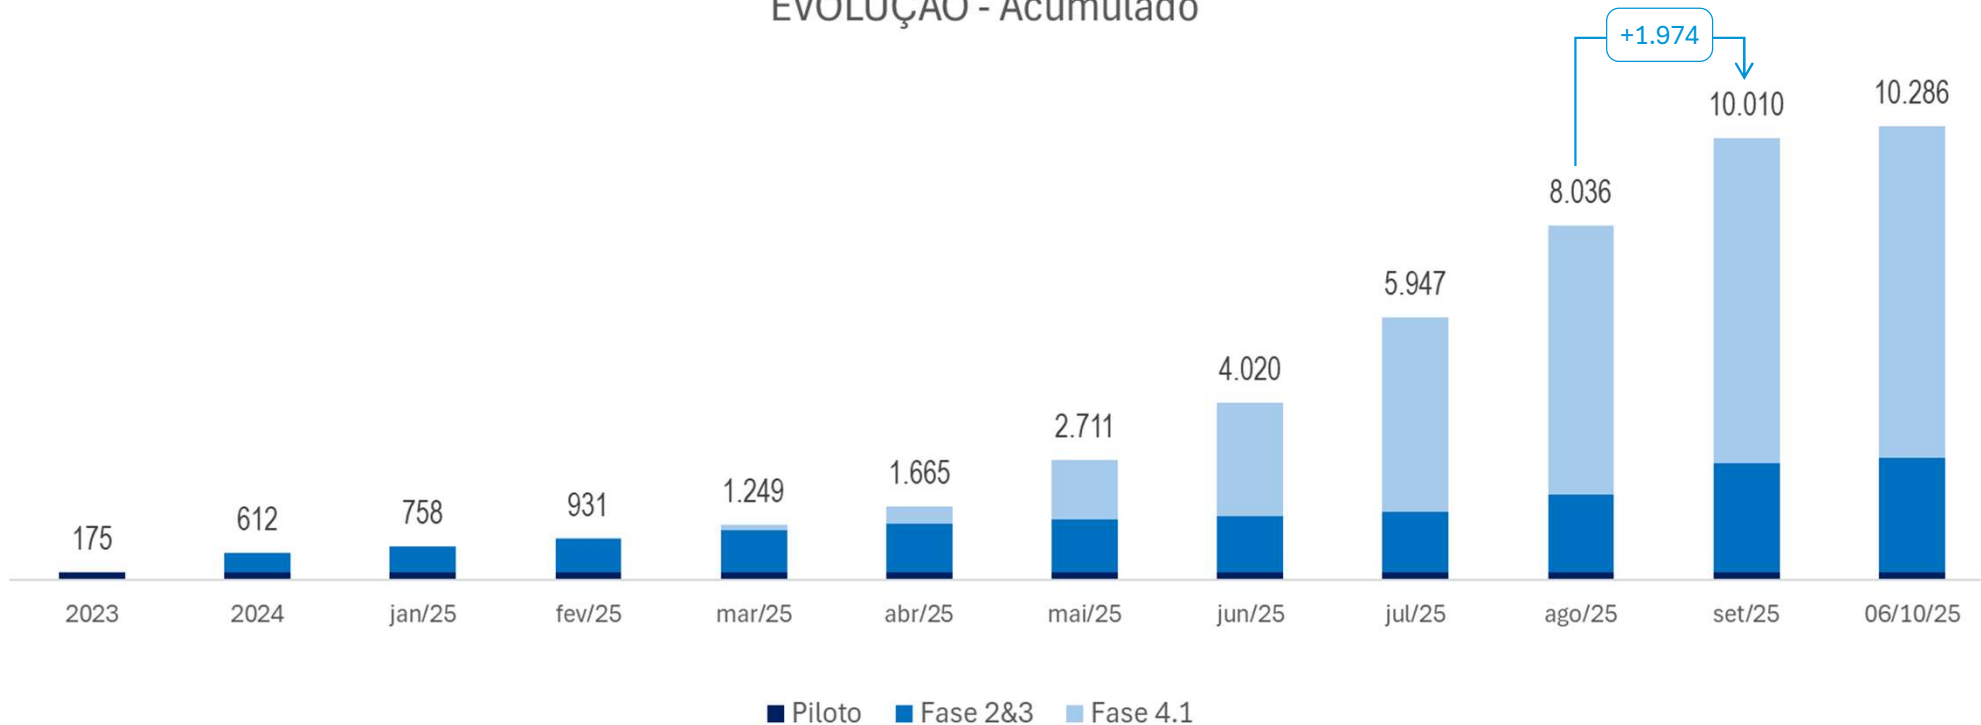

Acesso Terrestre	10.614
Desativadas/Saiu do Escopo	423
Escolas Conectadas	8.722
Escolas com impedimento	86
Em andamento	1.383

Em reforma	68
Sem Energia (ex-EACE)	14
Sem condições de acesso	4

Acesso Satelital	4.817
Desativadas/Saiu do Escopo	167
Escolas Conectadas	1.788
Escolas com impedimento	834
Em andamento	2.028

Em reforma	57
Sem Energia (ex-EACE)	754
Sem condições de acesso	23


(*) Fases 2&3 e Fase 4.1

Rede Externa	15.431
Desativadas/Saiu do Escopo	590
Escolas Conectadas	10.510
Escolas com impedimento	920
Escolas declinadas (T → T)	1.019
Escolas declinadas (T → S)	428
Em andamento	1.964



Em reforma	125
Sem Energia (ex-EACE)	768
Sem condições de acesso	27

Rede Interna	15.582
Desativadas/Saiu do Escopo	592
Infraestrutura concluída	14.475
Ativação lógica concluída	10.248
Ativação lógica pendente	4.227
Escolas com impedimento	182
Em andamento	333




Aguarda acesso terrestre	1.299
Aguarda acesso satelital	2.623
Sem Rede Externa (ex-EACE)	28
Cancelado após instalação	42
Em andamento	235

Em reforma	155
Sem condições de acesso	27

(*) Fases 2&3 e Fase 4.1


Gerador Solar	1.401
Desativadas/Saiu do Escopo	12
Atendidas [outro projeto]	22
Concluídas	1.284
Escolas com impedimento	15
Em andamento	68




Em reforma	8
Sem condições de acesso	5
Outros	2

(*) Fases 2&3 e Fase 4.1

FASE 2&3

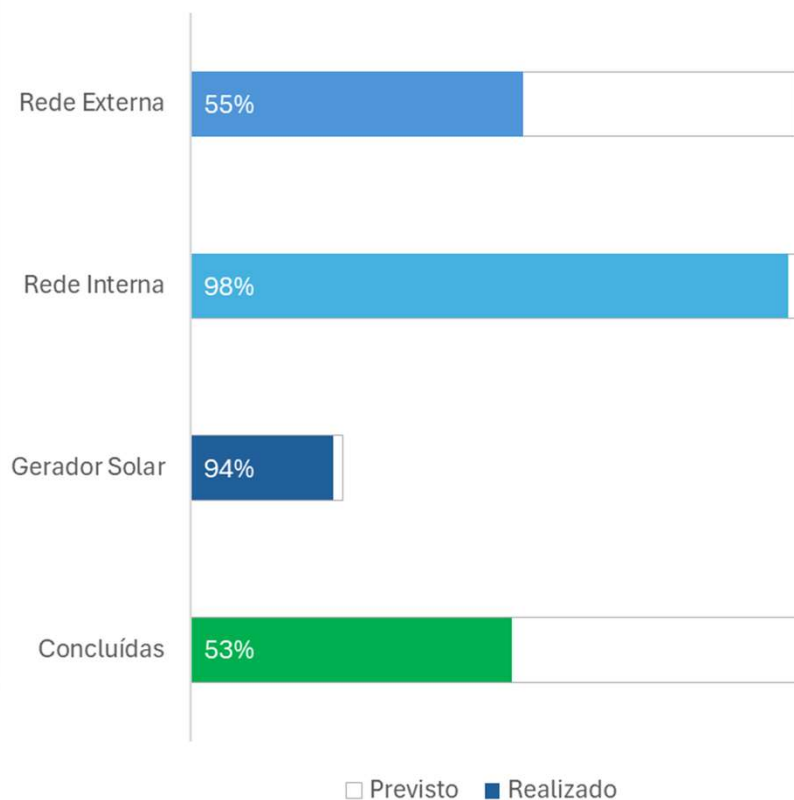

FASE 4.1

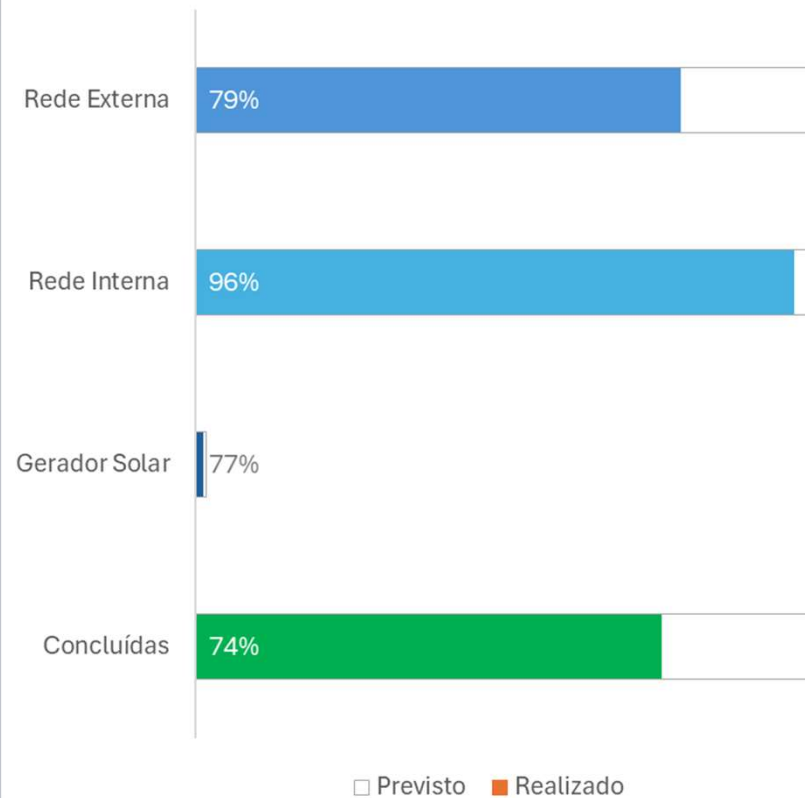

Obrigado!
