

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

Ministério da Saúde

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – SCTIE


AGOSTO 2020



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

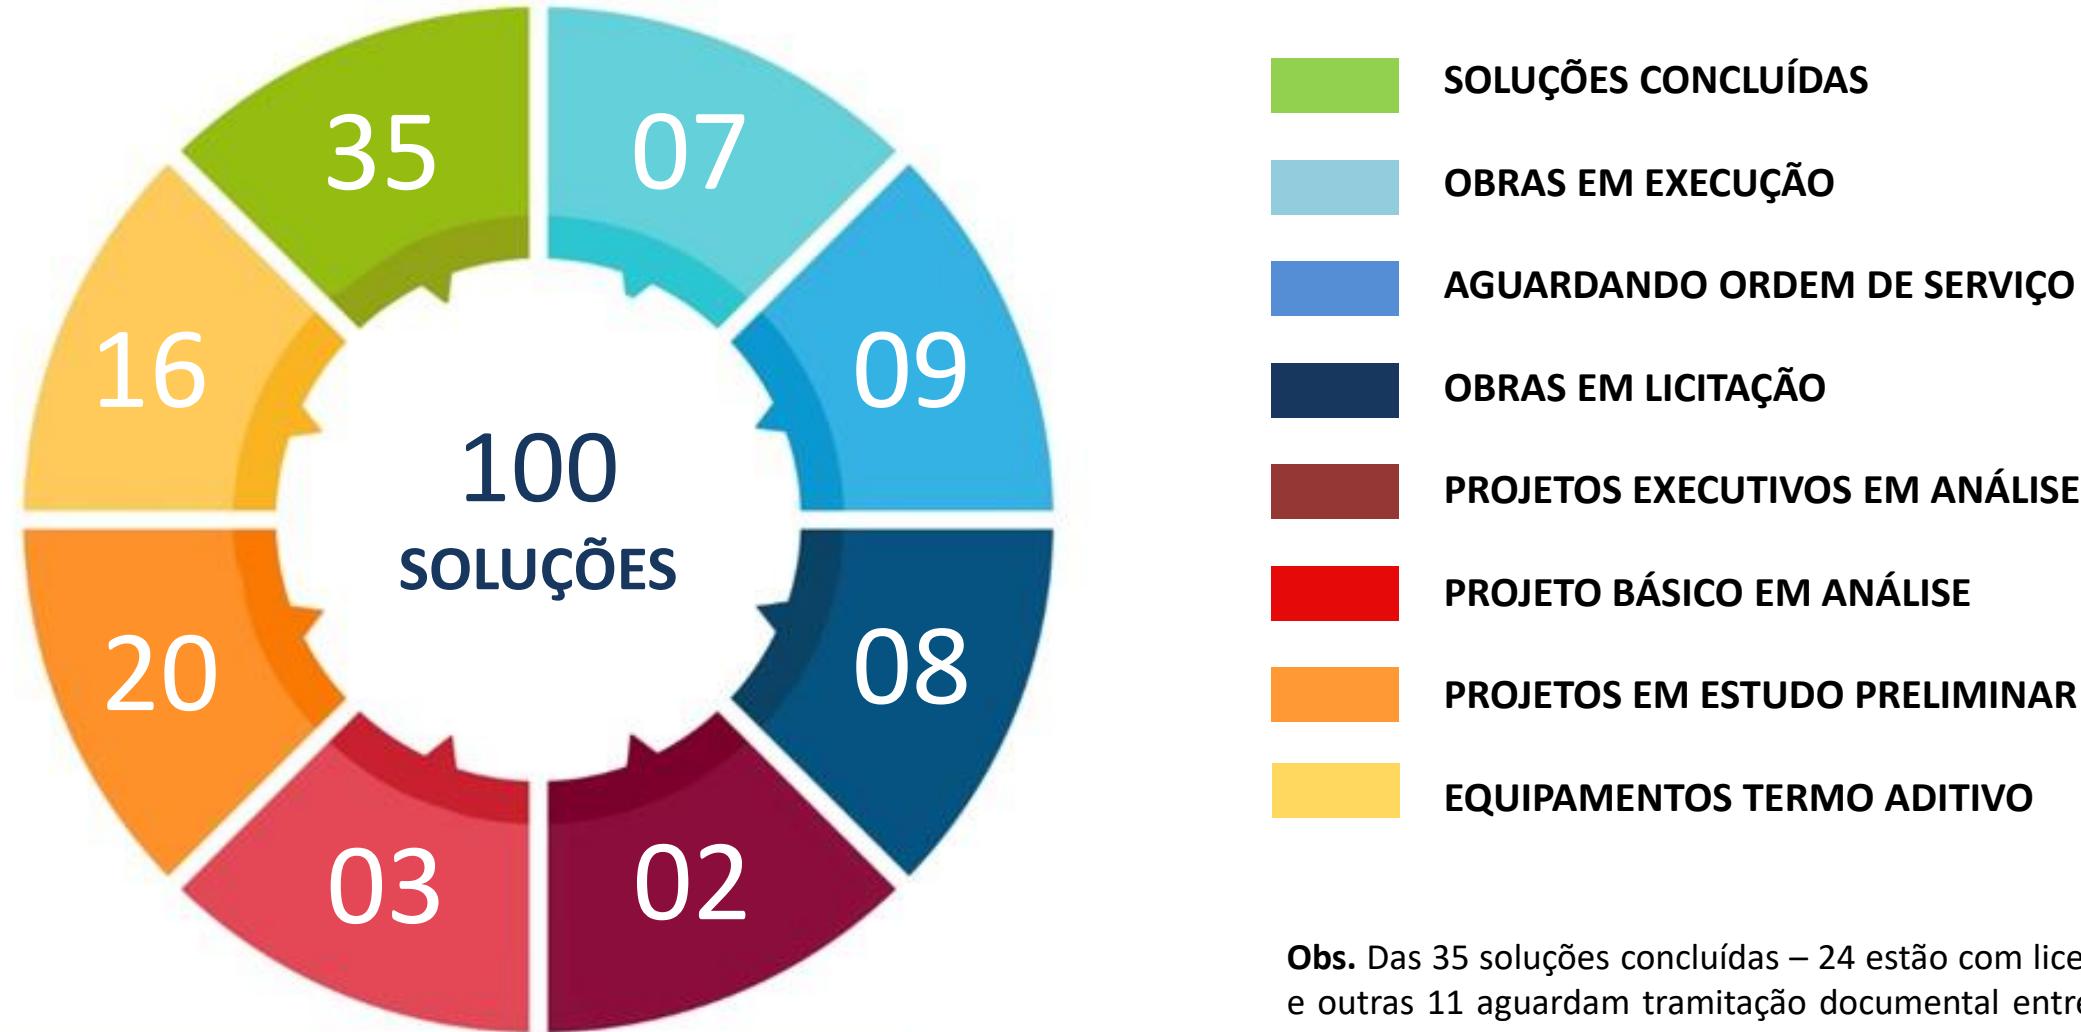

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	A Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba – Campina Grande/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
2	A Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
3	A Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
4	A Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
5	A Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
6	A Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
7	A Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
8	A Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
9	A Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
10	A Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
11	A Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
12	A Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
13	A Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
14	A Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
15	A Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
18	A	Instituto do Câncer do Ceará/ICC - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
20	A	Hospital Ana Nery – Sta Cruz do Sul/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
21	C	Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
22	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
23	CV	Fundação Pio XII/RO – Rondônia/RO*	EQUIP. TERMO ADITIVO - CONCLUÍDO
24	CV	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo – Mogi das Cruzes/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO - CONCLUÍDO
25	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
26	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
27	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
29	A	Hospital do Câncer de Pernambuco – HCP Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
30	C	Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
31	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
32	CV	Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC*	EQUIPAMENTO COMISSIONADO - ADITIVO
33	EO	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN*	EQUIPAMENTO COMISSIONADO - ADITIVO
34	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
35	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO

Legenda:

A = Ampliação

C = Construção

CV = Casamata Vazia

EO = Equip. Obsoleto

Obs. *Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
2	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
3	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
4	C	Hospital N. Sra da Conceição/Tubarão/SC	OBRA EM EXECUÇÃO
5	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	OBRA EM EXECUÇÃO
6	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	OBRA EM EXECUÇÃO
7	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	OBRA EM EXECUÇÃO

AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
2	C	Hospital São José - Teresópolis/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
3	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
4	C	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
5	C	Hospital Geral de Roraima/RR*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
6	C	Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
7	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
8	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
9	C	Hospital Universitário Santa Terezinha - Joaçaba/SC	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

Obs. *Obra licitada e contrato assinado, aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

AGOSTO 2020



OBRAS EM LICITAÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
2	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
3	C	Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
4	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
5	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
6	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop/MT	EM PROCESSO LICITATÓRIO
7	A	Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
8	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	EM PROCESSO LICITATÓRIO

PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	EM ANÁLISE
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

AGOSTO 2020



PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Universitário Walter Cantídio - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE
2	A	Hospital do Câncer III/INCA - Rio de Janeiro/RJ	EM ANÁLISE
3	A	Hospital São Paulo - HSP UNIFESP - São Paulo/SP	EM ANÁLISE

ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA/SP	EM ELABORAÇÃO
2	C	Hospital Universitário do Piauí - Teresina/PI	EM ELABORAÇÃO
3	C	Hospital e Maternidade Marques Bastos - Parnaíba/PI	EM ELABORAÇÃO
4	C	Hospital São José Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus/BA	EM ELABORAÇÃO
5	C	Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE	EM ELABORAÇÃO
6	C	Hospital Geral de Palmas/TO	EM ELABORAÇÃO
7	C	Hospital Maternidade São José - Colatina/ES	EM ELABORAÇÃO
8	C	Hospital Rio Doce - Linhares/ES	EM ELABORAÇÃO
9	C	Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES	EM ELABORAÇÃO

PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
10	C	Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG	EM ELABORAÇÃO
11	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	EM ELABORAÇÃO
12	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	EM ELABORAÇÃO
13	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	EM ELABORAÇÃO
14	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Paríquera-açu/SP	EM ELABORAÇÃO
15	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP	EM ELABORAÇÃO
16	C	Hospital Regional João de Freitas - Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO
17	C	Hospital Regional Darcy Vargas – Rio Bonito/RJ	EM ELABORAÇÃO
18			DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
19			DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
20			DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA

INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born/RS
2	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR
3	Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia/MG
4	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS
5	Hospital de Juazeiro/BA
6	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP
7	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN
8	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Hospital do Câncer – INCA I – Rio de Janeiro/RJ	AGUARDANDO INSTALAÇÃO
2	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	AGUARDANDO INSTALAÇÃO
4	Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP	AGUARDANDO INSTALAÇÃO
5	Ass. de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge - Goiânia/GO	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO
6	Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL	ADEQUAÇÃO DA CASAMATA
7	Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba/MG	AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO
8	Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ	AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	21/11/2014
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	12/05/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	18/11/2016

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.471.731,37
Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
Valor Projeto: R\$ 17.461,61
Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40
Valor da Solução: R\$ 4.710.492,57

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/07/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	03/04/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.711.598,95
Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
Valor Projeto: R\$ 17.312,15
Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60
Valor da Solução: R\$ 4.953.259,88

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	09/12/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	04/05/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 15.958,20

Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20

Valor da Solução: R\$ 4.504.829,77

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	29/09/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	24/07/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15
Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
Valor Projeto: R\$ 16.418,01
Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20
Valor da Solução: R\$ 4.643.731,99

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	05/01/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	18/10/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 1.975.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69
Valor Projeto: R\$ 15.341,00
Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60
Valor da Solução: R\$ 3.971.094,29

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	15/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	09/12/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	26/02/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.207.031,66

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	08/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	16/06/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	29/05/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.490.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.579.402,34

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	07/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	09/06/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	22/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.016.412,25

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 20.499,22

Valor Fiscalização: R\$ 127.173,81

Valor da Solução: R\$ 5.182.878,32

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	15/05/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	27/07/2017
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	20/05/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 19.532,11

Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80

Valor da Solução: R\$ 4.439.241,79

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	04/08/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	26/03/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	30/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.660.031,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.553,41

Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13

Valor da Solução: R\$ 5.134.753,91

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	13/07/2017
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	21/02/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.170.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 90.840,80

Valor da Solução: R\$ 4.221.104,80

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/06/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	21/03/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 119.062,64

Valor da Solução: R\$ 5.058.559,11

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	13/03/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	17/05/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.359.800,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.821.935,19

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	26/02/2016
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	26/09/2017
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	29/04/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.557.516,71

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	05/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	11/06/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/11/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.580.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 123.902,74

Valor da Solução: R\$ 5.084.093,89

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/02/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.661.900,00

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15

Valor Fiscalização: R\$ 125.146,14

Valor da Solução: R\$ 5.257.391,55

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/07/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	27/03/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.443.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86

Valor Fiscalização: R\$ 126.664,16

Valor da Solução: R\$ 4.949.767,38

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	08/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	02/06/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 15px;"></div>	30/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.681.680,43
Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04
Valor Projeto: R\$ 19.908,40
Valor Fiscalização: R\$ 218.136,67
Valor da Solução: R\$ 4.938.518,54

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/11/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/06/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.475.000,00
Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06
Valor Projeto: R\$ 75.308,66
Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95
Valor da Solução: R\$ 8.174.710,66

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/01/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	18/05/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.649.000,00
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 19.601,56
Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79
Valor da Solução: R\$ 5.140.617,72

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	06/06/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	05/07/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	14/07/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13

Valor Fiscalização: R\$ 110.968,71

Valor da Solução: R\$ 4.852.849,55

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	16/10/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	07/01/2019
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 10px;"></div>	18/08/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.174.990,00

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97

Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 8.947.396,33

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	17/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	13/08/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 4.680.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05

Valor Projeto: R\$ 81.720,06


Valor Fiscalização: R\$ 354.225,19

Valor da Solução: R\$ 7.370.881,32

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	19/09/2017
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.

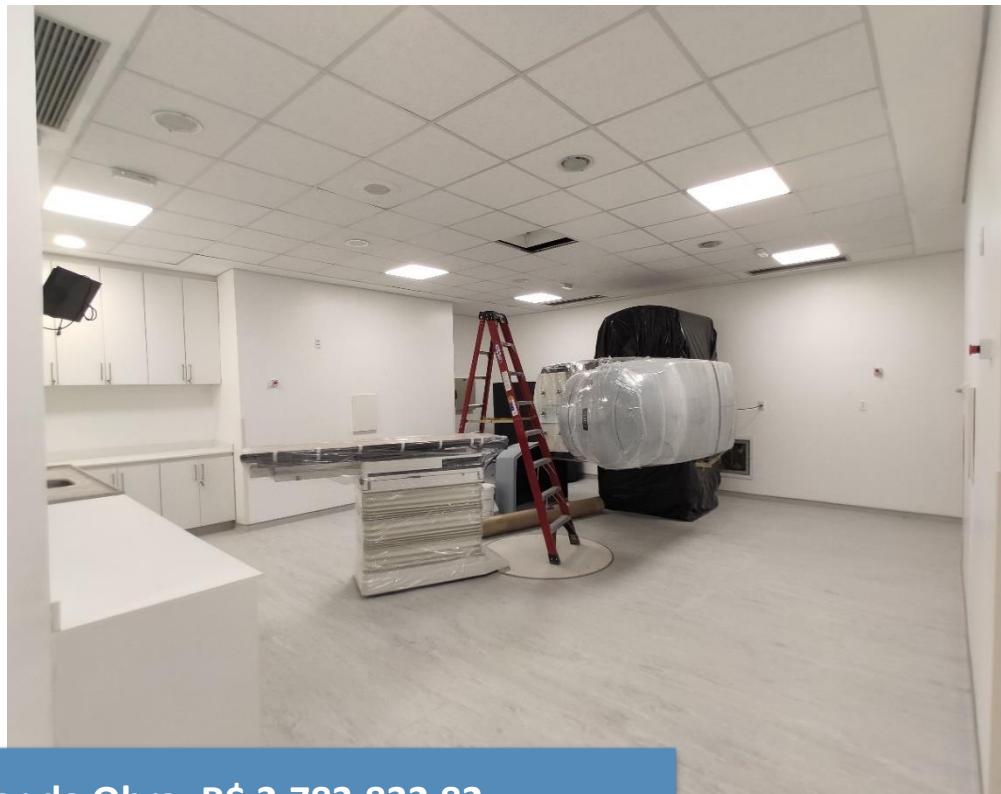

Valor da Obra: R\$ 2.783.832,82

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 149.379,24

Valor da Solução: R\$ 5.114.538,12

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/02/2016
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	24/10/2017
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 2.384.564,60

Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41

Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 190.187,70

Valor da Solução: R\$ 4.831.461,96

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	27/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	22/10/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 6.725.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 98.934,69

Valor Fiscalização: R\$ 291.178,09

Valor da Solução: R\$ 9.572.949,19

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/06/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	16/04/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 2.796.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 19.033,61

Valor Fiscalização: R\$ 165.557,91

Valor da Solução: R\$ 5.495.714,88

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	18/10/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 6.374.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 96.871,71

Valor Fiscalização: R\$ 310.258,13

Valor da Solução: R\$ 9.671.168,14

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	22/06/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/12/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Out./2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 2.373.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 132.098,70

Valor da Solução: R\$ 4.973.235,27

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	19/03/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	06/07/2017
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Out. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída (TRP), equipamento instalado, aguardando adequações operacionais e tramitação documental entre o serviço e a CNEN, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.982,60

Valor da Solução: R\$ 4.924.325,17

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	15/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/12/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Nov.. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 6.100.000,00
Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23
Valor Projeto: R\$ 78.443,83
Valor Fiscalização: R\$ 275.416,31
Valor da Solução: R\$ 9.076.432,38

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	22/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	10/09/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 97%; background-color: #ffcc00; height: 10px;"></div>	97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Nov. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato suspenso por deliberação do Comitê Gestor – COVID-19



Valor da Obra: R\$ 6.557.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83


Valor Fiscalização: R\$ 306.110,30

Valor da Solução: R\$ 9.323.046,71

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	15/10/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 93%; background-color: #ffd700; height: 10px;"></div>	93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Dez. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato suspenso por deliberação do Comitê Gestor – COVID-19

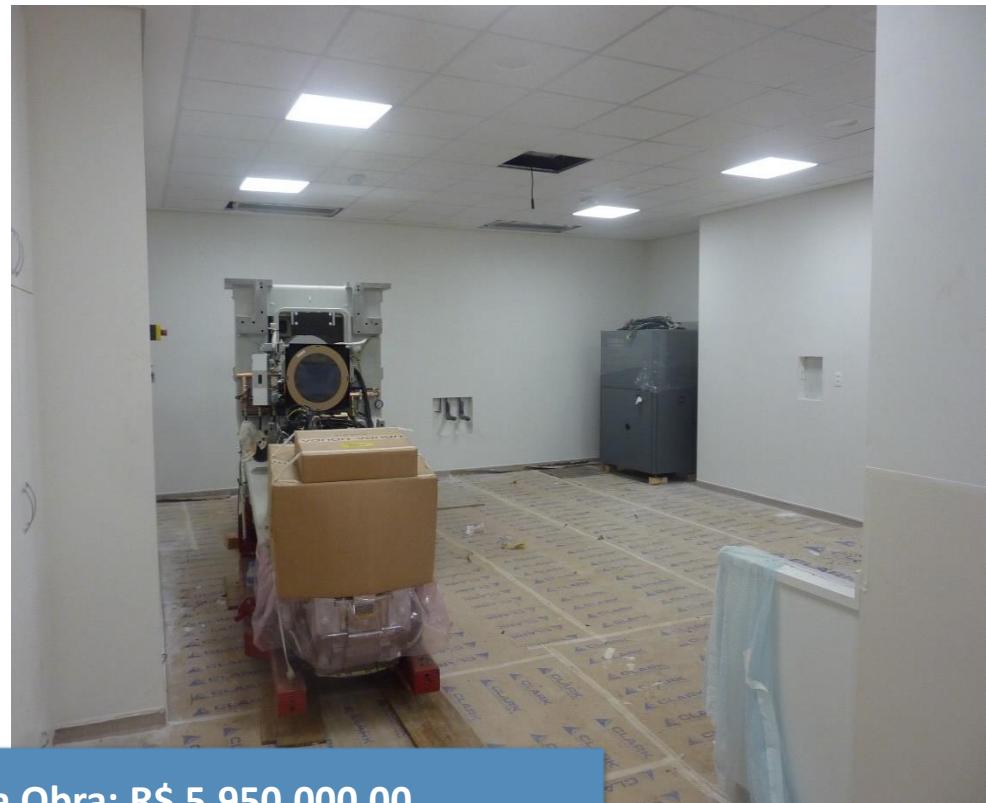

Valor da Obra: R\$ 5.950.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 90.683,51

Valor Fiscalização: R\$ 314.405,97

Valor da Solução: R\$ 8.709.591,06

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	09/02/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/11/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 92%; background-color: #ffcc00; height: 10px;"></div>	92%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Dez. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Obras em execução




Valor da Obra: R\$ 5.556.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43
Valor Projeto: R\$ 76.984,53
Valor Fiscalização: R\$ 340.122,55
Valor da Solução: R\$ 8.430.443,49

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	28/02/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	21/11/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 93%; background-color: #fca; height: 10px;"></div>	93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #fca; height: 10px;"></div>	15/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00; height: 10px;"></div>	Jan. 2021

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato suspenso por deliberação do Comitê Gestor – COVID-19

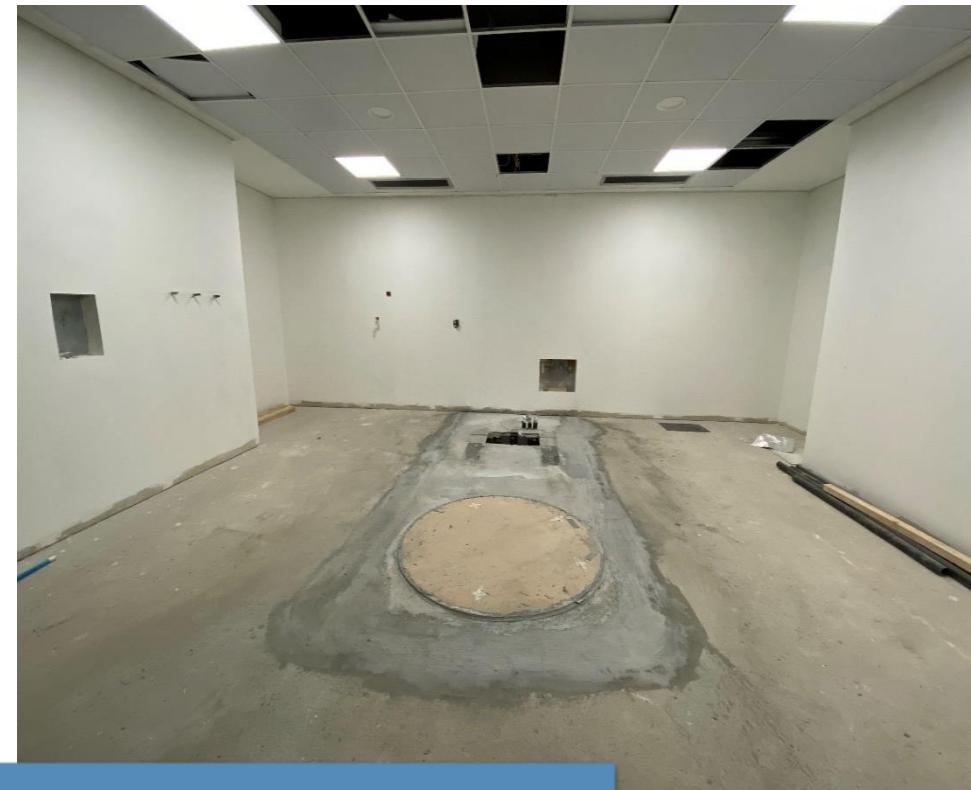

Valor da Obra: R\$ 5.634.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23

Valor Fiscalização: R\$ 306.939,86

Valor da Solução: R\$ 8.483.403,19

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	04/04/2019
OBRA CIVIL	<div style="width: 94%; background-color: #fca; height: 15px;"></div>	94%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #fca; height: 15px;"></div>	15/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00; height: 15px;"></div>	Jan. 2021

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Obras em execução



Valor da Obra: R\$ 6.705.471,97

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 92.214,19

Valor Fiscalização: R\$ 272.927,61

Valor da Solução: R\$ 10.143.985,20

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	27/09/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	17/12/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 78%; background-color: #ffcc00; height: 10px;"></div>	78%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	07/0/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	15/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Fev. 2021

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato suspenso por deliberação do Comitê Gestor – COVID-19



Valor da Obra: R\$ 7.240.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41

Valor Projeto: R\$ 80.055,13

Valor Fiscalização: R\$ 277.075,44

Valor da Solução: R\$ 10.088.348,98

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
PROJETO BÁSICO		15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO		26/11/2019
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		01/07/2020
OBRA CIVIL		8%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Mai. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Ago. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obras em execução



Valor da Obra: R\$ 5.714.883,22

Valor Equipamento: R\$ 2.347.173,90

Valor Projeto: R\$ 60.982,58

Valor Fiscalização: R\$ 85.377,60

Valor da Solução: R\$ 8.208.417,30

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	24/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	26/11/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 66%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	66%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando atualização da planilha SINAPI
Para instrução de novo processo licitatório.



Valor Executado Obra: R\$ 3.353.175,97

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.021,93


Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	08/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e7131; height: 10px;"></div>	14/07/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 46%; background-color: #c0392b; height: 10px;"></div>	46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c0392b; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c0392b; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c0392b; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando atualização da planilha SINAPI
Para instrução de novo processo licitatório.

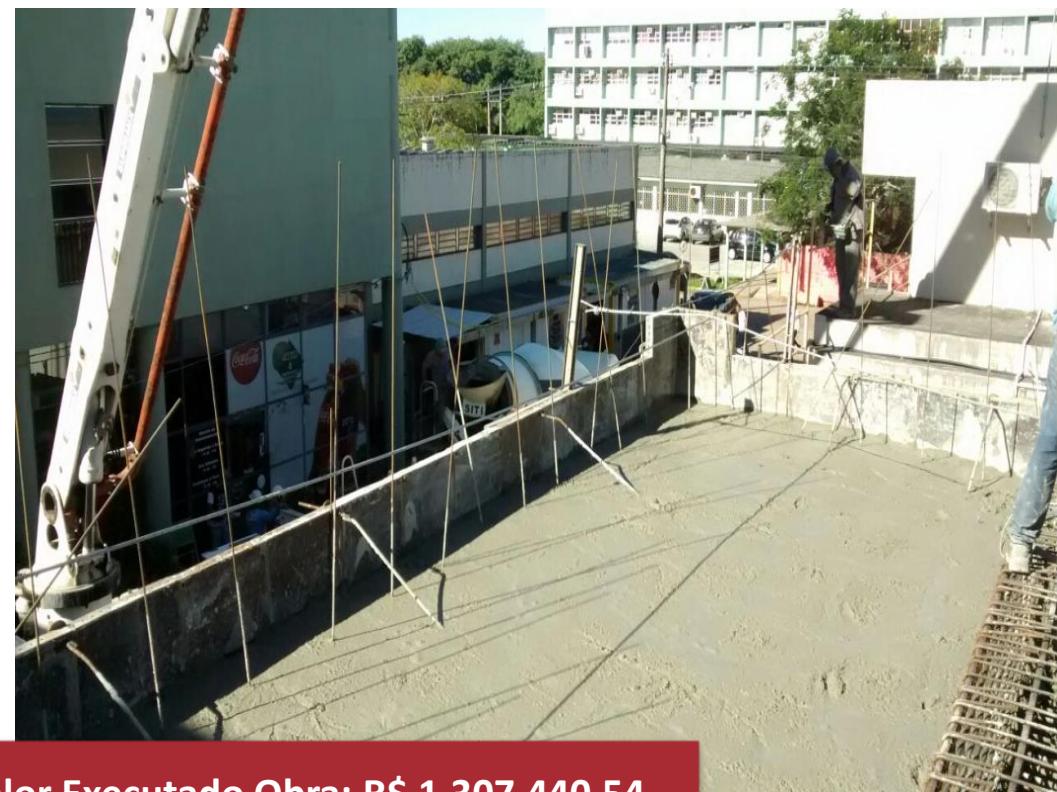

Valor Executado Obra: R\$ 1.307.440,54

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 138.891,93

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	18/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	21/06/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 45%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 3.459.283,16

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 91.026,10

Valor Fiscalização: R\$ 139.828,82

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f1c; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f1c; height: 10px;"></div>	21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f1c; height: 10px;"></div>	19/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f1c; height: 10px;"></div>	01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f1c; height: 10px;"></div>	18/07/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 44%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	44%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.831.284,83

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 87.339,73


Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	15/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	16/07/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 43%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	43%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

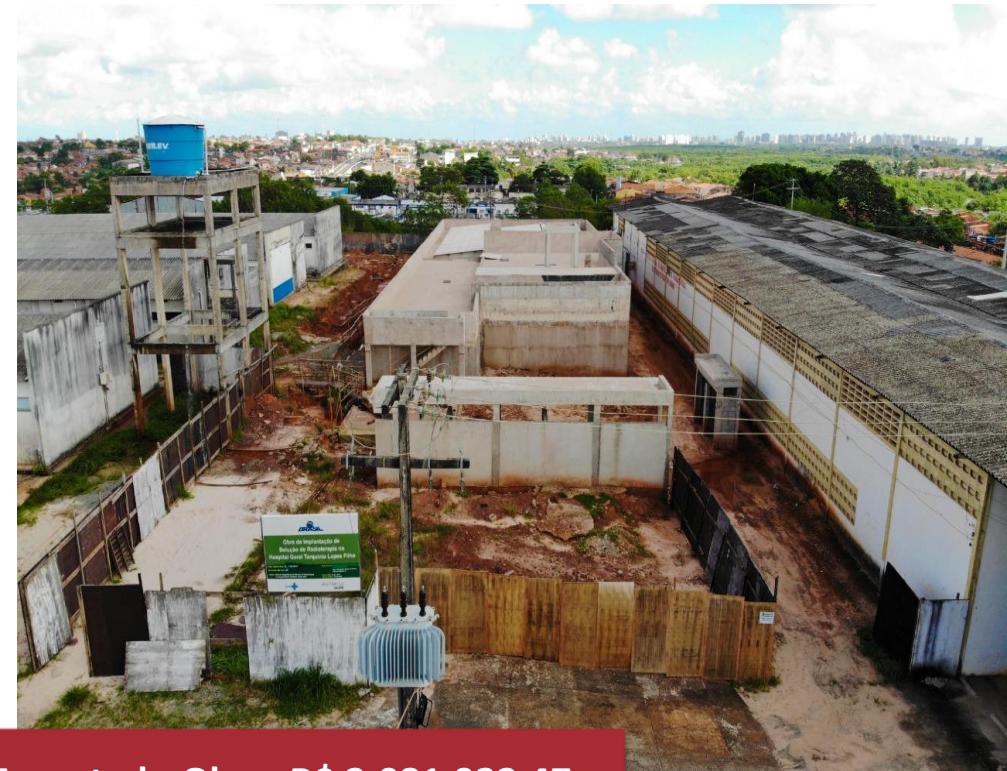

Valor Executado Obra: R\$ 2.081.932,47

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.433,76

Valor Fiscalização: R\$ 168.965,45

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	08/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/08/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 35%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 2.291.463,61

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 94.678,25

Valor Fiscalização: R\$ 147.939,49

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	24/08/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	23/07/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 32%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.760.465,01

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	21/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	12/07/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 26%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.531.358,73

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 72.385,08

Valor Fiscalização: R\$ 159.158,39

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	05/02/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	03/10/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 24%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	24%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.630.425,71

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 93.104,01

Valor Fiscalização: R\$ 137.431,63

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	19/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	02/08/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 22%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.716.352,06

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 90.253,80

Valor Fiscalização: R\$ 132.256,71

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	10/10/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/09/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 386.569,10

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 55.304,72

Valor Fiscalização: R\$ 75.451,11

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	10/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	17/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	06/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	10/01/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	21/01/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	10/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Set.2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Foto exemplo modelo

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	19/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	04/04/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Out.2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Foto exemplo modelo

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.
