

JULHO DE 2020

## PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS



- SOLUÇÕES CONCLUÍDAS
- OBRAS EM EXECUÇÃO
- AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
- PROCESSO EM LICITAÇÃO
- PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE
- PROJETO BÁSICO EM ELABORAÇÃO
- PROJETOS EM ESTUDO PRELIMINAR
- EQUIPAMENTOS TERMO ADITIVO

Obs. Das 30 soluções concluídas 02 são referentes ao aditivo de 20 equipamentos.



JULHO DE 2020

SOLUÇÃO CONCLUÍDA

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/FAP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
2	A Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
3	A Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
4	A Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
5	A Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
6	A Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
7	A Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
8	A Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
9	A Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
10	A Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
11	A Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
12	A Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
13	A Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
14	A Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
15	A Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO



JULHO DE 2020

## SOLUÇÃO CONCLUÍDA

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
18	A	Instituto do Câncer do Ceará/ICC - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
20	A	Hospital Ana Nery – Sta Cruz do Sul/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
21	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
22	-	Fundação Pio XII/RO - Rondônia	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
23	-	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo – Mogi das Cruzes/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM OPERAÇÃO
24	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM MANUTENÇÃO
25	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
26	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
27	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
29	A	Hospital do Câncer de Pernambuco – HCP Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
30	C	Hospital Marieta Konder/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO



JULHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## OBRAS EM EXECUÇÃO

TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1 C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
2 C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
3 C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	OBRA EM EXECUÇÃO
4 C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
5 A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	OBRA EM EXECUÇÃO
6 C	Hospital N. Sra da Conceição/Tubarão/SC	OBRA EM EXECUÇÃO
7 C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	OBRA EM EXECUÇÃO
8 C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
9 C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	OBRA EM EXECUÇÃO
10 C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	OBRA EM EXECUÇÃO
11 C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	OBRA EM EXECUÇÃO



JULHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Universitário Severino Sombra/Vassouras/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
2	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
3	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
4	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
5	C	Hospital Geral de Roraima/RR	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
6	C	Hospital Cura D'ars/ Sociedade Beneficente São Camilo/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
7	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
8	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO



JULHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
2	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
3	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
4	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
5	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
6	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária – Sinop/MT	EM PROCESSO LICITATÓRIO
7	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
8	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO

## PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	EM ANÁLISE
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE



JULHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE/ELABORAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE
2	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	EM ELABORAÇÃO
3	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Paríquera-açu/SP	EM ELABORAÇÃO
4	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	EM ELABORAÇÃO
5	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO
7	A	Hospital do Câncer III/INCA/RJ	EM ELABORAÇÃO

## PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
2	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí/PI	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
3	C	Hospital e Maternidade Marques Bastos/PI	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
4	C	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus/BA	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
5	C	Hospital Dom Thomás/PE	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
6	C	Hospital Geral de Palmas/TO	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR



JULHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR/PROJETO BÁSICO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
7	C	Hospital Maternidade São José/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
8	C	Hospital Rio Doce/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
9	C	Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
10	C	Hospital Regional Darcy Vargas/RJ	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
11	C	Hospital Nossa Senhora das Dores/MG	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
12	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
13	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
14	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
15			DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
16			DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR



JULHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA

INSTITUIÇÃO	STATUS
1 Fundação Pio XII/RO	CONCLUÍDO
2 Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo/SP	CONCLUÍDO
3 Fundação Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo Antônio/SC	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. EQUIPAMENTO/ INSTALAÇÃO
4 Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born/RS	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO VISITA TÉCNICA
5 Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO VISITA TÉCNICA
6 Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia/MG	ADEQUAÇÃO EM ANDAMENTO
7 Hospital Geral de Caxias do Sul/RS	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
8 Hospital de Juazeiro/BA	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
9 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
10 Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
11 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

JULHO DE 2020

**SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS****PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO**

INSTITUIÇÃO	STATUS
1 Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Hospital Dr. Luís Antonio/RN	OBRA CONCLUÍDA. EM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
2 Hospital do Câncer – Unidade I/INCA/RJ	OBRA EM ANDAMENTO. EQUIPAMENTO ENTREGUE NA OBRA
3 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	OBRA CONCLUÍDA. AGUARDANDO O EQUIPAMENTO
4 Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu/SP	OBRA EM ADEQUAÇÃO
5 Casa de Saúde Santa Marcelina/SP	OBRA EM CONCLUSÃO
6 Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge/GO	AGUARDA INÍCIO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CASAMATA
7 Hospital do Câncer – Unidade III/INCA/RJ	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
8 Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/AL	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
9 Hospital Dr. Hélio Angotti/MG	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	21/11/2014
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	12/05/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px; border-radius: 5px;"></div>	18/11/2016

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação

**Valor da Obra:** R\$ 2.471.731,37  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.105.091,19  
**Valor Projeto:** R\$ 17.461,61  
**Valor Fiscalização:** R\$ 116.208,40  
**Valor da Solução:** R\$ 4.710.492,57



**VOLTAR** 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	07/07/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	03/04/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação

**Valor da Obra:** R\$ 2.711.598,95  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.105.091,19  
**Valor Projeto:** R\$ 17.312,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 119.257,60  
**Valor da Solução:** R\$ 4.953.259,88



VOLTAR

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>14/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>03/09/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>11/02/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>07/07/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>09/12/2015</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>19/05/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>11/03/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>04/05/2017</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.

**Valor da Obra:** R\$ 2.446.257,75  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.416,63  
**Valor Projeto:** R\$ 15.958,20  
**Valor Fiscalização:** R\$ 74.197,20  
**Valor da Solução:** R\$ 4.504.829,77



**VOLTAR** 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	29/09/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 10px;"></div>	24/07/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.500.000,15  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.416,63  
**Valor Projeto:** R\$ 16.418,01  
**Valor Fiscalização:** R\$ 158.897,20  
**Valor da Solução:** R\$ 4.643.731,99

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO	05/01/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	18/10/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 1.975.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.873.353,69  
**Valor Projeto:** R\$ 15.341,00  
**Valor Fiscalização:** R\$ 107.399,60  
**Valor da Solução:** R\$ 3.971.094,29

VOLTAR 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	15/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	09/12/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	26/02/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.207.031,66

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>13/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>16/04/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>08/10/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>03/11/2015</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>16/06/2016</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>15/10/2016</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>09/09/2017</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 15px;"></div>	<b>29/05/2018</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.490.000,00

**Valor Equipamento:** R\$ 1.959.728,67

**Valor Projeto:** R\$ 15.836,87

**Valor Fiscalização:** R\$ 113.836,80

**Valor da Solução:** R\$ 4.579.402,34

**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO	07/10/2015
LICITAÇÃO	24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	09/06/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	22/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 3.016.412,25  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04  
**Valor Projeto:** R\$ 20.499,22  
**Valor Fiscalização:** R\$ 127.173,81  
**Valor da Solução:** R\$ 5.182.878,32

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO	15/05/2015
LICITAÇÃO	16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	27/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	20/05/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.400.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.943.140,88  
**Valor Projeto:** R\$ 19.532,11  
**Valor Fiscalização:** R\$ 76.568,80  
**Valor da Solução:** R\$ 4.439.241,79

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	04/08/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	30/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.660.031,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 16.553,41  
**Valor Fiscalização:** R\$ 95.002,13  
**Valor da Solução:** R\$ 5.134.753,91

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	13/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	21/02/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.170.000,00

**Valor Equipamento:** R\$ 1.943.140,88

**Valor Projeto:** R\$ 17.123,12

**Valor Fiscalização:** R\$ 90.840,80

**Valor da Solução:** R\$ 4.221.104,80

VOLTAR



## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	07/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	07/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	14/06/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9b00; height: 15px;"></div>	21/03/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 3.020.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.901.730,65  
**Valor Projeto:** R\$ 17.765,81  
**Valor Fiscalização:** R\$ 119.062,64  
**Valor da Solução:** R\$ 5.058.559,11

**VOLTAR** 

**ADESÃO AO PLANO**

<b>EVOLUÇÃO</b>	
<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<b>12/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	<b>30/09/2016</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	<b>05/07/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>22/09/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<b>13/03/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<b>04/06/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<b>22/12/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<b>17/05/2019</b>

**LICENÇA OPERAÇÃO**

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.**Valor da Obra:** R\$ 2.359.800,00**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37**Valor Projeto:** R\$ 17.156,53**Valor Fiscalização:** R\$ 81.811,29**Valor da Solução:** R\$ 4.821.935,19**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO	26/02/2016
LICITAÇÃO	13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/09/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	29/04/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.455.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04  
**Valor Projeto:** R\$ 17.657,67  
**Valor Fiscalização:** R\$ 66.066,00  
**Valor da Solução:** R\$ 4.557.516,71

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	05/12/2017
LICITAÇÃO	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	11/06/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	19/11/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.580.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 17.023,78  
**Valor Fiscalização:** R\$ 123.902,74  
**Valor da Solução:** R\$ 5.084.093,89

VOLTAR 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	06/02/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	23/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.661.900,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.450.253,26  
**Valor Projeto:** R\$ 20.092,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 125.146,14  
**Valor da Solução:** R\$ 5.257.391,55

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	20/07/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	27/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	20/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.443.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 16.935,86  
**Valor Fiscalização:** R\$ 126.664,16  
**Valor da Solução:** R\$ 4.949.767,38

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>13/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>14/05/2015</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>08/10/2015</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>26/11/2015</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>02/06/2016</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>26/02/2018</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>31/10/2018</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>30/12/2019</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Valor da Obra:** R\$ 2.681.680,43**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04**Valor Projeto:** R\$ 19.908,40**Valor Fiscalização:** R\$ 218.136,67**Valor da Solução:** R\$ 4.938.518,54**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	20/12/2017
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	07/11/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	16/06/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.475.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.390.464,05  
**Valor Projeto:** R\$ 75.308,66  
**Valor Fiscalização:** R\$ 233.937,95  
**Valor da Solução:** R\$ 8.174.710,66

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	05/07/2017
LICITAÇÃO	26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	23/01/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	18/05/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.649.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 19.601,56  
**Valor Fiscalização:** R\$ 108.848,79  
**Valor da Solução:** R\$ 5.140.617,72

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	06/06/2017
LICITAÇÃO	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	05/07/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	14/07/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.500.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.225.725,70  
**Valor Projeto:** R\$ 16.155,13  
**Valor Fiscalização:** R\$ 110.968,71  
**Valor da Solução:** R\$ 4.852.849,55

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	16/10/2017
LICITAÇÃO	27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	07/01/2019
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Ago. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.174.990,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.457.336,41  
**Valor Projeto:** R\$ 81.131,97  
**Valor Fiscalização:** R\$ 233.937,95  
**Valor da Solução:** R\$ 8.947.396,33

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>09/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>18/09/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>17/01/2018</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>15/03/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>13/08/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>30/04/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>10/01/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	<b>Ago. 2020</b>



- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Valor da Obra:** R\$ 4.680.000,00**Valor Equipamento:** R\$ 2.254.936,06**Valor Projeto:** R\$ 81.720,06**Valor Fiscalização:** R\$ 354.225,19**Valor da Solução:** R\$ 7.370.881,32**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	19/09/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	Ago. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.783.832,82  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.163.225,28  
**Valor Projeto:** R\$ 18.100,78  
**Valor Fiscalização:** R\$ 149.379,24  
**Valor da Solução:** R\$ 5.114.538,12

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	22/06/2018
LICITAÇÃO	04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO	14/12/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Set./2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.373.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.451.438,10  
**Valor Projeto:** R\$ 16.698,47  
**Valor Fiscalização:** R\$ 132.098,70  
**Valor da Solução:** R\$ 4.973.235,27

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO	26/02/2016
LICITAÇÃO	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	24/10/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.384.564,60  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.239.114,41  
**Valor Projeto:** R\$ 17.595,25  
**Valor Fiscalização:** R\$ 190.187,70  
**Valor da Solução:** R\$ 4.831.461,96

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	27/12/2017
LICITAÇÃO	27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	22/10/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.725.500,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.457.336,41  
**Valor Projeto:** R\$ 98.934,69  
**Valor Fiscalização:** R\$ 291.178,09  
**Valor da Solução:** R\$ 9.572.949,19

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>16/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>24/11/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>14/06/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>19/12/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>16/04/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>07/08/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>02/03/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	<b>Set. 2020</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Valor da Obra:** R\$ 2.796.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.515.123,36  
**Valor Projeto:** R\$ 19.033,61  
**Valor Fiscalização:** R\$ 165.557,91  
**Valor da Solução:** R\$ 5.495.714,88

**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	26/01/2018
LICITAÇÃO	20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	18/10/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Set. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.374.500,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.889.538,30  
**Valor Projeto:** R\$ 96.871,71  
**Valor Fiscalização:** R\$ 310.258,13  
**Valor da Solução:** R\$ 9.671.168,14

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>20/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>22/01/2015</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>19/03/2015</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>17/01/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>06/07/2017</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>26/02/2018</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>16/08/2018</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>Out. 2020</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Valor da Obra:** R\$ 2.757.000,00**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04**Valor Projeto:** R\$ 17.549,53**Valor Fiscalização:** R\$ 130.982,60**Valor da Solução:** R\$ 4.924.325,17**VOLTAR**

### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	22/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	10/09/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 97%; background-color: #ffc107; height: 10px;"></div>	97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	Out. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.557.500,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.354.501,58  
**Valor Projeto:** R\$ 104.934,83  
**Valor Fiscalização:** R\$ 306.110,30  
**Valor da Solução:** R\$ 9.323.046,71

VOLTAR 

<b>EVOLUÇÃO</b>	
<b>ADESÃO AO PLANO</b>	 <b>12/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	 <b>06/11/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	 <b>15/01/2018</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	 <b>01/03/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	 <b>12/12/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	 <b>99%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	 <b>20/01/2020</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	 <b>15/07/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	 <b>Out. 2020</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Valor da Obra:** R\$ 6.100.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 78.443,83  
**Valor Fiscalização:** R\$ 275.416,31  
**Valor da Solução:** R\$ 9.076.432,38

**VOLTAR**

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	07/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	15/10/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 93%; background-color: #ffc107; height: 10px;"></div>	93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	Nov. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.950.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.354.501,58  
**Valor Projeto:** R\$ 90.683,51  
**Valor Fiscalização:** R\$ 314.405,97  
**Valor da Solução:** R\$ 8.709.591,06

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	09/02/2018
LICITAÇÃO	12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	06/11/2018
OBRA CIVIL	89%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Dez. 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.556.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.457.336,41  
**Valor Projeto:** R\$ 76.984,53  
**Valor Fiscalização:** R\$ 340.122,55  
**Valor da Solução:** R\$ 8.430.443,49

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>13/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>27/11/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>28/02/2018</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>16/05/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>21/11/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>93%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>07/08/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>15/07/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>Jan. 2021</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.634.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.459.714,10  
**Valor Projeto:** R\$ 82.749,23  
**Valor Fiscalização:** R\$ 306.939,86  
**Valor da Solução:** R\$ 8.483.403,19

**VOLTAR**

<b>EVOLUÇÃO</b>	
<b>ADESÃO AO PLANO</b>	 <b>30/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	 <b>13/09/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	 <b>19/12/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	 <b>27/04/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	 <b>04/04/2019</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	 <b>86%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	 <b>31/01/2020</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	 <b>15/08/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	 <b>Jan. 2021</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.705.471,97  
**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43  
**Valor Projeto:** R\$ 92.214,19  
**Valor Fiscalização:** R\$ 272.927,61  
**Valor da Solução:** R\$ 10.143.985,20

**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	27/09/2017
LICITAÇÃO	16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	17/12/2018
OBRA CIVIL	78%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Fev. 2021

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 7.240.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.491.218,41  
**Valor Projeto:** R\$ 80.055,13  
**Valor Fiscalização:** R\$ 277.075,44  
**Valor da Solução:** R\$ 10.088.348,98

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	24/01/2018
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	26/11/2018
OBRA CIVIL	66%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--


- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.




**Valor da Obra:** R\$ 6.700.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.889.538,30  
**Valor Projeto:** R\$ 95.021,93  
**Valor Fiscalização:** R\$ 324.360,78  
**Valor da Solução:** R\$ 10.008.921,01

VOLTAR 

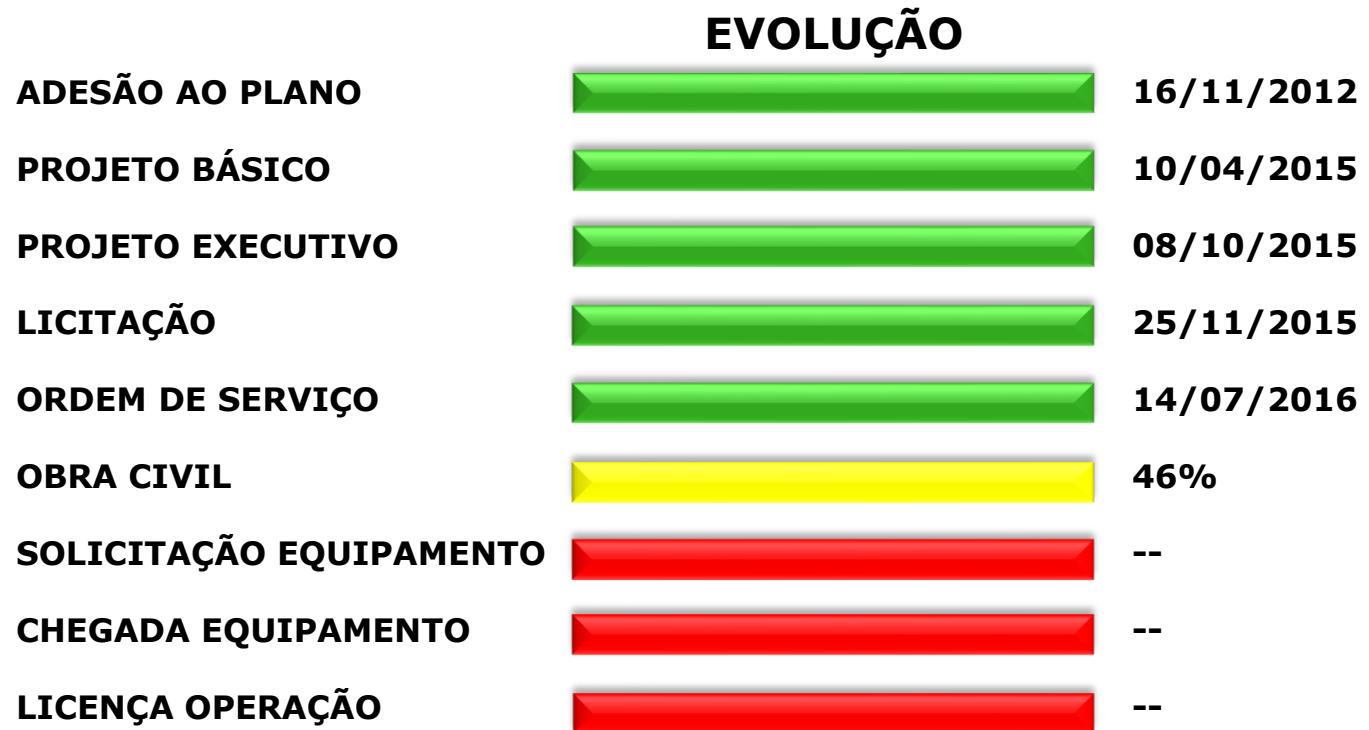

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.

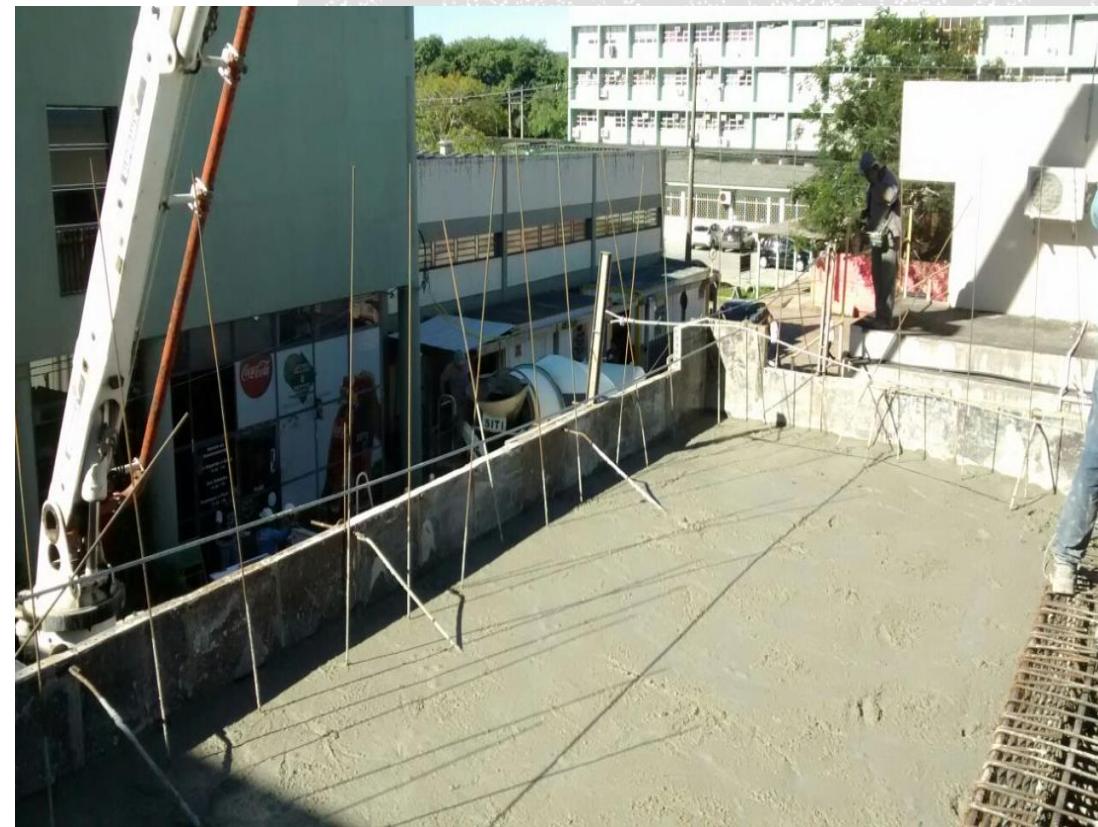

**Valor da Obra:** R\$ 3.373.673,75  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.613.938,83  
**Valor Projeto:** R\$ 17.566,24  
**Valor Fiscalização:** R\$ 138.891,93  
**Valor da Solução:** R\$ 6.144.070,75

VOLTAR 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	18/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	21/06/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 45%; background-color: #ffc107; height: 10px;"></div>	45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 8.730.809,92

**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43

**Valor Projeto:** R\$ 91.026,10

**Valor Fiscalização:** R\$ 299.473,76

**Valor da Solução:** R\$ 12.194.681,21

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>12/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>21/08/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>19/12/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>01/03/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>18/07/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>44%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>--</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>--</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>--</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.531.242,45  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 87.339,73  
**Valor Fiscalização:** R\$ 312.746,83  
**Valor da Solução:** R\$ 9.553.901,24


**VOLTAR** 

### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>19/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>31/08/2017</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>15/01/2018</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>28/02/2018</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>16/07/2018</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 43%; background-color: #ffc107; height: 10px;"></div>	<b>43%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	<b>--</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	<b>--</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #dc3545; height: 10px;"></div>	<b>--</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.

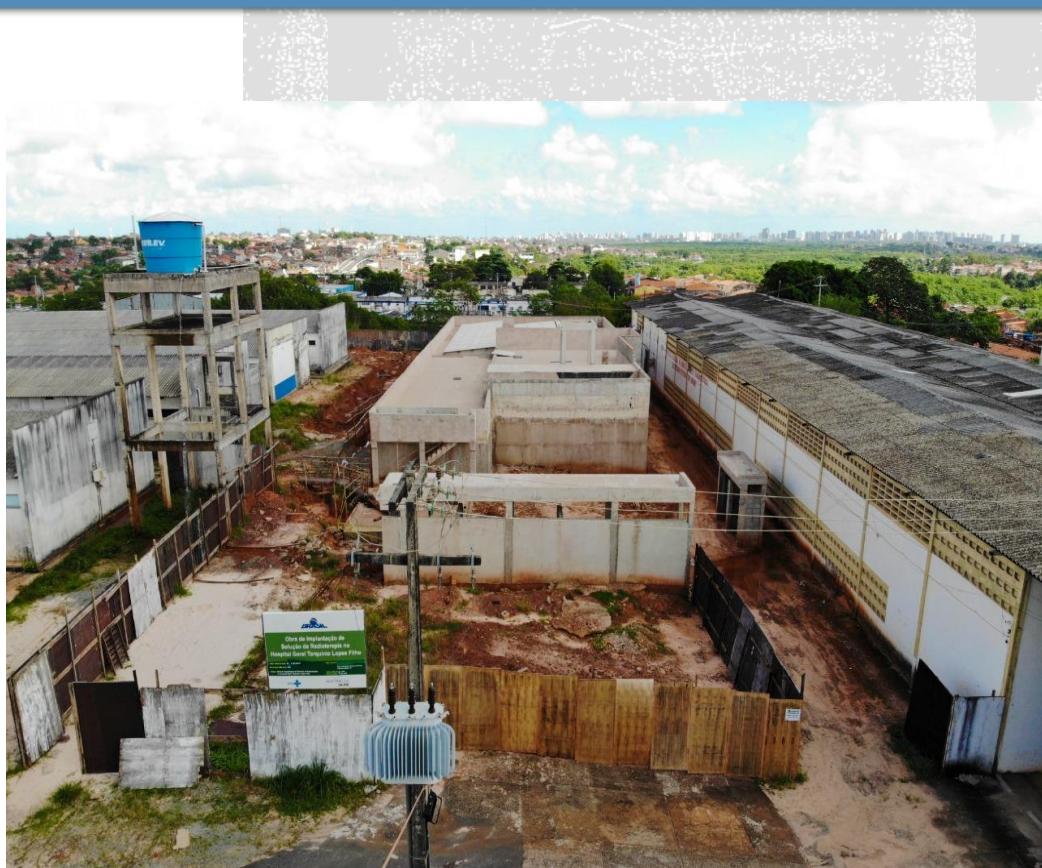

**Valor da Obra:** R\$ 7.647.833,80

**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43

**Valor Projeto:** R\$ 95.433,76

**Valor Fiscalização:** R\$ 315.235,54

**Valor da Solução:** R\$ 11.131.874,53

**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO	08/01/2018
LICITAÇÃO	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	23/08/2018
OBRA CIVIL	35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--


- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 8.472.498,69  
**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43  
**Valor Projeto:** R\$ 94.678,25  
**Valor Fiscalização:** R\$ 342.611,25  
**Valor da Solução:** R\$ 11.983.159,62

VOLTAR 

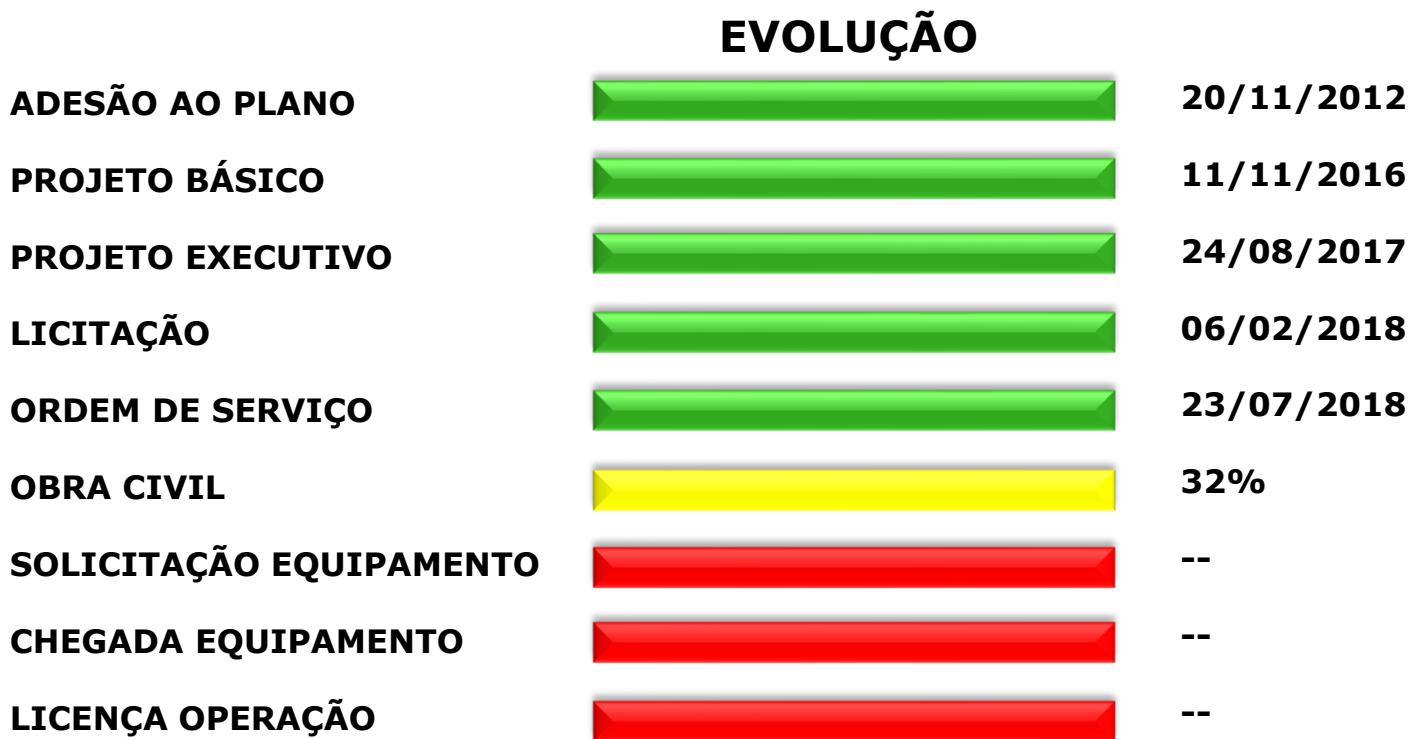

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.629.748,29  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 61.386,10  
**Valor Fiscalização:** R\$ 310.258,13  
**Valor da Solução:** R\$ 9.623.964,75

**VOLTAR** 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	21/12/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	12/07/2018
OBRA CIVIL	26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.831.358,73  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 72.385,08  
**Valor Fiscalização:** R\$ 350.906,93  
**Valor da Solução:** R\$ 9.877.222,97

**VOLTAR**

**ADESÃO AO PLANO****EVOLUÇÃO****PROJETO BÁSICO****PROJETO EXECUTIVO****LICITAÇÃO****ORDEM DE SERVIÇO****OBRA CIVIL****SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO****CHEGADA EQUIPAMENTO****LICENÇA OPERAÇÃO**

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.**Valor da Obra: R\$ 8.873.467,49****Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43****Valor Projeto: R\$ 93.104,01****Valor Fiscalização: R\$ 319.383,37****Valor da Solução: R\$ 12.359.326,30****VOLTAR**

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		02/08/2018
OBRA CIVIL		22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 8.319.861,69  
**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43  
**Valor Projeto:** R\$ 90.253,80  
**Valor Fiscalização:** R\$ 355.884,33  
**Valor da Solução:** R\$ 11.839.371,25

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	10/10/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	04/09/2018
OBRA CIVIL	13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 7.096.762,90  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 55.304,72  
**Valor Fiscalização:** R\$ 275.416,31  
**Valor da Solução:** R\$ 10.050.056,16

**VOLTAR** 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
PROJETO BÁSICO		15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO		26/11/2019
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		01/07/2020
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Mai. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Ago. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.714.883,22  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.347.173,90  
**Valor Projeto:** R\$ 60.982,58  
**Valor Fiscalização:** R\$ 85.377,60  
**Valor da Solução:** R\$ 8.208.417,30

VOLTAR



## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>10/04/2019</b>
<b>OBRA DE ADEQUAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>17/05/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>06/10/2019</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	<b>10/01/2020</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do [Sexto Termo Aditivo – Modalidade Casamata Vazia](#) do Contrato 134/2013.

**Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04**



VOLTAR

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #28a745; height: 10px;"></div>	21/01/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do [Sexto Termo Aditivo – Modalidade Casamata Vazia](#) do Contrato 134/2013.



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

VOLTAR

