

## PANORAMA DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS





JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## SOLUÇÃO CONCLUÍDA

TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1 A	Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/FAP/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
2 A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
3 A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
4 A	Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
5 A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
6 A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
7 A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
8 A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
9 A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
10 A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
11 A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
12 A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
13 A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
14 A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
15 A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## SOLUÇÃO CONCLUÍDA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
16	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
17	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
18	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
19	A	Instituto do Câncer do Ceará/ICC - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
20	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
21	A	Hospital Ana Nery/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
22	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
23	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
24	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
25	-	Fundação Pio XII/RO	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
26	-	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
27	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA - COMISSIONAMENTO	
29	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA - COMISSIONAMENTO	



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	C	Hospital Marieta Konder/SC	OBRA EM EXECUÇÃO	
2	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
3	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
4	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	OBRA EM EXECUÇÃO	
5	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
6	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	OBRA EM EXECUÇÃO	
7	C	Hospital N. Sra da Conceição/Tubarão/SC	OBRA EM EXECUÇÃO	
8	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	OBRA EM EXECUÇÃO	
9	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
10	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	OBRA EM EXECUÇÃO	
11	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	OBRA EM EXECUÇÃO	



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
2	C	Hospital Universitário Severino Sombra/Vassouras/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
3	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
4	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
5	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
6	C	Hospital Geral de Roraima/RR	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	
7	C	Hospital Cura D'ars/ Sociedade Beneficente São Camilo/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO	



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
2	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
3	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
4	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
5	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
6	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
7	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária – Sinop/MT	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
8	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
9	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
10	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO	

## PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	EM ANÁLISE
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE/ELABORAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE
2	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	EM ELABORAÇÃO
3	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Paríquera-açu/SP	EM ELABORAÇÃO
4	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	EM ELABORAÇÃO
5	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO
7	A	Hospital do Câncer III/INCA/RJ	EM ELABORAÇÃO

## PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
2	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí/PI	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
3	C	Hospital e Maternidade Marques Bastos/PI	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
4	C	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus/BA	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
5	C	Hospital Dom Thomás/PE	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
6	C	Hospital Geral de Palmas/TO	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR/PROJETO BÁSICO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
6	C	Hospital Maternidade São José/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
7	C	Hospital Rio Doce/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
8	C	Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
9	C	Hospital Regional Darcy Vargas/RJ	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
10	C	Hospital Nossa Senhora das Dores/MG	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
11	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
12	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
13	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
14			AGUARDANDO INCLUSÃO PELO COMITE GESTOR
15			AGUARDANDO INCLUSÃO PELO COMITE GESTOR
16			AGUARDANDO INCLUSÃO PELO COMITE GESTOR



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA

	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	Fundação Pio XII/RO	CONCLUÍDO	<a href="#"></a>
2	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo/SP	CONCLUÍDO	<a href="#"></a>
3	Fundação Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo Antônio/SC	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. EQUIPAMENTO/ INSTALAÇÃO	
4	Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born/RS	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO VISITA TÉCNICA	
5	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO VISITA TÉCNICA	
6	Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia/MG	ADEQUAÇÃO EM ANDAMENTO	
7	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	
8	Hospital de Juazeiro/BA	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	
9	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	
10	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	
11	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO	



JUNHO DE 2020

## SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

## PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO

INSTITUIÇÃO	STATUS
1 Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Hospital Dr. Luís Antonio/RN	OBRA CONCLUÍDA. EM INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO
2 Hospital do Câncer – Unidade I/INCA/RJ	OBRA EM ANDAMENTO. EQUIPAMENTO ENTREGUE NA OBRA
3 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	OBRA CONCLUÍDA. AGUARDANDO O EQUIPAMENTO
4 Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu/SP	OBRA EM ADEQUAÇÃO
5 Casa de Saúde Santa Marcelina/SP	OBRA EM CONCLUSÃO
6 Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge/GO	AGUARDA INÍCIO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CASAMATA
7 Hospital do Câncer – Unidade III/INCA/RJ	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
8 Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/AL	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
9 Hospital Dr. Hélio Angotti/MG*	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

\*Entrou no PER-SUS por determinação do Comitê Gestor em 22/01/2020, substituindo o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

LEGENDA	
A	Ampliação
C	Construção

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>20/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>11/09/2014</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>21/11/2014</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>30/01/2015</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>12/05/2015</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>16/10/2015</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>23/09/2016</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>18/11/2016</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação

**Valor da Obra:** R\$ 2.471.731,37  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.105.091,19  
**Valor Projeto:** R\$ 17.461,61  
**Valor Fiscalização:** R\$ 116.208,40  
**Valor da Solução:** R\$ 4.710.492,57



VOLTAR 

**EVOLUÇÃO**

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>09/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>04/11/2014</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>11/02/2015</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>23/03/2015</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>07/07/2015</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>16/10/2015</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>23/09/2016</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 10px;"></div>	<b>03/04/2017</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação

**Valor da Obra:** R\$ 2.711.598,95  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.105.091,19  
**Valor Projeto:** R\$ 17.312,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 119.257,60  
**Valor da Solução:** R\$ 4.953.259,88



VOLTAR

**EVOLUÇÃO**

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>14/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>03/09/2014</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>11/02/2015</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>07/07/2015</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>09/12/2015</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>19/05/2016</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>11/03/2017</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>04/05/2017</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.

**Valor da Obra:** R\$ 2.446.257,75  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.416,63  
**Valor Projeto:** R\$ 15.958,20  
**Valor Fiscalização:** R\$ 74.197,20  
**Valor da Solução:** R\$ 4.504.829,77



VOLTAR

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	29/09/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	24/07/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.500.000,15  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.968.416,63  
**Valor Projeto:** R\$ 16.418,01  
**Valor Fiscalização:** R\$ 158.897,20  
**Valor da Solução:** R\$ 4.643.731,99

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO	05/01/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	18/10/2017

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 1.975.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.873.353,69  
**Valor Projeto:** R\$ 15.341,00  
**Valor Fiscalização:** R\$ 107.399,60  
**Valor da Solução:** R\$ 3.971.094,29

VOLTAR 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	15/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	09/12/2015
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	26/02/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.129.997,03  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.901.730,65  
**Valor Projeto:** R\$ 18.100,78  
**Valor Fiscalização:** R\$ 157.203,20  
**Valor da Solução:** R\$ 4.207.031,66

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	08/10/2015
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	16/06/2016
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	29/05/2018

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.490.000,00

**Valor Equipamento:** R\$ 1.959.728,67

**Valor Projeto:** R\$ 15.836,87

**Valor Fiscalização:** R\$ 113.836,80

**Valor da Solução:** R\$ 4.579.402,34

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO	07/10/2015
LICITAÇÃO	24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	09/06/2016
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	22/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 3.016.412,25  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04  
**Valor Projeto:** R\$ 20.499,22  
**Valor Fiscalização:** R\$ 127.173,81  
**Valor da Solução:** R\$ 5.182.878,32

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO	15/05/2015
LICITAÇÃO	16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	27/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	20/05/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.400.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.943.140,88  
**Valor Projeto:** R\$ 19.532,11  
**Valor Fiscalização:** R\$ 76.568,80  
**Valor da Solução:** R\$ 4.439.241,79

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	04/08/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	30/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.660.031,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 16.553,41  
**Valor Fiscalização:** R\$ 95.002,13  
**Valor da Solução:** R\$ 5.134.753,91

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	13/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	21/02/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.170.000,00

**Valor Equipamento:** R\$ 1.943.140,88

**Valor Projeto:** R\$ 17.123,12

**Valor Fiscalização:** R\$ 90.840,80

**Valor da Solução:** R\$ 4.221.104,80

VOLTAR



## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>07/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>19/12/2014</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>07/10/2015</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>03/11/2015</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>14/06/2016</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>100%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>12/10/2016</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>25/09/2017</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 15px;"></div>	<b>21/03/2018</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 3.020.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 1.901.730,65  
**Valor Projeto:** R\$ 17.765,81  
**Valor Fiscalização:** R\$ 119.062,64  
**Valor da Solução:** R\$ 5.058.559,11

VOLTAR 

**ADESÃO AO PLANO****PROJETO BÁSICO****PROJETO EXECUTIVO****LICITAÇÃO****ORDEM DE SERVIÇO****OBRA CIVIL****SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO****CHEGADA EQUIPAMENTO****LICENÇA OPERAÇÃO** Concluído Em andamento Não iniciado**Obs.** Solução entregue e em operação.

## EVOLUÇÃO

**12/11/2012****30/09/2016****05/07/2017****22/09/2017****13/03/2018****100%****04/06/2018****22/12/2018****17/05/2019****Valor da Obra:** R\$ 2.359.800,00**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37**Valor Projeto:** R\$ 17.156,53**Valor Fiscalização:** R\$ 81.811,29**Valor da Solução:** R\$ 4.821.935,19**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO	26/02/2016
LICITAÇÃO	13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	26/09/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	29/04/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.455.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04  
**Valor Projeto:** R\$ 17.657,67  
**Valor Fiscalização:** R\$ 66.066,00  
**Valor da Solução:** R\$ 4.557.516,71

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	05/12/2017
LICITAÇÃO	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	11/06/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	19/11/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Solução entregue e em operação.



**Valor da Obra:** R\$ 2.580.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 17.023,78  
**Valor Fiscalização:** R\$ 123.902,74  
**Valor da Solução:** R\$ 5.084.093,89

VOLTAR

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	06/02/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	23/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.661.900,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.450.253,26  
**Valor Projeto:** R\$ 20.092,15  
**Valor Fiscalização:** R\$ 125.146,14  
**Valor da Solução:** R\$ 5.257.391,55

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	20/07/2017
LICITAÇÃO	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	27/03/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	20/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.443.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 16.935,86  
**Valor Fiscalização:** R\$ 126.664,16  
**Valor da Solução:** R\$ 4.949.767,38

VOLTAR

**EVOLUÇÃO**

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>13/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>14/05/2015</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>08/10/2015</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>26/11/2015</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>02/06/2016</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>100%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>26/02/2018</b>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>31/10/2018</b>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f3b; height: 15px;"></div>	<b>30/12/2019</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.681.680,43  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04  
**Valor Projeto:** R\$ 19.908,40  
**Valor Fiscalização:** R\$ 218.136,67  
**Valor da Solução:** R\$ 4.938.518,54

**VOLTAR** 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	20/12/2017
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	07/11/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	16/06/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.475.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.390.464,05  
**Valor Projeto:** R\$ 75.308,66  
**Valor Fiscalização:** R\$ 233.937,95  
**Valor da Solução:** R\$ 8.174.710,66

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	05/07/2017
LICITAÇÃO	26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	23/01/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	18/05/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.649.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.363.167,37  
**Valor Projeto:** R\$ 19.601,56  
**Valor Fiscalização:** R\$ 108.848,79  
**Valor da Solução:** R\$ 5.140.617,72

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	06/06/2017
LICITAÇÃO	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	05/07/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	Julho 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.500.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.225.725,70  
**Valor Projeto:** R\$ 16.155,13  
**Valor Fiscalização:** R\$ 110.968,71  
**Valor da Solução:** R\$ 4.852.849,55

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	16/10/2017
LICITAÇÃO	27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	07/01/2019
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Julho 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.174.990,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.457.336,41  
**Valor Projeto:** R\$ 81.131,97  
**Valor Fiscalização:** R\$ 233.937,95  
**Valor da Solução:** R\$ 8.947.396,33

VOLTAR

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>09/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>18/09/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>17/01/2018</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>15/03/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>13/08/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		<b>30/04/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		<b>10/01/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		<b>Julho 2020</b>

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Valor da Obra:** R\$ 4.680.000,00**Valor Equipamento:** R\$ 2.254.936,06**Valor Projeto:** R\$ 81.720,06**Valor Fiscalização:** R\$ 354.225,19**Valor da Solução:** R\$ 7.370.881,32**VOLTAR** 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	27/12/2017
LICITAÇÃO	27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	22/10/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	Setembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.725.500,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.457.336,41  
**Valor Projeto:** R\$ 98.934,69  
**Valor Fiscalização:** R\$ 291.178,09  
**Valor da Solução:** R\$ 9.572.949,19

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	11/02/2015
LICITAÇÃO	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	19/09/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	Agosto 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.783.832,82  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.163.225,28  
**Valor Projeto:** R\$ 18.100,78  
**Valor Fiscalização:** R\$ 149.379,24  
**Valor da Solução:** R\$ 5.114.538,12

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	22/06/2018
LICITAÇÃO	04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO	14/12/2018
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Agosto/2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.373.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.451.438,10  
**Valor Projeto:** R\$ 16.698,47  
**Valor Fiscalização:** R\$ 132.098,70  
**Valor da Solução:** R\$ 4.973.235,27

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO	26/02/2016
LICITAÇÃO	01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO	24/10/2017
OBRA CIVIL	99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	Agosto 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.384.564,60  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.239.114,41  
**Valor Projeto:** R\$ 17.595,25  
**Valor Fiscalização:** R\$ 190.187,70  
**Valor da Solução:** R\$ 4.831.461,96

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO	19/03/2015
LICITAÇÃO	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	06/07/2017
OBRA CIVIL	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	Setembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.757.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04  
**Valor Projeto:** R\$ 17.549,53  
**Valor Fiscalização:** R\$ 130.982,60  
**Valor da Solução:** R\$ 4.924.325,17

VOLTAR



**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>16/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>24/11/2014</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>14/06/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>19/12/2017</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>16/04/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>07/08/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>02/03/2020</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	<b>Setembro 2020</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 2.796.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.515.123,36  
**Valor Projeto:** R\$ 19.033,61  
**Valor Fiscalização:** R\$ 165.557,91  
**Valor da Solução:** R\$ 5.495.714,88

**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	26/01/2018
LICITAÇÃO	20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	18/10/2018
OBRA CIVIL	99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Setembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.374.500,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.889.538,30  
**Valor Projeto:** R\$ 96.871,71  
**Valor Fiscalização:** R\$ 310.258,13  
**Valor da Solução:** R\$ 9.671.168,14

VOLTAR



### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	22/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	10/09/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 97%; background-color: #ffd700; height: 15px;"></div>	97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 15px;"></div>	Setembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.557.500,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.354.501,58  
**Valor Projeto:** R\$ 104.934,83  
**Valor Fiscalização:** R\$ 306.110,30  
**Valor da Solução:** R\$ 9.323.046,71

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	15/01/2018
LICITAÇÃO	01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	12/12/2018
OBRA CIVIL	98%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Outubro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.100.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 78.443,83  
**Valor Fiscalização:** R\$ 275.416,31  
**Valor da Solução:** R\$ 9.076.432,38

VOLTAR 

## EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/12/2017
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	15/10/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 93%; background-color: #ffd700; height: 10px;"></div>	93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>	Novembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.950.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.354.501,58  
**Valor Projeto:** R\$ 90.683,51  
**Valor Fiscalização:** R\$ 314.405,97  
**Valor da Solução:** R\$ 8.709.591,06

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	28/02/2018
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	21/11/2018
OBRA CIVIL	93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Dezembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.634.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.459.714,10  
**Valor Projeto:** R\$ 82.749,23  
**Valor Fiscalização:** R\$ 306.939,86  
**Valor da Solução:** R\$ 8.483.403,19

VOLTAR



EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	09/02/2018
LICITAÇÃO	12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	06/11/2018
OBRA CIVIL	87%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Dezembro 2020

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 5.556.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.457.336,41  
**Valor Projeto:** R\$ 76.984,53  
**Valor Fiscalização:** R\$ 340.122,55  
**Valor da Solução:** R\$ 8.430.443,49

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>
OBRA CIVIL	<div style="width: 80%; background-color: #ffd700; height: 10px;"></div>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 100%; background-color: #ffd700; height: 10px;"></div>
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #c00000; height: 10px;"></div>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 6.705.471,97  
**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43  
**Valor Projeto:** R\$ 92.214,19  
**Valor Fiscalização:** R\$ 272.927,61  
**Valor da Solução:** R\$ 10.143.985,20

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	27/09/2017
LICITAÇÃO	16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	17/12/2018
OBRA CIVIL	78%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	15/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	Janeiro 2021

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra:** R\$ 7.240.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.491.218,41  
**Valor Projeto:** R\$ 80.055,13  
**Valor Fiscalização:** R\$ 277.075,44  
**Valor da Solução:** R\$ 10.088.348,98

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	24/01/2018
LICITAÇÃO	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	26/11/2018
OBRA CIVIL	66%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Está em novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.700.000,00  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.889.538,30  
**Valor Projeto:** R\$ 95.021,93  
**Valor Fiscalização:** R\$ 324.360,78  
**Valor da Solução:** R\$ 10.008.921,01

VOLTAR 



- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Está em novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 3.373.673,75  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.613.938,83  
**Valor Projeto:** R\$ 17.566,24  
**Valor Fiscalização:** R\$ 138.891,93  
**Valor da Solução:** R\$ 6.144.070,75

VOLTAR 

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>16/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>26/09/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>18/12/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>06/02/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>21/06/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>45%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		--
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		--
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 8.730.809,92

**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43

**Valor Projeto:** R\$ 91.026,10

**Valor Fiscalização:** R\$ 299.473,76

**Valor da Solução:** R\$ 12.194.681,21

VOLTAR 

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>		<b>12/11/2012</b>
<b>PROJETO BÁSICO</b>		<b>21/08/2017</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO</b>		<b>19/12/2017</b>
<b>LICITAÇÃO</b>		<b>01/03/2018</b>
<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>18/07/2018</b>
<b>OBRA CIVIL</b>		<b>44%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>		--
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>		--
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.531.242,45  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 87.339,73  
**Valor Fiscalização:** R\$ 312.746,83  
**Valor da Solução:** R\$ 9.553.901,24


**VOLTAR** 

### EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	<b>19/11/2012</b>
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	<b>31/08/2017</b>
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	<b>15/01/2018</b>
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	<b>28/02/2018</b>
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 15px;"></div>	<b>16/07/2018</b>
OBRA CIVIL	<div style="width: 43%; background-color: #ffd700; height: 15px;"></div>	<b>43%</b>
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000; height: 15px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000; height: 15px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000; height: 15px;"></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.

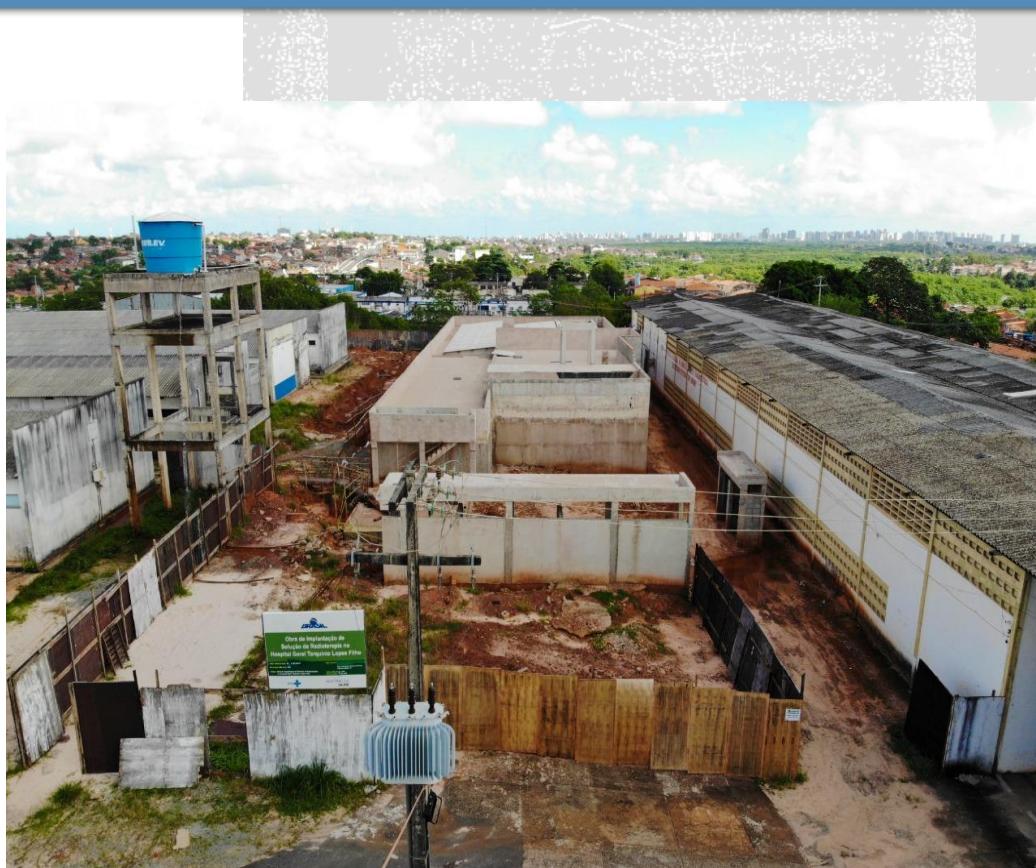

**Valor da Obra:** R\$ 7.647.833,80

**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43

**Valor Projeto:** R\$ 95.433,76

**Valor Fiscalização:** R\$ 315.235,54

**Valor da Solução:** R\$ 11.131.874,53

VOLTAR

EVOLUÇÃO		
ADESÃO AO PLANO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>	31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>	08/01/2018
LICITAÇÃO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div style="width: 100%; background-color: #2e8b57; height: 10px;"></div>	23/08/2018
OBRA CIVIL	<div style="width: 35%; background-color: #ffd700; height: 10px;"></div>	35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000; height: 10px;"></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000; height: 10px;"></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div style="width: 0%; background-color: #ff0000; height: 10px;"></div>	--


- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 8.472.498,69  
**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43  
**Valor Projeto:** R\$ 94.678,25  
**Valor Fiscalização:** R\$ 342.611,25  
**Valor da Solução:** R\$ 11.983.159,62

VOLTAR

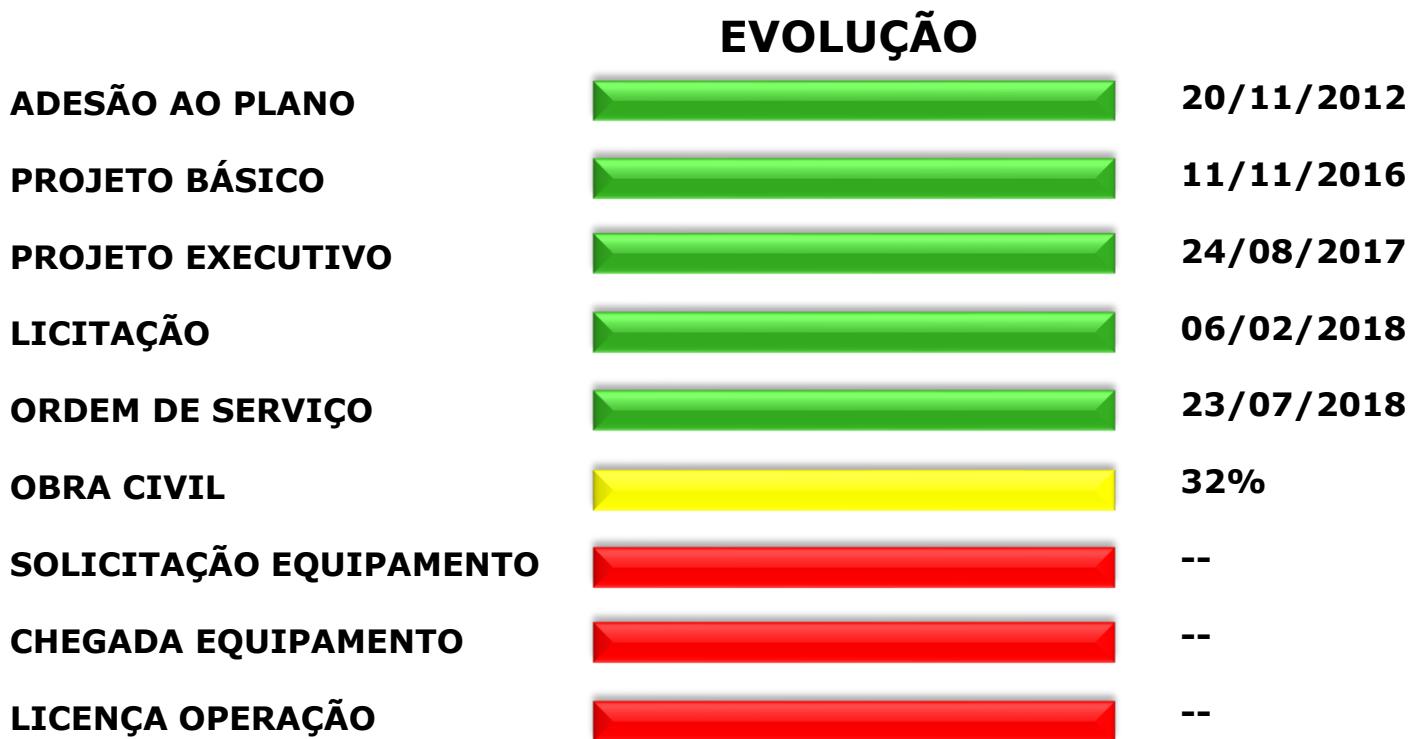

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.629.748,29  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 61.386,10  
**Valor Fiscalização:** R\$ 310.258,13  
**Valor da Solução:** R\$ 9.623.964,75

VOLTAR 

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	21/12/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	12/07/2018
OBRA CIVIL	26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 6.831.358,73  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 72.385,08  
**Valor Fiscalização:** R\$ 350.906,93  
**Valor da Solução:** R\$ 9.877.222,97

VOLTAR

**ADESÃO AO PLANO****EVOLUÇÃO****PROJETO BÁSICO****PROJETO EXECUTIVO****LICITAÇÃO****ORDEM DE SERVIÇO****OBRA CIVIL****SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO****CHEGADA EQUIPAMENTO****LICENÇA OPERAÇÃO**

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.**Valor da Obra:** R\$ 8.873.467,49**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43**Valor Projeto:** R\$ 93.104,01**Valor Fiscalização:** R\$ 319.383,37**Valor da Solução:** R\$ 12.359.326,30**VOLTAR**

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	19/12/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	02/08/2018
OBRA CIVIL	22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 8.319.861,69  
**Valor Equipamento:** R\$ 3.073.371,43  
**Valor Projeto:** R\$ 90.253,80  
**Valor Fiscalização:** R\$ 355.884,33  
**Valor da Solução:** R\$ 11.839.371,25

VOLTAR

EVOLUÇÃO	
ADESÃO AO PLANO	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	10/10/2017
LICITAÇÃO	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	04/09/2018
OBRA CIVIL	13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	--
LICENÇA OPERAÇÃO	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



**Valor da Obra:** R\$ 7.096.762,90  
**Valor Equipamento:** R\$ 2.622.572,23  
**Valor Projeto:** R\$ 55.304,72  
**Valor Fiscalização:** R\$ 275.416,31  
**Valor da Solução:** R\$ 10.050.056,16

VOLTAR

## EVOLUÇÃO

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>10/04/2019</b>
<b>OBRA DE ADEQUAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>17/05/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>06/10/2019</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>10/01/2020</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do [Sexto Termo Aditivo – Modalidade Casamata Vazia](#) do Contrato 134/2013.

**Valor Equipamento:** R\$ 2.018.793,04



VOLTAR

**EVOLUÇÃO**

<b>ADESÃO AO PLANO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>18/04/2019</b>
<b>OBRA DE ADEQUAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>100%</b>
<b>SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>25/09/2019</b>
<b>CHEGADA EQUIPAMENTO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>18/10/2019</b>
<b>LICENÇA OPERAÇÃO</b>	<div style="width: 100%; background-color: #2e9f00; height: 10px;"></div>	<b>21/01/2020</b>

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do [Sexto Termo Aditivo – Modalidade Casamata Vazia](#) do Contrato 134/2013.



**Valor Equipamento:** R\$ 2.335.182,90

VOLTAR

