



ATLAS

DNIT
Infraestrutura Aquaviária



Fevereiro | 2025

PRESIDENTE DO BRASIL

Luiz Inácio Lula da Silva

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –DNIT

Fabricio de Oliveira Galvão – Diretor Geral

Fabio Pessoa da Silva Nunes – Diretor de Infraestrutura Rodoviária

Luiz Guilherme Rodrigues de Mello – Diretor de Planejamento e Pesquisa

Marcos de Brito Campos Júnior – Diretor de Administração e Finanças

José Eduardo Guidi – Diretor de Infraestrutura Ferroviária

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

Edme Tavares de Albuquerque

COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS AQUAVIÁRIAS

Célio Henrique dos Reis Silva

COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES AQUAVIÁRIAS

André Martins de Araújo



SUMÁRIO

1. Intervenções Aquaviárias no Brasil

1. Bacias Hidrográficas
2. Construção e Recuperação
3. Operação
4. Manutenção
5. Sinalização
6. Estudos e Projetos

2. Intervenções Aquaviárias por Superintendência Regional¹

3. INDICADORES

4. GLOSSÁRIO

ANEXO

¹Superintendências Regionais classificadas em ordem alfabética.

Atlas de Infraestrutura Aquaviária

No dia 10 de Outubro de 2022, entrou em vigor o Decreto de nº 11.225, de 07 de Outubro de 2022, que altera Estrutura Regimental do DNIT. A partir disso, as intervenções aquaviárias foram divididas entre as superintendências regionais que correspondem à unidade federativa.

O atlas é composto por instrumentos contratuais ativos e paralisados com atuação dentro do Sistema Nacional de Viação – SNV (Lei federal 12.379 de 06 de janeiro de 2011), sob responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária – DAQ.

As tabelas e mapas presentes no Atlas são referentes aos dados do mês anterior, sendo atualizados sempre no dia 10 do mês da publicação.

Os instrumentos contratuais são referentes à execução de:

- obras de implantação e recuperação portuárias e aquaviárias;
- operação e manutenção de portos, hidrovias e eclusas;
- manutenção e sinalização das hidrovias;
- estudos e projetos em hidrovias e portos.

A estrutura do Atlas propõe a apresentação das intervenções aquaviárias, com base no tipo de atividade realizada:

- Construção e Recuperação;
- Operação;
- Manutenção;
- Sinalização;
- Estudos e Projetos.

MODAL DO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Principais Rios Fora da Jurisdição Nacional
- Rodovias Federais
- Ferrovias
- Superintendência Regional

Para acessar a tabela com os Rios do SNV e PNV, escaneie o QR Code ou acesse o link: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/atlas-e-mapas/pnv-e-snv/>



484 0 484 km

1:20.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



BACIAS HIDROGRÁFICAS

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Principais Rios Fora da Jurisdição Nacional
- Superintendência Regional

Bacias Hidrográficas

- AMAZÔNICA
- ATLÂNTICO LESTE
- ATLÂNTICO NORDESTE OCIDENTAL
- ATLÂNTICO NORDESTE ORIENTAL
- ATLÂNTICO SUDESTE
- ATLÂNTICO SUL
- PARAGUAI
- PARANÁ
- PARNAÍBA
- SÃO FRANCISCO
- TOCANTINS-ARAGUAIA
- URUGUAI




484 0 484 km

1:20.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



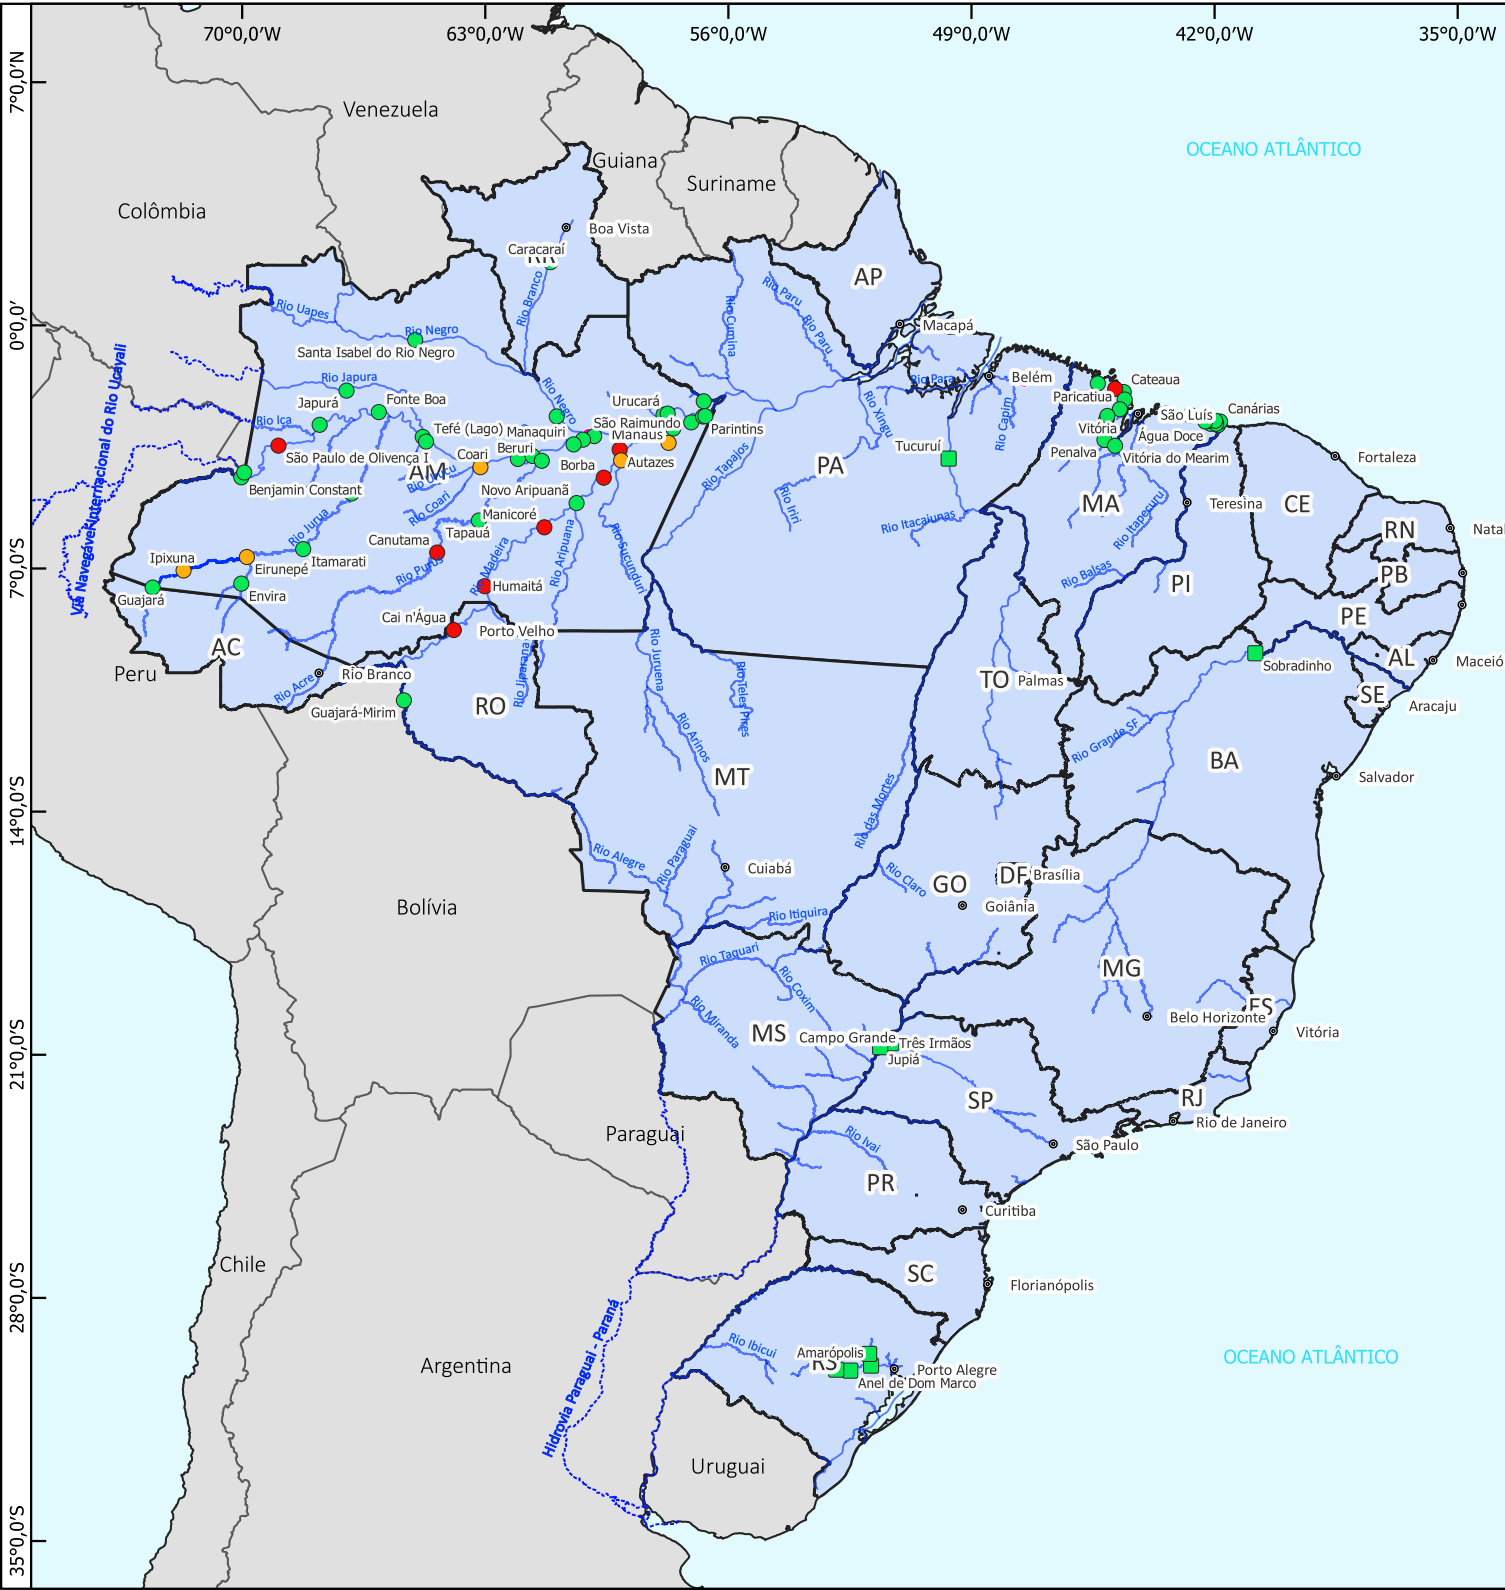

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Legenda:

- Capitais
- Hidroviás
- Principais Rios Fora da Jurisdição Nacional
- Eclusa em Operação
- Instalação Portuária em Operação
- Instalação Portuária em Operação Restrita
- Instalação Portuária Fora de Operação
- Instalação Portuária Delegada
- Superintendência Regional

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	61	77%
Instalações Portuárias Fora de Operação	12	15%
Instalações Portuárias em Operação Restrita	6	8%

Total **79** **100%**


Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	08	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-

Total **08** **100%**

DERROCAGEM, DRAGAGEM E DESTOCAMENTO

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Principais Rios Fora da Jurisdição Nacional
- Hidrovia do Rio Madeira - Dragagem
- Dragagem da Travessia do Rio Madeira - Humaitá/AM
- Hidrovia do Rio Tocantins - Derrocagem do Pedral do Lourenço
- Hidrovia do Rio Tietê - Derroc. do Canal de Nova Avanhandava
- Hidrovia do Rio Paraguai - Dragagem do Tramo Norte
- Hidrovia do Rio Taquari - Dragagem
- Superintendência Regional

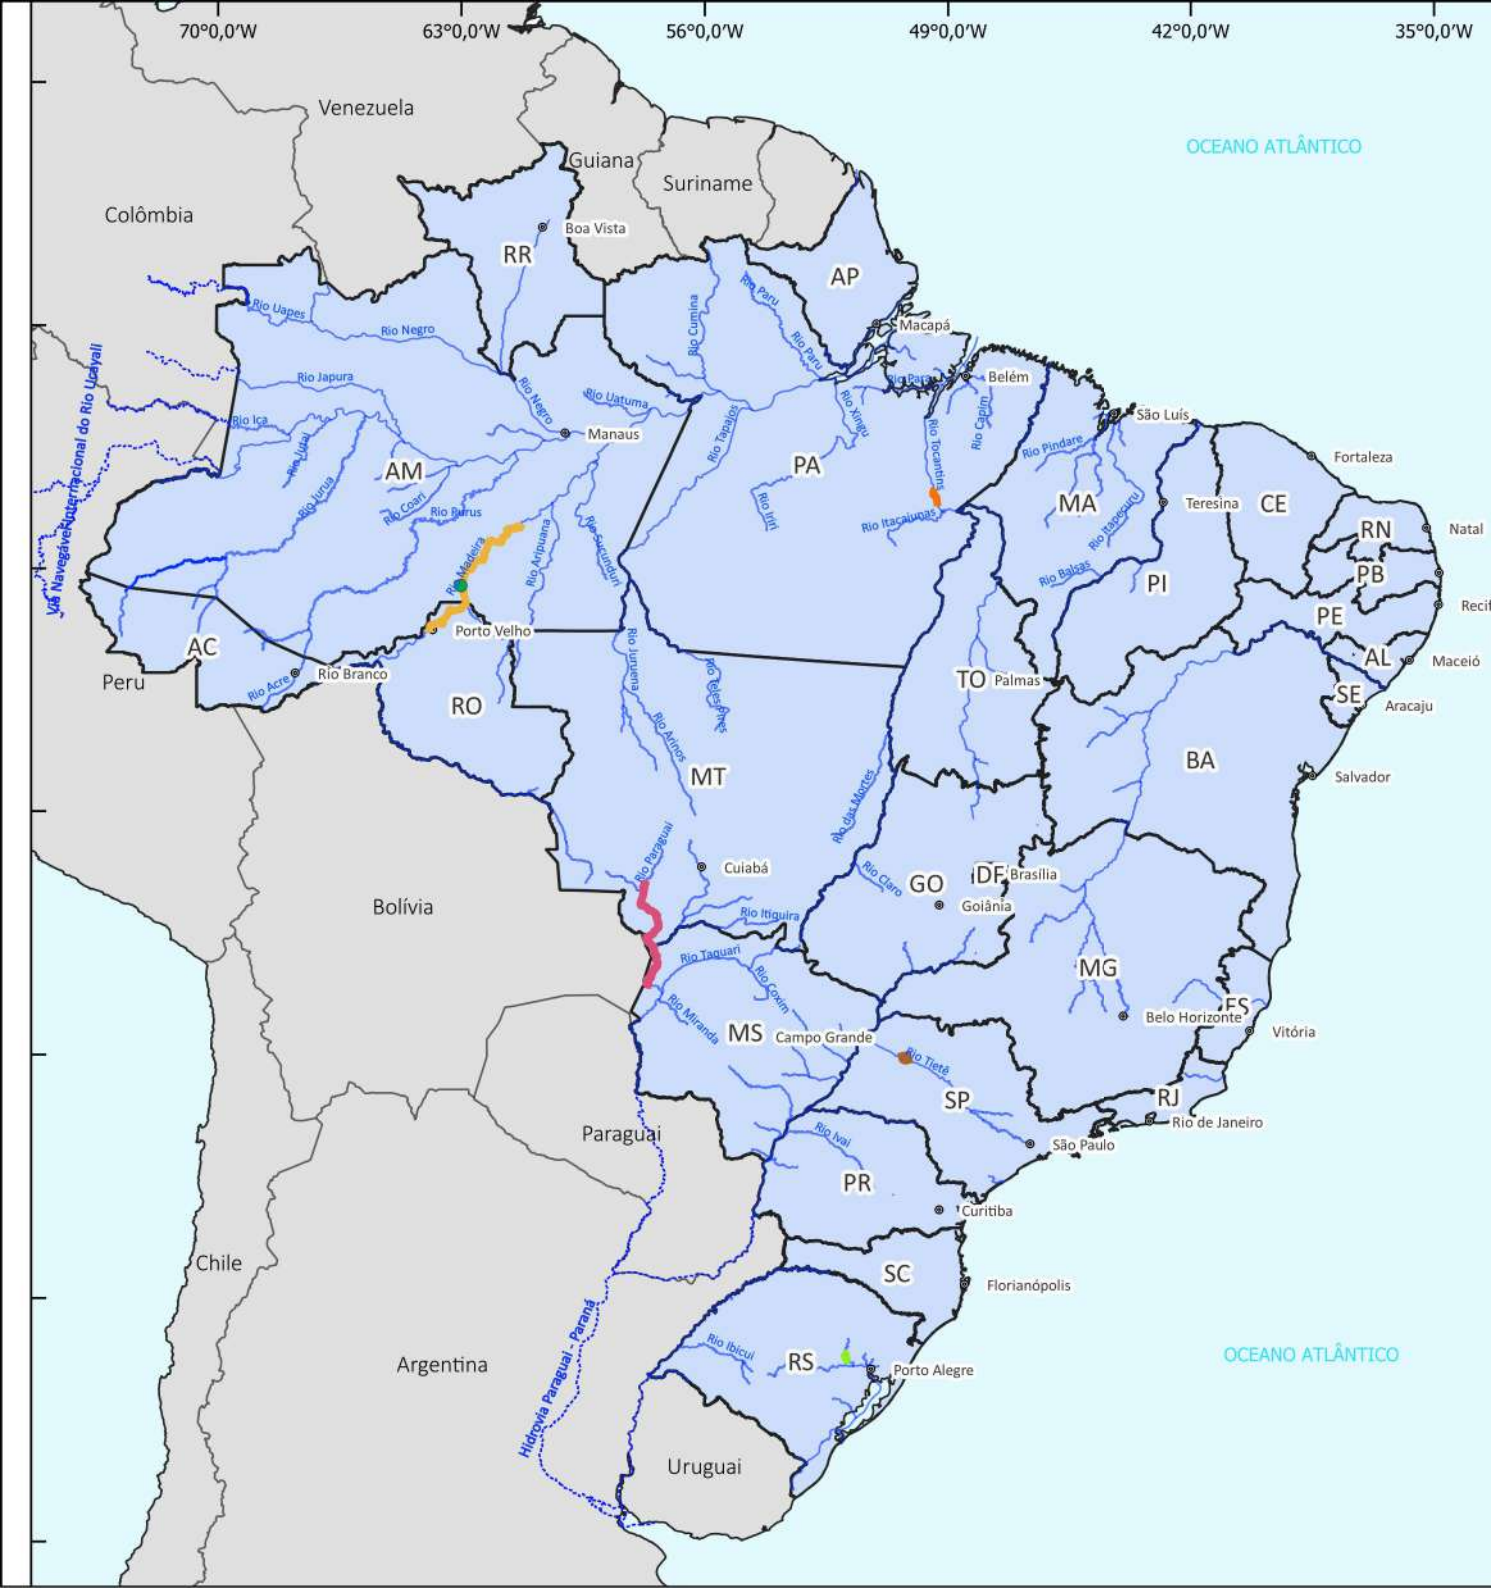

484 0 484 km

1:20.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



ESTUDOS, PROJETOS E PLANO DE MONITORAMENTO

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Principais Rios Fora da Jurisdição Nacional
- Instalação Portuária em Fase de Projeto
- Superintendência Regional
- Hidrovia do Rio Madeira - PMH Lote 01
- Hidrovia do Rio Madeira - PMH Lote 02
- Hidrovia do Rio Madeira - PMH Lote 03
- Hidrovia do Rio Tapajós- PMH Lote Único
- Hidrovia do Rio Tocantins- PMH Lote 01
- Hidrovia do Rio Tocantins- PMH Lote 02
- Hidrovia do Rio São Francisco - PMH Lote 01
- Hidrovia do Rio São Francisco - PMH Lote 02
- Hidrovia do Rio Paraguai - PMH Lote 02
- Hidrovia do Rio Paraguai - PMH Lote 03
- Hidrovia do Rio Paraguai - PMH Lote 04




484 0 484 km

1:20.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)

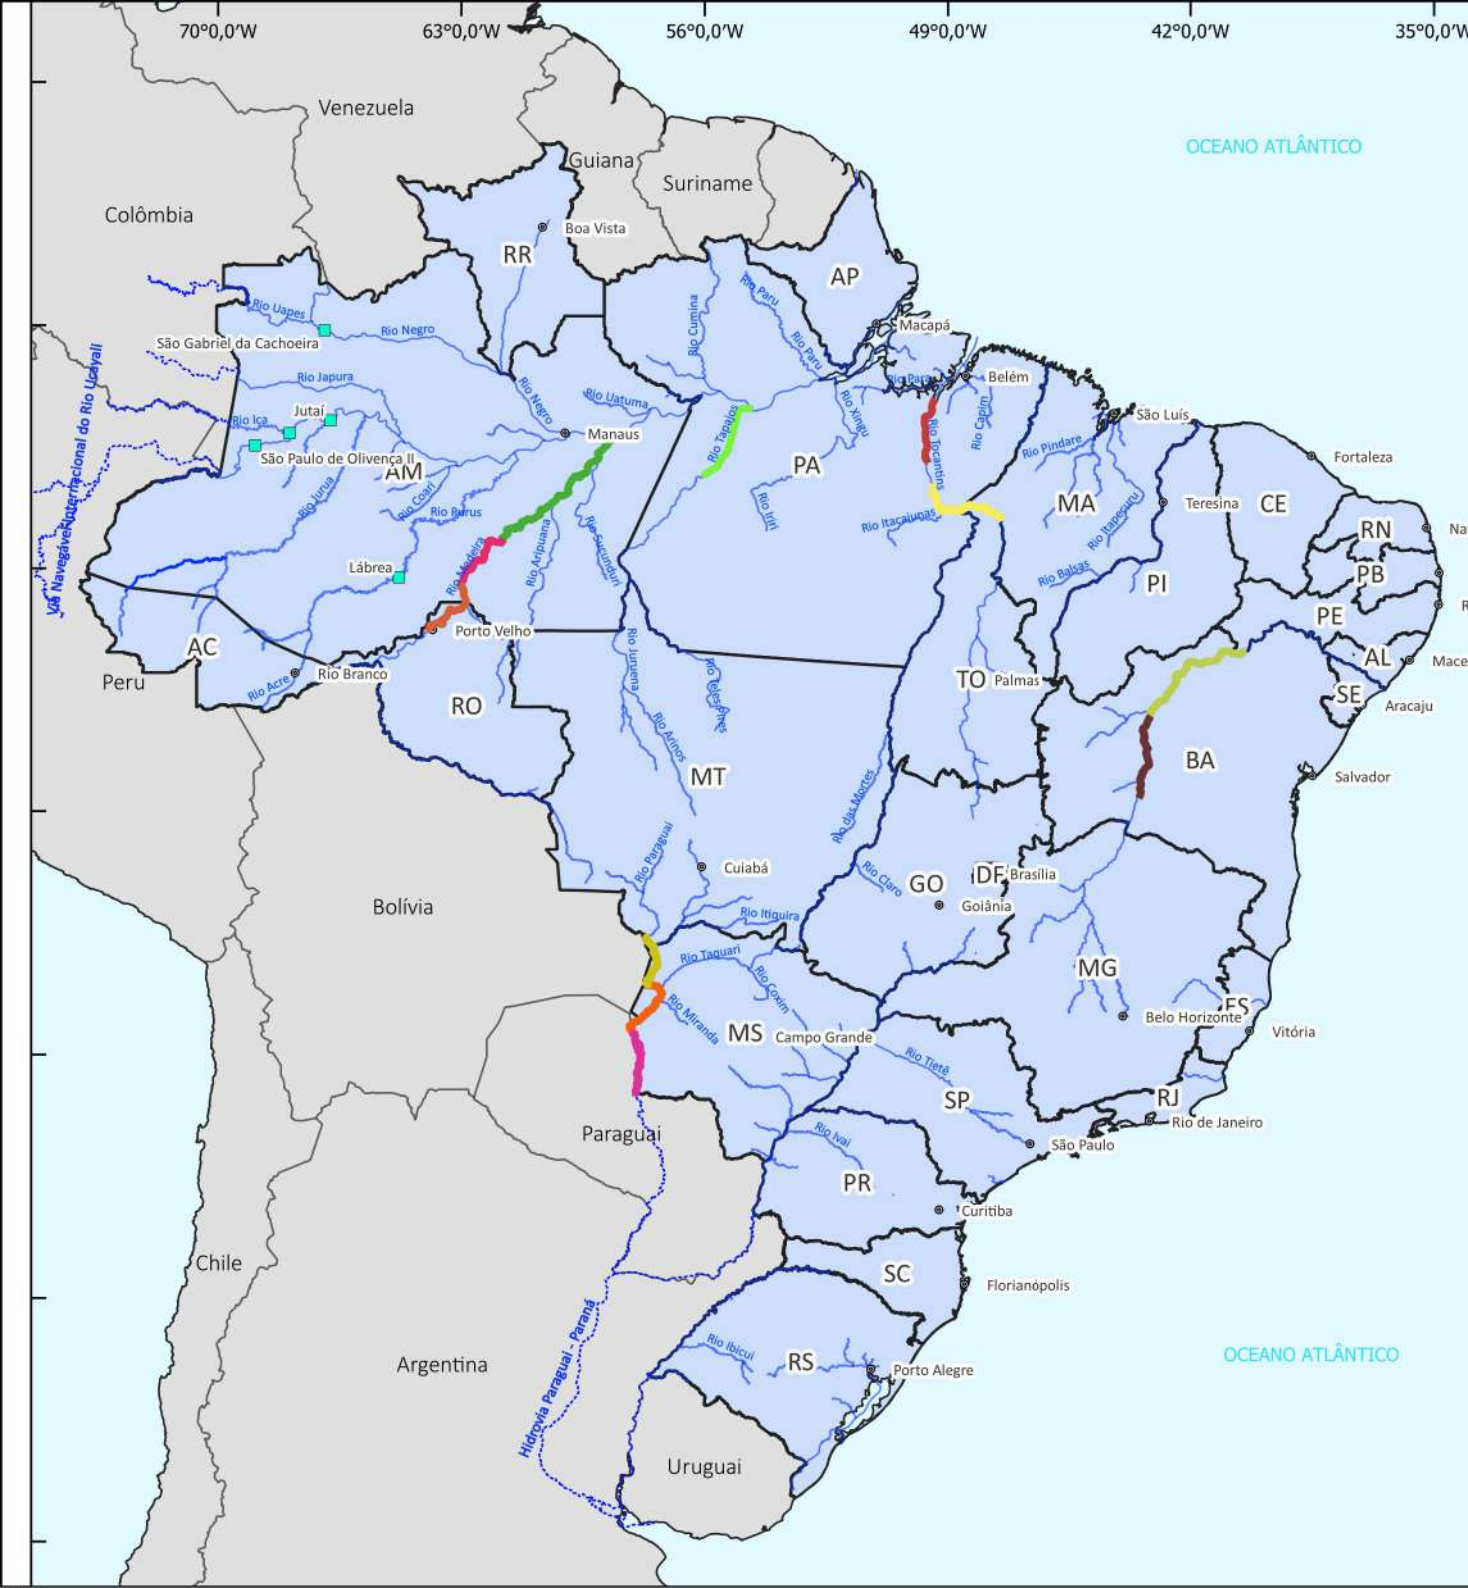

MODERNIZAÇÃO DAS ECLUSAS

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Principais Rios Fora da Jurisdição Nacional
- ≡ Modernização das Eclusas do Sul
- ▭ Superintendência Regional



484 0 484 km

1:20.400.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)





ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR AP

Terminal Portuário de Santana - AP

DNIT




CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda:

- Capitais
- Hidrovias Nacionais
- ◆ Instalação Portuária em Construção



100 0 100 km

1:4.700.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000
Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (%)	
1	IP4 de Santana - AP (RDCI)	AP	Rio Amazonas	00 00238/2022	PPB Engenharia LTDA e FN CRESPO NETO E CIA LTDA.	13/06/2022	30/06/2025	R\$	26.785.130	R\$	8.795.178	33%	ATIVO	02 00583/2022	LAGHI ENGENHARIA LTDA	11/11/2022	10/08/2025	R\$	45.879	0%
TOTAL GERAL									R\$	26.785.130	R\$	8.795.178	33%	TOTAL GERAL			R\$	45.879	0%	



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR AM



Rio Amazonas

DNIT



CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda:





Capitais



Hidrovias Nacionais



Instalação Portuária em Construção

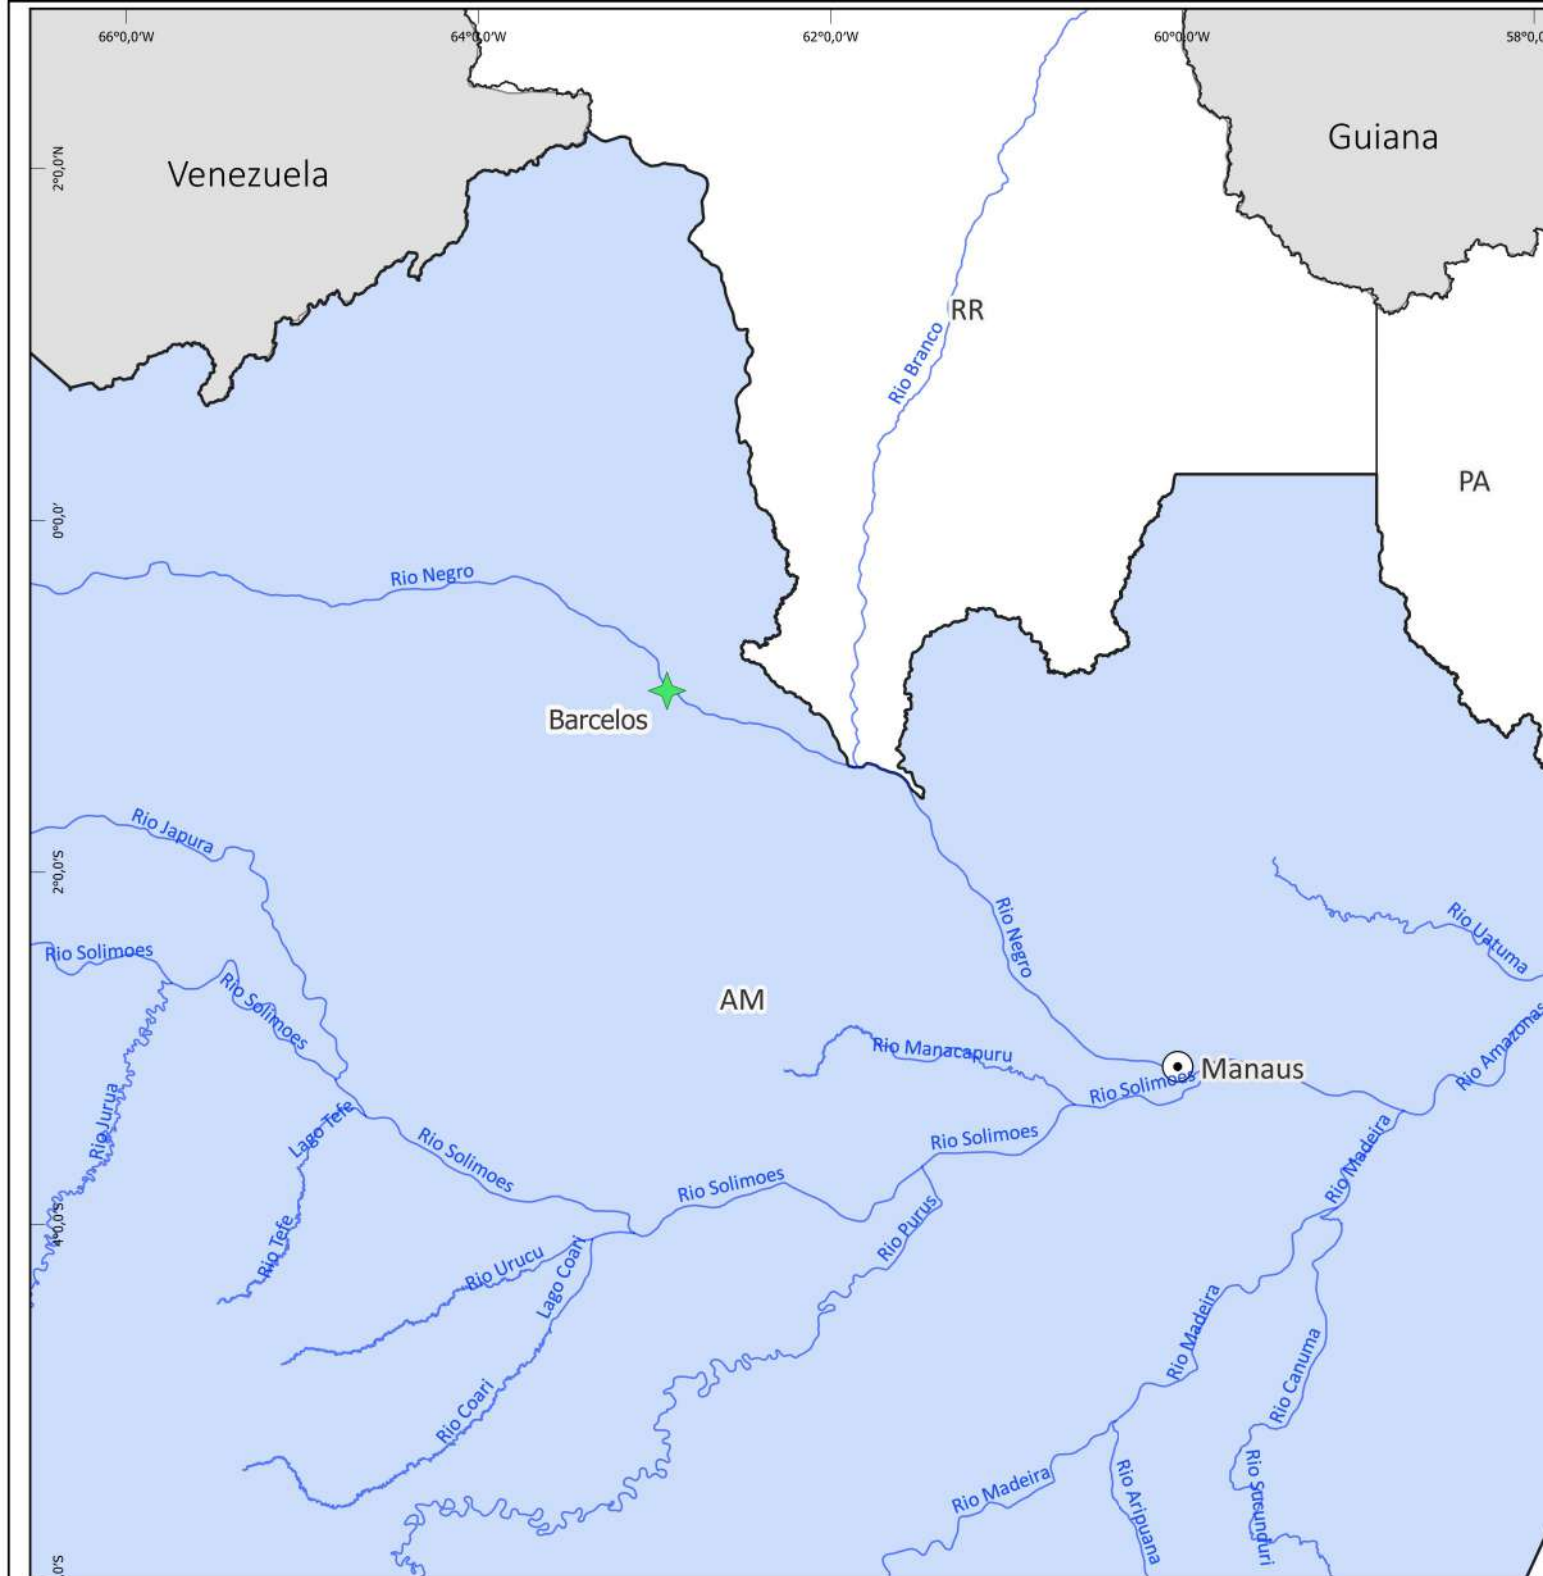

100 0 100 km


1:4.700.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



Instrumentos de construção e recuperação																	
	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Projeto Executivo e Recuperação da IP4 Manicoré/AM (RDCI)	AM	Bacia Amazônica	01 00051/2022	ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	12/01/2022	30/12/2025	R\$ 20.557.394	R\$ -	0%	ATIVO	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	30/12/2024	R\$ 15.678.920	39%
	IP4 de Barcelos - (RDCI)	AM	Rio Negro HN-129	00 00503/2020	JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA.	12/08/2020	18/01/2025	R\$ 18.939.337	R\$ 18.352.127	97%	ATIVO	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	30/12/2024	R\$ 15.678.920	39%
TOTAL GERAL								R\$ 39.496.731	R\$ 18.352.127	46%		TOTAL GERAL				R\$ 15.678.920	39%

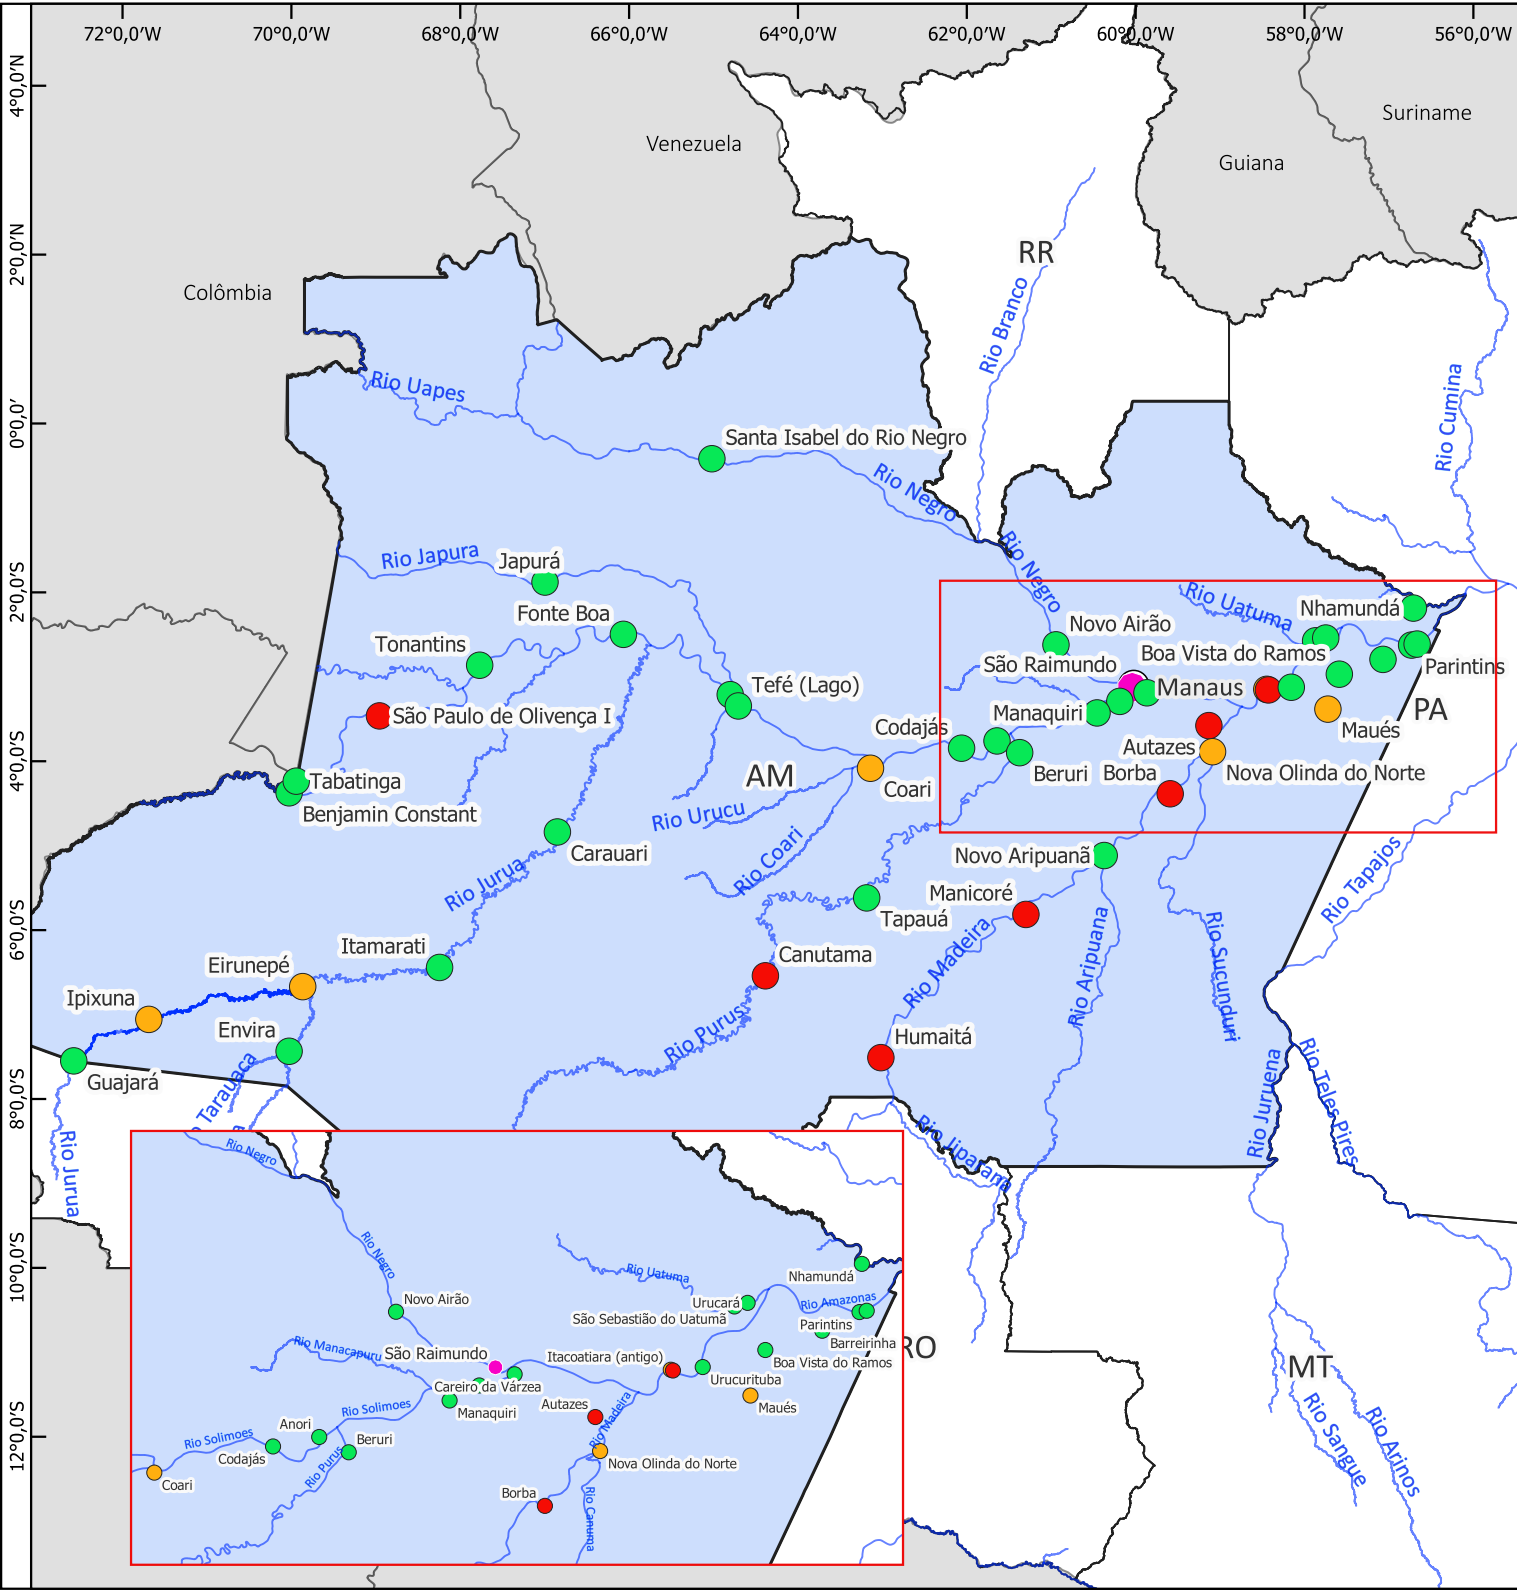

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Instalação Portuária em Operação
- Instalação Portuária em Operação Restrita
- Instalação Portuária Fora de Operação
- Instalação Portuária Delegada


Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	29	63%
Instalações Portuárias Fora de Operação	07	16%
Instalações Portuárias em Operação Restrita	10	21%

Total	46	100%
--------------	-----------	-------------

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	-	-
Eclusas Fora de Operação	-	-


Total	-	-
--------------	---	---

Instrumentos de operação de IP4																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	IP4 Cobertas	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 6)	AM	Rio Amazonas	Autazes/AM, Barcelos/AM, Caracará/RR, Careiro da Várzea/AM, Itacoatiara - Novo Terminal/AM, Itacoatiara/AM, Novo Airão/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, São Raimundo-Manaus/AM	01 00032/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/02/2021	19/01/2025	R\$ 50.917.622	R\$ 48.527.570	95%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/11/2021	18/05/2025	R\$ 12.930.535	95%
2	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 3)	AM	Rio Amazonas	Apuí/AM, Borba/AM, Cai n'Água-Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO, Humaitá/AM, Manicoré/AM, Nova Olinda do Norte/AM, Novo Aripuanã/AM, Urucurituba/AM	01 00353/2021	CONSORCIO AMAZONPORTS	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 45.896.207	R\$ 38.536.617	84%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2021	18/05/2025	R\$ 12.930.535	95%
3	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 4	AM	Rio Amazonas	Alvarães/AM, Carauari/AM, Eirunepé/AM, Envira/AM, Guajará/AM, Ipixuna/AM, Itamarati/AM, Tefé (Lago Tefé)/AM	01 00354/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 47.212.352	R\$ 38.974.164	83%	ATIVO	01 00040/2021	LAGHI ENGENHARIA LTDA	22/02/2021	15/05/2025	R\$ 10.724.205	88%
4	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 2	AM	Rio Amazonas	Benjamin Constant/AM, Coari/AM, Fonte Boa/AM, Japurá/AM, Jutai/AM, Santo Antônio do Içá/AM, São Paulo de Olivença/AM, Tabatinga/AM, Tonantins/AM	01 00352/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 38.984.522	R\$ 29.159.949	75%	ATIVO	01 00040/2021	LAGHI ENGENHARIA LTDA	22/02/2021	15/05/2025	R\$ 10.724.205	88%
TOTAL GERAL									R\$ 183.010.703	R\$ 155.198.299	85%		TOTAL GERAL			R\$ 12.930.535	95%	

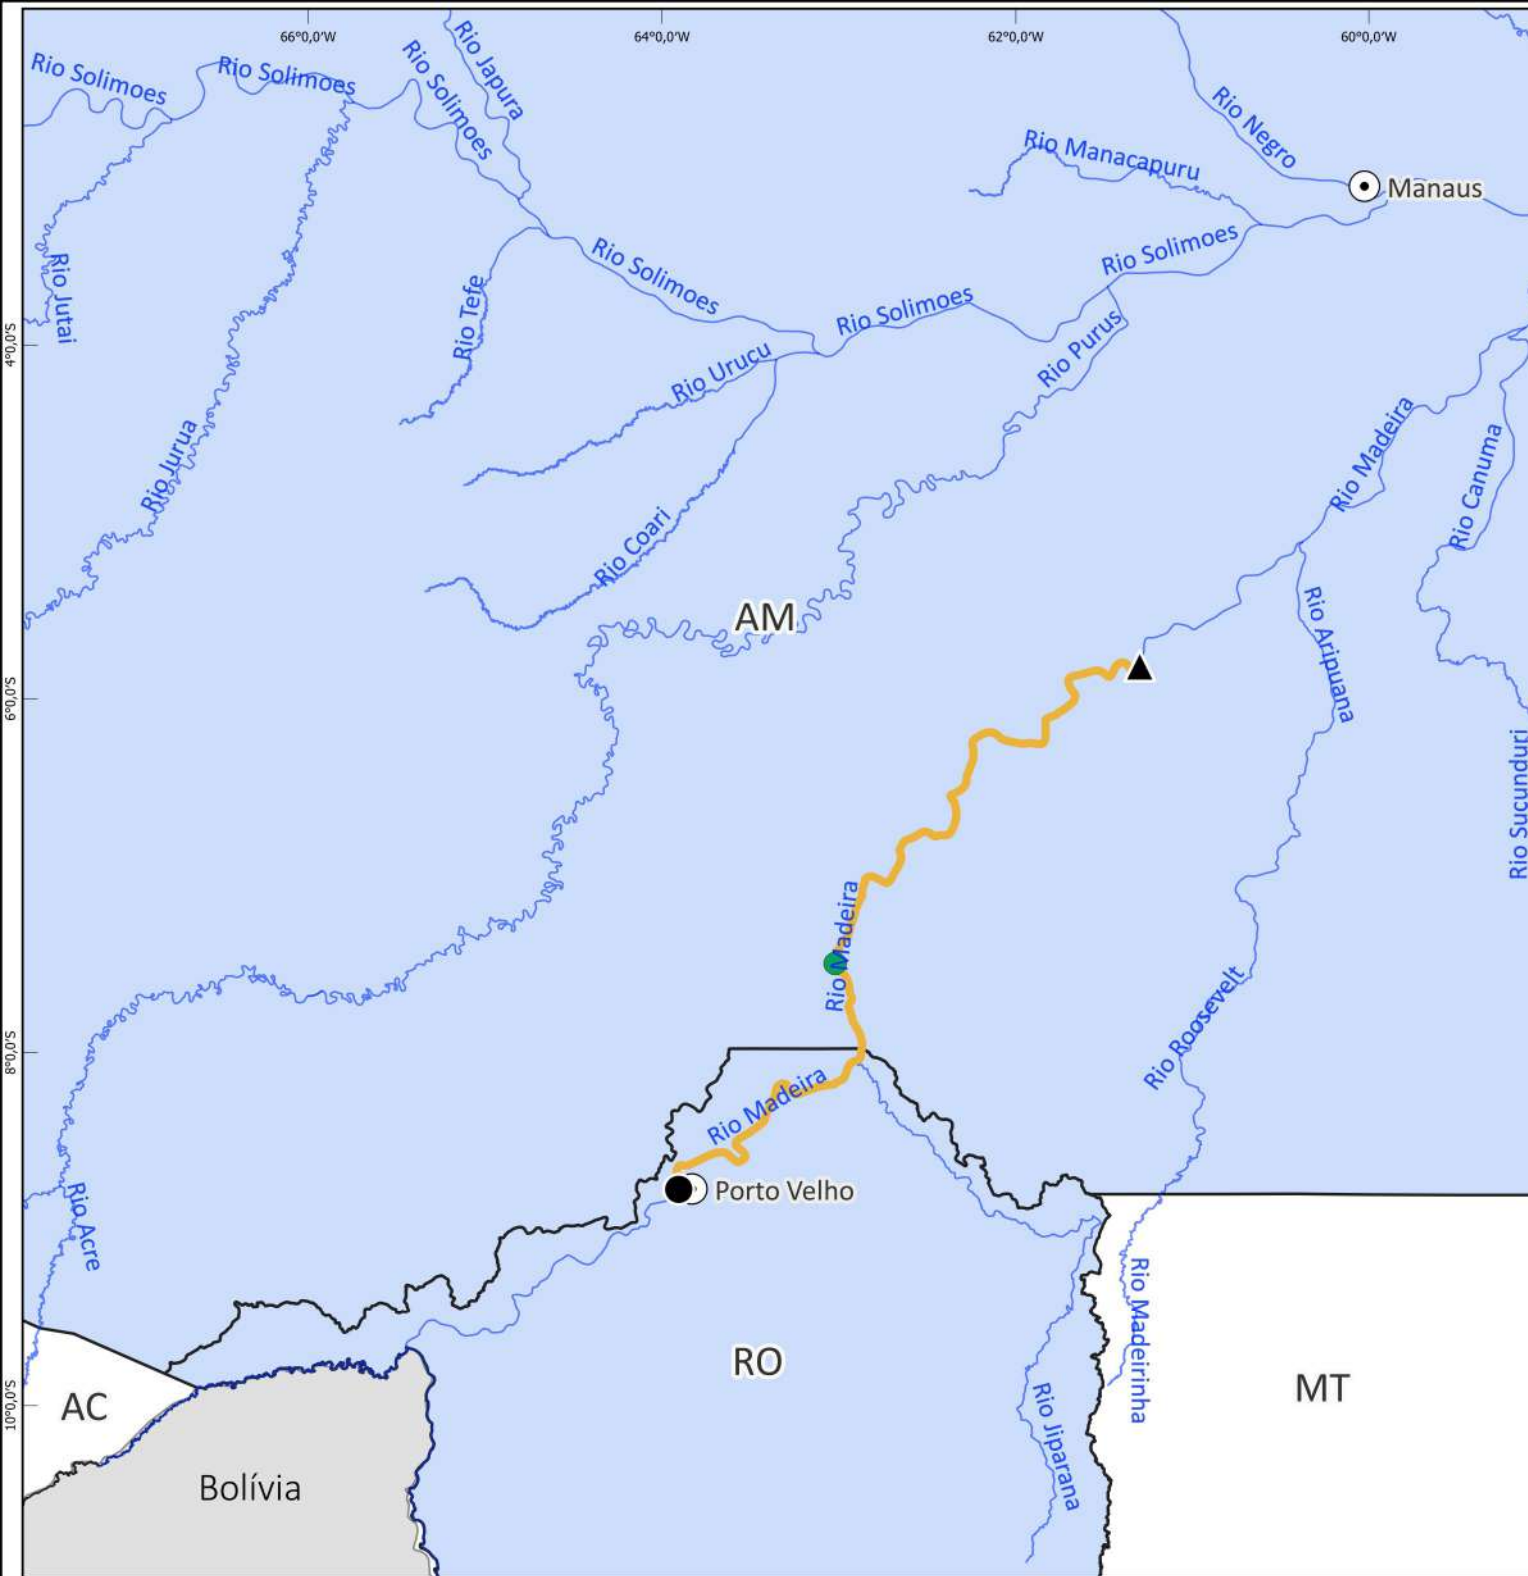

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Hidrovia do Rio Madeira - Dragagem
- Travessia do Rio Madeira
- Início do Trecho - Dragagem do Rio Madeira
- Fim do Trecho - Dragagem do Rio Madeira



100 0 100 km

1:4.400.000



Instrumentos de manutenção de hidrovía																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM)	AM	Rio Madeira HN-117	22 00250/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/07/2022	29/09/2027	R\$ 9.723.224	R\$ 4.896.632	50%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 9.415.005	87%	
TOTAL GERAL								R\$ 9.723.224	R\$ 4.896.632	50%		TOTAL GERAL				R\$ 9.415.005	87%	

Instrumentos de manutenção de hidrovía																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem do Rio Madeira (HN-117)	RO	Rio Madeira HN-117	22 00220/2021	Consórcio Jan De Nul - JEED	18/06/2021	17/06/2025	R\$ 138.869.342	R\$ 129.104.334	93%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 9.415.005	87%	
2	Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM)	AM	Rio Madeira HN-117	22 00250/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/07/2022	29/09/2027	R\$ 9.723.224	R\$ 4.896.632	50%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 9.415.005	87%	
TOTAL GERAL								R\$ 148.592.566	R\$ 134.000.966	90%		TOTAL GERAL				R\$ 9.415.005	87%	



ESTUDOS, PROJETOS E PLANO DE MONITORAMENTO



Legenda:



Capitais



Hidrovias



Início do Trecho



Fim do Trecho



Instalação Portuária em Fase de Projeto



Hidrovia do Rio Madeira - PMH Lote 01



Hidrovia do Rio Madeira - PMH Lote 02



Hidrovia do Rio Madeira - PMH Lote 03




100 0 100 km

1:5.700.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)

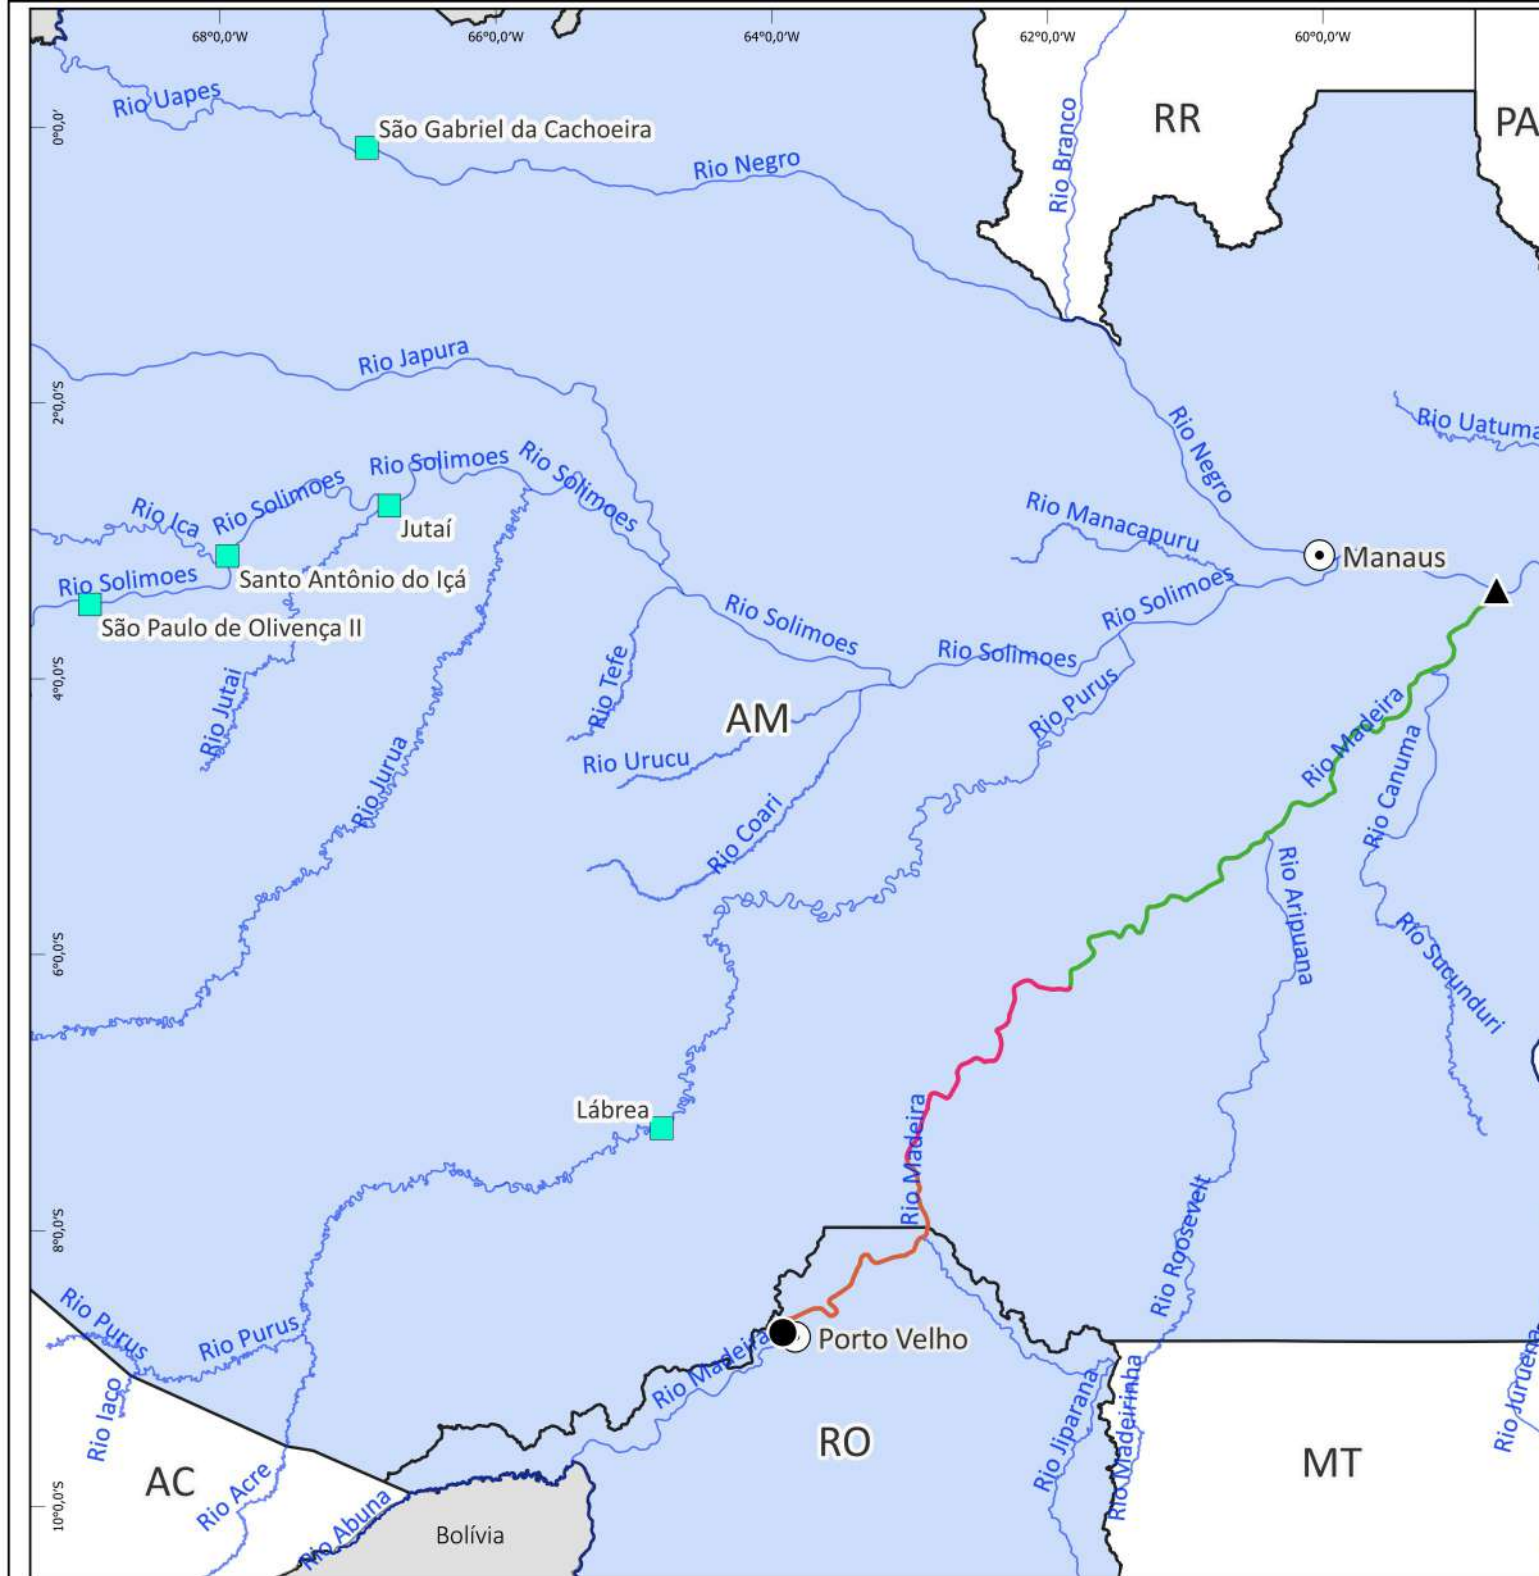

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Projeto de IP4 de São Paulo de Olivença	AM	Rio Solimões HN-132	27 00940/2018	INTERNAVE ENGENHARIA	02/09/2019	12/04/2025	R\$ 777.157	R\$ 521.821	67%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	Projeto de IP4 de São Raimundo	AM	Rio Amazonas HN-100	27 00629/2016	Consórcio São Raimundo	01/02/2017	02/06/2025	R\$ 2.408.562	R\$ 1.095.028	45%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
1	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 1	AM/RO	Rio Madeira HN-117	22 00908/2020	CHD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS LTDA	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 14.054.411	R\$ 6.752.928	48%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 2	AM	Rio Madeira HN-117	01 00909/2020	LAGHI ENGENHARIA LTDA E RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 13.394.748	R\$ 3.809.655	28%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
4	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 3	AM	Rio Madeira HN-117	01 00910/2020	LAGHI ENGENHARIA LTDA E RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 16.061.416	R\$ 3.896.416	24%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
5	Projeto Executivo e Recuperação da IP4 Manicoré/AM (RDCI)	AM	Bacia Amazônica	01 00051/2022	ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	12/01/2022	30/12/2025	R\$ 20.557.394	R\$ -	0%	ATIVO	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	30/12/2024	R\$ 15.678.920	39%




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR BA



Eclusa de Sobradinho/BA

DNIT

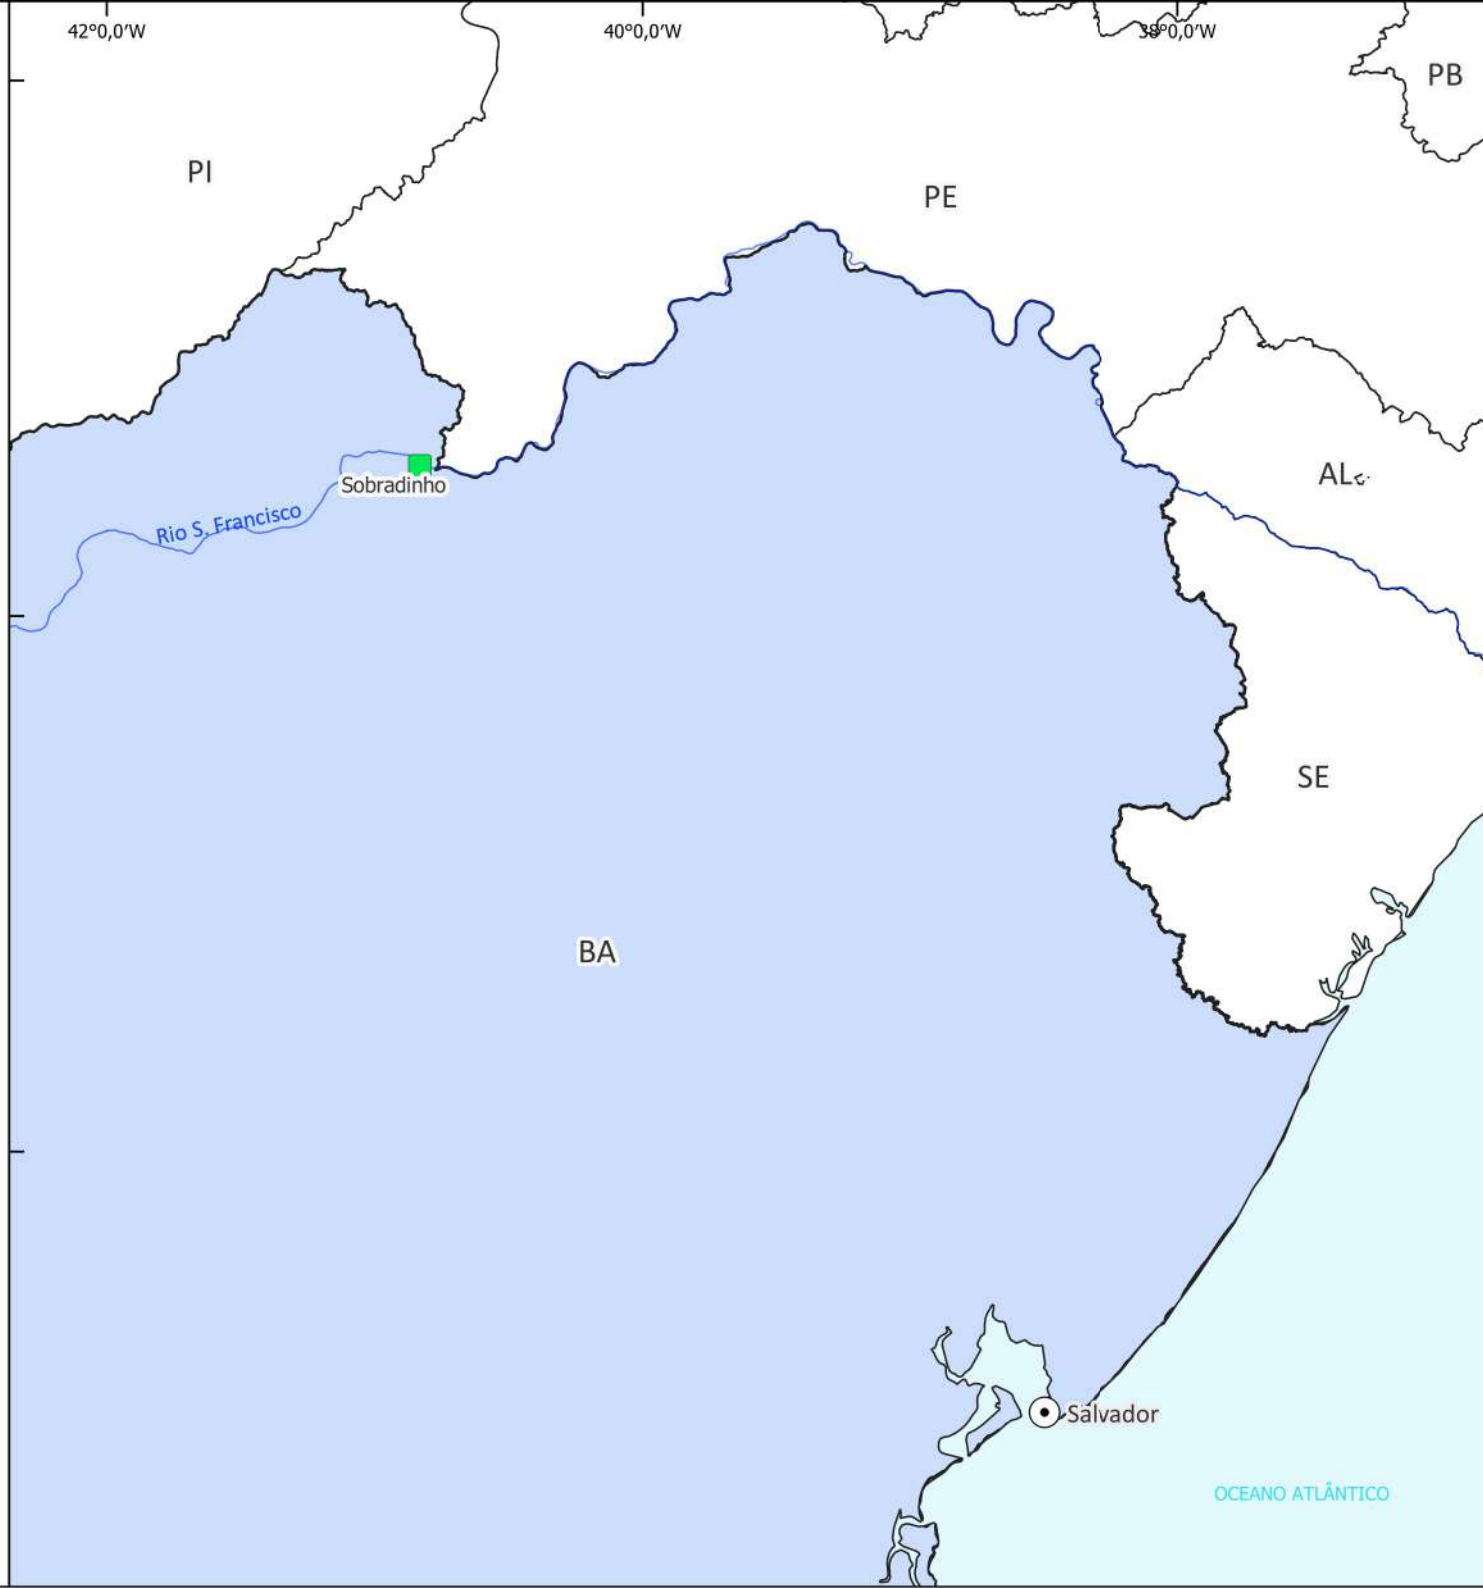


Legenda:

- Capitais
- Hidroviás
- Eclusa em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	-	-
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	-	-

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	01	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	01	100%



76 0 76 km


1:2.750.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



Instrumentos de operação de eclusas																					
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (%)		
1	Operação da Eclusa de Sobradinho (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00577/2021	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A	27/12/2021	26/12/2026	R\$	29.410.915	R\$	12.607.297	43%	ATIVO	05 00671/2021	SIRCOP SERVICOS AQUAVIARIOS E AERONAUTICOS LTDA	27/12/2021	26/10/2026	R\$	6.168.517	59%	
TOTAL GERAL									R\$	29.410.915	R\$	12.607.297	43%		TOTAL GERAL				R\$	6.168.517	59%

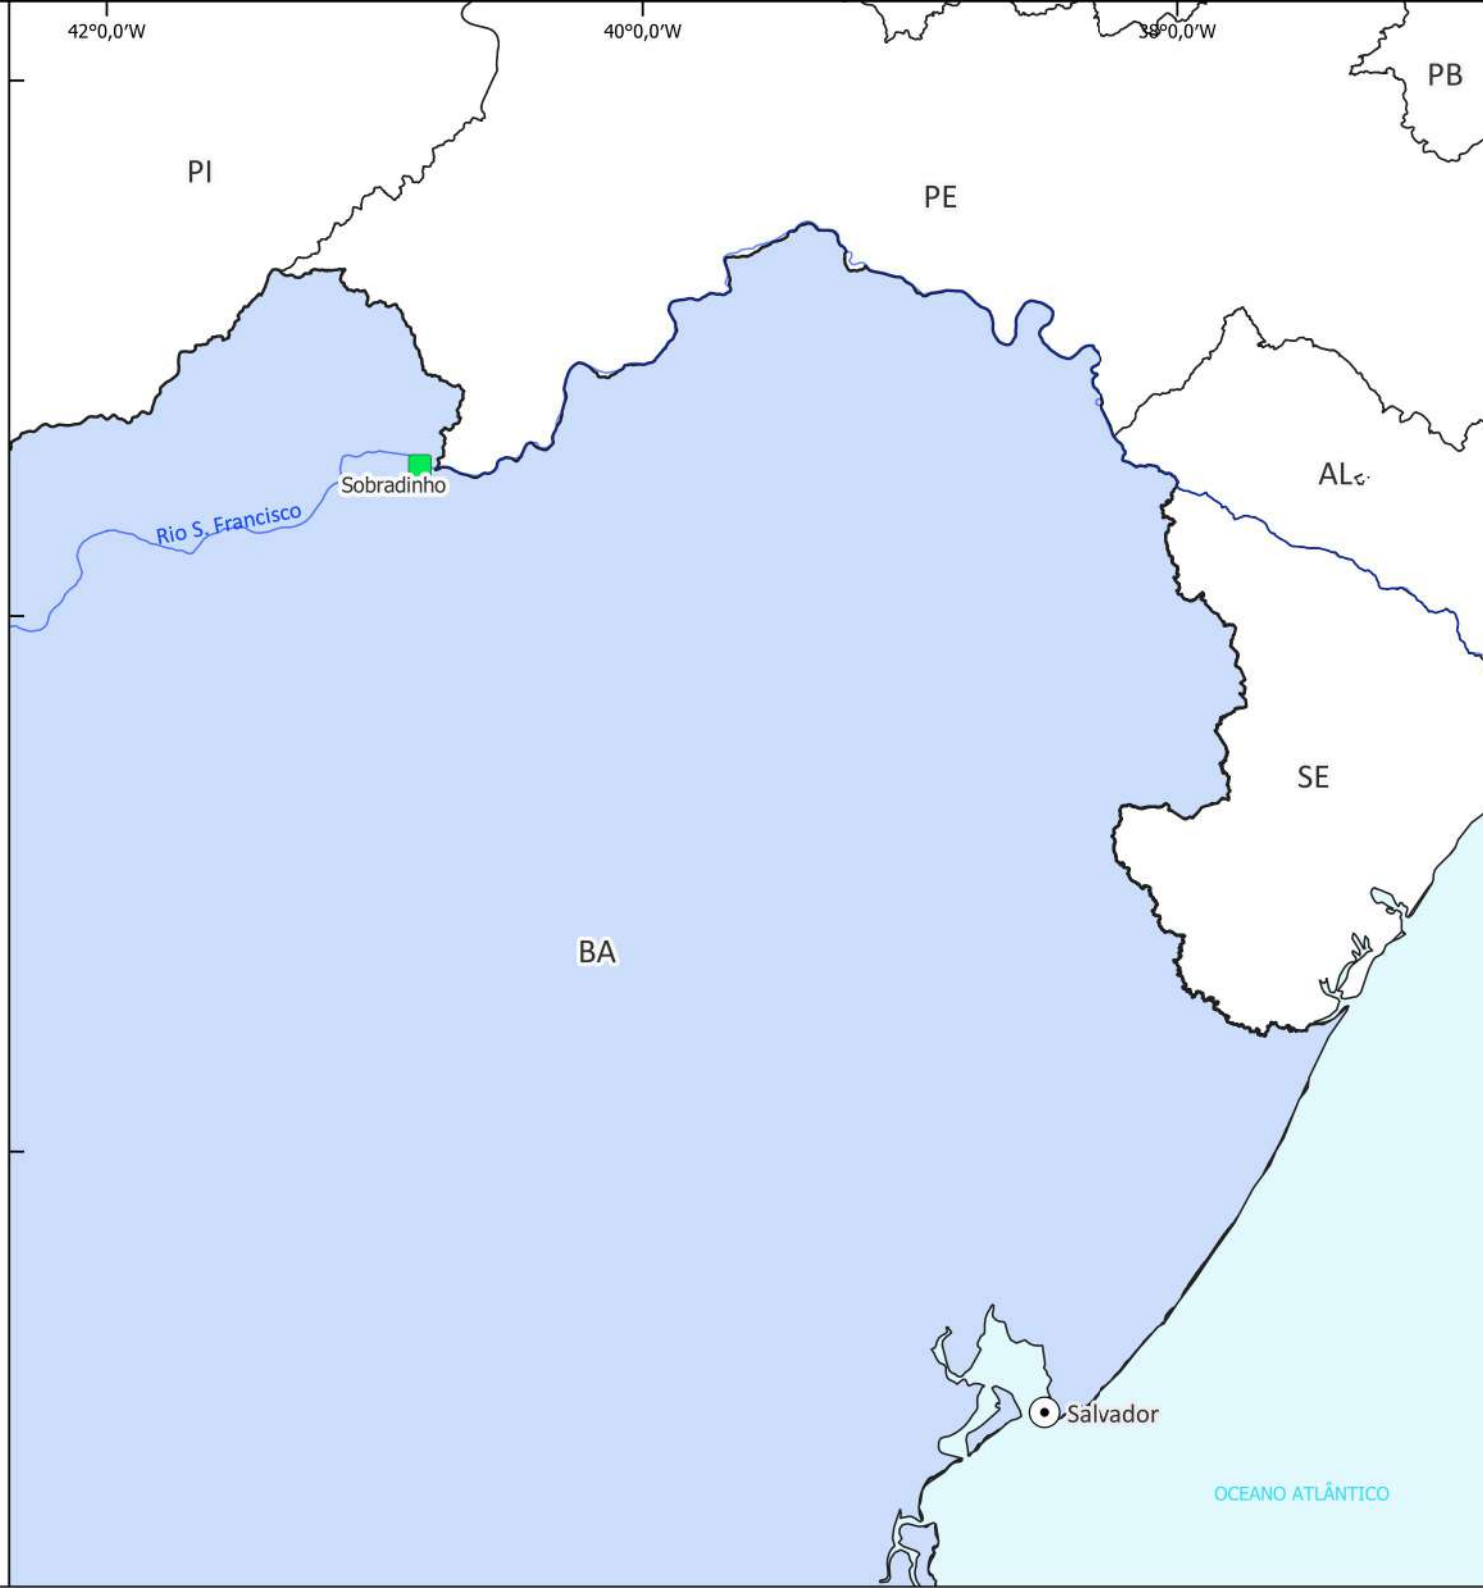

Legenda:

- Capitais
- Hidroviás
- Eclusa em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	-	-
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	-	-

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	01	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	01	100%



76 0 76 km

1:2.750.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)




Instrumentos de operação de eclusas																	
	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Operação da Eclusa de Sobradinho (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00577/2021	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A	27/12/2021	26/12/2026	R\$ 29.410.915	R\$ 12.607.297	43%	ATIVO	05 00671/2021	SIRCOP SERVICOS AQUAVIARIOS E AERONAUTICOS LTDA	27/12/2021	26/10/2026	R\$ 6.168.517	56%
TOTAL GERAL								R\$ 29.410.915	R\$ 12.607.297	43%		TOTAL GERAL				R\$ 6.168.517	56%



Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Início do Trecho
- Fim do Trecho
- Hidrovia do Rio São Francisco - PMH Lote 01
- Hidrovia do Rio São Francisco - PMH Lote 02



100 0 100 km

1:4.300.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)




#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco - Lote 1 (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00330/2021	UMI SAN SERVIÇOS DE APOIO À NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	01/09/2021	30/08/2026	R\$ 6.145.537	R\$ 1.356.000	22%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco - Lote 2 (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00331/2021	UMI SAN SERVIÇOS DE APOIO À NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	01/09/2021	30/08/2026	R\$ 5.611.389	R\$ 1.429.287	25%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 11.756.926	R\$ 2.785.287	24%		TOTAL GERAL				R\$ -	0%



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR MA



Rio Parnaíba

DNIT




Legenda:

- ⊙ Capitais
- Hidrovias
- Instalação Portuária em Operação
- Instalação Portuária Fora de Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	20	90%
Instalações Portuárias Fora de Operação	02	10%
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	22	100%

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	-	-
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	-	-

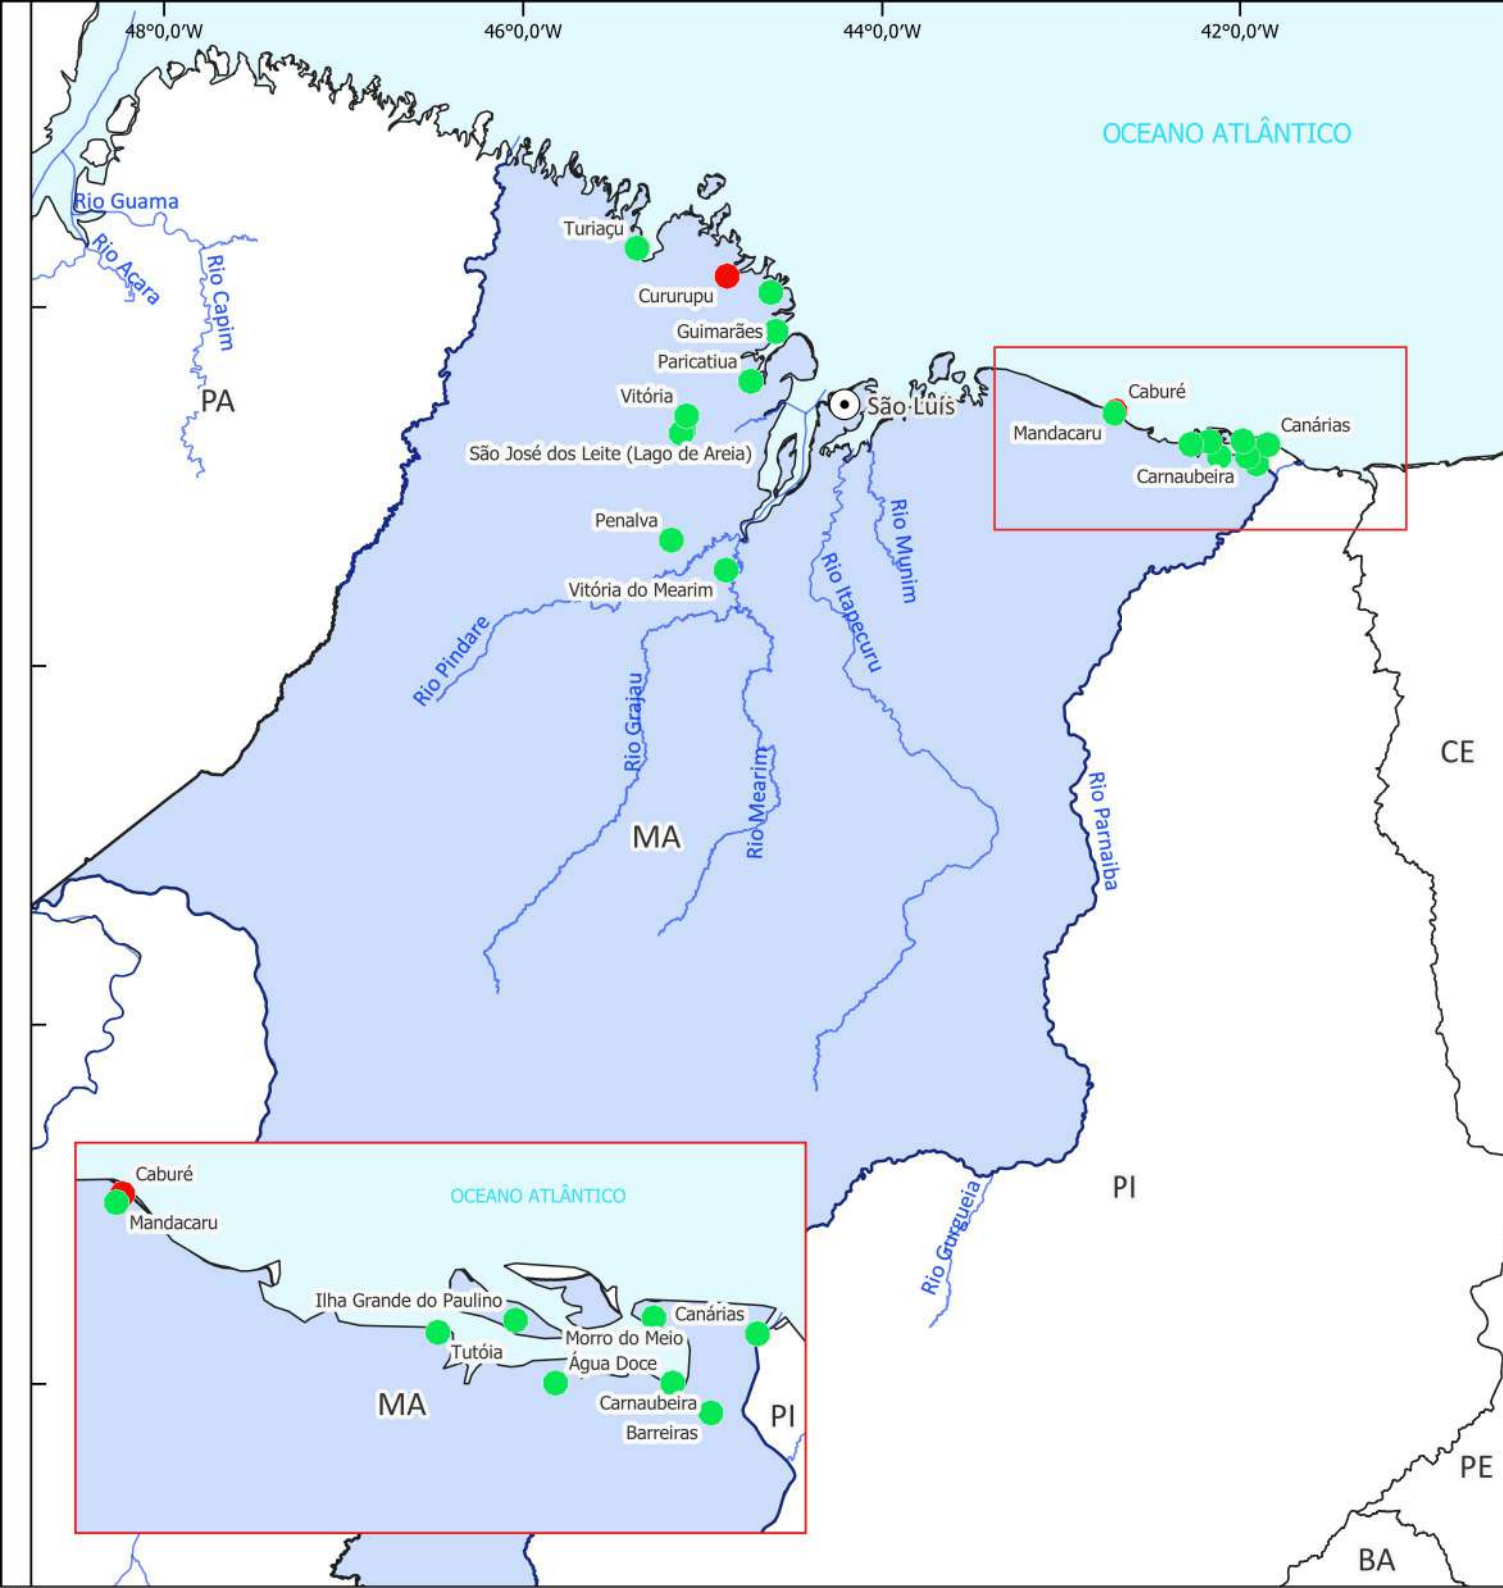

Instrumentos de manutenção de IP4																				
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (%)	
1	Manutenção dos Terminais Hidroviários - Atlântico Nordeste e Parnaíba (HN-400)	PI	Parnaíba	15 00477/2023	S E R SERVICOS, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	25/08/2023	25/08/2025	R\$	12.431.196	R\$	7.778.511	63%	ATIVO	15 00586/2021	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	10/11/2021	09/02/2025	R\$	4.822.556	81%
TOTAL GERAL								R\$	12.431.196	R\$	7.778.511	63%	TOTAL GERAL			R\$	4.822.556	81%		




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR MS




Hidrovia do Paraguai

DNIT

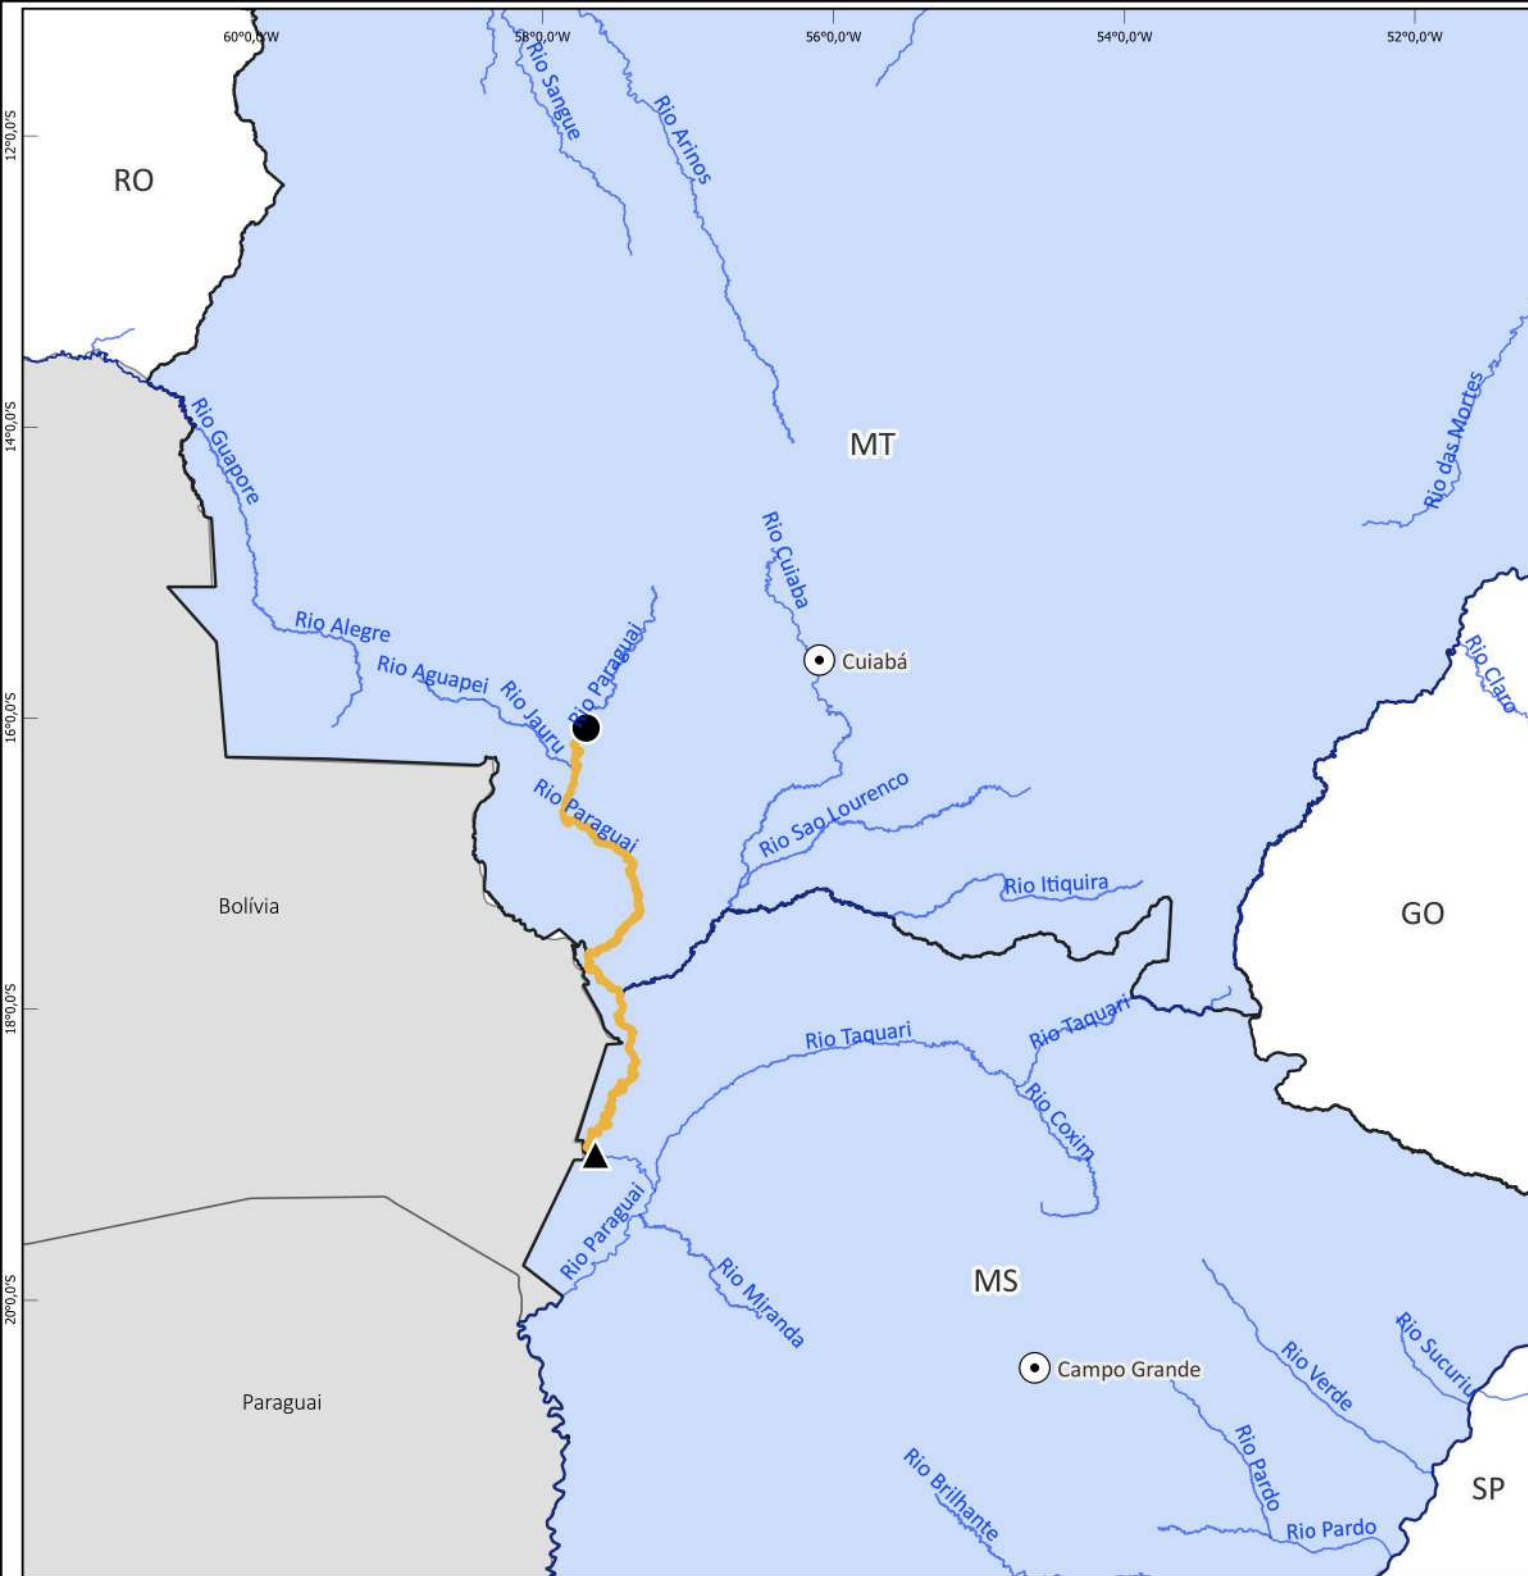

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Hidrovia do Rio Paraguai - Dragagem do Tramo Norte
- ▲ Fim do Trecho - Dragagem do Rio Paraguai
- Início do Trecho - Dragagem do Rio Paraguai



13 0 13 km

1:4.700.000



Instrumentos de manutenção de hidrovía																	
				Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
Dragagem e Sinalização do Rio Paraguai HN-950 (Tramo Norte)				19 00316/2023	CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA	13/06/2023	17/05/2028	R\$ 14.989.838	R\$ 3.017.360	20%	ATIVO	-	-	-	-	-	-

58°0,0'W



56°0,0'W

54°0,0'W

52°0,0'W

**SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA****Legenda:**

- Capitais
- Hidrovias Nacionais
- Tramo Norte da Hidrovia do Rio Paraguai
- Tramo Sul da Hidrovia do Rio Paraguai
- Início do Trecho
- Corumbá-MS
- Fim do Trecho

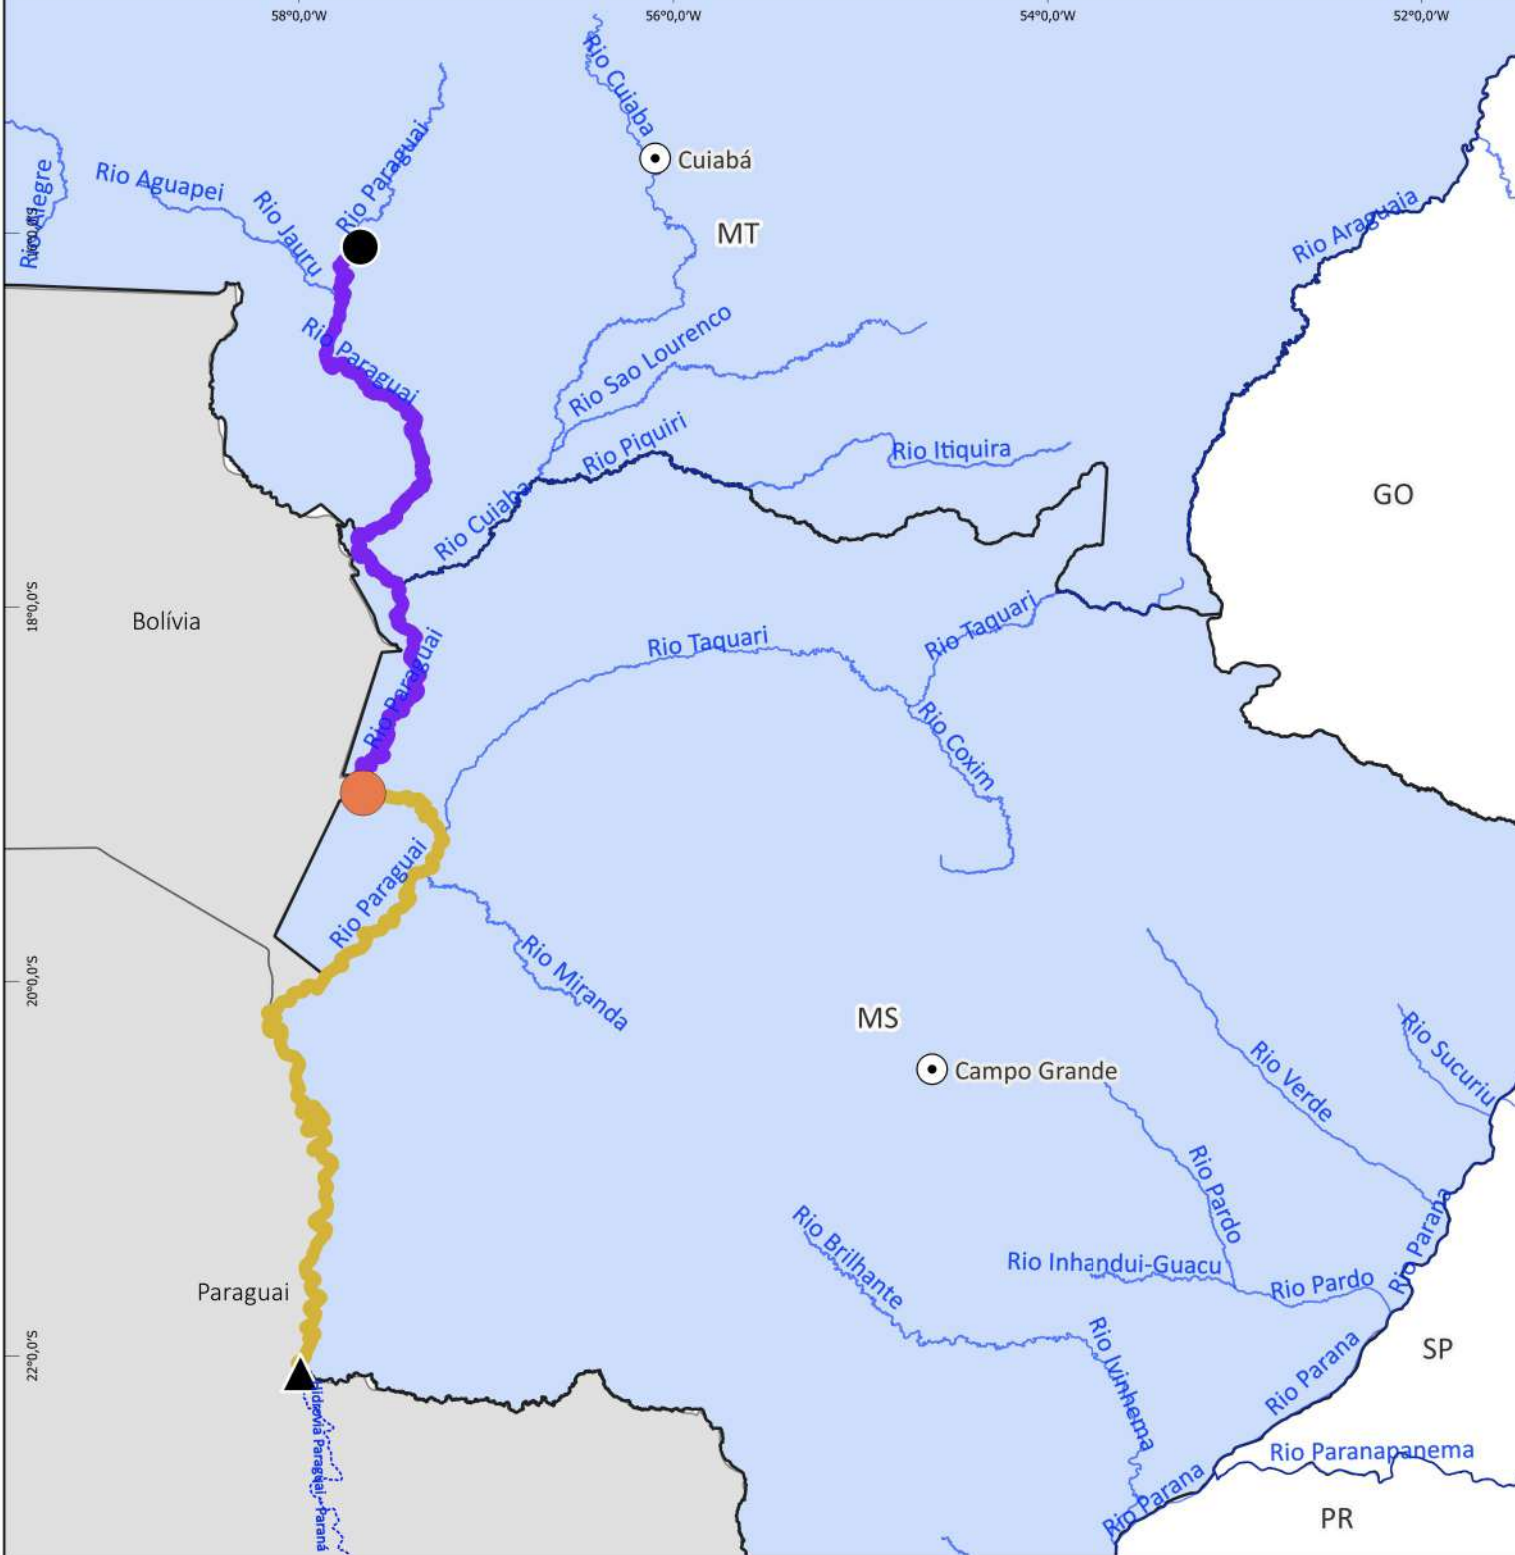

100 0 100 km

1:3.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000
Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)

Instrumentos de manutenção de hidrovía																		
			o (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
Dragagem e Sinalização do Rio Paraguai HN-950 (Tramo Norte)			guai HN-950	19 00316/2023	CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA	13/06/2023	17/05/2028	R\$ 14.989.838	R\$ 3.017.360	20%	ATIVO	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção da Sinalização e desobstrução de vegetação - Tramo Sul			Bacia do Rio Paraguai HN-950	19 00008/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/03/2022	29/11/2025	R\$ 5.439.178	R\$ 2.186.646	40%	ATIVO	19 00006/2022	PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA – EPP		01/03/2022	31/08/2025	R\$ 1.399.804	45%




ESTUDOS, PROJETOS E PLANO DE MONITORAMENTO



Legenda:


- Capitais
- Hidrovias
- Corumbá-MS
- Início do Trecho
- Fim do Trecho
- Hidrovia do Rio Paraguai - PMH Lote 02
- Hidrovia do Rio Paraguai - PMH Lote 03
- Hidrovia do Rio Paraguai - PMH Lote 04



100 0 100 km

1:5.200.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000
Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)

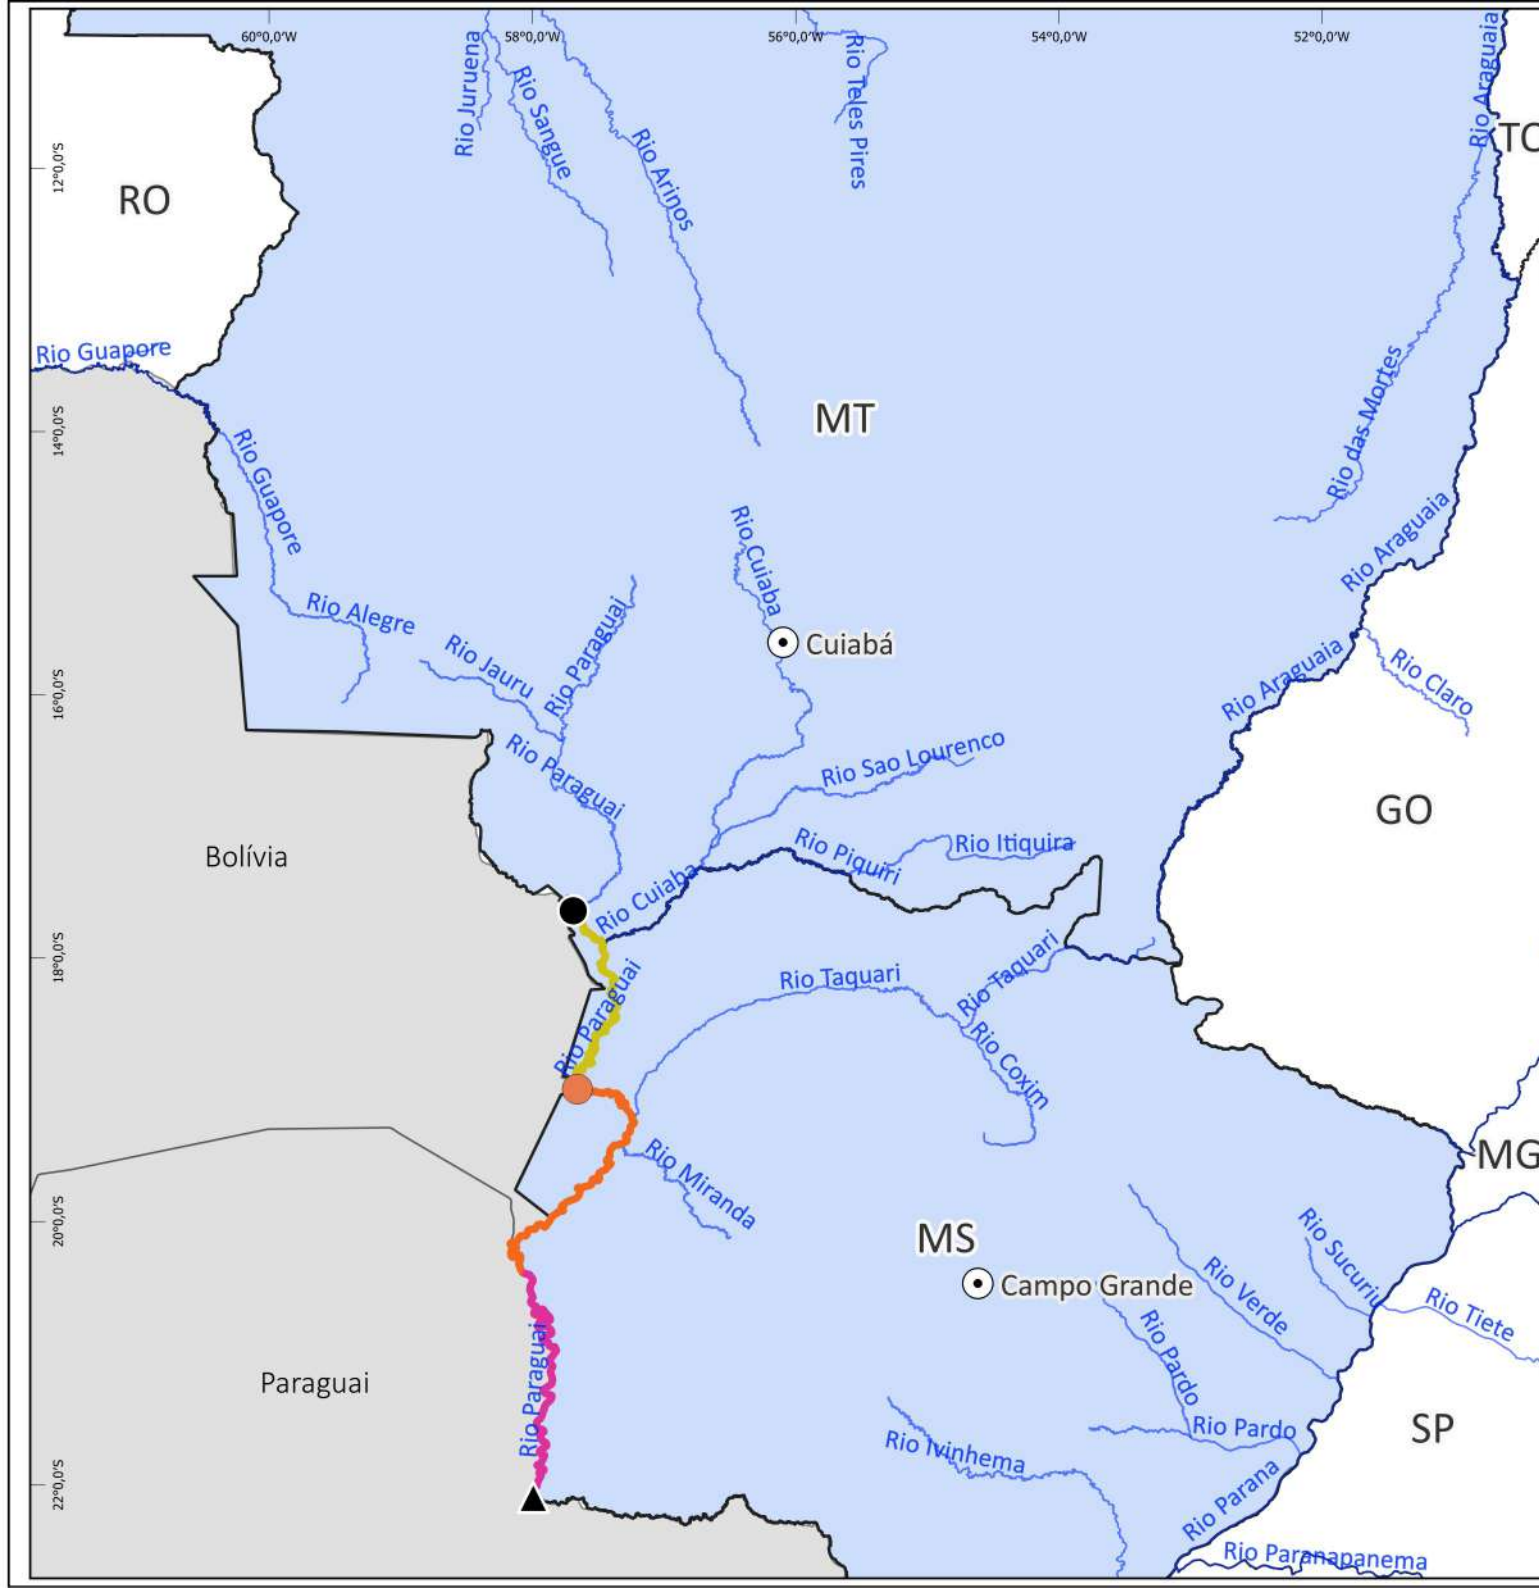

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - (Lote 02)	MS	Rio Paraguai HN-950	19 00431/2022	Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda.	05/10/2022	08/09/2027	R\$ 10.715.039	R\$ 2.574.918	24%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - (Lote 03)	MS	Rio Paraguai HN-950	19 00469/2022	CONSÓRCIO PROGAIA, R PEOTTA, ENVIRONLINK	05/10/2022	08/09/2027	R\$ 8.618.955	R\$ 2.182.201	25%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - (Lote 04)	MS	Rio Paraguai HN-950	19 00485/2022	BELOV ENGENHARIA S.A	25/10/2022	28/09/2027	R\$ 9.958.546	R\$ 2.310.352	23%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 29.292.540	R\$ 7.067.471	24%		TOTAL GERAL				R\$ -	0%




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR PA




IP4 Visau/PA

DNIT

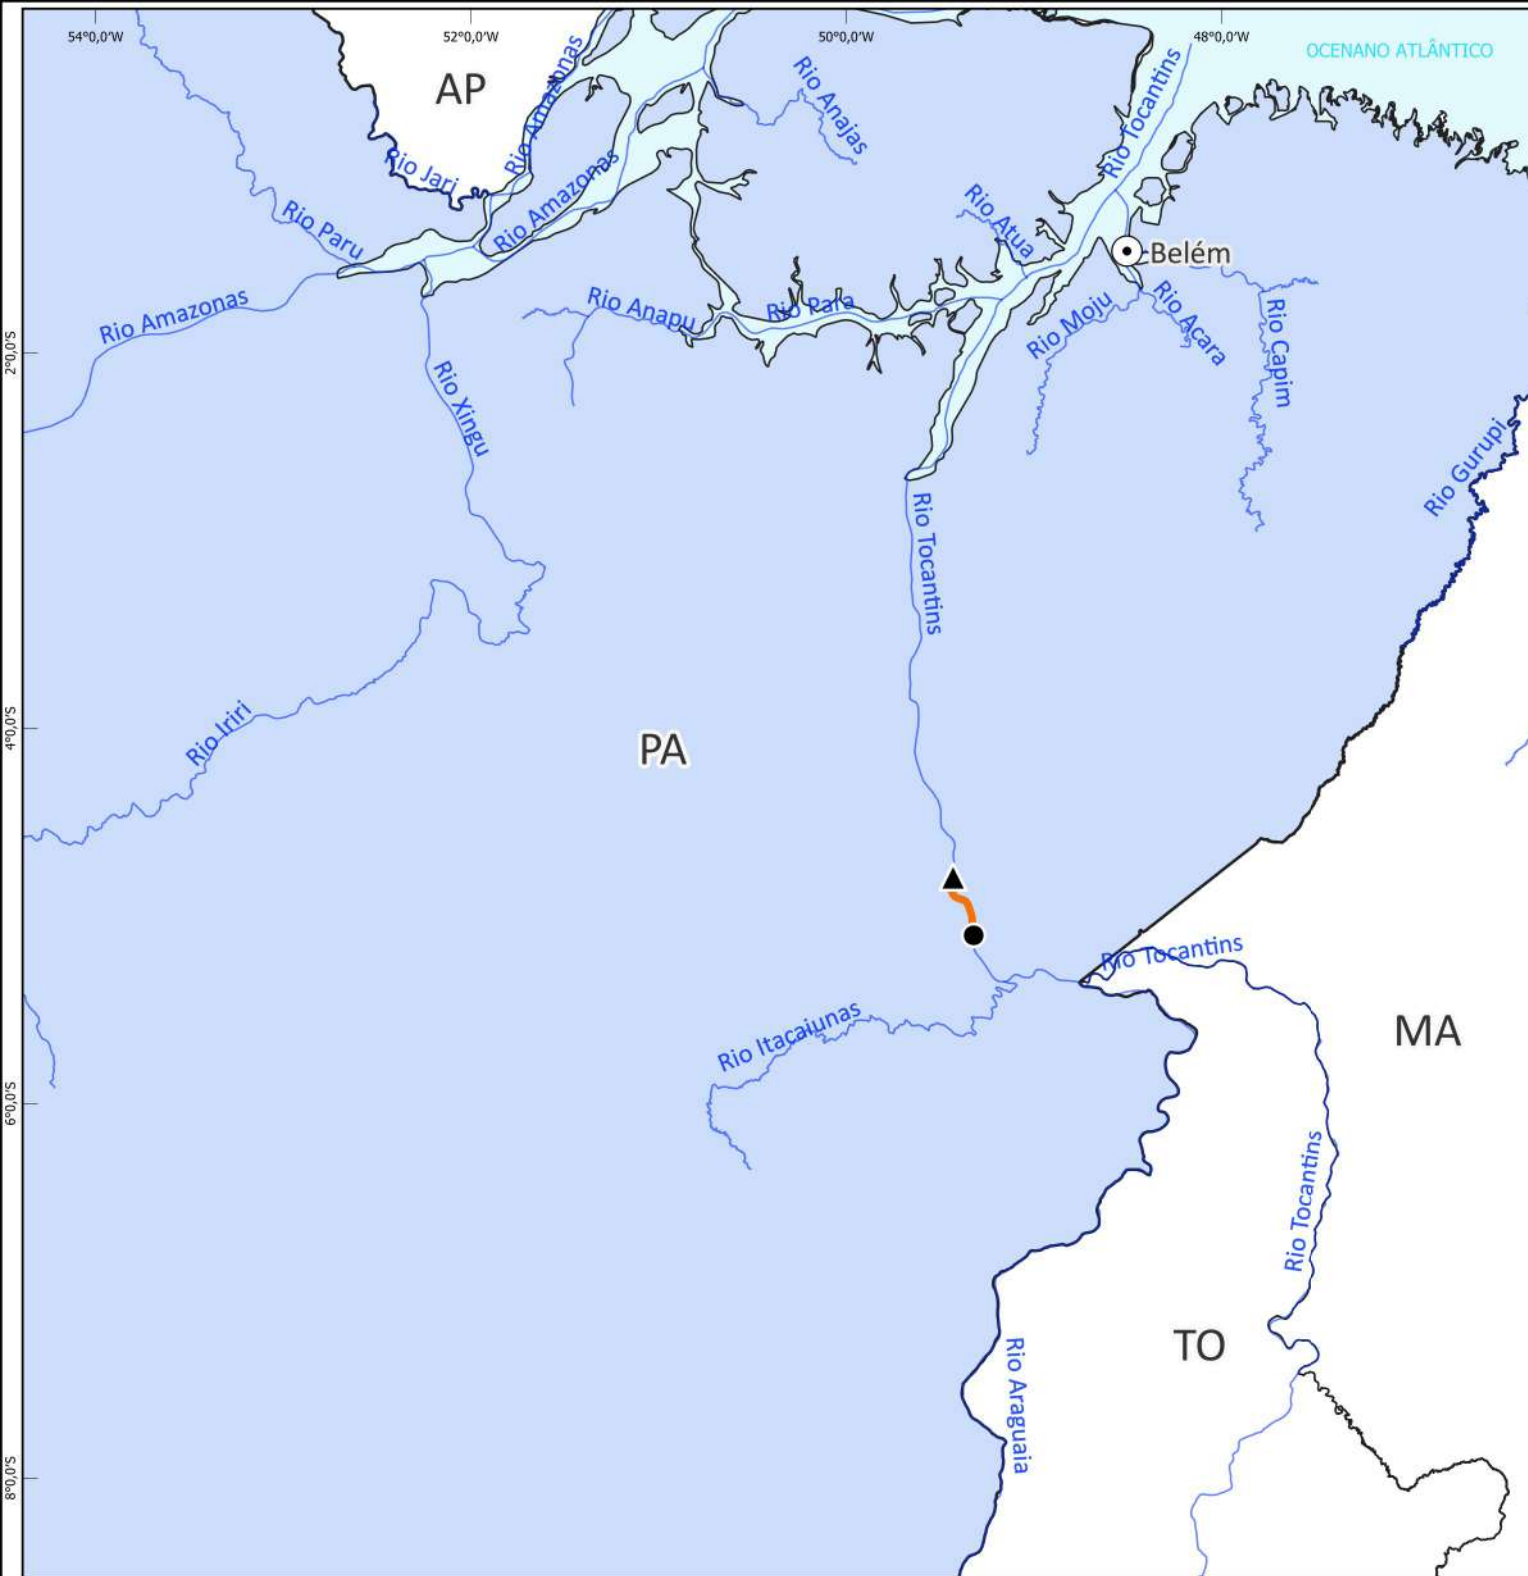

Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Hidrovia do Rio Tocantins - Dragagem do Pedral do Lourenço
- Início do Trecho - Pedral do Lourenço
- ▲ Final do Trecho - Pedral do Lourenço




100 0 100 km

1:4.200.000



Instrumentos de construção e recuperação																				
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (%)	
1	Derrocagem do Pedral do Lourenço	PA	Rio Tocantins HN-200	00 00245/2016	Consórcio DTA-O'Martin	16/06/2016	16/04/2025	R\$	996.212.623	R\$	18.887.934	2%	ATIVO	00 00599/2016	Consórcio Hidrotopo/ Caruso	09/11/2016	16/04/2025	R\$	21.452.574	13%
TOTAL GERAL								R\$	996.212.623	R\$	18.887.934	2%	TOTAL GERAL				R\$	21.452.574	13%	

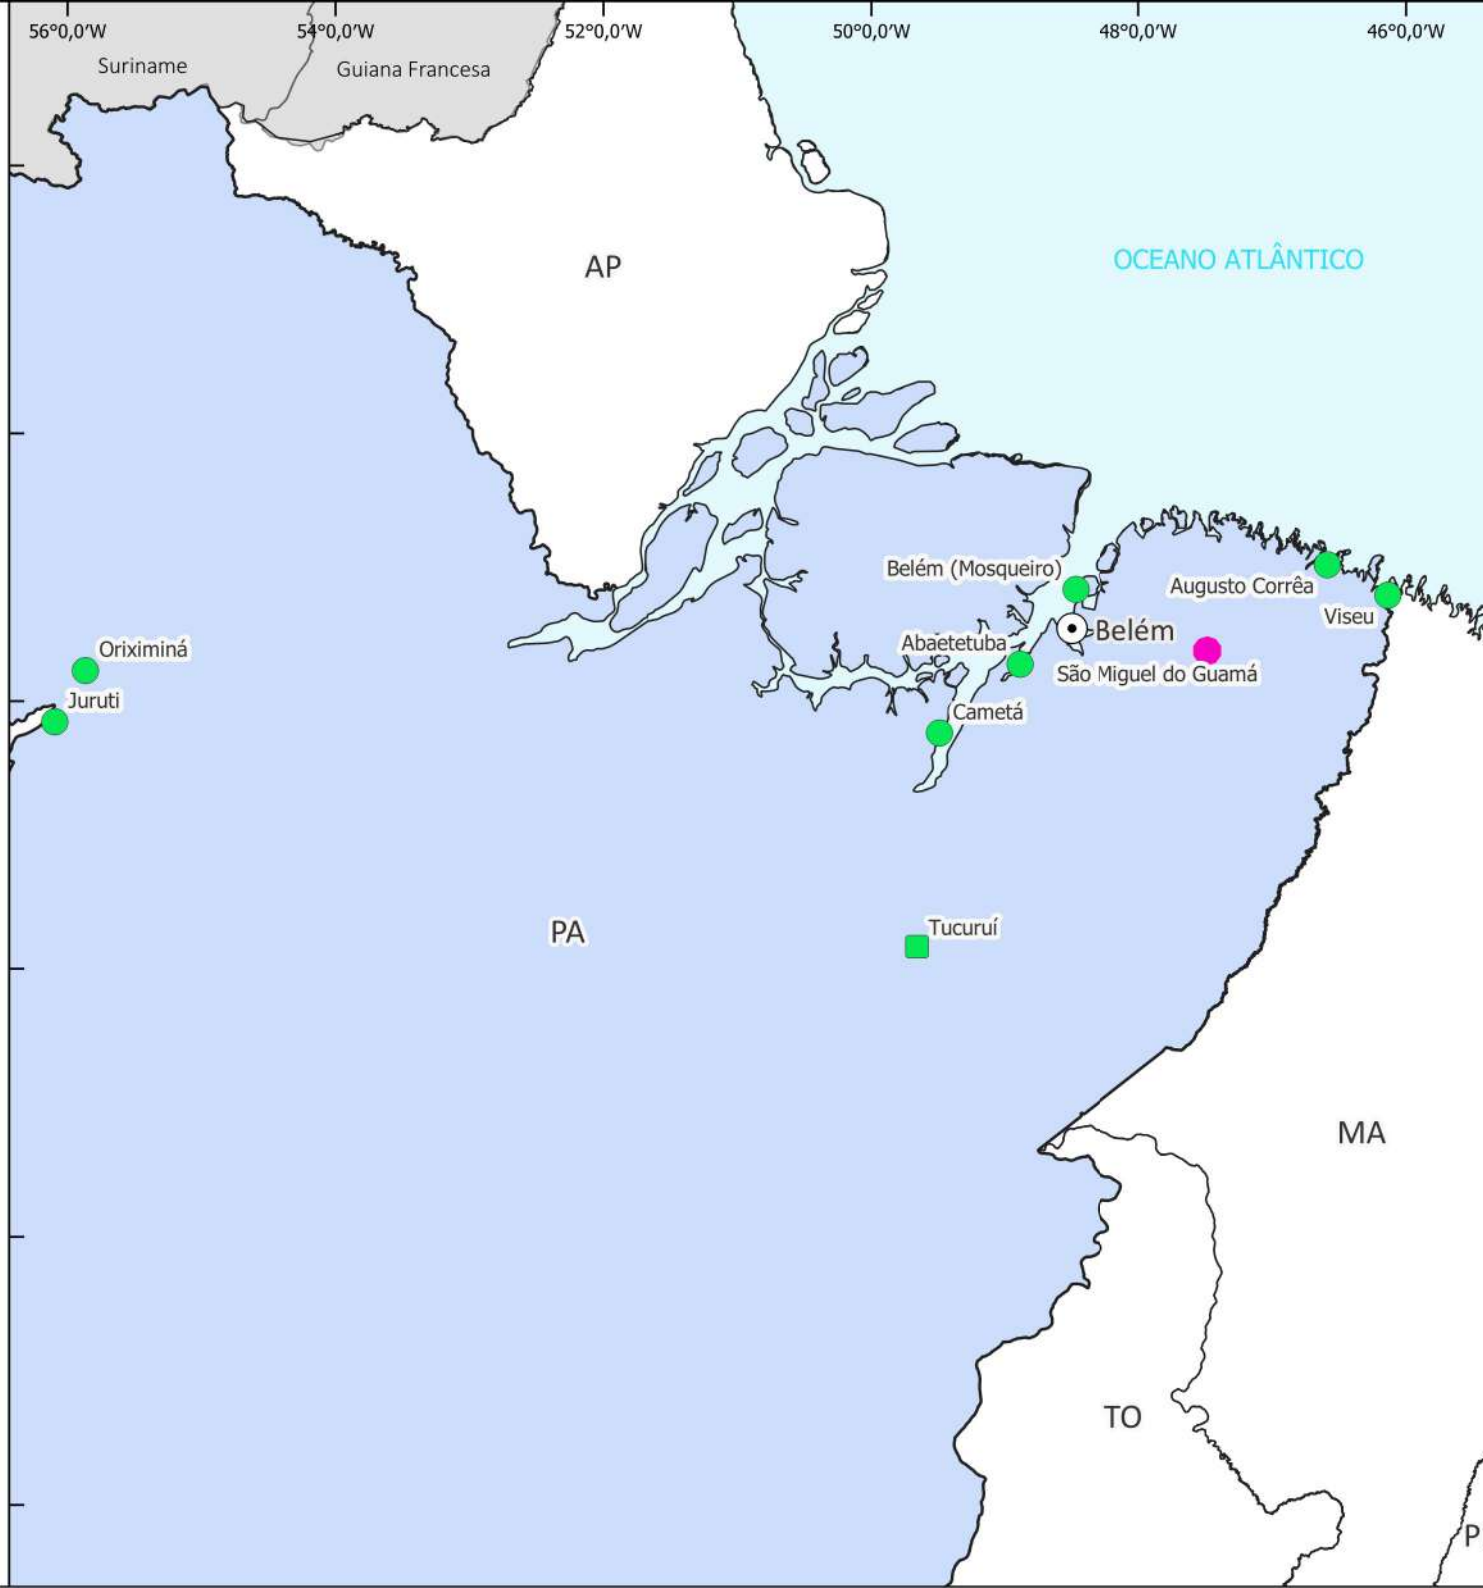


Legenda:

- ⊙ Capitais
- Instalação Portuária em Operação
- Instalação Portuária Delegada
- Eclusa em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	08	100%
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	08	100%

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	01	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	01	100%



120 0 120 km

1:10.000.000


Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção das Eclusa do Tucuruí	PA	Rio Tocantins HN-200	02 00800/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/02/2022	13/01/2027	R\$ 36.295.034	R\$ 21.135.004	58%	ATIVO	02 00096/2022	TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA	11/04/2022	11/04/2027	R\$ 7.319.891	52%
TOTAL GERAL								R\$ 36.295.034	R\$ 21.135.004	58%		TOTAL GERAL				R\$ 7.319.891	52%

Instrumentos de operação de IP4																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	IP4 Cobertas	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção das IP4 do Pará - O&M	PA	Bacia Tocantins-Araguaia	Abaetetuba/PA, Augusto Córrea/PA, Belém Mosqueiro/PA, Cametá/PA, Juruti/PA, Oriximiná/PA, Santarém/PA, São Miguel Do Guamá/PA, Viseu/PA	02 00696/2021	VILHENA SERVIÇOS LTDA	19/12/2021	17/10/2025	R\$ 22.060.877	R\$ 10.379.259	47%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL									R\$ 22.060.877	R\$ 10.379.259	47%		TOTAL GERAL				R\$ -	-

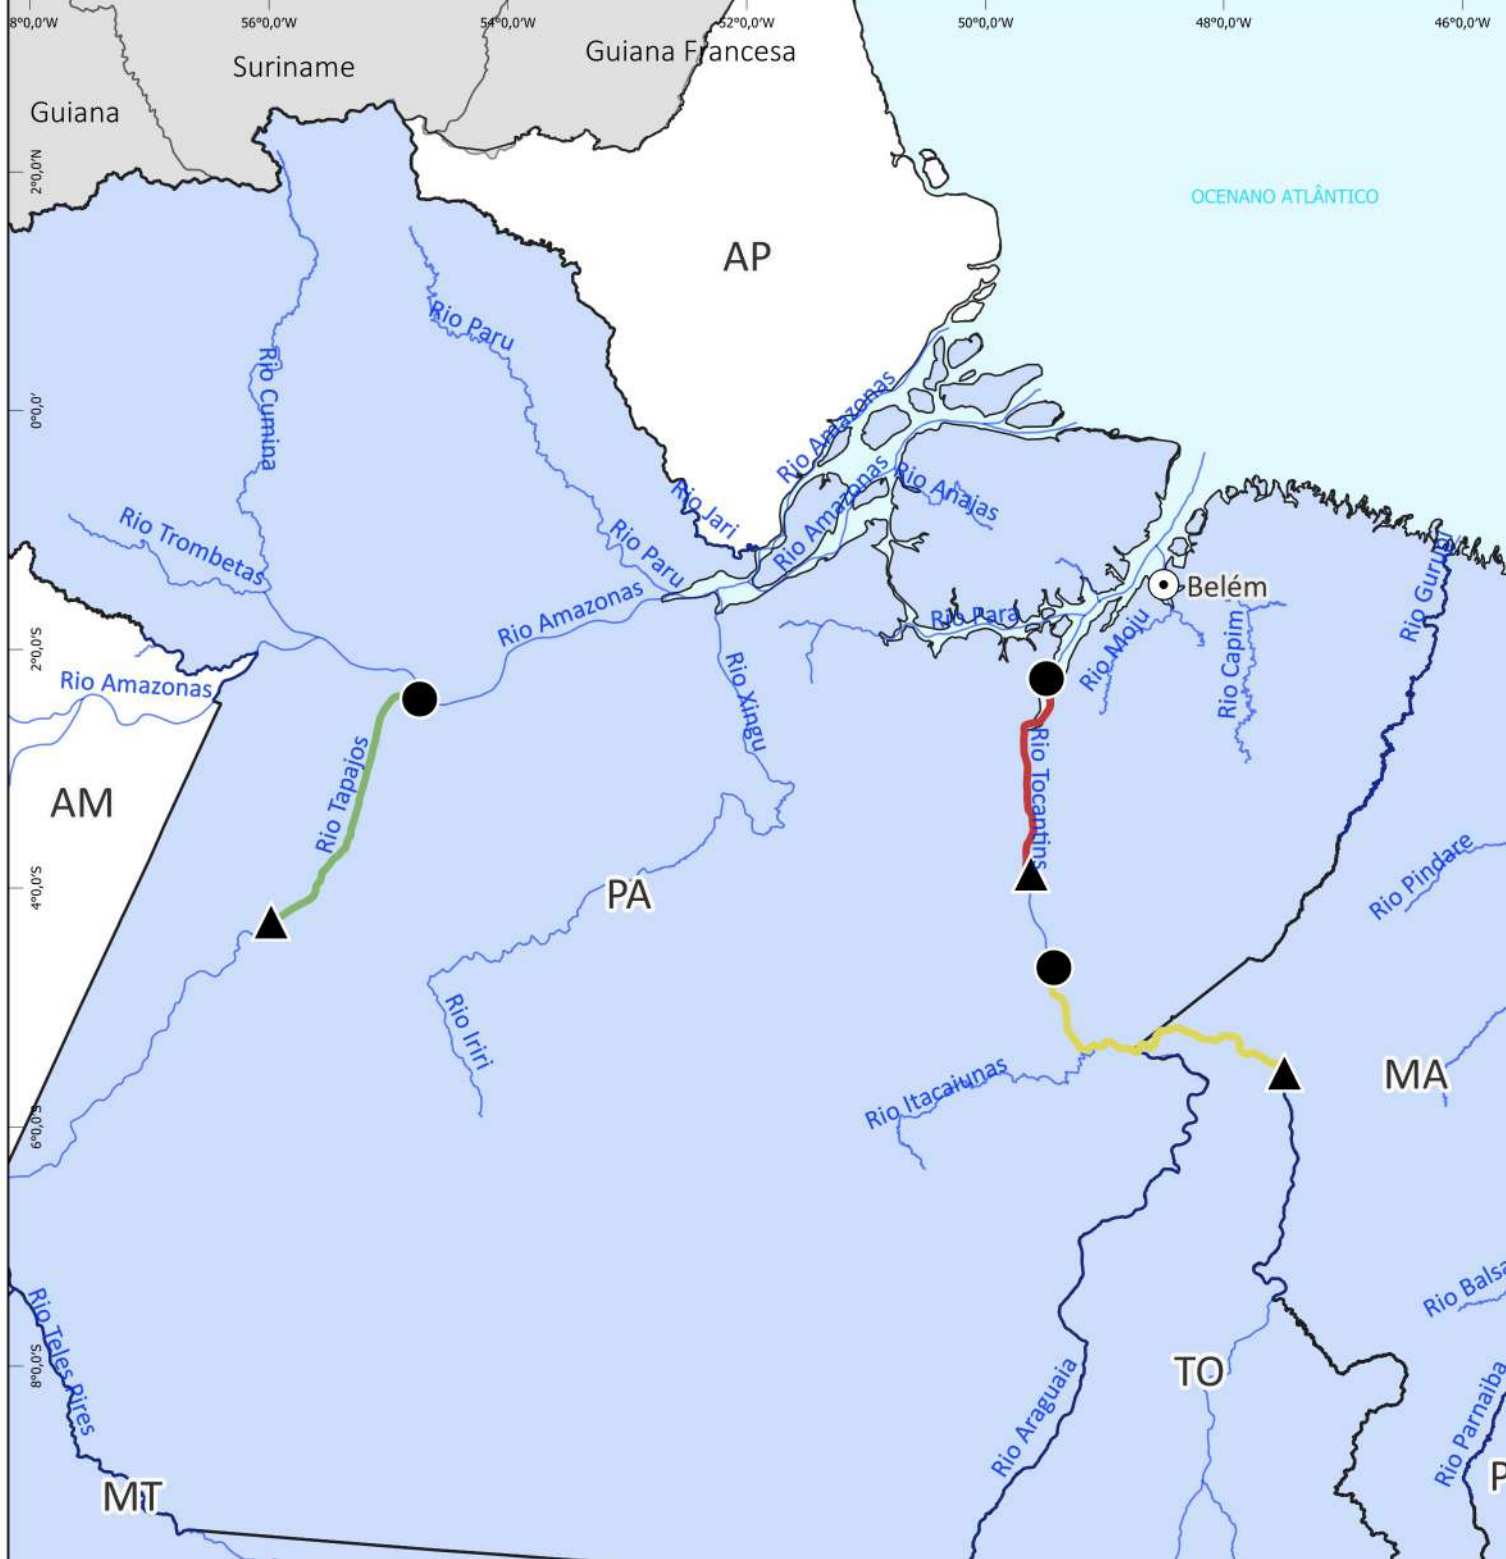

ESTUDOS, PROJETOS E PLANO DE MONITORAMENTO



- Legenda:**
- Capitais
 - Hidrovias
 - Início do Trecho
 - Fim do Trecho
 - Hidrovia do Rio Tapajós - PMH Lote Único
 - Hidrovia do Rio Tocantins - PMH Lote 01
 - Hidrovia do Rio Tocantins - PMH Lote 02

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	EVTEA e projetos na Hidrovia de Guamá-Capim	PA	Rio Guamá HN-201 e Rio Capim HN-203	00 00133/2017	CONSÓRCIO R.PEOTTA-HIDROTO- ENEFER	14/07/2017	04/01/2025	R\$ 4.099.517	R\$ 3.111.439	76%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	EVTEA Tapajós	PA	Rio Tapajós HN-106, Rio Teles Pires HN-110, Rio Juruena HN-107	00 00566/2015	CONSÓRCIO R.PEOTTA-HIDROTO- ENEFER	31/07/2015	31/12/2024	R\$ 19.077.670	R\$ 17.890.379	94%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tapajós	PA	Rio Tapajós HN-106	02 00922/2020	CHD-CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS LTDA.	15/01/2021	12/04/2026	R\$ 13.167.513	R\$ 7.998.116	61%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
4	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tocantins - Lote 2 (HN-200)	PA	Rio Tocantins (HN-200)	02 00234/2021	CONSÓRCIO PROGAIA/ENVIRONLINK	07/07/2021	07/07/2026	R\$ 6.900.414	R\$ 2.524.956	37%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
5	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tocantins - Lote 1 (HN-200)	PA	Rio Tocantins (HN-200)	02 00233/2021	CONSÓRCIO CONCREMAT/BELOV,	02/08/2021	19/07/2026	R\$ 8.181.498	R\$ 1.811.188	22%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 51.426.612	R\$ 33.336.078	65%		TOTAL GERAL				R\$ -	0%




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RO



IP4 Cai N'Água/RO

DNIT

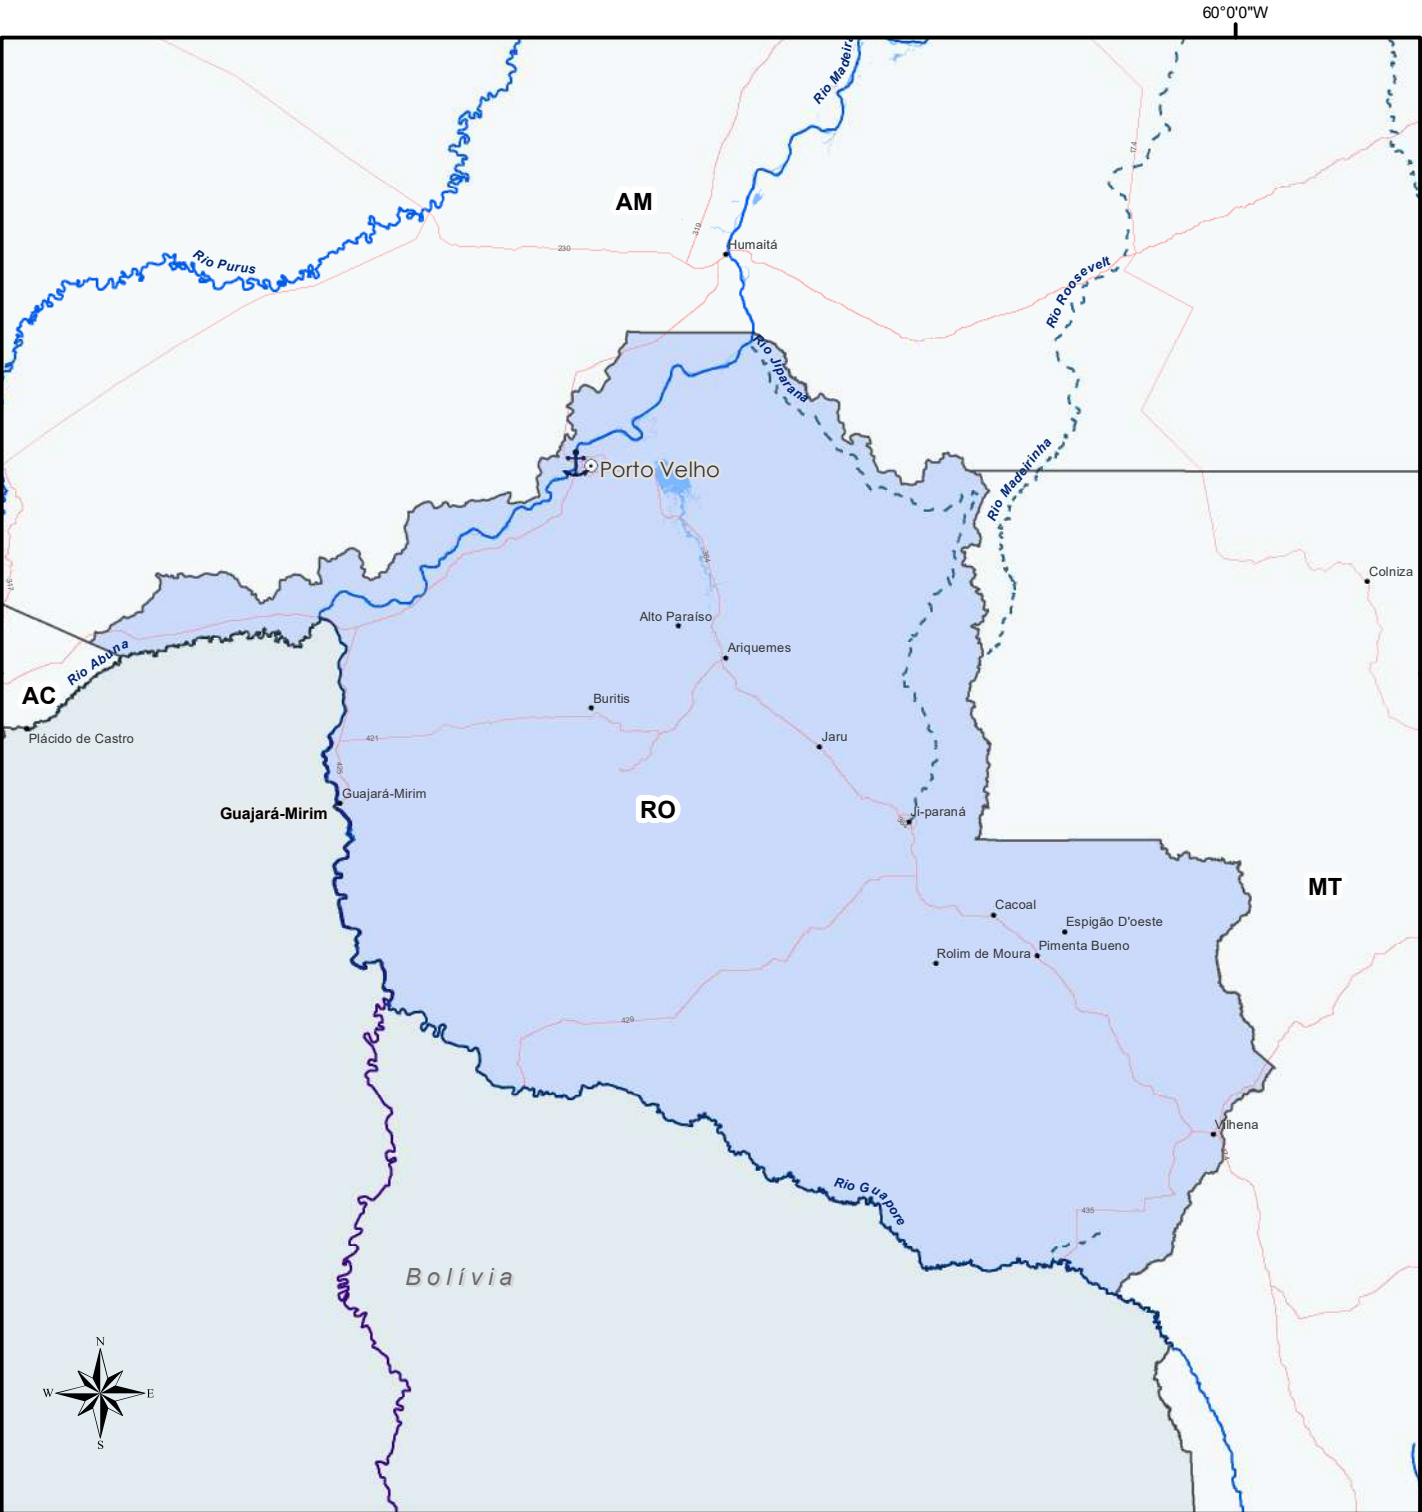

Superintendência Regional de Rondônia

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO




Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Rodovias
 - Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Intervenções		Quantidade
IP4 em construção		00

Obs: A Obra só será dada como concluída após emissão do Termo de Recebimento Definitivo.



Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem do Rio Madeira (HN-117)	RO	Rio Madeira HN-117	22 00220/2021	Consórcio Jan De Nul - JEED	18/06/2021	17/06/2025	R\$ 138.869.342	R\$ 112.352.571	81%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 2.292.901	72%	
2	Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM)	AM	Rio Madeira HN-117	22 00250/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/07/2022	29/09/2027	R\$ 9.723.224	R\$ 4.676.630	48%	ATIVO	22 00221/2021		08/06/2021	01/06/2025	R\$ 2.292.901	72%	
TOTAL GERAL								R\$ 148.592.566	R\$ 117.029.201	79%		TOTAL GERAL				R\$ 2.292.901	72%	

- Os trechos contemplados pelos serviços de Dragagem do Rio Madeira (HN-117) estão localizados nos Estados do Amazonas e Rondônia, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).
- Os serviços de Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM) estão localizados no Estado do Amazonas, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).



Legenda:

- ⊙ Capitais
- Hidrovias
- Instalação Portuária em Operação
- Instalação Portuária Fora de Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	01	50%
Instalações Portuárias Fora de Operação	01	50%
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	02	100%

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	-	-
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	-	-




100 0 100 km

1:3.650.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



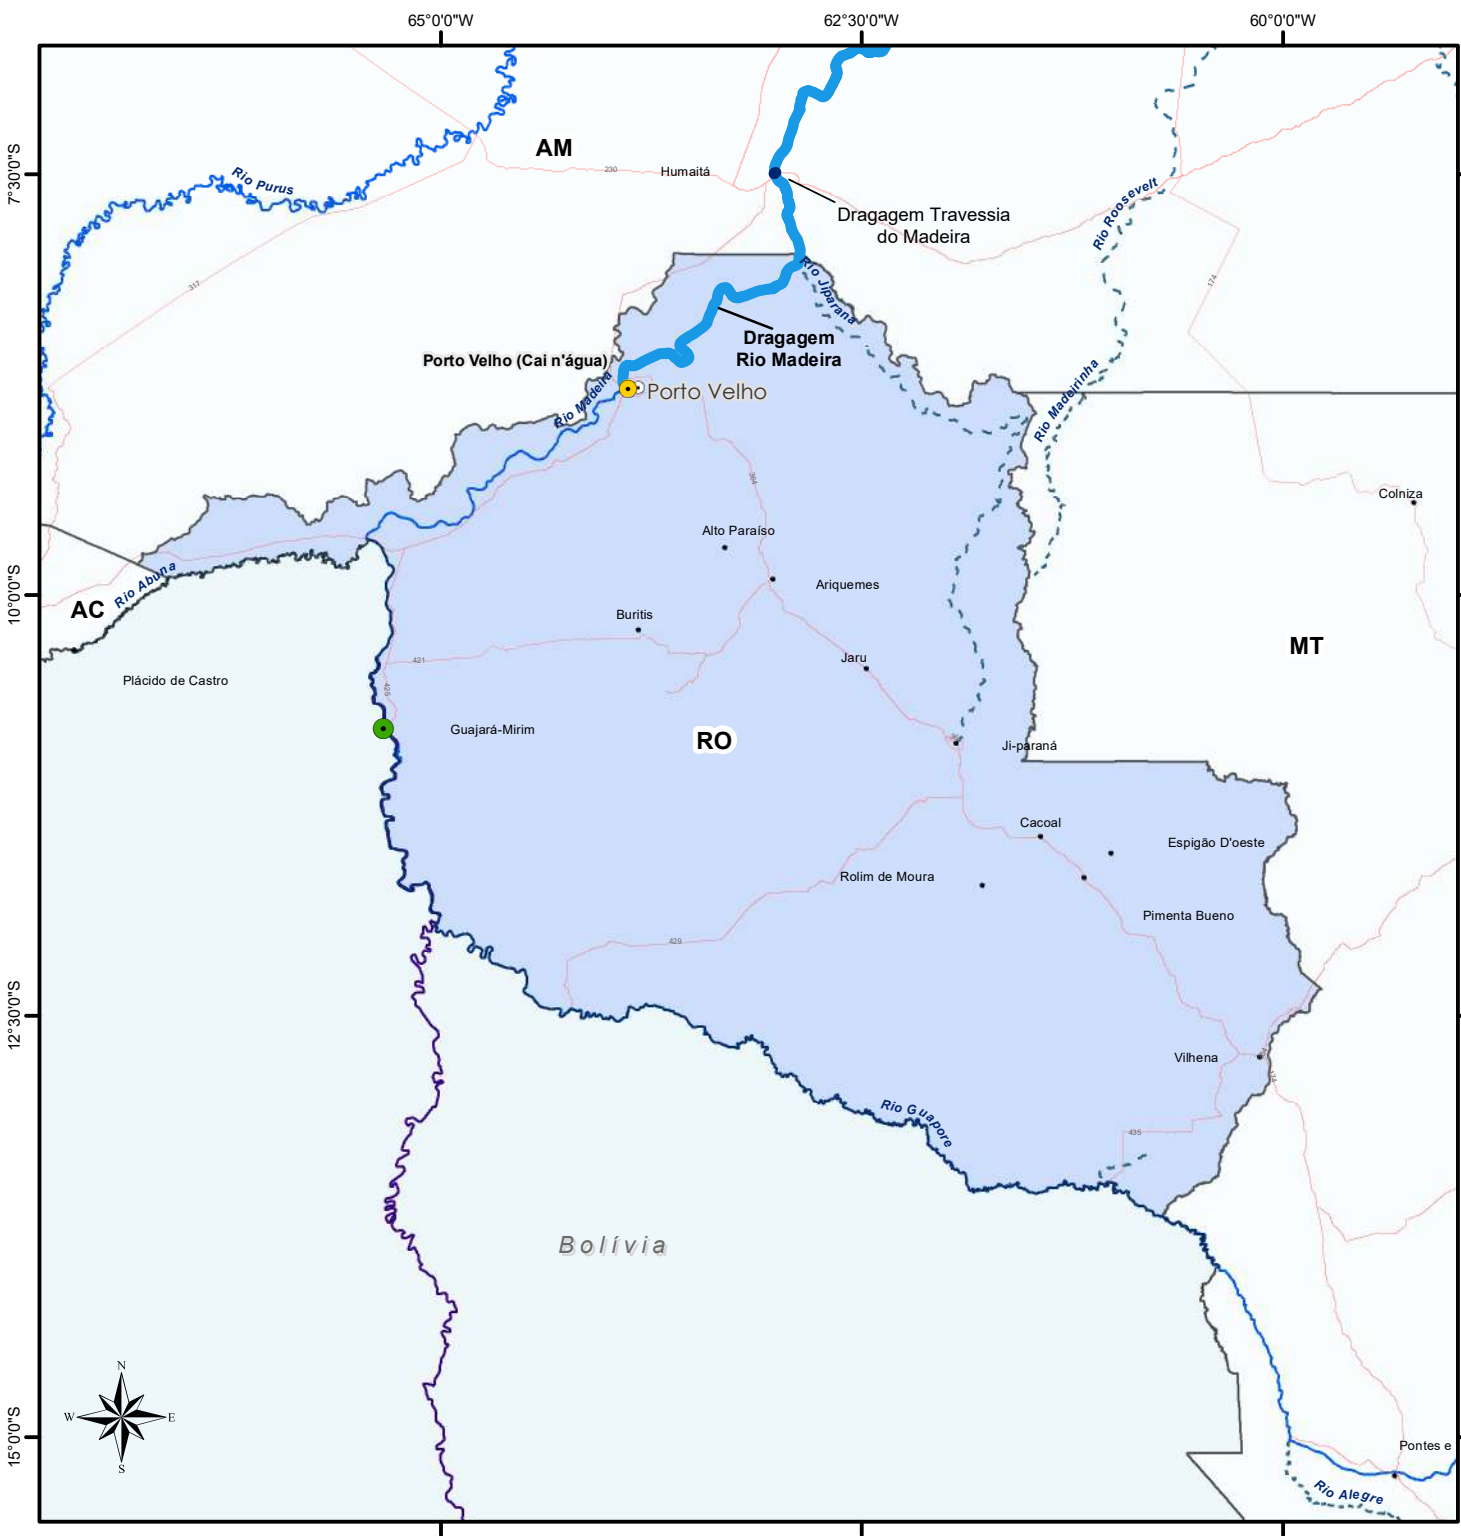

Superintendência Regional de Rondônia MANUTENÇÃO




Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Rodovias
 - Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte

- Concluídas em operação
- Concluídas fora de operação


Intervenções Aquaviárias		(km)
Dragagem Rio Madeira		620,0 km
Dragagem Travessia do Rio Madeira		8,35 km



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
	Dragagem do Rio Madeira (HN-117)	RO	Rio Madeira HN-117	22 00220/2021	Consórcio Jan De Nul - JEED	18/06/2021	17/06/2025	R\$ 138.869.342	R\$ 129.104.334	93%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 9.415.005	87%	
	Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM)	AM	Rio Madeira HN-117	22 00250/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/07/2022	29/09/2027	R\$ 9.723.224	R\$ 4.896.632	50%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 9.415.005	87%	
TOTAL GERAL								R\$ 148.592.566	R\$ 134.000.966	90%		TOTAL GERAL					R\$ 9.415.005	87%

- Os trechos contemplados pelos serviços de Dragagem do Rio Madeira (HN-117) estão localizados nos Estados do Amazonas e Rondônia, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).
- Os serviços de Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM) estão localizados no Estado do Amazonas, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).

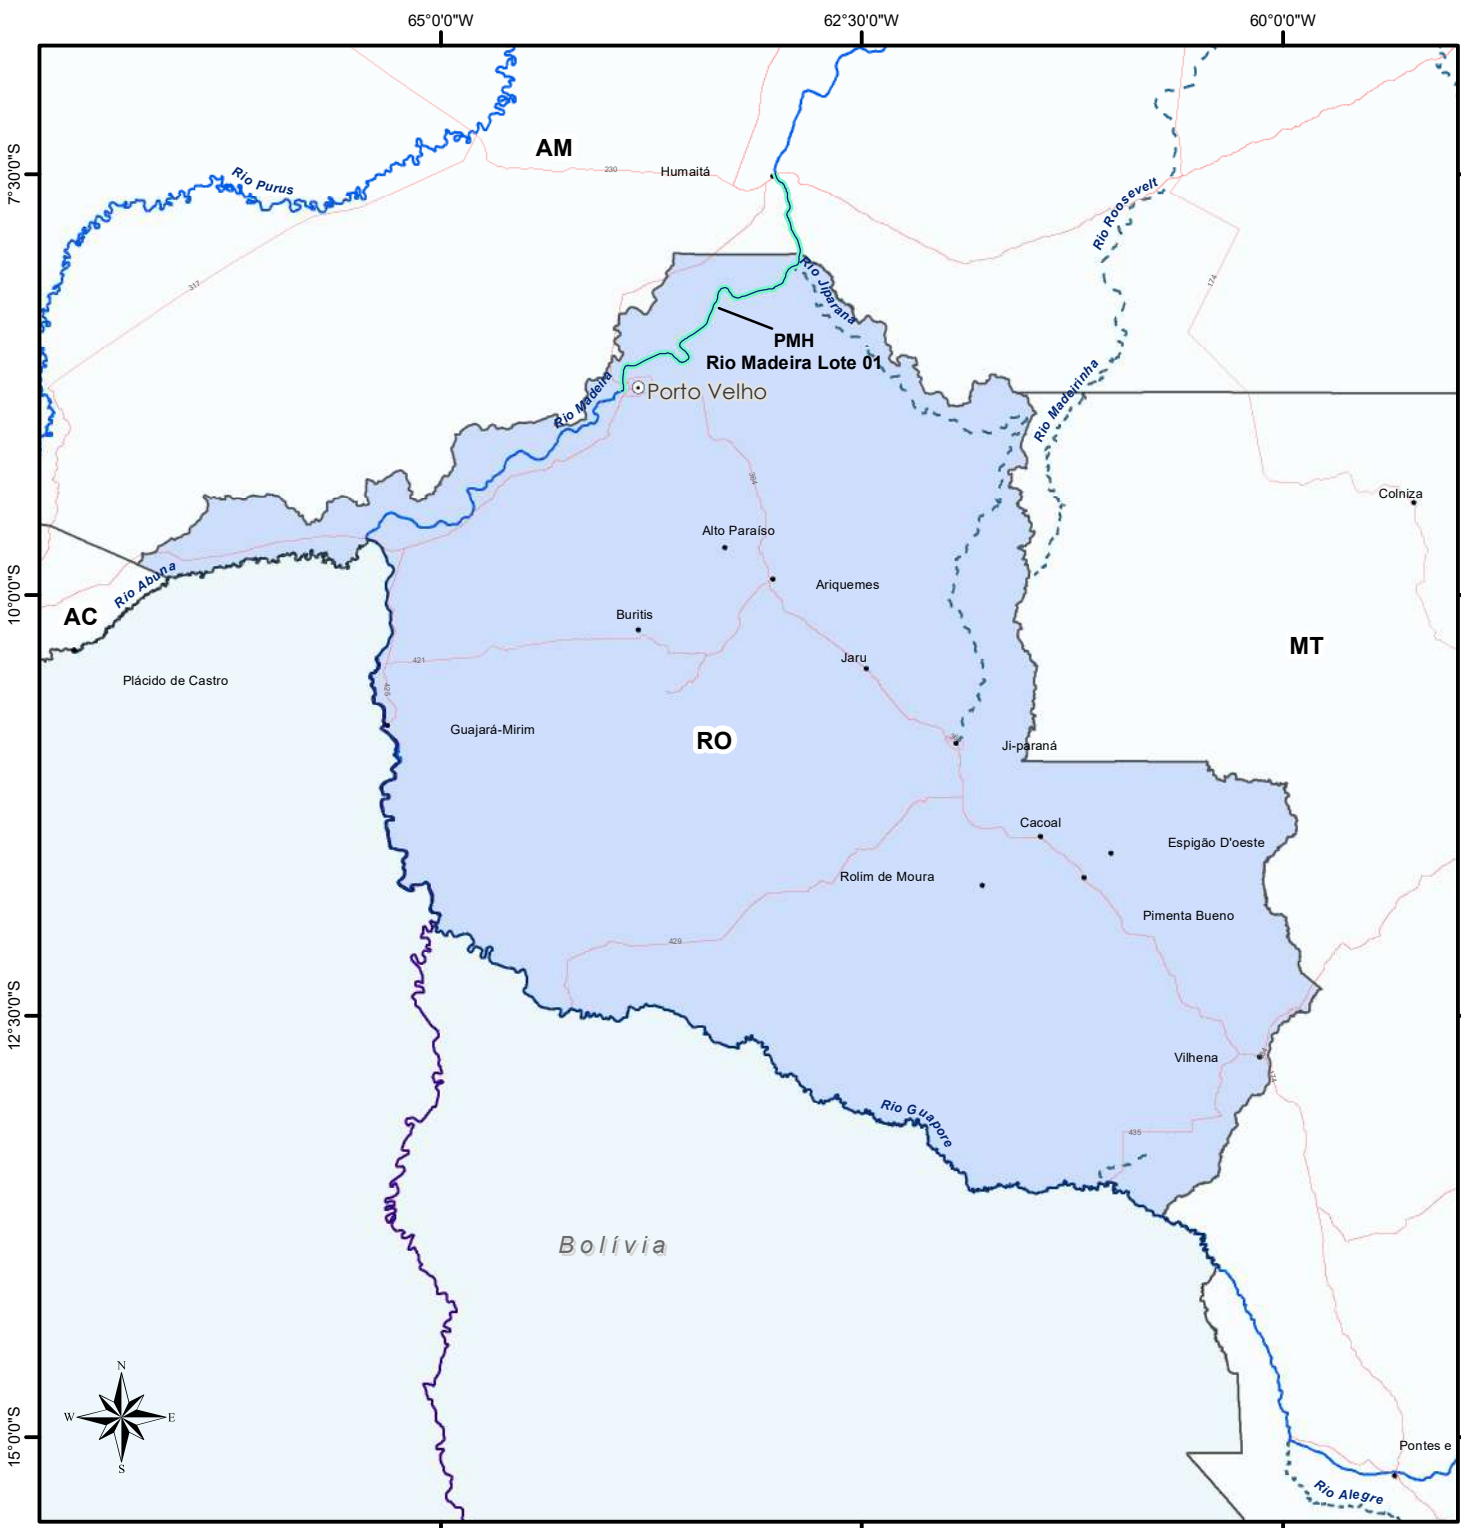

Superintendência Regional de Rondônia

ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Estudos e Projetos (km)

PMH Rio Madeira	245,0 km
-----------------	----------



1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 1	AM/RO	Rio Madeira HN-117	22 00908/2020	CHD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS LTDA	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 14.054.411	R\$ 6.752.928	48%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 14.054.411	R\$ 6.752.928	48%		TOTAL GERAL				R\$ -	0%



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RR

DNIT

IP4 Caracará/RR

64°0,0'W

62°0,0'W

60°0,0'W

58°0,0'W

56°0,0'W

OCEANO ATLÂNTICO




OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

**Legenda:**

- Capitais
- Hidrovias
- Instalação Portuária em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	01	100%
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	01	100%

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	-	-
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	-	-



120 0 120 km

1:10.000.000Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



Instrumentos de operação de IP4																				
		UF	Rio (HN)	IP4 Cobertas	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)		
Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 6)	AM	Rio Amazonas	Autazes/AM, Barcelos/AM, Caracará/RR, Careiro da Várzea/AM, Itacoatiara - Novo Terminal/AM, Itacoatiara/AM, Novo Airão/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, São Raimundo-Manaus/AM	01 00032/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/02/2021	19/01/2025	R\$	50.917.622	R\$	48.527.570	95%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/11/2021	18/05/2026	R\$	16.429.854	85%
TOTAL GERAL									R\$	50.917.622	R\$	48.527.570	95%	TOTAL GERAL			R\$	16.429.854	85%	



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RS



Eclusa de Bom Retiro do Sul/Rs

DNIT

54°0,0'W

52°0,0'W

SC



OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



Legenda:


⊙ Capitais

— Hidrovias

■ Eclusa em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	-	-
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	-	-

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	04	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	04	100%



50 0 50 km

1:1.550.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



Uruguai

Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção das Eclusas do Sul (HN-706,HN-710)	RS	Rio Jacuí HN -706 e Rio Taquari HN -710	10 00655/2021	PAMPULHA ENGENHARIA LTDA	24/11/2021	23/11/2026	R\$ 39.742.010	R\$ 21.842.240	55%	ATIVO	10 00560/2021	RUMO ENGENHARIA	24/11/2021	23/11/2026	R\$ 3.199.682	66%
TOTAL GERAL								R\$ 39.742.010	R\$ 21.842.240	55%		TOTAL GERAL				R\$ 3.199.682	66%

* Eclusas do Sul (Eclusa de Fandango, Eclusa Anel de Dom Marco, Eclusa Amarópolis e Eclusa Bom Retiro do Sul) .

54°0,0'W

52°0,0'W

SC




OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Eclusa em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	-	-
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	-	-
Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	04	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	04	100%



50 0 50 km

1:1.550.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



Uruguai



Instrumentos de manutenção de hidrovía																				
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)		
1	Dragagem do Rio Taquari	RS	Rio Taquari HN-710	10 00109/2021	JEED ENGENHARIA LTDA	25/03/2021	24/03/2026	R\$	38.773.036	R\$	13.426.258	35%	ATIVO	10 00272/2023	CHD - Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas	20/06/2023	20/08/2026	R\$	5.945.071	48%
TOTAL GERAL									R\$	38.773.036	R\$	13.426.258	35%		TOTAL GERAL			R\$	5.945.071	48%




SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA



Legenda:

- Capitais
- Hidrovias Nacionais
- Hidrovia do Rio Taquari
- Início do Trecho
- Fim do Trecho



100 0 100 km

1:2.600.000



Instrumentos de sinalização																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Sinalização do Rio Taquari	RS	Rio Taquari HN-710	10 00436/2023	SEA AND PORT SERVIÇOS LTDA.	14/08/2023	15/10/2026	R\$ 4.682.603	R\$ 1.599.281	34%	ATIVO	10 00272/2023	CHD - Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas LTDA	20/06/2023	20/08/2026	R\$ 5.945.071	48%	
TOTAL GERAL								R\$ 4.682.603	R\$ 1.599.281	34%		TOTAL GERAL				R\$ -	-	




MODERNIZAÇÃO DE ECLUSAS



Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- ≡ Eclusas (Modernização)



1:2.600.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
SIRGAS 2000
Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Projeto de Modernização Eclusa Fandango	RS	Rio Jacuí HN-706	00 00799/2019	Consórcio MAGNA-THEMAG	29/11/2019	10/07/2025	R\$ 1.138.214	R\$ 624.131	55%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	Projeto de Modernização Eclusa Anel de Dom Marco	RS	Rio Jacuí HN-706	00 00798/2019	Consórcio MAGNA-THEMAG	20/06/2023	10/07/2025	R\$ 930.478	R\$ 521.346	56%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Segurança de Barragens (Anel de Dom Marco e Fandango)	RS	Rio Jacuí HN-706	10 00271/2023	LEV BRASIL - ESTUDOS E PROJETOS EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO MAR LTDA	01/08/2023	31/03/2025	R\$ 562.567	R\$ 448.261	80%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 2.631.259	R\$ 1.593.738	61%		TOTAL GERAL				R\$ -	0%

Obs.: Projetos das Eclusas de Amarópolis e Bom Retiro do Sul - Convertidos em Anteprojetos (devido rescisão de contrato das Eclusas de Amarópolis e Bom Retiro do Sul, os produtos elaborados subsidiaram anteprojetos para publicação de RDCI para as reformas dessas Eclusas).



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária


SR SP



Eclusa de Jupiá/SP

DNIT

Instrumentos de construção e recuperação																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Derrocagem de Nova Avanhandava	SP	Rio Tietê HN-913	TC 589/2014	DH - SP	25/03/2015	30/06/2026	R\$ 435.220.907	R\$ 59.253.793	14%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 435.220.907	R\$ 59.253.793	14%		TOTAL GERAL				R\$ -	-

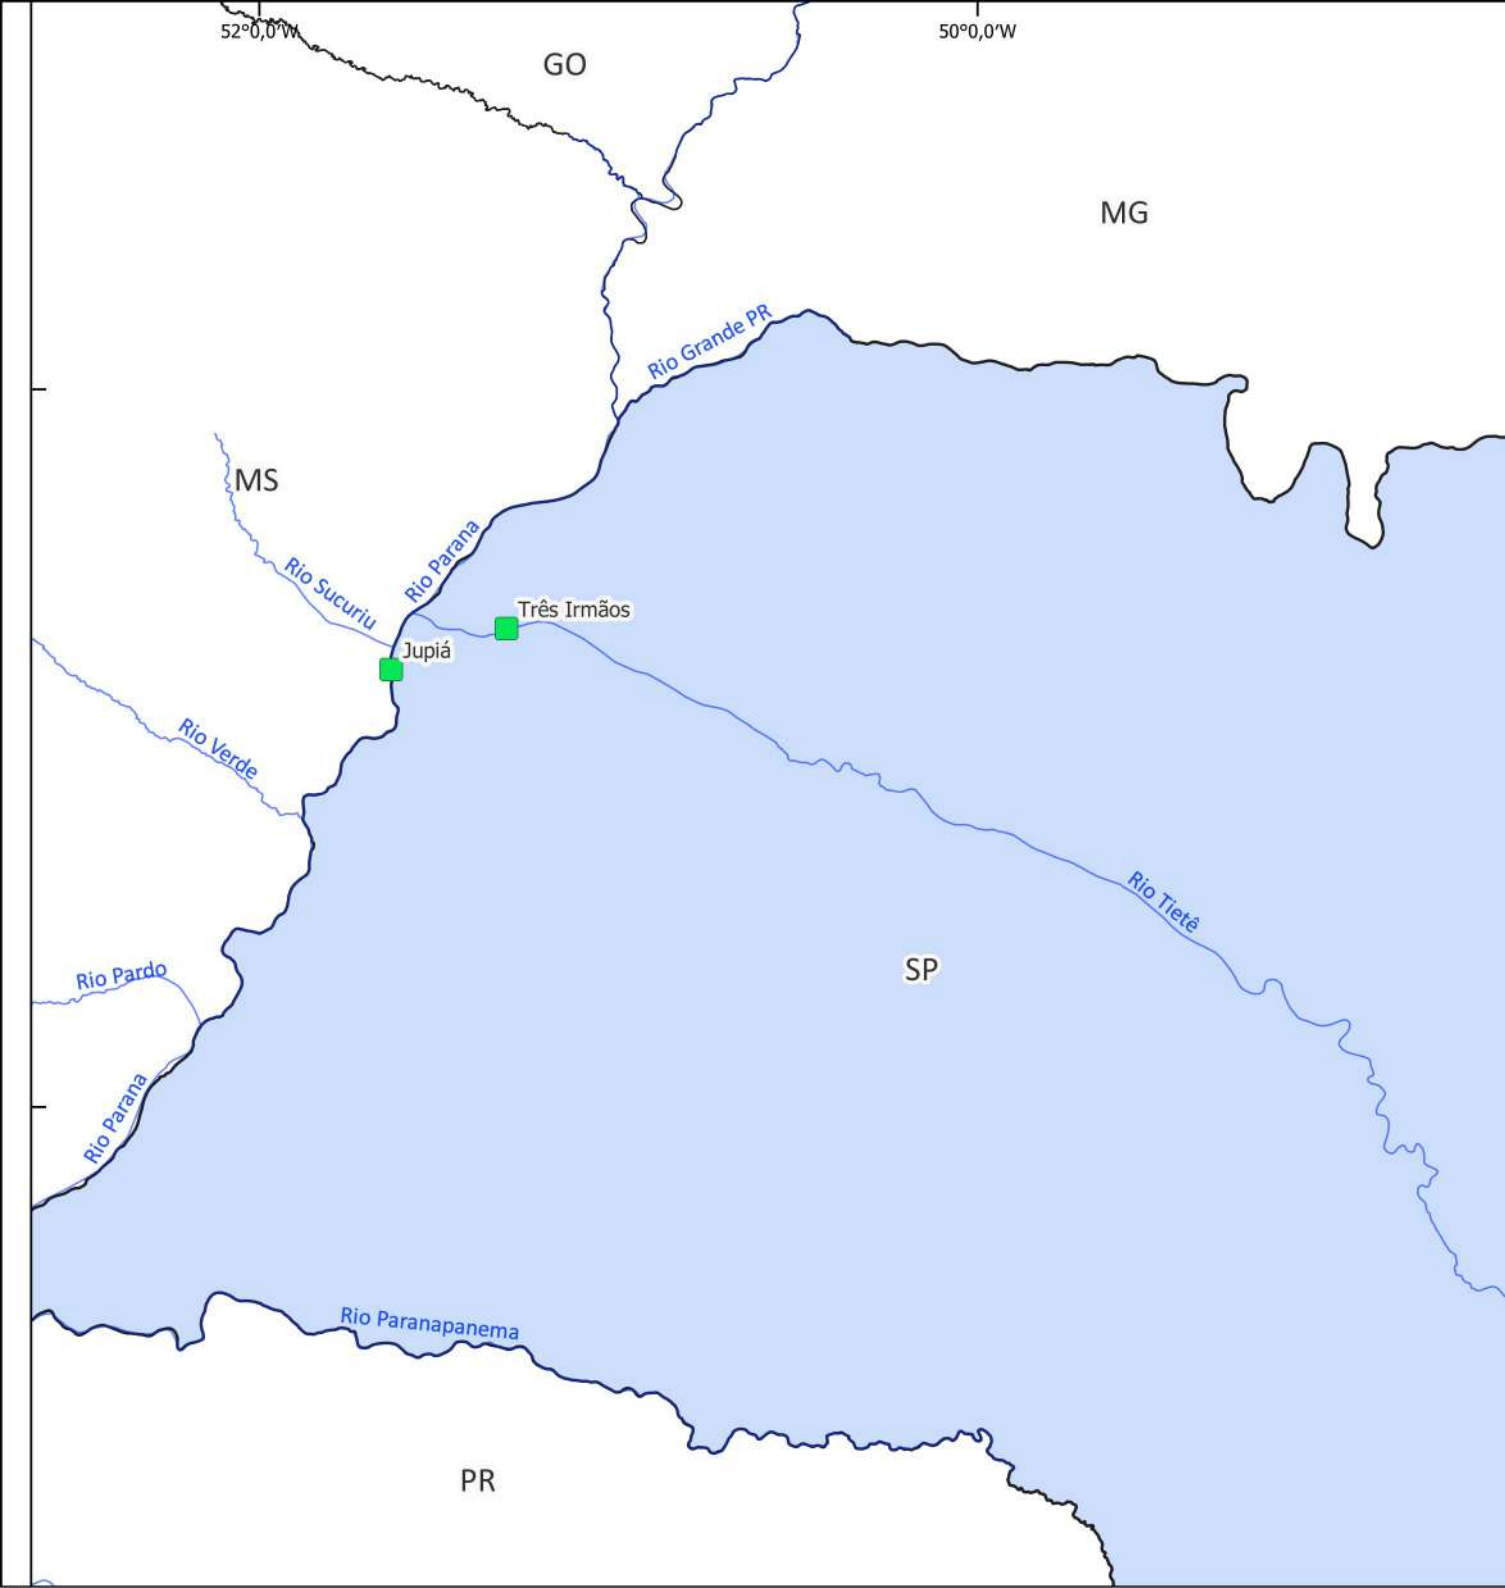


Legenda:

 Hidroviárias

 Eclusa em Operação

Instalações Portuárias	Quantidade	%
Instalações Portuárias em Operação	-	-
Instalações Portuárias Fora de Operação	-	-
Instalações Portuárias em Operação Restrita	-	-
Total	-	-

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	02	100%
Eclusas Fora de Operação	-	-
Total	02	100%



54 0 54 km


1:1.780.000

Sistema de Coordenadas Geográficas

SIRGAS 2000

Fonte: Diretoria de Infraestrutura Aquaviária (DAQ/DNIT)



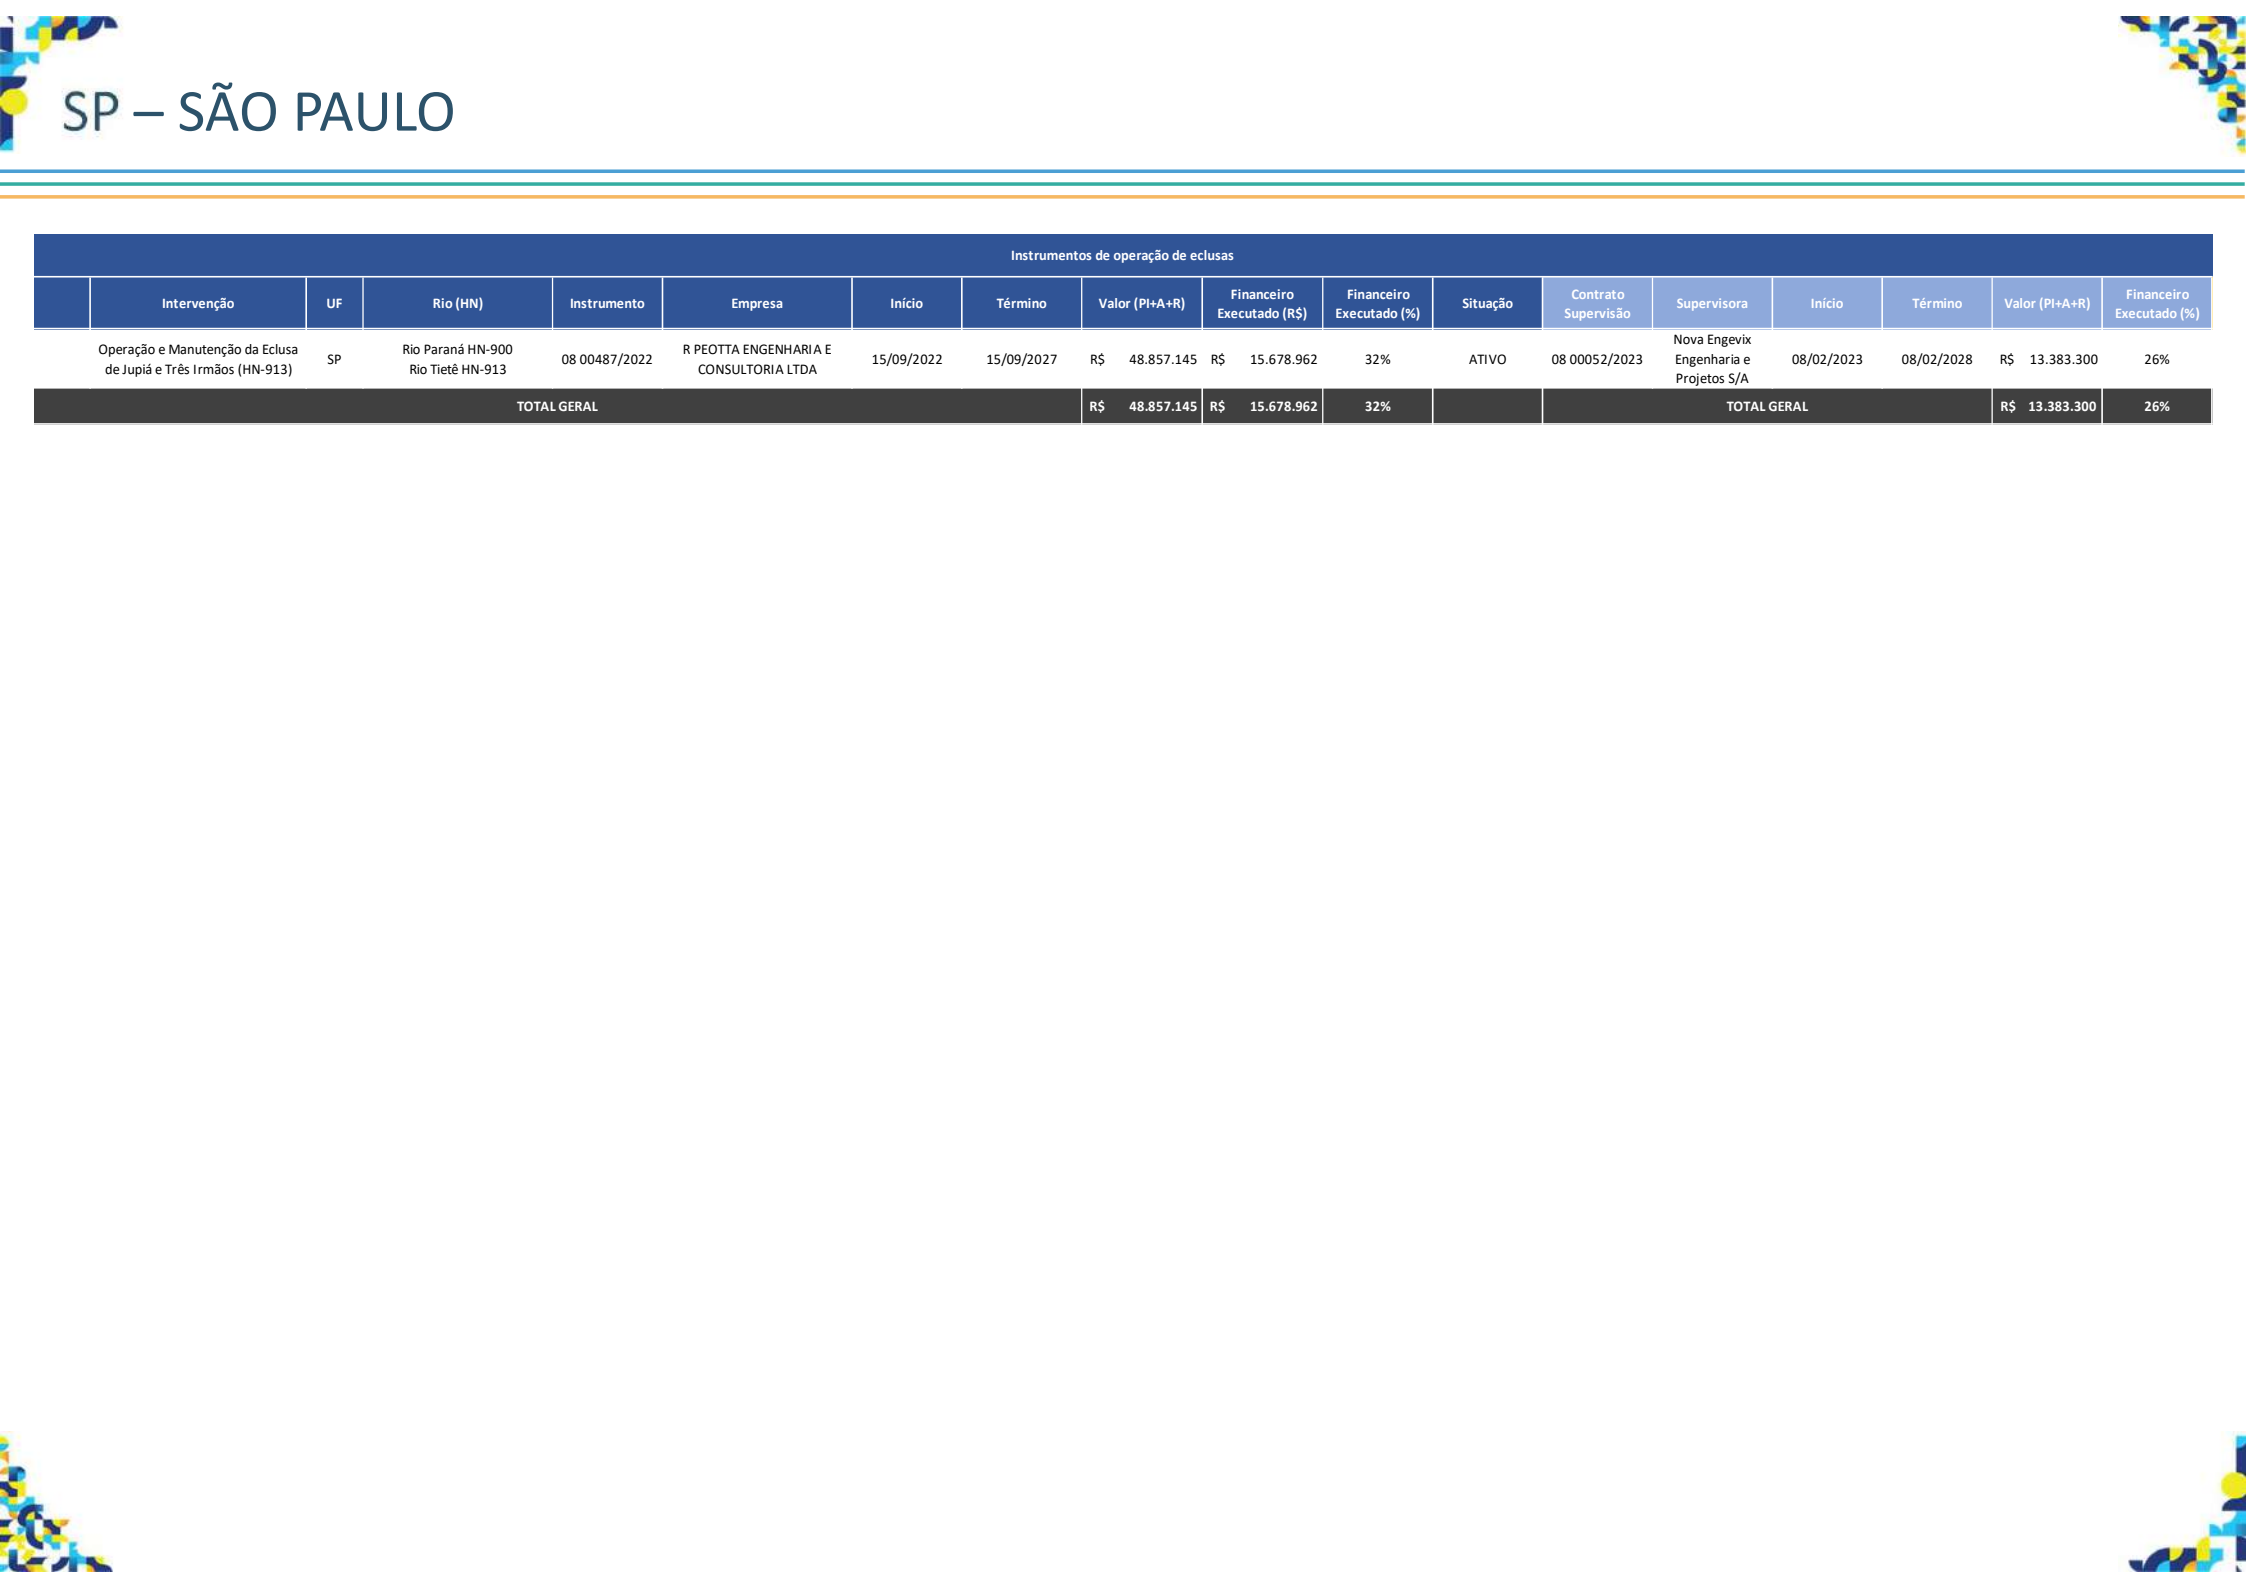

Instrumentos de operação de eclusas																	
	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Operação e Manutenção da Eclusa de Jupia e Três Irmãos (HN-913)	SP	Rio Paraná HN-900 Rio Tietê HN-913	08 00487/2022	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15/09/2022	15/09/2027	R\$ 48.857.145	R\$ 15.678.962	32%	ATIVO	08 00052/2023	Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A	08/02/2023	08/02/2028	R\$ 13.383.300	26%
TOTAL GERAL								R\$ 48.857.145	R\$ 15.678.962	32%		TOTAL GERAL				R\$ 13.383.300	26%

SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA



Legenda:

- Capitais
- Hidrovias
- Hidrovia do Rio Paraná
- Início do Trecho - Lote A
- Início do Trecho - Lote B / Fim do Trecho - Lote A
- Fim do Trecho - Lote B



Instrumentos de manutenção de hidrovía																	
			io (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovía do Rio Paraná - Lote A (Trechos I e II)		aná HN-900	08 00544/2021	CONSTRUTORA AJM EIRELI	09/02/2022	05/11/2026	R\$ 22.339.446	R\$ 4.817.995	22%	ATIVO	08 00035/2022	CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND-INTERNAVE	09/02/2022	04/02/2027	R\$ 12.890.244	57%
	Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovía do Rio Paraná - Lote B (Trechos III e IV)		aná HN-900	08 00548/2021	HIDROTOP CONSTRUCOES, IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	09/02/2022	05/11/2026	R\$ 32.417.682	R\$ 7.424.274	23%	ATIVO	08 00035/2022	CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND-INTERNAVE	09/02/2022	04/02/2027	R\$ 12.890.244	57%
TOTAL GERAL								R\$ 54.757.127	R\$ 12.242.269	22%		TOTAL GERAL				R\$ 12.890.244	57%








ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

INDICADORES



DNIT

INDICADORES ESTRATÉGICOS



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS


Indicadores Táticos														Indicadores Operacionais					
Indica1doSR/ Mês	1.1 Índice de obras de Instalações Portuárias concluída com termo de recebimento provisório		2.1 Índice de obras em hidroviás concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		4.2 % de Instalações Portuárias com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de Instalações Portuárias (Dias)		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório		4.2.1 Movimenta ção de passageiros nas Instalações Portuárias	5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas	5.1.2 Nº de Eclusagens
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Realizado
jan/25	0	2	8	14	0	1	100%	100%	87%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	4.017,00 t	42
fev/25																			
mar/25																			
abr/25																			
mai/25																			
jun/25																			
jul/25																			
ago/25																			
set/25																			
out/25																			
nov/25																			
dez/25																			
																	-	4.017,00 t	42

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais	
Indicador / Mês	1.1 Índice de obras de Instalações Portuárias concluída com termo de recebimento provisório		4.1 Índice de obras de recuperação de Instalações Portuárias concluídas		4.2 % de Instalações Portuárias com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de Instalações Portuárias (Dias)		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório	4.2.1 Movimentação de passageiros nas Instalações Portuárias
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Realizado
jan/25	0	1	0	0	100%	100%	84%	85%	0	-
fev/25										
mar/25										
abr/25										
mai/25										
jun/25										
jul/25										
ago/25										
set/25										
out/25										
nov/25										
dez/24										
Total Acumulado - 2025										-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃO (SR-MA)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas - 2025 (acumulado)




Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/25	0	1
fev/25		
mar/25		
abr/25		
mai/25		
jun/25		
jul/25		
ago/25		
set/25		
out/25		
nov/25		
dez/25		

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2. Índice de intervenções de obras hidroviárias concluídas – 2025 (acumulado)



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/25	0	2
fev/25		
mar/25		
abr/25		
mai/25		
jun/25		
jul/25		
ago/25		
set/25		
out/25		
nov/25		
dez/25		

INDICADORES ESTRATÉGICOS

3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas – 2025 (acumulado)

Meta

1



INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

[illegible]

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RONDÔNIA (SR-RO)

INDICADORES ESTRATÉGICOS


2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas – 2025 (acumulado)

Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de implantação/ampliação hidroviárias para a SR em 2025.

3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas – 2025 (acumulado)

1
Meta

0



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/25	0	1
fev/25		
mar/25		
abr/25		
mai/25		
jun/25		
jul/25		
ago/25		
set/25		
out/25		
nov/25		
dez/25		

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais	
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas	5.1.2 Nº de Eclusagens
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Realizado
jan/25	0	1	0	0	100%	100%	100%	100%	300,00 t	18
fev/25										
mar/25										
abr/25										
mai/25										
jun/25										
jul/25										
ago/25										
set/25										
out/25										
nov/25										
dez/25										
Total Acumulado - 2025									300,00 t	18

Glossário

Ancoradouro: É o local onde a embarcação ancora, lança a âncora ao largo. Também é chamado de fundeadouro.

Atracadouro: É uma estrutura de apoio náutico avançada em direção à água, suspensa, apoiada em pilares ou flutuante, utilizada como apoio à atracação, embarque, desembarque e trânsito de pessoas e embarcações, para atividades de turismo, lazer e pesca ou para o apoio de um emissário submarino ou subfluvial.

Barragem: É uma barreira artificial feita em cursos hídricos para retenção de grandes quantidades de água. Sua utilização visa sobretudo abastecer zonas residenciais, agrícolas, industriais, produzir energia elétrica ou regularizar um caudal a fim de permitir a navegação. É o mesmo que açude ou represa.

Canal de Acesso: É o canal que liga o alto-mar com as instalações portuárias, podendo ser natural ou artificial e dotado de profundidade adequada além da devida sinalização, com o objetivo de dar acesso das embarcações ao porto.

Confluência: Local de junção entre trechos de drenagem.

Demolição: Ato de se destruir alguma construção seguindo normas técnicas e de segurança a fim de dar outro destino ao espaço antes ocupado por ela.

Derrocagem: Consiste em um processo de retirada ou destruição de pedras ou rochas submersas, que impedem a plena navegação. A sua execução visa promover a readequação do canal com finalidade de economicidade.

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária – DIR: Responsável pela manutenção, recuperação e construção de vias de transporte interurbanas federais.

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP: Responsável pelo gerenciamento dos investimentos plurianuais, por prover estatísticas do setor de infraestrutura e subsidiar com o informações o ministério de infraestrutura.

Diretoria Administração e Finanças – DAF: Responsável pela administração das atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, TI, RH e aos recursos logísticos.

Diretoria de Infraestrutura Ferroviária – DIF: Responsável pela realização de obras na malha ferroviária e gestão do patrimônio ferroviário.

Dolphins: Colunas de concreto posicionadas no rio para proteção de pilar, além de servir de referência para o operador da eclusa e, em alguns casos, de atracadouros de embarcações.

Glossário

Dragagem: Serviço de desassoreamento, alargamento, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagoas, mares, baías e canais de acesso a portos. O principal objetivo é realizar a manutenção ou aumentar a profundidade.

Dragagem de Manutenção: Obra/serviço de engenharia destinado a limpeza, desobstrução e remoção de material do fundo de corpos d'água, com o objetivo de garantir a segurança da navegação.

Eclusa: É uma obra de engenharia que permite que embarcações superem desníveis em cursos de água. São normalmente construídas em barragens, quedas de águas, corredeiras ou hidrelétricas.

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA: Para o DNIT, compreendem o conjunto de estudos necessários à verificação da existência de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a execução de uma determinada obra de infraestrutura de transportes, ou conjunto delas, nos segmentos considerados, dentre as alternativas propostas, consubstanciado, principalmente nos estudos de tráfego, capacidade da hidrovia e seu nível de serviço, aliados às pesquisas complementares e outras similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de engenharia, socioeconômicos e ambientais necessários.

Fiscalização: Atividade de competência do DNIT, visando a assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de leis, instrumentos de outorga, regulamentos e demais normas pertinentes, a ser realizada por servidor ou de entidade ou órgão conveniado, habilitado para o exercício da fiscalização.

Hidrovia: São os trechos de rios navegáveis com canal delimitado, sinalizado e com gabarito hidroviário mantido, onde ocorrem o transporte aquático ou aquaviário realizado por embarcações (barcos, navios, barcas) que, por sua vez, podem ser: Marítimas (mares), Fluviais (rios) e Lacustres (lagos).

Implantação de Hidrovia: Obras ou serviços de engenharia a serem executadas com o objetivo de tornar o corpo hídrico uma hidrovia.

Infraestrutura Aquaviária: Conjunto de áreas e recursos destinados a possibilitar a operação segura de embarcações, compreendendo o canal de acesso, estruturas de atracação, bacia de evolução e respectivo balizamento e sinalização náutica.

Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4: Instalação portuária localizada fora da poligonal do Porto Organizado, utilizada no embarque e desembarque de passageiros e cargas, que operam exclusivamente com embarcações de navegação interior.

Glossário

Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

Ponte de Acesso: É uma estrutura que conecta a infraestrutura portuária ao continente.

Sistema Hidroviário Nacional: É a relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano Nacional de Viação.

Sistema Nacional de Viação: É constituído pela infraestrutura viária e pela estrutura operacional dos diferentes meios de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Superintendência Regional – SR: São órgãos descentralizados, aos quais compete programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execução de planos e programas visando ao diagnóstico, ao prognóstico e às ações nas áreas de engenharia e operações, rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias, objetivando garantir a fluidez do tráfego e a navegabilidade dos rios, em condições operacionais e econômicas ideais, com segurança e zelo pela preservação do meio ambiente.



ANEXOS

Divisão de Trechos e Subtrechos dos Corpos Hídricos priorizados

Está disponibilizado no endereço “https://linktr.ee/daq_dnit”, podendo também ser acessado pelo QR code abaixo, o trabalho desenvolvido pela setorial COIAQ, presente na Nota Técnica nº 139/2021, que detalha a divisão dos trechos e subtrechos dos corpos hídricos priorizados, aprimorando a precisão das suas extensões, bem como otimizando o mapeamento geográfico.

DIVISÃO DE TRECHOS E SUBTRECHOS DOS CORPOS HIDRÍCOS PRIORIZADOS				
Nome	Código	Nº Trecho	Ext. (km)	Descrição do Trecho
Lagoa dos Patos	HN-700	33	82,40	Do município de Tapes (RS), até a confluência com o lago Guaíba.
Lagoa dos Patos	HN-700	22	10,90	Do município de São Lourenço do Sul (RS), até a confluência com o rio Camaquã/RS.
Rio Tietê	HN-913	190	60,90	Do município de Mogi das Cruzes, até a confluência com o Rio Baquirivu Guacu.
Lagoa dos Patos	HN-700	32	29,20	Do município de Arambare (RS), até o município de Tapes (RS).
Rio São Francisco	HN-500	150	22,70	Do limite estadual entre Bahia e Sergipe, na jusante da represa Xingo, até a confluência com o rio Sal/BA.
Rio Parnaíba	HN-400	95	48,70	Do final do Trecho 9.4, até a confluência com o rio Riozinho/PI.
Rio Parnaíba	HN-400	94	50,10	Do final do Trecho 9.3, até o 50 km a montante.
Rio Solimões	HN-132	94	25,90	Do final do trecho 9.3, até a cidade de Jutai/IP4/AM, próximo a confluência com o rio Jutai/AM.
Rio Tapajós	HN-106	93	46,50	Do final do trecho 9.2, até a confluência com os rios Teles Pires e Juruena.
Rio Solimões	HN-132	93	50,20	Do final do trecho 9.2, até 50km a montante.
Rio Tapajós	HN-106	92	50,00	Do final do trecho 9.1, próximo ao igarapé Traíra, até 50km a montante.
Rio Parnaíba	HN-400	92	44,30	Do final do Trecho 9.1, até a cidade de Ribeiro Gonçalves/PI/Ponte.
Rio Solimões	HN-132	83	40,60	Do final do trecho 8.2, até a confluência com o rio Juruá/AM.
Rio Solimões	HN-132	82	50,20	Do final do trecho 8.1, até 50km a montante.
Rio Parnaíba	HN-400	73	10,70	Do final do Trecho 7.2, até a cidade de Notorque/MA.
Rio Madeira	HN-117	72	28,30	Do final do trecho 7.1 próximo a confluência com o igarapé Boca do
Total			33.447,70	

Data de Atualização: 30/06/2022 | Frequência de Atualização: Pontual

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Powered by



Acesso ao painel com a divisão de trechos e subtrechos dos corpos hídricos priorizados



ESCANEE-ME
