



ATLAS

DNIT

Infraestrutura Aquaviária



MARÇO | 2021

PRESIDENTE DO BRASIL

Jair Messias Bolsonaro

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Tarcísio Gomes de Freitas

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –DNIT

Antônio Leite dos Santos Filho – Diretor Geral

Euclides Bandeira de Souza Neto – Diretor Substituto da Diretoria Executiva

Lucas Alberto Vissotto Júnior – Diretor de Infraestrutura Rodoviária Substituto

Luiz Guilherme Rodrigues de Mello – Diretor de Planejamento e Pesquisa

Fernanda Gimenez Machado Faé – Diretora Substituta de Administração e Finanças

Marcelo Almeida Pinheiro Chagas – Diretor de Infraestrutura Ferroviária

DIRETORA DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

Karoline Brasileiro Quirino Lemos

COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS AQUAVIÁRIAS

Rodrigo Moraes Português de Souza

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO E OPERAÇÕES AQUAVIÁRIAS

Gleilson Mendes Nunes - Substituto



SUMÁRIO

1. Intervenções Aquaviárias no Brasil

1. Bacias Hidrográficas
2. Construção e Recuperação
3. Operação
4. Manutenção
5. Sinalização
6. Estudos e Projetos

2. Intervenções Aquaviárias por Superintendência Regional¹

3. INDICADORES

4. GLOSSÁRIO

ANEXO

¹Superintendências Regionais classificadas em ordem alfabética.

Atlas de Infraestrutura Aquaviária

No dia 17 de junho de 2020, entrou em vigor o Decreto de nº 10.367, de 22 de maio de 2020, que altera Estrutura Regimental do DNIT. A partir disso, as intervenções aquaviárias foram divididas entre as superintendências regionais que correspondem à unidade federativa.

O atlas é composto por instrumentos contratuais ativos e paralisados com atuação dentro do Sistema Nacional de Viação – SNV (Lei federal 12.379 de 06 de janeiro de 2011), sob responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária – DAQ.

As tabelas e mapas presentes no Atlas são referentes aos dados do mês anterior, sendo atualizados sempre no dia 15 do mês anterior a esta publicação.

Os instrumentos contratuais são referentes à execução de:

- obras de implantação e recuperação portuárias e aquaviárias;
- operação e manutenção de portos, hidrovias e eclusas;
- manutenção e sinalização das hidrovias;
- estudos e projetos em hidrovias e portos.

A estrutura do Atlas propõe a apresentação das intervenções aquaviárias, com base no tipo de atividade realizada:

- Construção e Recuperação;
- Operação;
- Manutenção;
- Sinalização;
- Estudos e Projetos.

MODAL DO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO (SNV)

Legenda

● Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias SNV

Hidrovias

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

— SNV

— Hidrografia

Fonte:
IBGE: Hidrografia escala 1:2.500.000. Limite Estadual, Limite dos países América do Sul.
www.inde.gov.br
DNIT: PNV: Lei 5.917 de 10 de setembro de 1973
e SNV: Lei n.º 12.379 de 06 de janeiro de 2011 - Rodovias, Ferrovias e Hidrovias.
<http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo>
- Superintendências Regionais conforme decreto n.º 10.367 de 22 de maio de 2020.

550 275 0 550 km

1:25.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.



BACIAS HIDROGRÁFICAS

Legenda

○ Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias SNV

Hidrovias

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

— SNV

Bacias Hidrográficas

- Amazônica
- Atlântico Leste
- Atlântico NO Ocidental
- Atlântico NO Oriental
- Atlântico Sudeste
- Atlântico Sul
- Paraguai
- Paraná
- Parnaíba
- São Francisco
- Tocantins - Araguaia
- Uruguai

Fonte:
IBGE: Hidrografia escala 1:2.500.000. Limite Estadual,
Limite dos países América do Sul. Bacias Hidrográficas ano 2020.
www.inde.gov.br
DNIT: PNV: Lei 5.917 de 10 de setembro de 1973
e SNV: Lei n.º 12.379 de 06 de janeiro de 2011 -
Rodovias, Ferrovias e Hidrovias.
<http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo>
- Superintendências Regionais conforme decreto
n.º 10.367 de 22 de maio de 2020.

550 275 0 550 km

1:25.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.






CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- Portos Organizados**
DNIT
Demais
- Total Nacional: 37**
04 10,8 %
33 89,2 %
- Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4**
Concluídas em operação
Concluídas fora de operação
- SNV**
Ferrovias
Rodovias SNV
- Hidrovias**
Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
SNV

Intervenções		Quantidade
IP4 em construção		13
Obra de IP4 paralísada		00
Obra de IP4 inacabada		01
Obra de Eclusa inacabada		01
Dolphin (obra de proteção de pilar) ponte BR 262/MS		01
Terminal de Passageiros Porto de Maceió		01
Dragagem dos Portos de Rio Grande e Paranaguá		02
Recuperação de IP4		02

OBRAS AQUAVIÁRIAS	
Derrocagem	
Dragagem	



1:27.700.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000
Dados emitidos em Fevereiro/2021.

MANUTENÇÃO

Legenda

● Capitais

SR - Superintendência Regional

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4

● Concluídas em operação

● Concluídas fora de operação

Eclusas sob jurisdição DNIT

■ em Operação

■ fora de Operação

SNV

— Ferrovias

— Rodovias SNV

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

— SNV

Intervenções

Quantidade

⚓	Dragagem do Porto Organizado de Recife	01
⚓	Remoção de Navio no Porto de Vila do Conde	01

Intervenções Aquaviárias


(km)

—	Dragagem	2.504,0 km
—	Desobstrução do canal do Grajaú	7,0 km

600 300 0 600 km

1:27.700.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

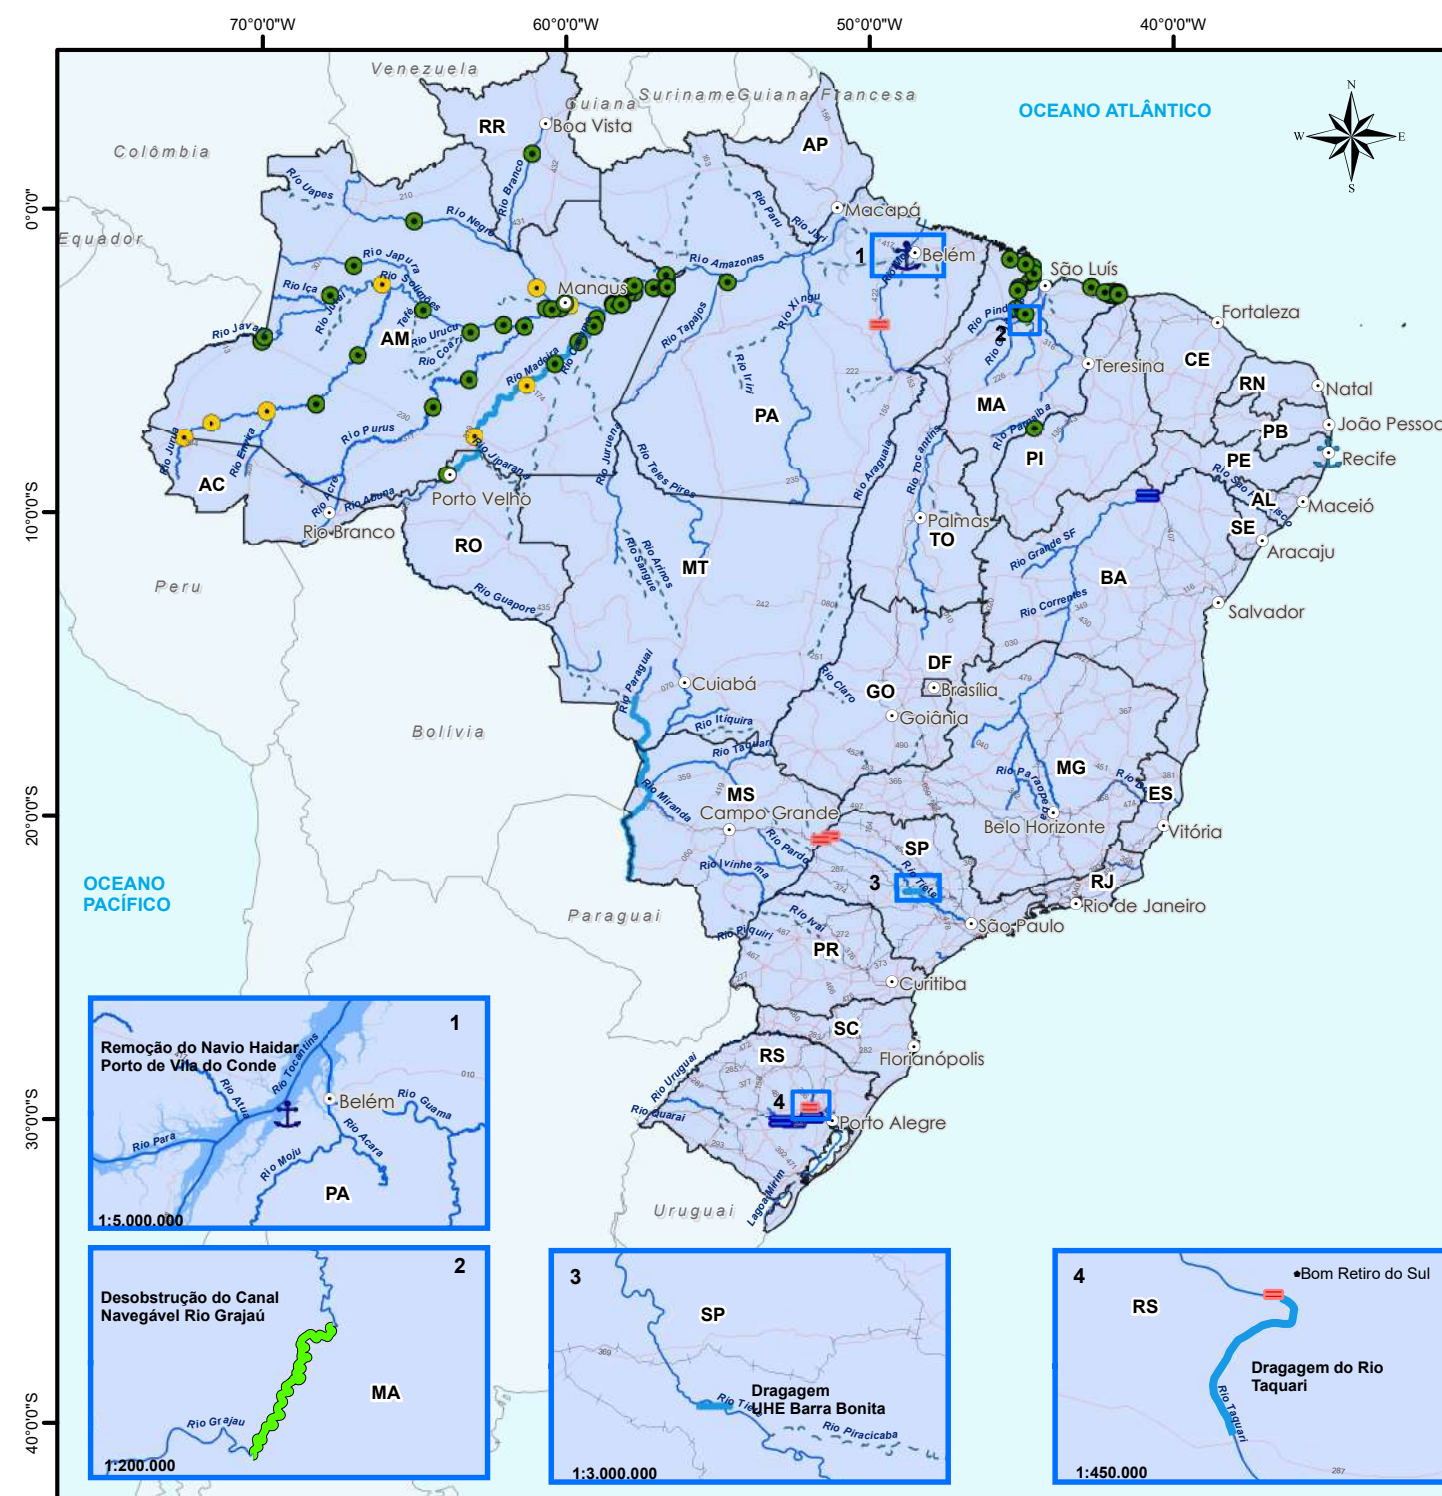

SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias SNV

Hidrovias

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Sinalização (linear)	(km)
Implantação de Sinalização	776,7 km
Manutenção de Sinalização	86,0 km
Sinalização Implantada	5.054,2 km

570 285 0 570 km

1:26.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000



ESTUDOS E PROJETOS

Legenda

Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

Ferrovias

Rodovias SNV

Hidrovias

Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

SNV

Estudos e Projetos	(km)	(%)
Estudos e Projetos	11.032,9 km	17,8 %
PMH Rio Tapajós/PA	287,89 km	
PMH Rio Madeira	1.086,00 km	

Estudos e Projetos	Quantidade
IP4 em Estudos	05
Projetos em Eclusas	04

540 270 0 540 km

1:25.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.






ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR AL



Terminal de Passageiros do Porto de
Maceió/AL

DNIT

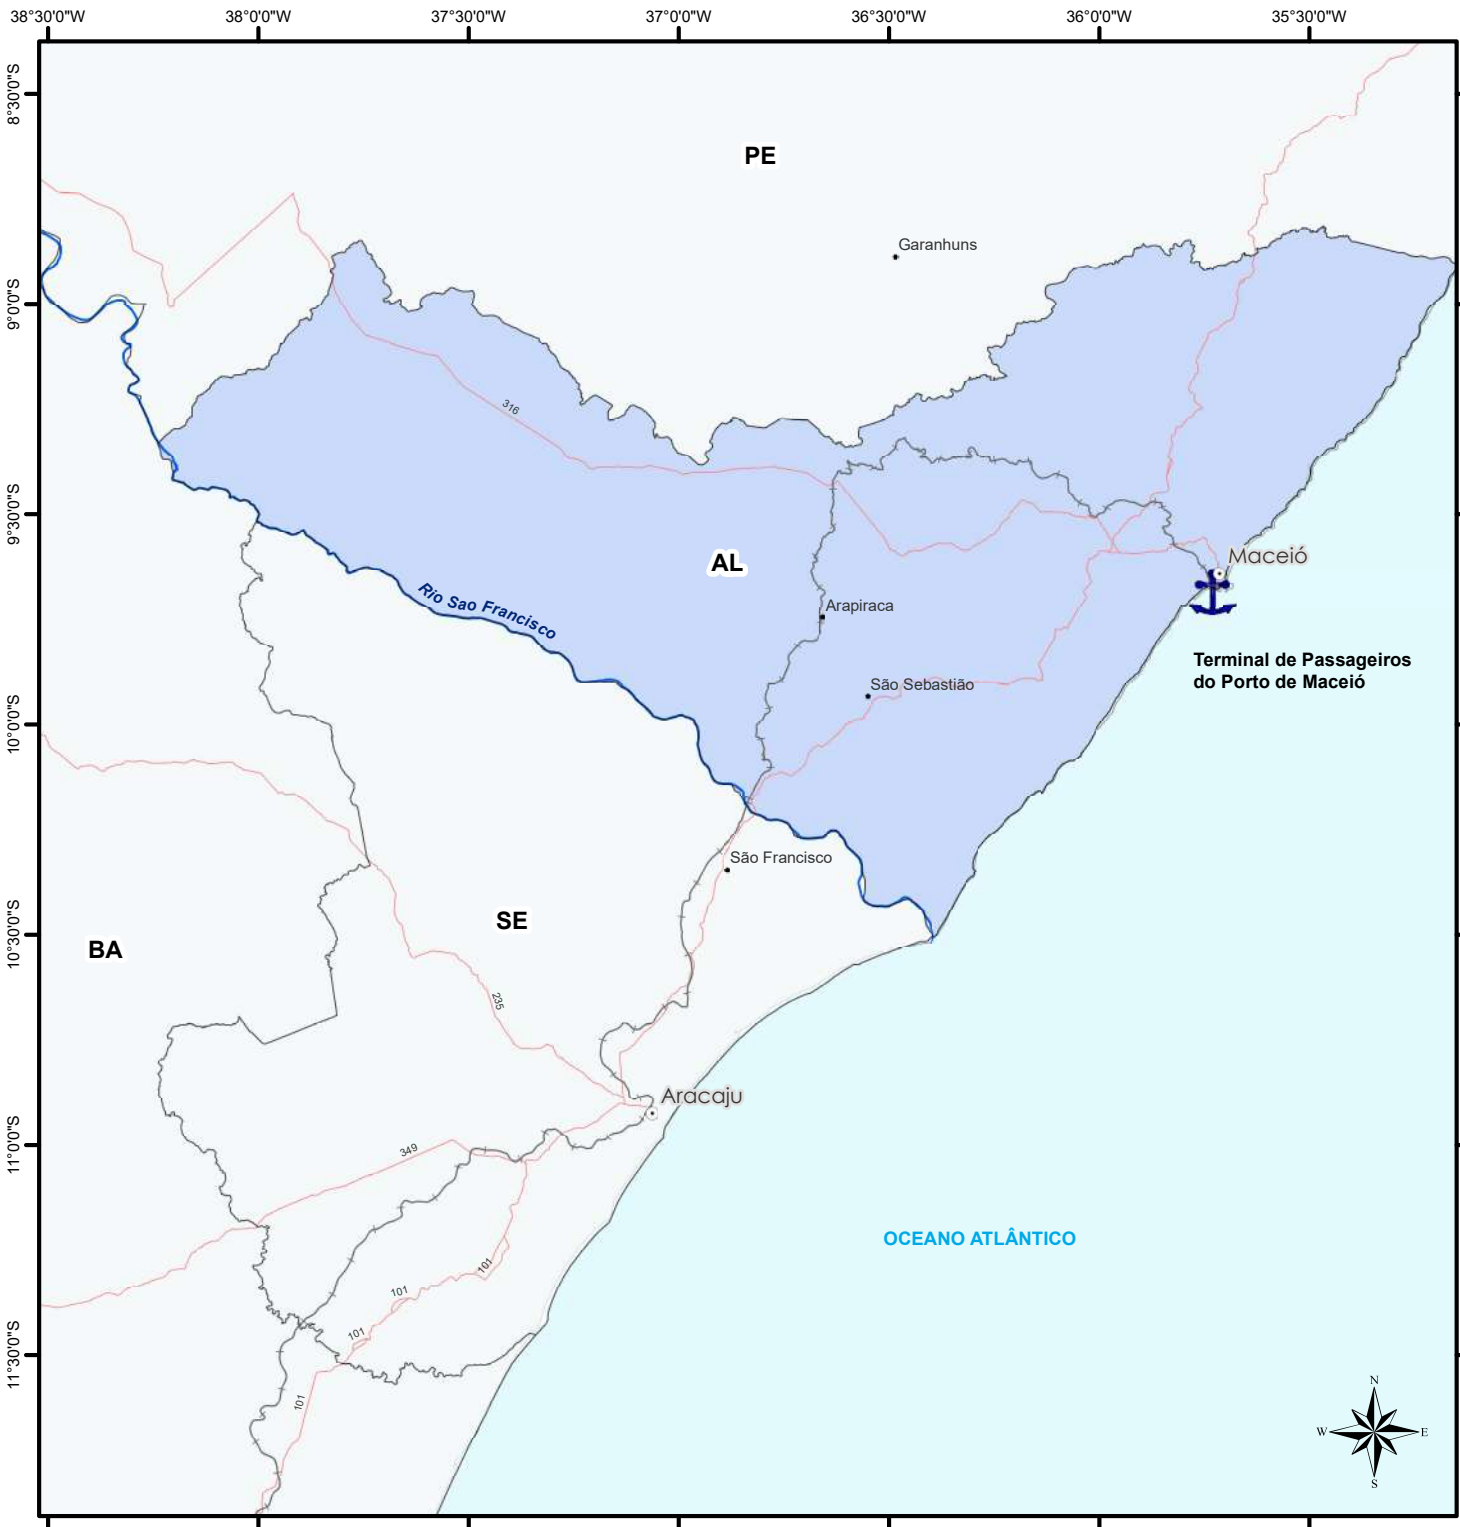

Superintendência Regional de Alagoas

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Obras Portuárias		Quantidade
	Terminal de passageiros do Porto de Maceió	01



1:2.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

AL - ALAGOAS

Instrumentos de construção e recuperação																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Terminal de Passageiros do Porto de Maceió	AL	-	00 00009/2018	Plataforma Engenharia	13/07/2018	31/03/2021	R\$ 5.709.686	R\$ 2.802.587	49%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 5.709.686	R\$ 2.802.587	49%		TOTAL GERAL				-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR AM



Rio Amazonas

DNIT

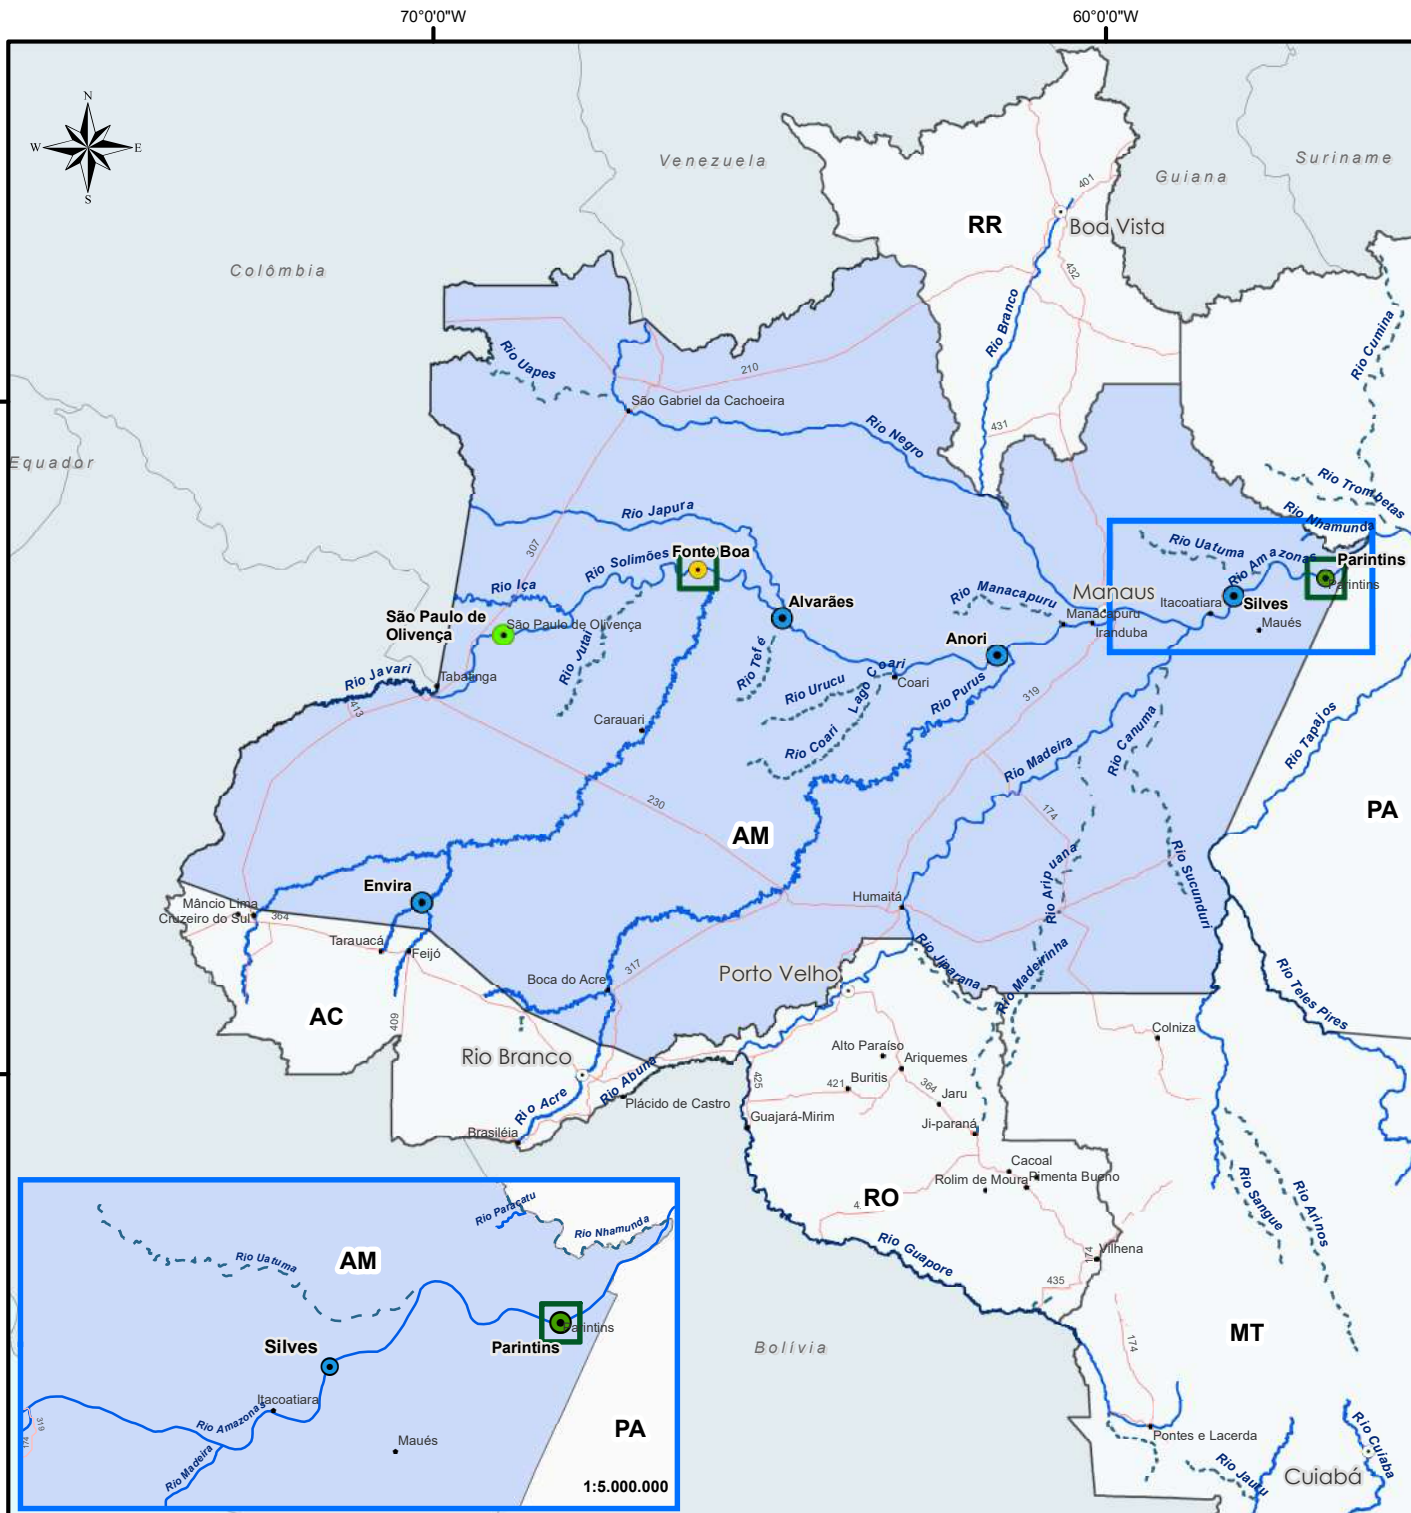

Superintendência Regional do Amazonas

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Rodovias

Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4

- Concluídas em operação
- Concluídas fora de operação

Hidroviás do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
 SNV

IP4 em Obras		Quantidade
	Em construção	04
	Obra inacabada	01
	IP4 em recuperação	03

Obs: A Obra só será dada como concluída após emissão do Termo de Recebimento Definitivo.



1:12.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

AM - AMAZONAS

Instrumentos de construção e recuperação																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)	
1	IP4 de Alvarães	AM	Rio Solimões HN-132	27 00626/2016	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	01/02/2017	29/07/2021	R\$	23.243.702	R\$	20.700.466	89%	Ativo	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	01/01/2022	16%
2	IP4 de Anori	AM	Rio Solimões HN-132	27 00624/2016	J. NASSER ENGENHARIA LTDA	16/01/2017	31/03/2021	R\$	15.322.547	R\$	7.854.469	51%	Ativo					
3	IP4 Fonte Boa	AM	Rio Solimões HN-132	27 00815/2019	FOCUS EMPREENDIMENTOS EIRELI	02/12/2019	24/05/2021	R\$	3.532.591	R\$	1.262.622	36%	Ativo					
4	IP4 de Envira	AM	Rio Taraucá HN-144	27 00628/2016	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	01/02/2017	25/05/2022	R\$	27.857.824	R\$	12.511.811	45%	Ativo	27 00631/2016	LAGHI	01/06/2017	14/06/2021	42%
5	IP4 de Silves	AM	Rio Amazonas HN-100	27 00627/2016	J. NASSER ENGENHARIA LTDA	16/01/2017	28/12/2021	R\$	21.401.176	R\$	18.902.216	88%	Ativo					
TOTAL GERAL									R\$	91.357.840	R\$	61.231.585	67%		TOTAL GERAL			29%

70°0'0"W

60°0'0"W

Superintendência Regional do Amazonas

OPERAÇÃO



Legenda

○ Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

Rodovias


Hidrovias do SNV

Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

SNV

Instalações Portuárias de Pequeno Porte - IP4	Quantidade	%
● Concluídas em operação	35	81,4%
● Concluídas fora de operação	08	18,6%
Total	43	100,0%

Cobertura Contratual	Quantidade	%
○ Coberto	43	100,0%
○ Descoberto	00	00,0%
Total	43	100,0%

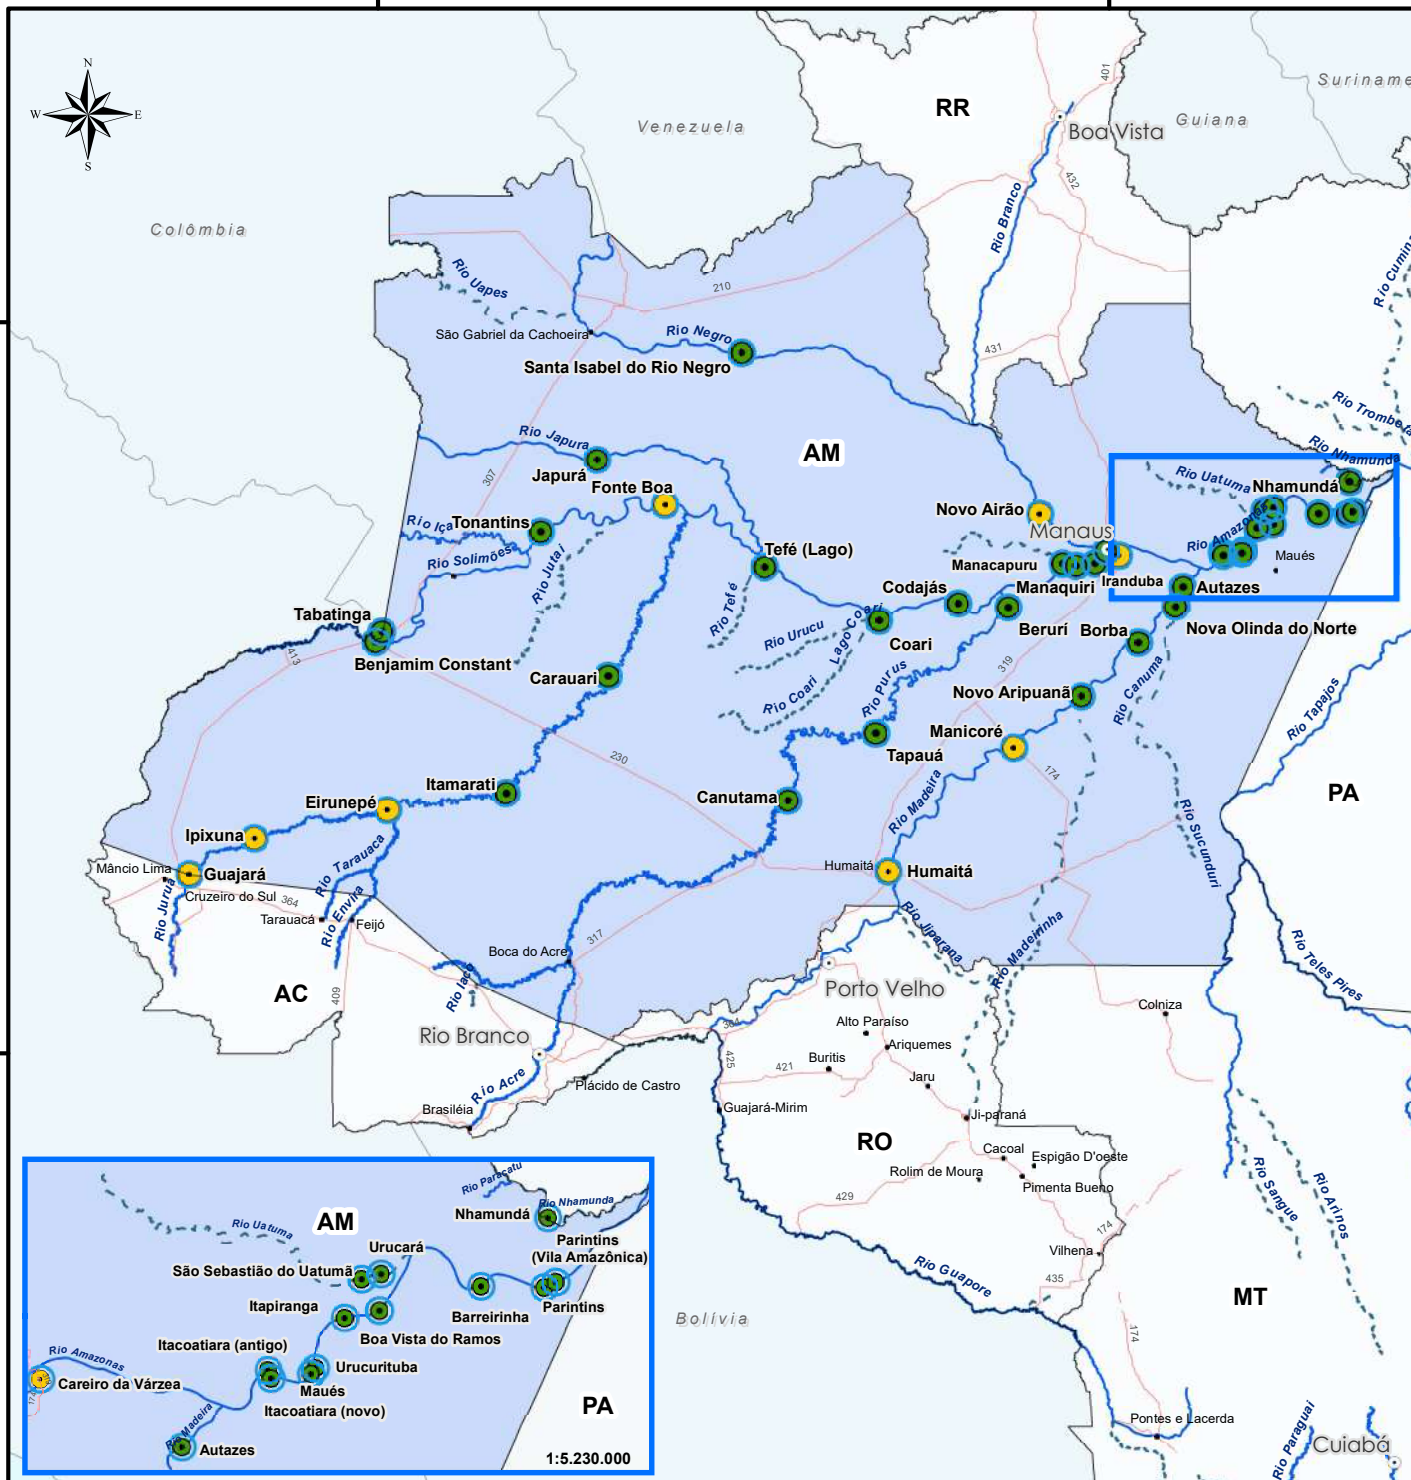

240 120 0 240 km

1:11.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

AM - AMAZONAS

Instrumentos de operação de IP4																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	IP4 Cobertas	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Operação de IP4 - Lote 1	AM / RR	Rio Solimões HN-132 Rio Negro HN-129, Rio Uatumã HN-116, Rio Tefé HN-141, Rio Amazonas HN-100 e Rio Japurá HN-142	Caracará/RR, Careiro Da Várzea/AM, Iranduba/AM, Manacapuru/AM, Manaquiri/AM, Novo Airão/AM, Sta Isabel Do Rio Negro/AM, São Raimundo/AM	27 00616/2016	COMSERVIÇO LTDA	07/11/2016	16/10/2021	R\$ 41.491.896	R\$ 21.149.120	51%	Ativo	-	-	-	-	-
2	Operação de IP4 - Lote 2	AM	Rio Amazonas HN-100 e Rio Madeira HN-117	Autazes/AM, Borba/AM, Cai N'Água/RO, Humaitá/AM, Manicoré/AM, Nova Olinda do Norte/AM, Novo Aripuanã/AM	27 00617/2016	ANTONELLY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	07/11/2016	16/10/2021	R\$ 35.894.081	R\$ 18.410.512	51%	Ativo	-	-	-	-	-
3	Operação de IP4 - Lote 3	AM	Rio Amazonas HN-100, Rio Negro HN-129, Rio Uatumã HN-116, Rio Tefé HN-141 e Rio Japurá HN-142	Barreirinha/AM, Boa Vista Do Ramos/AM, Itacoatiara/AM, Itapiranga/AM, Maués/AM, Nhamundá/AM, Parintins/AM, São Sebastião do Uatamã/AM,	27 00619/2016	COMSERVIÇO LTDA	07/11/2016	16/10/2021	R\$ 44.954.951	R\$ 23.966.215	53%	Ativo	-	-	-	-	-
4	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 6	AM	-	Autazes/AM, Barcelos/AM, Careiro da Várzea/AM, Itacoatiara/AM, Novo Airão/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, São Raimundo/AM, Caracará/RO.	01 00032/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/02/2021	21/04/2023	R\$ 25.100.000	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
5	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 1	AM	-	Boa Vista Do Ramos/AM, Itapiranga/AM, Maués/AM, Nhamundá/AM, Parintins/AM, Silves/AM, Urucará/AM, São Sebastião do Uatamã/AM e Vila Amazônia/AM.	01 00915/2020	COMSERVIÇO LTDA	01/02/2021	21/04/2023	R\$ 28.086.547	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
6	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 5	AM	-	Iranduba/AM, Anori/AM, Beruri/AM, Canutama/AM, Codajás/AM, Manacapuru/AM, Manaquiri/AM, Tapauá/AM e Lábrea/AM.	01 00916/2020	COMSERVIÇO LTDA	01/02/2021	21/04/2023	R\$ 25.061.315	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
4	Operação de IP4 - Lote 4	AM	Rio Solimões HN-132 e Rio Purus HN-134	Beruri/AM, Canutama/AM, Coari/AM, Codajás/AM, Tapauá/AM	27 00622/2016	ANTONELLY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	07/11/2016	16/10/2021	R\$ 26.975.428	R\$ 14.259.032	53%	Ativo	-	-	-	-	-
5	Operação de IP4 - Lote 5	AM	Rio Solimões HN-132, Rio Juruá HN-143, Rio Negro HN-129, Rio Uatumã HN-116, Rio Tefé HN-141, Rio Amazonas HN-100 e Rio Japurá HN-142	Benjamin Constant/AM, Carauari/AM, Eirunepé/AM, Fonte Boa/AM, Guajará/AM, Ipixuna/AM, Itamarati/AM, Japurá/AM, Tabatinga/AM, Tonantins/AM, São Paulo de Olivença/AM	27 00623/2016	ANTONELLY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	07/11/2016	16/10/2021	R\$ 47.064.196	R\$ 24.565.511	52%	Ativo	-	-	-	-	-
6	Operação de IP4 - Lote 6	AM	Rio Negro HN-129, Rio Uatumã HN-116, Rio Tefé HN-141, Rio Amazonas HN-100 e Rio Japurá HN-142	Itacoatiara/AM, Parintins/AM, Tefé/AM	27 00860/2018	ANTONELLY SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	29/10/2018	15/10/2021	R\$ 11.008.559	R\$ 3.420.433	31%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL									R\$ 285.636.972	R\$ 105.770.823	37%		TOTAL GERAL			-	

AM - AMAZONAS

Instrumentos de manutenção de IP4																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Manutenção Corretiva de Estruturas Navais	AM	-	27 00391/2019	FOCUS EMPREENDIMENTOS	01/08/2019	18/10/2021	R\$ 2.415.800	R\$ 1.495.880	62%	Ativo	-	-	-	-	-
2	Manutenção de IP4 - Lote 1	AM	Rio Amazonas HN-100	01 00727/2015	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02/12/2015	30/10/2021	R\$ 11.311.804	R\$ 7.718.133	68%	Ativo	-	-	-	-	-
3	Manutenção de IP4 - Lote 2	AM	Rio Solimões HN-132	01 00860/2015	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02/12/2015	30/10/2021	R\$ 17.353.968	R\$ 13.536.155	78%	Ativo	-	-	-	-	-
4	Manutenção de IP4 - Lote 3	AM	Rio Madeira HN-117	01 00861/2015	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02/12/2015	30/10/2021	R\$ 11.977.132	R\$ 10.101.375	84%	Ativo	-	-	-	-	-
5	Manutenção de IP4 - Lote 4	AM	Rio Juruá HN-143	01 00862/2015	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02/12/2015	30/10/2021	R\$ 11.063.044	R\$ 8.918.678	81%	Ativo	-	-	-	-	-
6	Manutenção de IP4 - Lote 5	AM	Rio Purus HN-134	27 00863/2015	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02/12/2015	30/10/2021	R\$ 4.140.699	R\$ 2.774.658	67%	Ativo	-	-	-	-	-
7	Manutenção de IP4 - Lote 6	AM / RR	Rio Branco HN-130 e Rio Negro HN-129	01 00864/2015	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02/12/2015	30/10/2021	R\$ 2.713.481	R\$ 1.255.946	46%	Ativo	-	-	-	-	-
8	Certificação Naval de 15 IP4.	AM	-	27 00209/2016	CONSÓRCIO FOCUS-LAGHI	01/07/2016	04/06/2021	R\$ 3.916.304	R\$ 2.983.015	76%	Ativo	-	-	-	-	-
9	Programas Ambientas das IP4 da Ahimoc - Lote V.	AM	Rio Solimões HN-132, Rio Juruá HN-143 e Rio Japurá HN-142	27 00857/2018	CARUSO JR ESTUDOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA	31/12/2018	14/11/2021	R\$ 915.199	R\$ 525.437	57%	Ativo	-	-	-	-	-
10	Programas Ambientas das IP4 da Ahimoc - Lote III.	AM	Rio Amazonas HN-100	27 00855/2018	CARUSO JR ESTUDOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA	31/12/2018	14/11/2021	R\$ 722.850	R\$ 447.872	62%	Ativo	-	-	-	-	-
11	Programas Ambientas das IP4 da Ahimoc - Lote I.	AM	Rio Branco HN-130, Rio Negro HN-129, Rio Solimões HN-132	27 00853/2018	VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	31/12/2018	14/11/2021	R\$ 475.425	R\$ 313.009	66%	Ativo	-	-	-	-	-
12	Programas Ambientas das Ip4 da Ahimoc - Lote II.	AM	Rio Madeira HN-117	27 00854/2018	VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	31/12/2018	14/11/2021	R\$ 369.757	R\$ 234.291	63%	Ativo	-	-	-	-	-
13	Programas Ambientas das Ip4 da Ahimoc - Lote IV.	AM	Rio Purus HN-134 e Rio Madeira HN-117	27 00856/2018	VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	31/12/2018	14/11/2021	R\$ 368.653	R\$ 251.780	68%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 67.744.115	R\$ 50.556.228	75%		TOTAL GERAL				-

AM - AMAZONAS

Instrumentos de estudos e projetos																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Projeto de Dragagem do Furo do Pucu	AM	Rio Andirá e Rio Paraná do Ramos	27 00775/2018	Consórcio MAC-LAGHI/PUCU	01/11/2018	18/05/2021	R\$ 638.361	R\$ 348.028	55%	Ativo	-	-	-	-	-
2	Projeto de IP4 de Belém de Solimões	AM	Rio Solimões HN-132	27 00166/2014	Laghi Engenharia LTDA	27/12/2016	25/03/2021	R\$ 536.960	R\$ 229.268	43%	Ativo	-	-	-	-	-
3	Projeto de IP4 de Lábrea	AM	Rio Purus HN-134	32 00308/2016	DZETA ENGENHARIA LTDA	15/06/2016	05/04/2021	R\$ 704.936	R\$ 697.186	99%	Ativo	-	-	-	-	-
4	Projeto de IP4 de São Paulo de Olivença	AM	Rio Solimões HN-132	27 00940/2018	INTERNAVE ENGENHARIA	02/09/2019	22/07/2021	R\$ 675.698	R\$ 319.169	47%	Ativo	-	-	-	-	-
5	Projeto de IP4 de São Raimundo	AM	Rio Amazonas HN-100	27 00629/2016	Consórcio São Raimundo	01/02/2017	22/08/2021	R\$ 1.896.319	R\$ 496.676	26%	Ativo	-	-	-	-	-
6	Projeto de IP4 de Barcelos	AM	Rio Negro HN-129	00 00503/2020	JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA.	01/08/2020	01/08/2022	R\$ 11.873.098	R\$ 224.310	2%	Ativo	-	-	-	-	-
7	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Rio Madeira - Lote 1	AM	Rio Madeira HN-117	01 00908/2020	LCD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS LTDA	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 11.397.500	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
8	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Rio Madeira - Lote 2	AM	Rio Madeira HN-117	01 00909/2020	LAGHI ENGENHARIA LTDA E RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 11.496.599	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
9	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Rio Madeira - Lote 3	AM	Rio Madeira HN-117	01 00910/2020	LAGHI ENGENHARIA LTDA E RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 13.778.000	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 52.997.472	R\$ 2.314.636	4%		TOTAL GERAL				-



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR BA



DNIT

Eclusa de Sobradinho/BA

44°0'0"W

42°0'0"W

40°0'0"W

38°0'0"W



Superintendência Regional da Bahia

OPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Eclusas	Quantidade	%
■ Eclusas em Operação	01	100,0%
■ Eclusas fora de Operação	00	0,0%
Total	01	100,0 %


Cobertura Contratual	Quantidade	%
■ Coberto	01	100,0 %
■ Descoberto	00	0,0 %
Total	01	100,0 %

100 50 0 100 km

1:4.500.000


Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

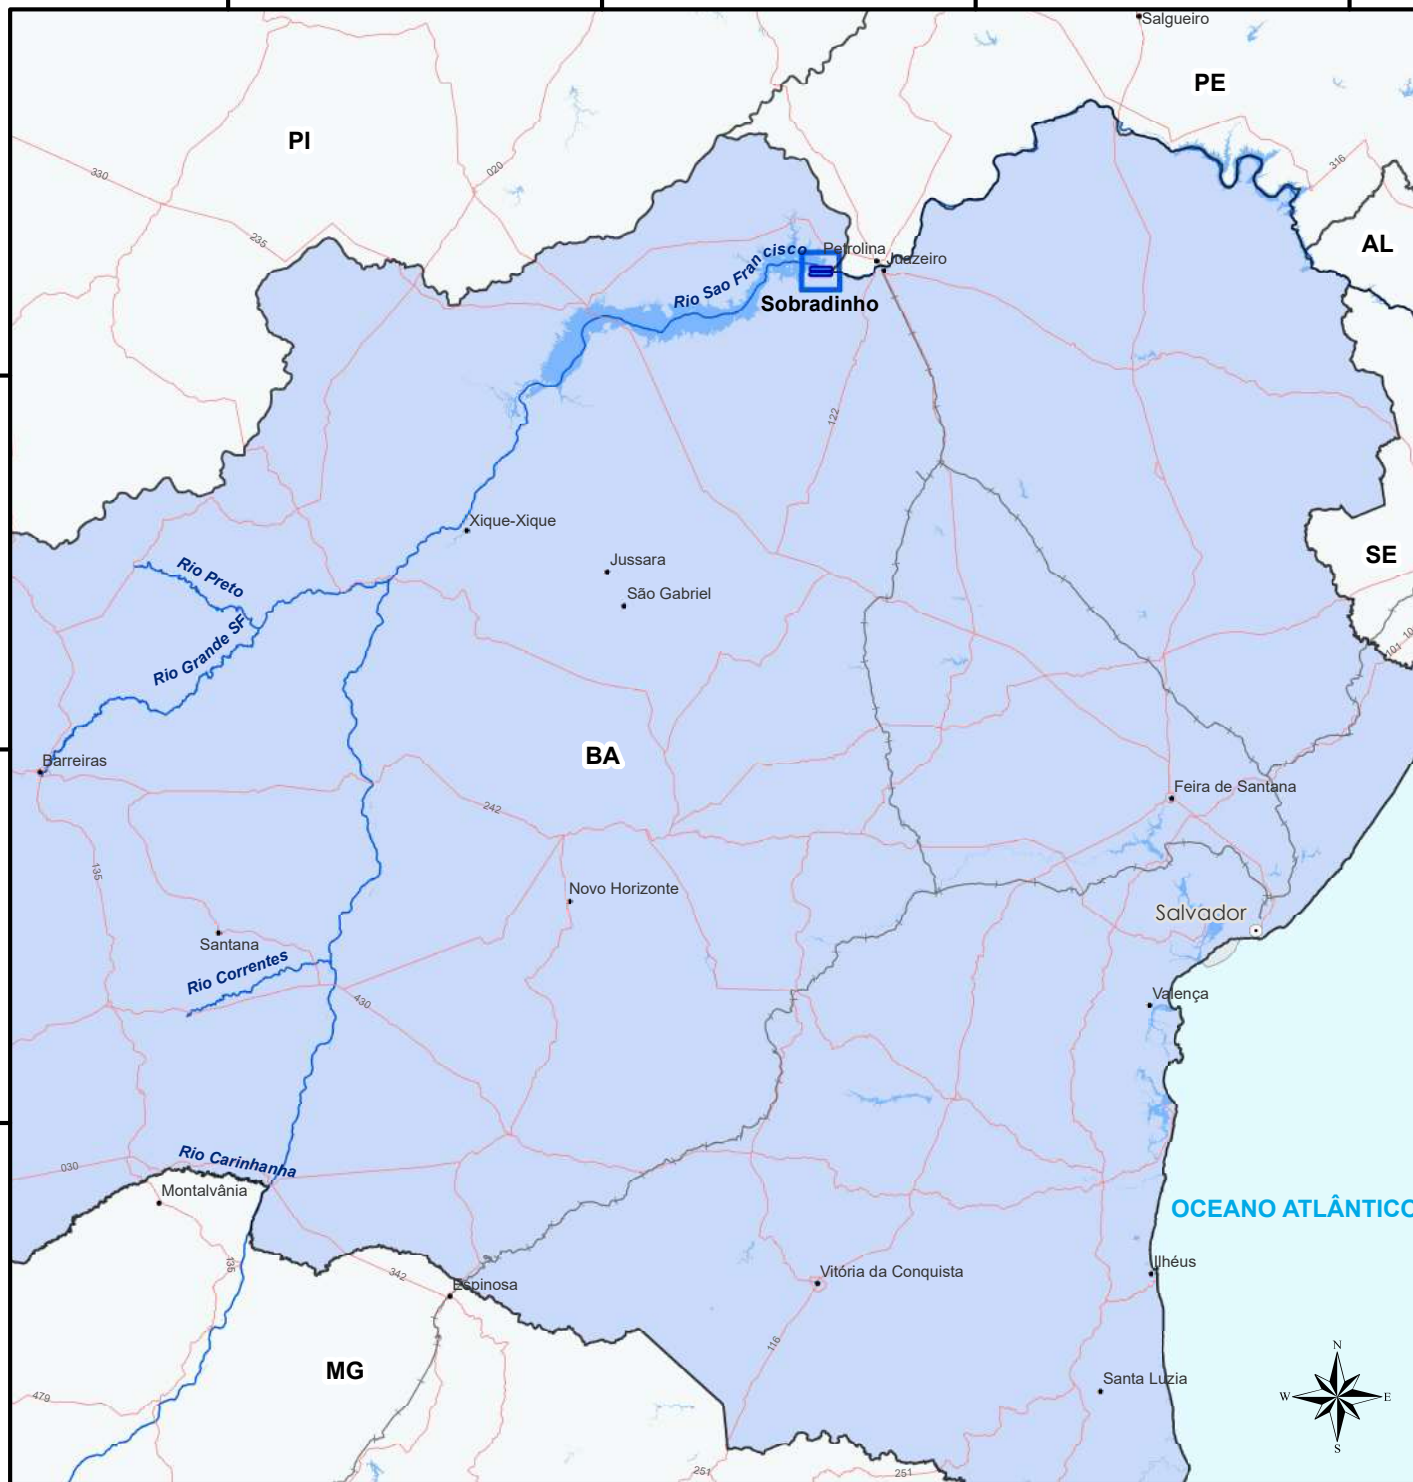

BA - BAHIA

Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)	
1	Manutenção e Operação da Eclusa do Sobradinho	BA	Rio São Francisco HN-500	32 00894/2019	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	26/12/2019	02/10/2021	R\$ 4.524.750	R\$ 1.844.464	41%	Ativo	32 00304/2020	Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.	01/06/2020	01/06/2021	68%	
TOTAL GERAL								R\$ 4.524.750	R\$ 1.844.464	41%		TOTAL GERAL				68%	

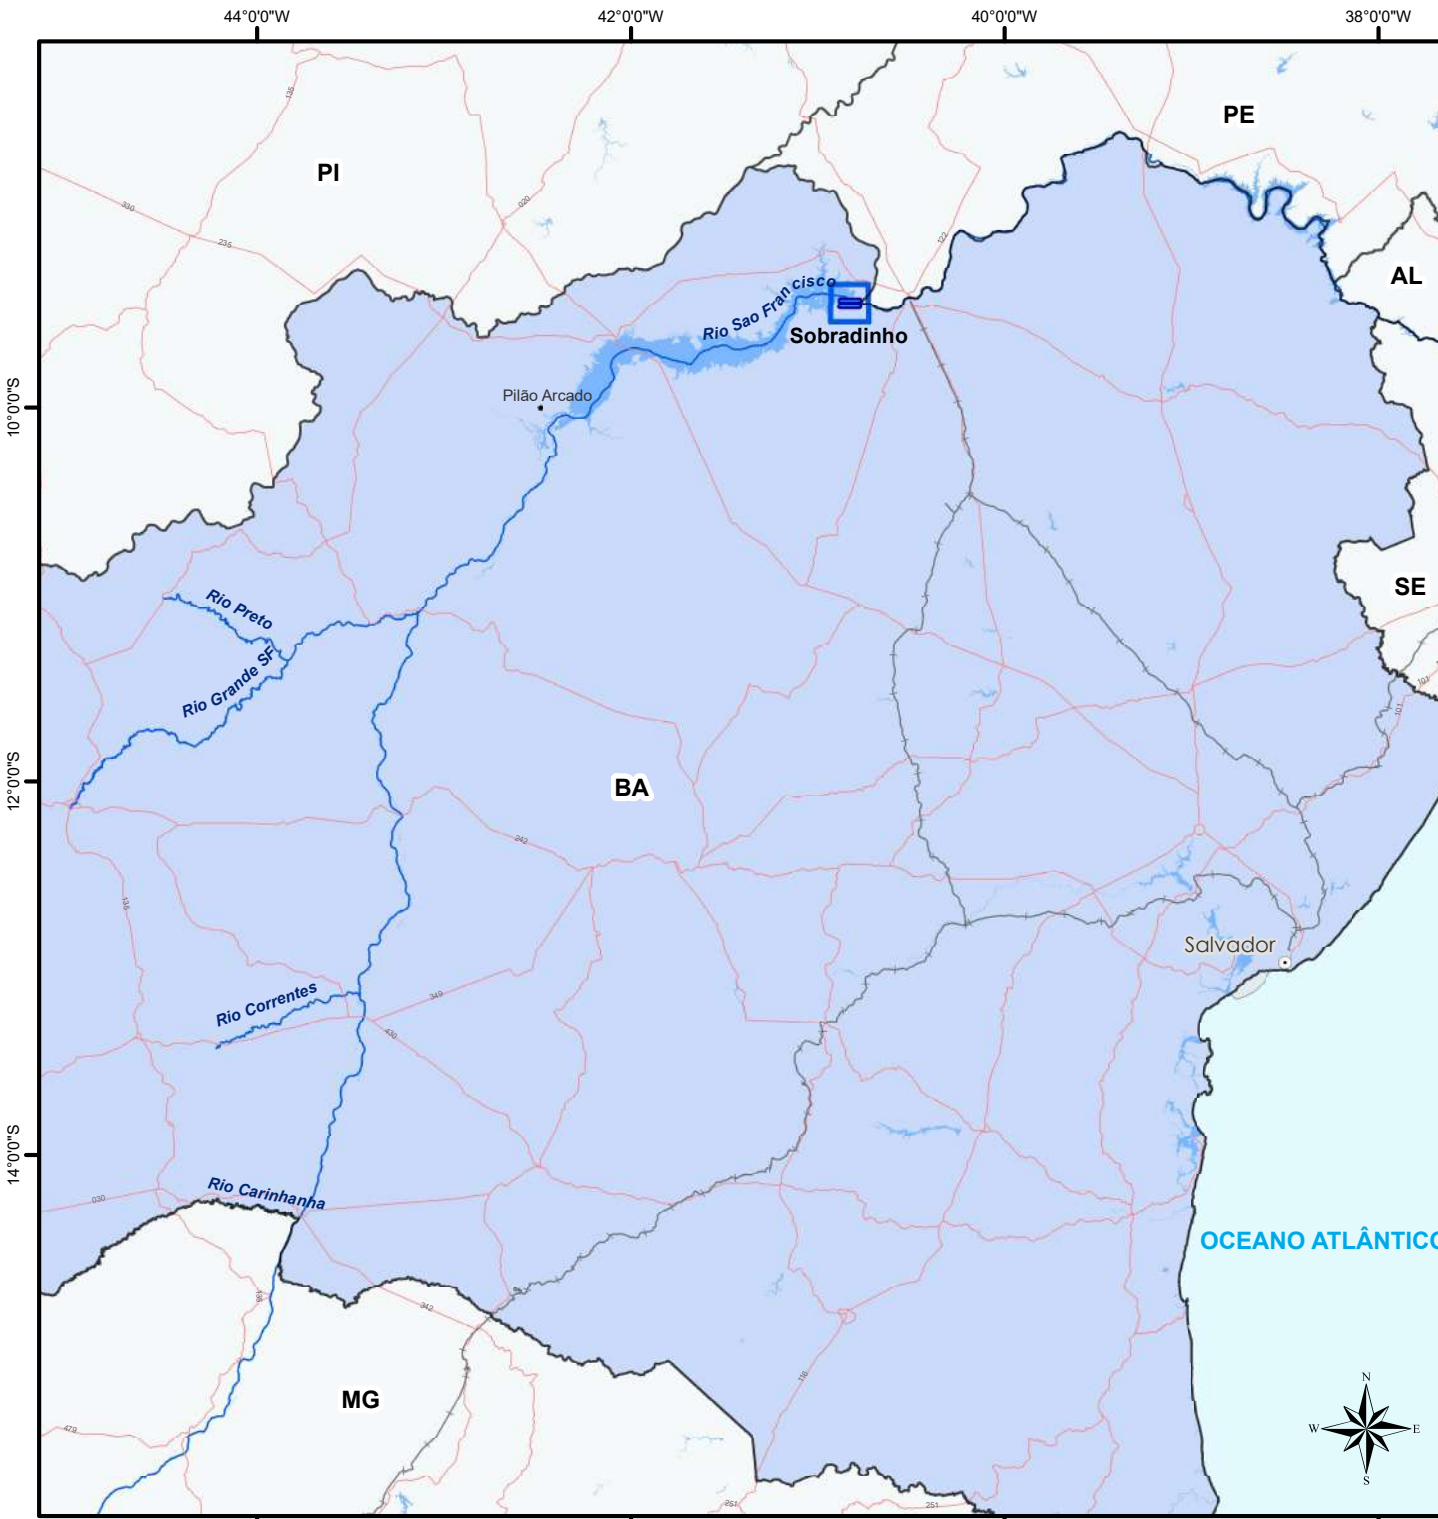

Superintendência Regional da Bahia

MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias


Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Eclusas

- Eclusas em Operação
- Eclusas fora de Operação

Cobertura Contratual		Quantidade	%
	Coberto	01	100,0 %
	Descoberto	00	0,0 %
Total		01	100,0 %



1:4.500.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

BA - BAHIA

Instrumentos de manutenção de eclusas																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Manutenção e Operação da Eclusa do Sobradinho	BA	Rio São Francisco HN-500	32 00894/2019	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	26/12/2019	02/10/2021	R\$ 4.524.749,69	R\$ 1.844.464,26	41%	Ativo	32 00304/2020	Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A.	01/06/2020	01/06/2021	68%
TOTAL GERAL								R\$ 4.524.750	R\$ 1.844.464	41%		TOTAL GERAL				68%

44°0'0"W

42°0'0"W

40°0'0"W

38°0'0"W



Superintendência Regional da Bahia

ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

○ Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

— SNV

Estudos e Projetos

(km)

— Projeto de Levan. Batimétrico (Rio São Francisco) 3.768,9 km

OCEANO ATLÂNTICO



100 50 0 100 km

1:4.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

PI

PE

AL

SE

BA

Salvador

MG

Rio São Francisco

Pilão Arcado

Rio Preto
Rio Grande SP

Rio Correntes

Rio Carinhonha

10°0'0"S

12°0'0"S

14°0'0"S

BA - BAHIA

Instrumentos de estudos e projetos																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Levantamento Batimétrico de Baixios	BA	Rio São Francisco HN-500	32 00124/2020	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	30/03/2020	15/04/2021	R\$ 634.566	R\$ 298.185	47%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 634.566	R\$ 298.185	47%		TOTAL GERAL				-



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR MA



Rio Parnaíba

DNIT

45°0'0"W

MANUTENÇÃO



Legenda

Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

Ferrovias

Rodovias

Hidrovias do SNV

Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

SNV

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4

Concluídas em operação

Concluídas fora de operação


Intervenções Aquaviárias

(km)

Desobstrução do canal do Grajaú 7,0 km

Dragagem do canal navegável Rio Parnaíba 2,0 km

1:4.500.000

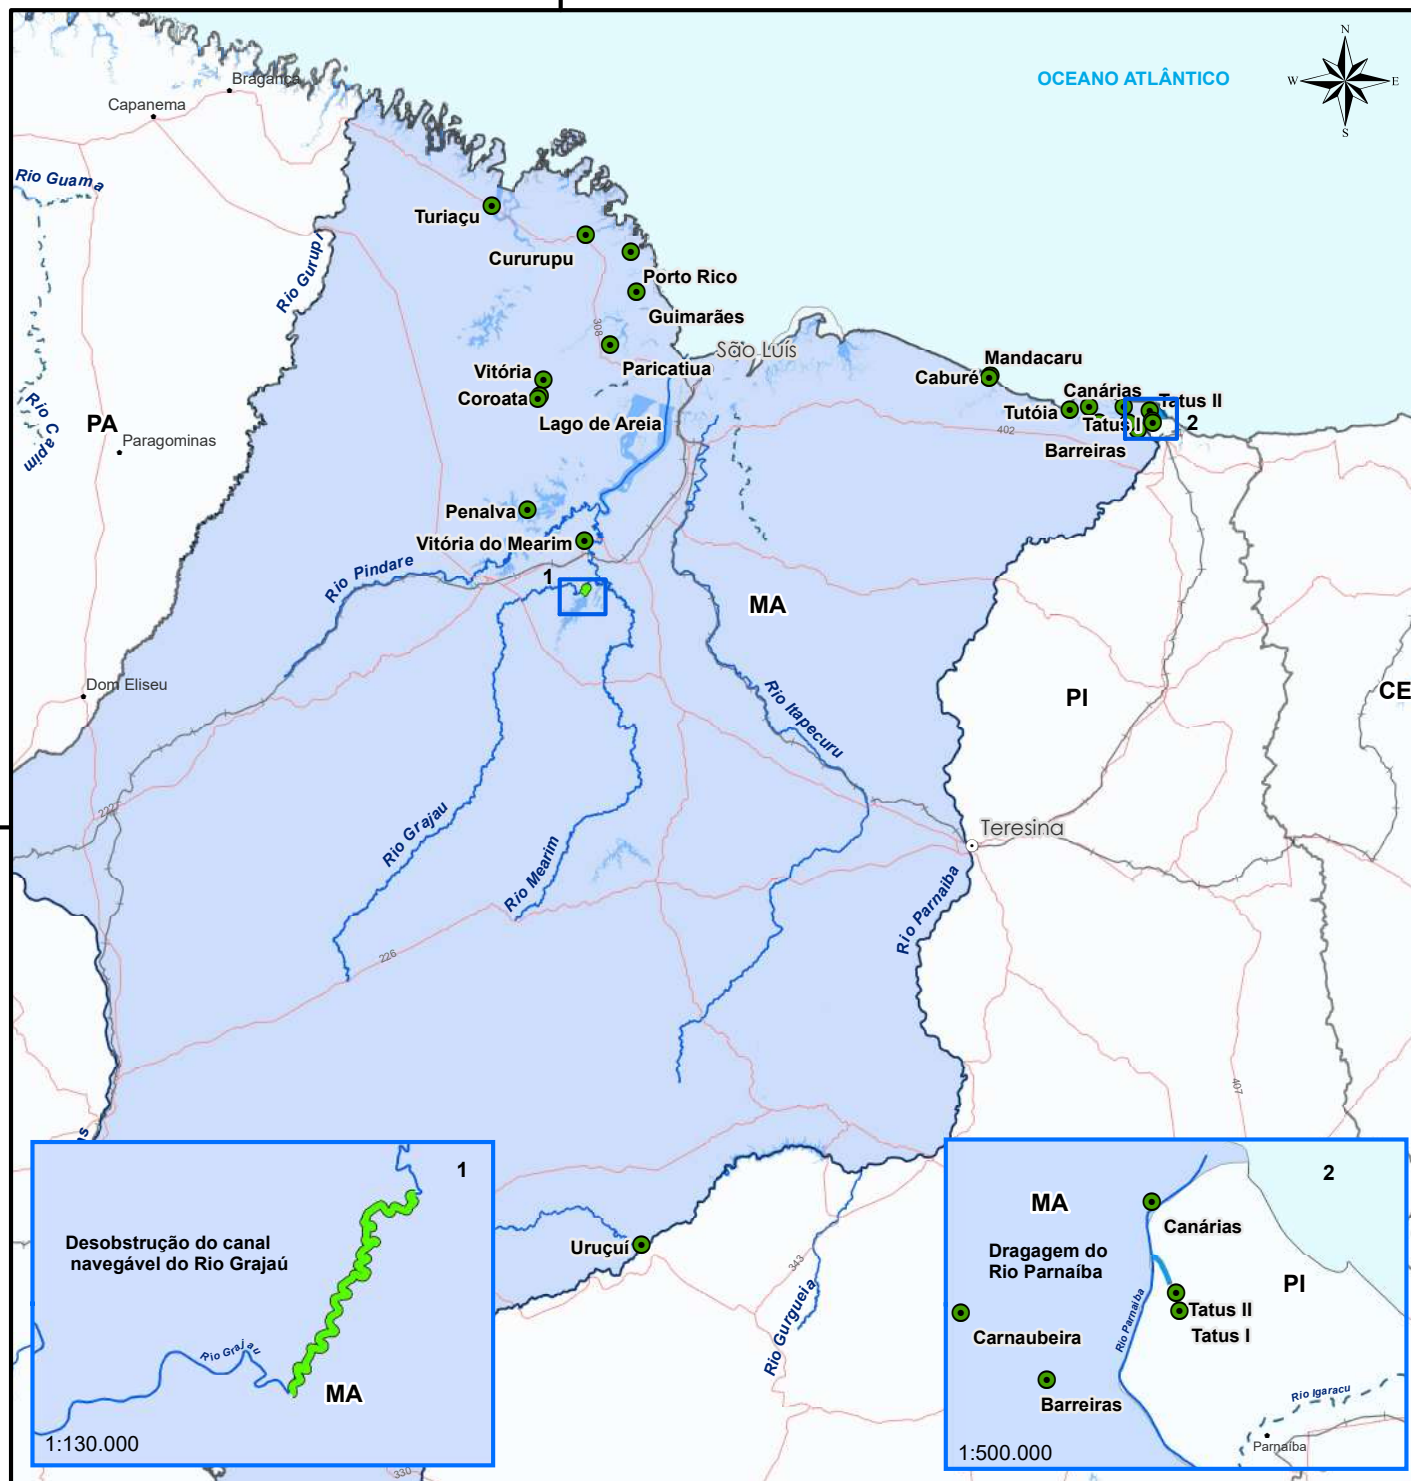Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

MA - MARANHÃO

Instrumentos de manutenção de IP4																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Manutenção de Terminais Hidroviários	MA	-	00 00631/2020	S E R SERVICOS, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	22/09/2020	18/07/2021	R\$ 1.169.164	R\$ 616.871	53%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 1.169.164	R\$ 616.871	53%		TOTAL GERAL				-

Instrumentos de manutenção de hidrovia																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Desobstrução do Rio Grajaú	MA	Rio Grajaú HN-305	29 00806/2019	CONSÓRCIO CRUZ - PACHECO	21/11/2019	08/12/2021	R\$ 1.682.936	R\$ 1.661.514	99%	Ativo	15 00513/2020	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	01/08/2020	29/03/2021	88%
2	Dragagem do Rio Parnaíba	PI	Rio Parnaíba HN-400	15 00933/2020	VM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTD	22/11/2019	08/08/2021	R\$ 1.581.565	R\$ -	0%	Ativo					
TOTAL GERAL								R\$ 3.264.502	R\$ 1.661.514	51%		TOTAL GERAL				



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR MS



Hidrovia do Paraguai

DNIT

57°30'0"W

55°0'0"W

Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO**Legenda**

● Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

- - - SNV

Intervenção**Quantidade** Dolphin (obra de proteção de pilar) ponte BR 262/MS 01

60 30 0 60 km

1:2.700.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

MT

Rio Piquiri

Rio Itiquira

Rio Culaba

Rio Taquari

Coxim

Rio Coxim

MS

São Gabriel do Oeste

Bandeirantes

Aquidauana

Campo Grande

Bonito

Jardim

Rio Brilhante

Rio Vinhedo

Dolphin (obra de proteção de pilar)
Ponte BR 262/MS

Rio Miranda

Rio Paraguai


Bolívia

Paraguai



MS – MATO GROSSO DO SUL

Instrumentos de construção e recuperação																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Dolphin (obra de proteção de pilar) - ponte BR 262	MS	Rio Paraguai HN-950	30 00801/2017	NOVATA ENGENHARIA	29/11/2017	11/11/2021	R\$ 3.662.671	R\$ 3.522.419	96%	CONCLUÍDO	30 00441/2017	CONS. BUREAU-CARUSO	06/07/2017	10/03/2021	71%
TOTAL GERAL								R\$ 3.662.671	R\$ 3.522.419	96%		TOTAL GERAL				71%

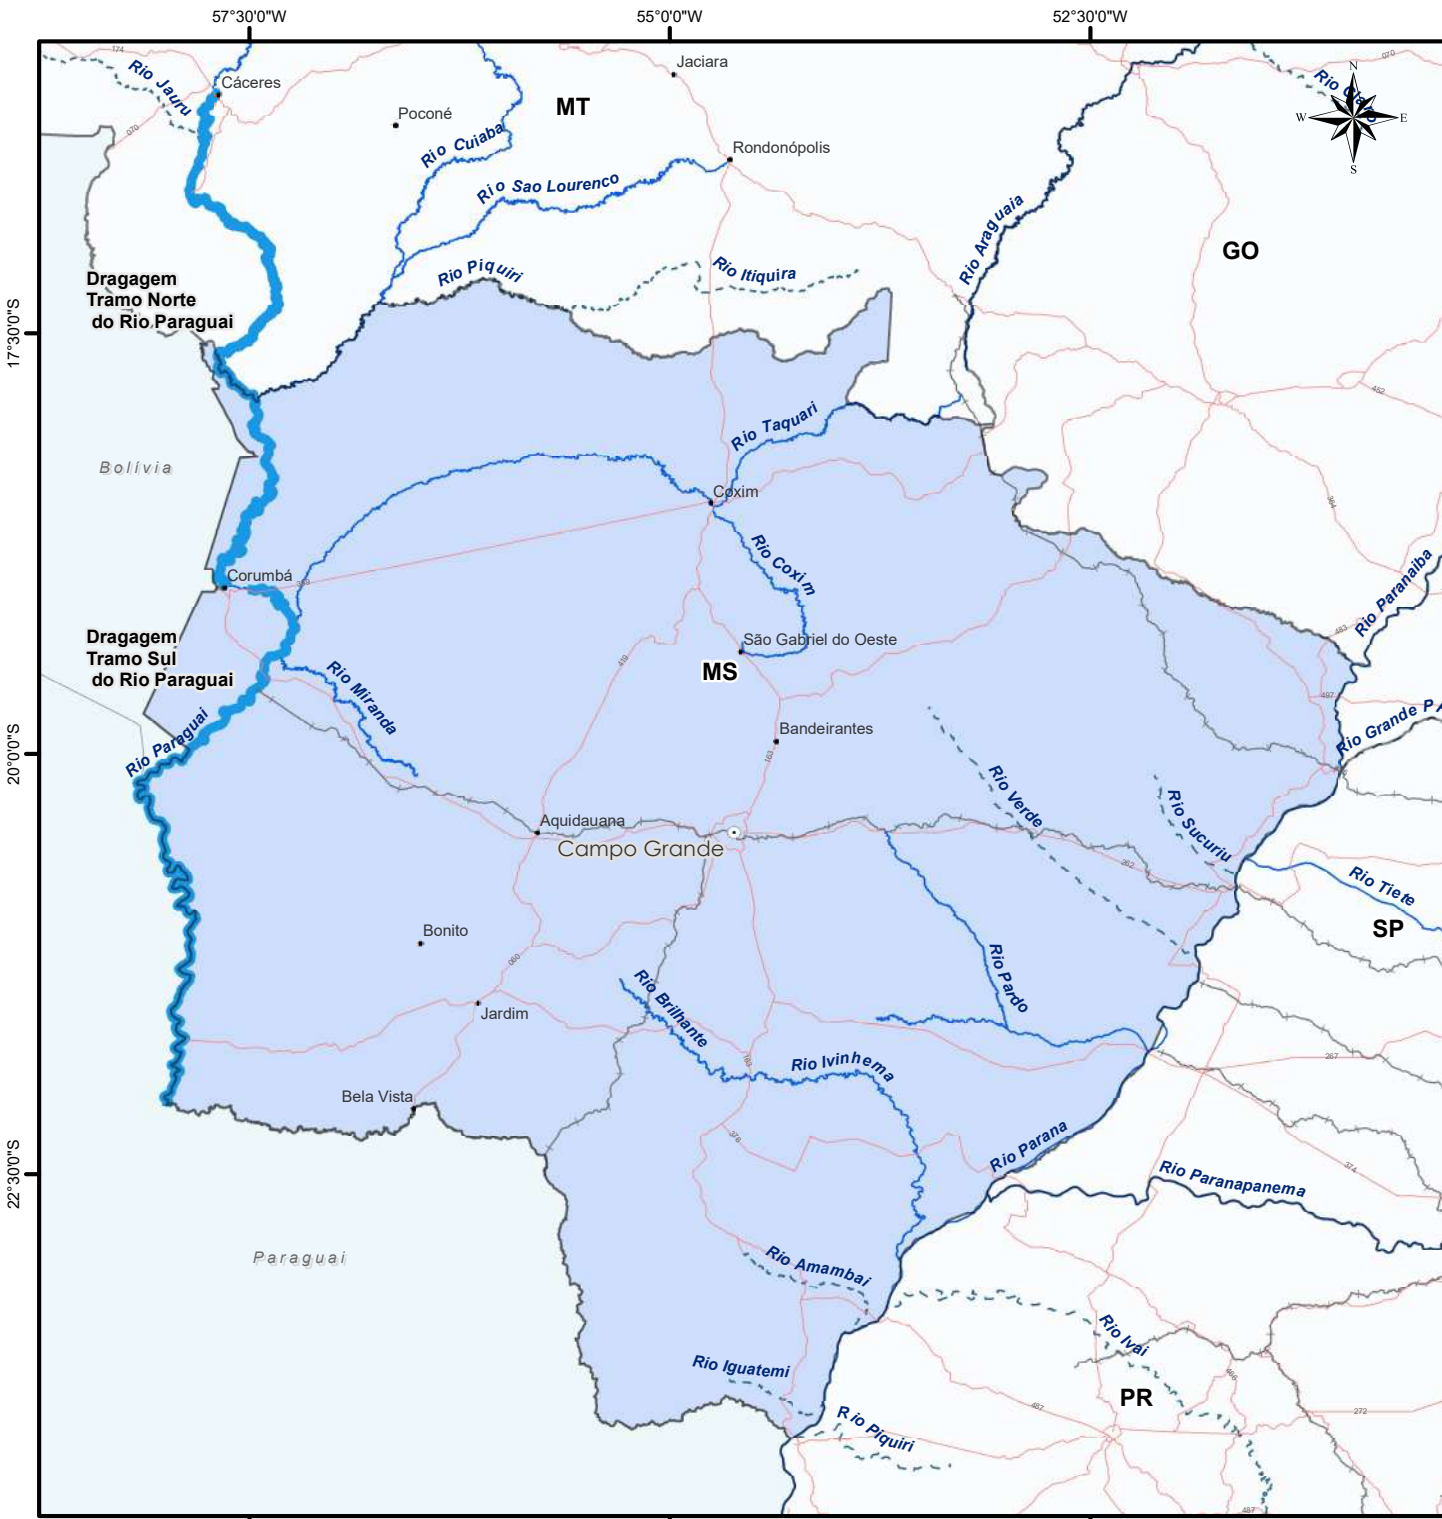

Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul
MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Intervenções Aquaviárias		(km)
Dragagem Tramo Sul e Tramo Norte		1.385,0



1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

MS – MATO GROSSO DO SUL

Instrumentos de manutenção de hidrovia																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Dragagem do Rio Paraguai (Tramos Sul e Norte)	MS	Rio Paraguai HN-950	30 00864/2020	JEED ENGENHARIA LTDA	21/12/2020	11/12/2022	R\$ 10.292.890	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 10.292.890	R\$ -	0%		TOTAL GERAL			-	



Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul
SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Sinalização	(km)
Manutenção Sinalização Tramo Norte	661,0 km



1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

MS – MATO GROSSO DO SUL

Instrumentos de sinalização																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Manutenção e Adequação da Sinalização Náutica do Tramo Norte	MS	Rio Paraguai HN-950	30 00864/2020	JEED ENGENHARIA LTDA	21/12/2020	11/12/2022	R\$	10.292.890	R\$	-	0%	Ativo	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$	10.292.890	R\$	-	0%		TOTAL GERAL			-



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR PA



IP4 Visau/PA

DNIT

55°0'0"W

50°0'0"W

45°0'0"W



Superintendência Regional do Pará

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

● Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV


— SNV

Instalações Portuárias de Pequeno Porte - IP4

Quantidade	%
08	100,0%
00	00,0%

OBRAS AQUAVIÁRIAS

— Derrocagem do Pedral do Lourenço

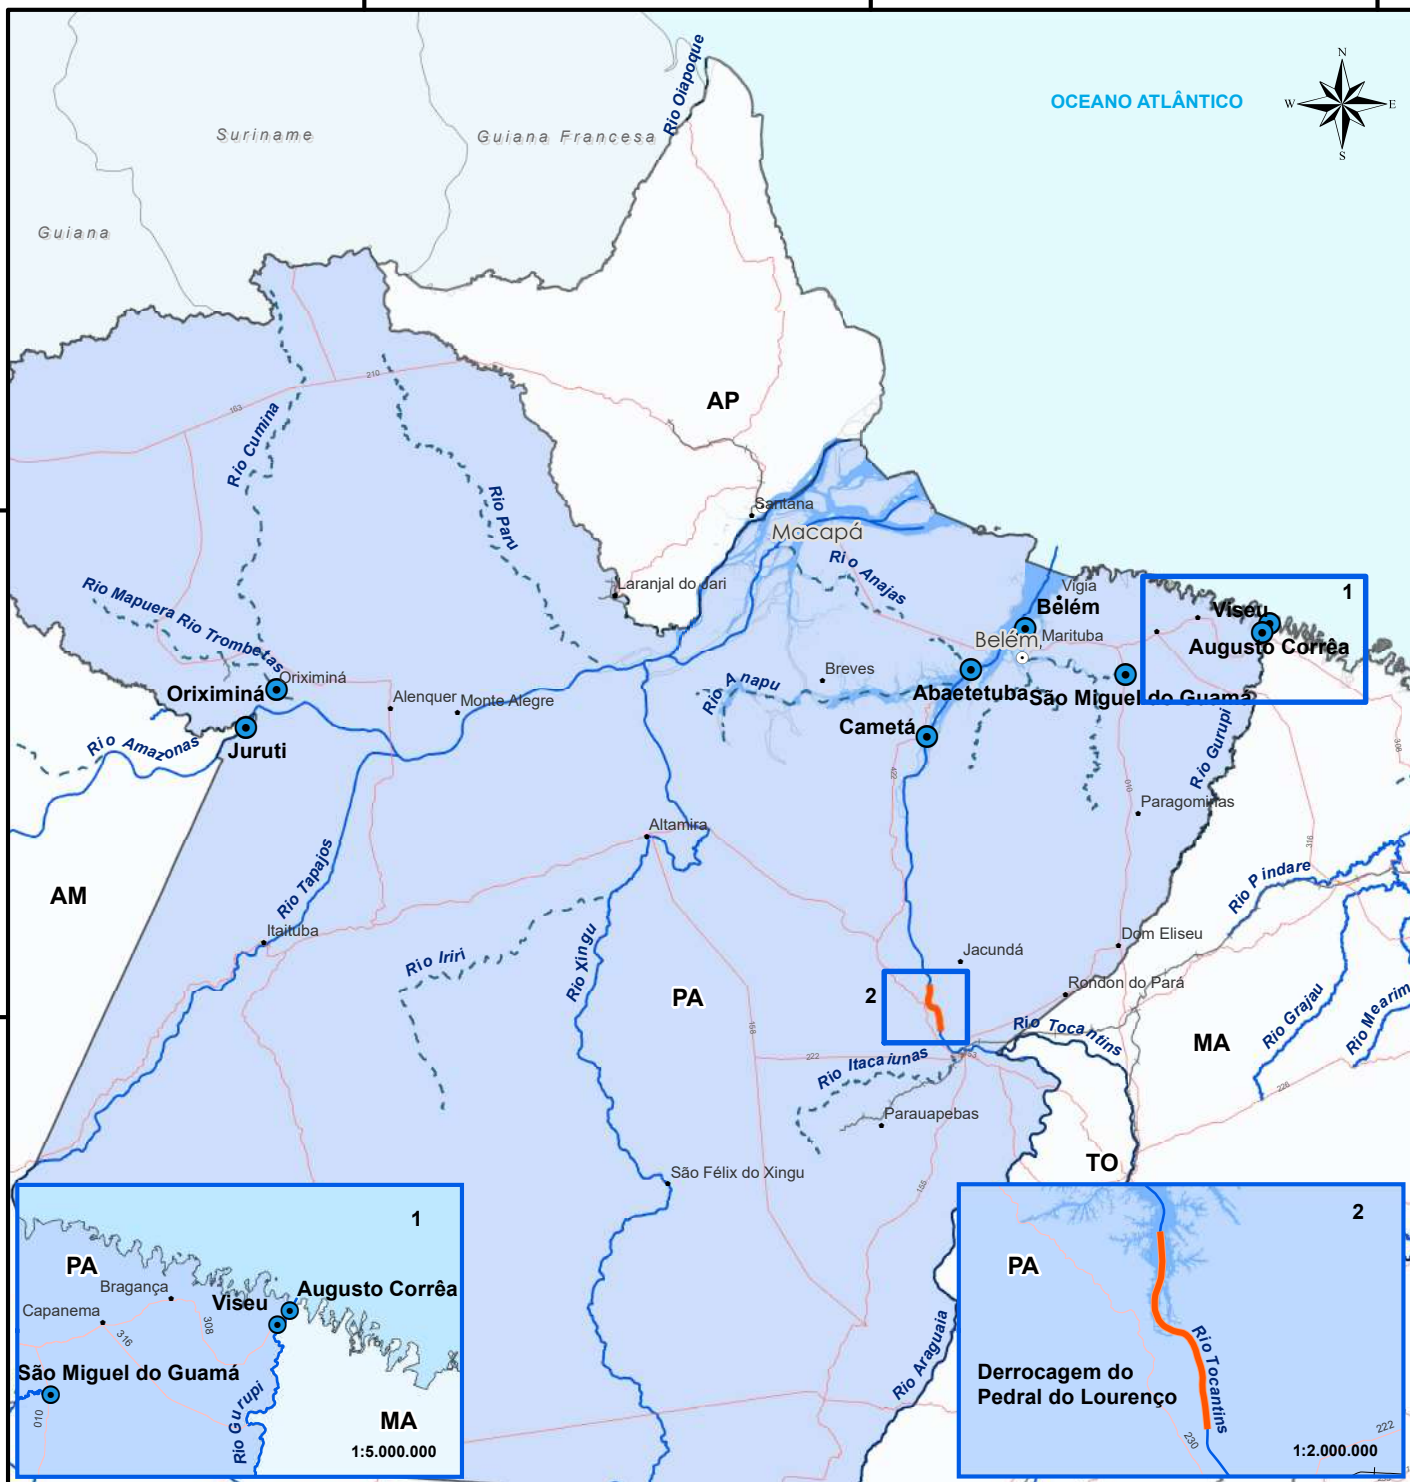

175 87,5 0 175 km


1:8.300.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

PA - PARÁ

Instrumentos de construção e recuperação																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Derrocagem do Pedral do Lourenço	PA	Rio Tocantins HN-200	00 00245/2016	Consórcio DTA-O'Martin	16/06/2016	14/04/2021	R\$ 656.087.626	R\$ 8.323.335	1%	Ativo	00 00599/2016	Consórcio Hidrotopo/ Caruso	09/11/2016	13/10/2021	12%
2	IP4 de Abaetetuba	PA	Rio Maratauíra	02 00734/2014	PAULO RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA FI	14/08/2014	27/06/2021	R\$ 11.333.491	R\$ 10.822.107	95%	Ativo					
3	IP4 de Augusto Corrêa	PA	Rio Urumajó	02 00733/2014	PAULO RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA FI	15/08/2014	27/06/2021	R\$ 22.231.893	R\$ 20.811.080	94%	Ativo					
4	IP4 de Belém (Mosqueiro)	PA	Baía do Guajará HN-201	02 00736/2014	PAULO RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA FI	26/08/2014	27/06/2021	R\$ 6.758.839	R\$ 5.059.527	75%	Ativo	00 00732/2015	Consórcio PRI-MAC	07/11/2015	24/01/2021	97%
5	IP4 de Cametá	PA	Rio Tocantins HN-200	02 00734/2014	PAULO RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA FI	14/08/2014	27/06/2021	R\$ 11.333.491	R\$ 10.822.107	95%	Ativo					
6	IP4 de Viseu	PA	Rio Gurupi HN-306	02 00733/2014	PAULO RAYMUNDO BRÍGIDO DE OLIVEIRA FI	15/08/2014	27/06/2021	R\$ 22.231.893	R\$ 20.811.080	94%	Ativo					
7	IP4 de Juruti	PA	Rio Amazonas HN-100	02 00499/2020	Paulo Raymundo Brígido de Oliveira	02/07/2020	06/10/2021	R\$ 4.835.466	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
8	IP4 Oriximiná														-	-
TOTAL GERAL								R\$ 734.812.698	R\$ 76.649.236	10%		TOTAL GERAL				57%

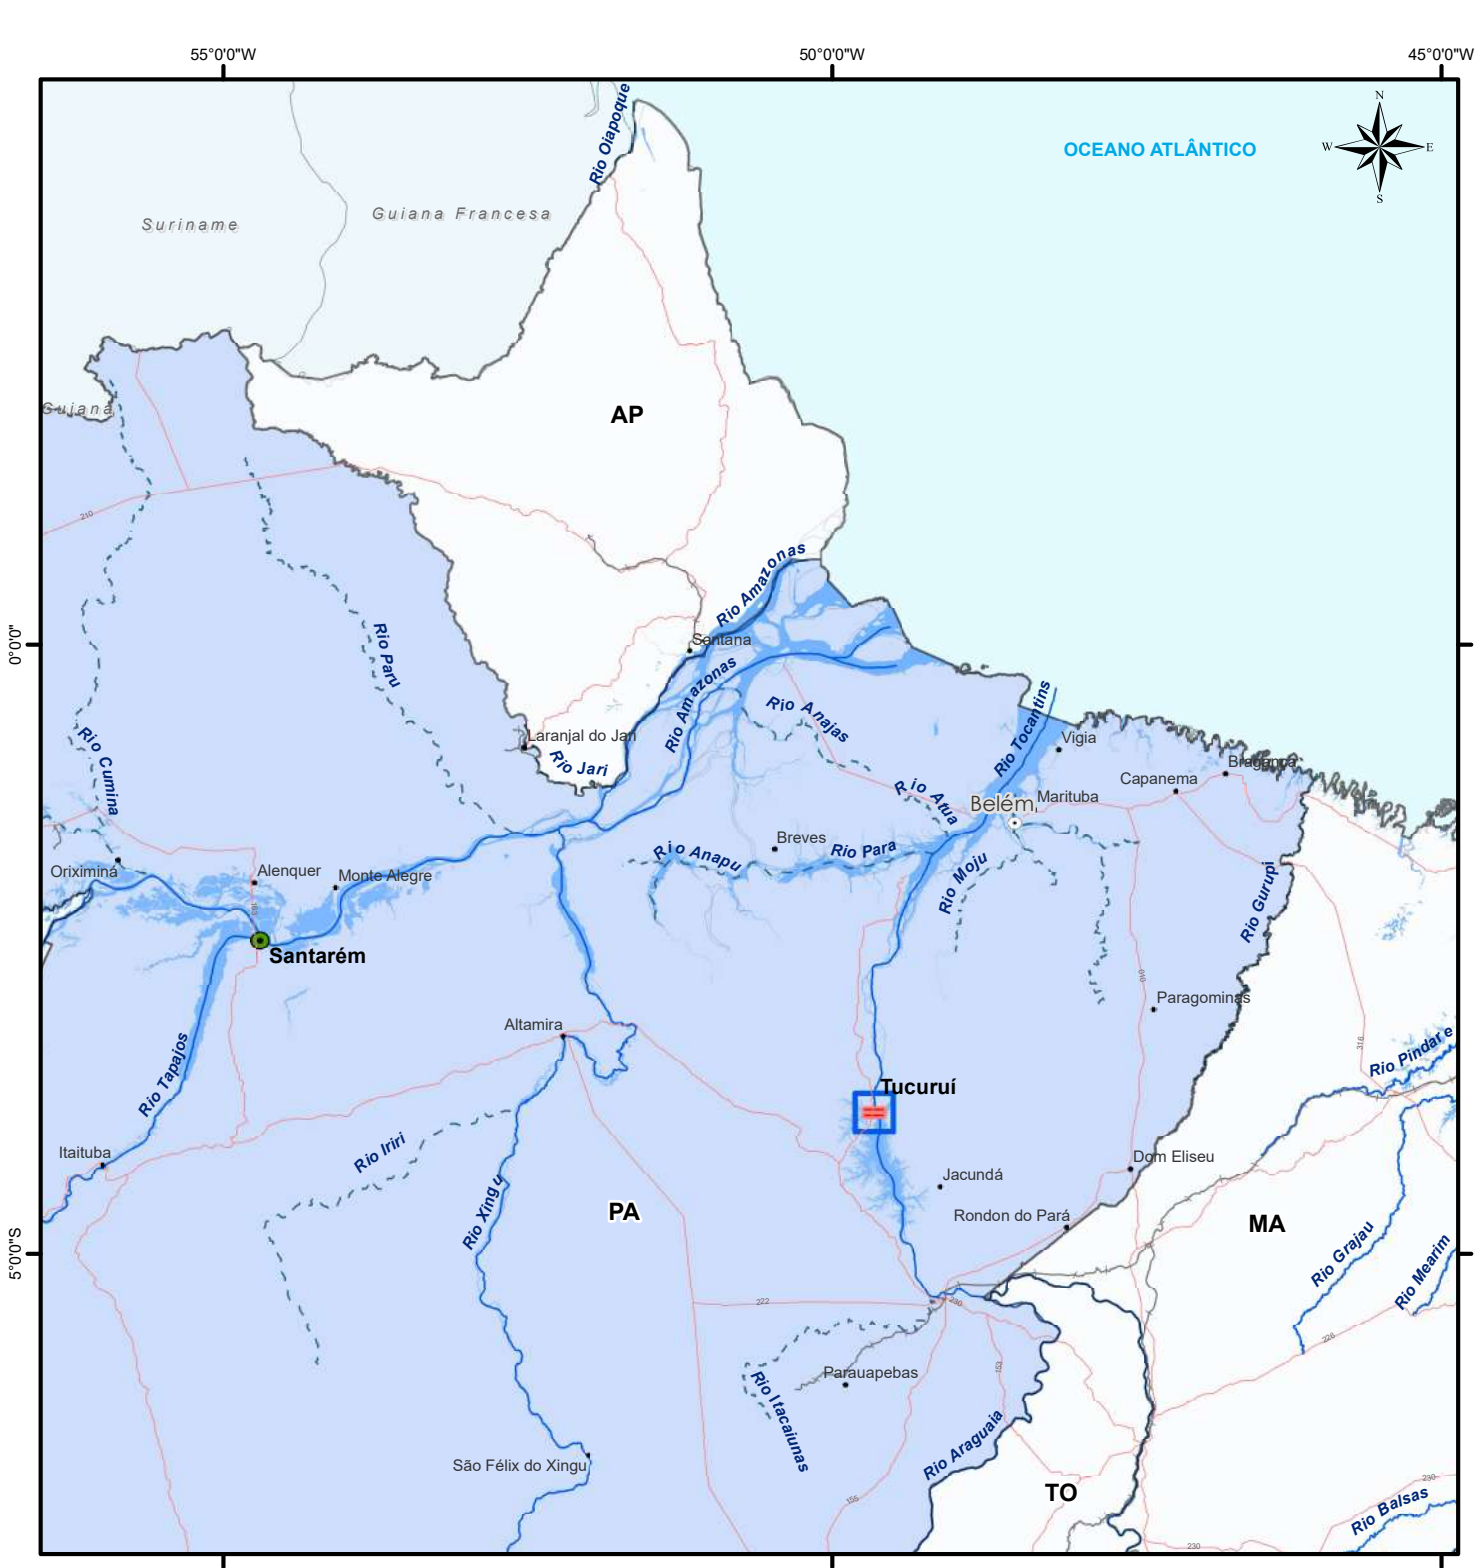

Superintendência Regional do Pará
OPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV**

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV


Instalações Portuárias de Pequeno Porte - IP4	Quantidade	%
IP4 em Operação	01	100,0 %
IP4 fora de Operação	00	00,0 %
Total	01	100,0 %

Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	00	0,0 %
Descoberto	01	100,0 %
Total	01	100,0 %

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação (*)	00	0,0 %
Eclusas fora de Operação	01	100,0 %
Total	01	100,0 %

Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	01	100,0 %
Descoberto	00	0,0 %
Total	01	100,0 %

(*) Eclusa disponível para operação em casos emergenciais.



1:6.902.671

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

PA - PARÁ

Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)	
1	Diagnóstico, Operação e Manutenção das Eclusa do Tucuruí	PA	Rio Tocantins HN-200	28 00904/2019	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	03/01/2020	20/08/2021	R\$ 5.958.901	R\$ 4.141.590	70%	Ativo	28 00330/2020	TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA	01/06/2020	16/06/2021	77%	
TOTAL GERAL								R\$ 5.958.901	R\$ 4.141.590	70%		TOTAL GERAL				77%	

55°0'0"W

50°0'0"W

45°0'0"W



Legenda

● Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

- - - SNV

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4

● Concluídas em operação

● Concluídas fora de operação

Eclusas

— Eclusa fora de operação

Cobertura Contratual - IP4		Quantidade	%
● Coberto		00	0,0 %
● Descoberto		01	100,0 %
Cobertura Contratual - ECLUSAS		Quantidade	%
□ Coberto		01	100,0 %
□ Descoberto		00	0,0 %
Total		01	100,0 %

175 87,5 0 175 km

1:8.300.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000


Dados emitidos em Fevereiro/2021.



PA - PARÁ

Instrumentos de manutenção de hidrovia																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Remoção do Navio Haidar	PA	Rio Pará HN-205	00 00001/2019	Superpesa	23/05/2019	17/12/2021	R\$ 44.637.500	R\$ 11.136.735	25%	Ativo	28 00319/2020	CHD-Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas Ltda	14/05/2020	25/06/2021	66%
TOTAL GERAL								R\$ 44.637.500	R\$ 11.136.735	25%		TOTAL GERAL				66%

Instrumentos de manutenção de eclusas																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Diagnóstico, Operação e Manutenção das Eclusa do Tucuruí	PA	Rio Tocantins HN-200	28 00904/2019	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	03/01/2020	20/08/2021	R\$ 5.958.900,89	R\$ 4.141.590,03	70%	Ativo	28 00330/2020	TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA	01/06/2020	16/06/2021	77%
TOTAL GERAL								R\$ 5.958.901	R\$ 4.141.590	70%		TOTAL GERAL				77%



- SNV**

- ## Hidroviás do SNV


- ## Sinalização

(km)

- ## Cobertura Contratual

Quantidade

-  Descoberto




1:6.902.671

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

PA - PARÁ

Instrumentos de sinalização																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Sinalização na foz do Rio Amazonas	PA	Rio Amazonas HN-100	TED 331/2018	Marinha Brasileira	16/08/2018	16/02/2023	R\$ 8.027.800	R\$ 1.871.868	23%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 8.027.800	R\$ 1.871.868	23%		TOTAL GERAL				-

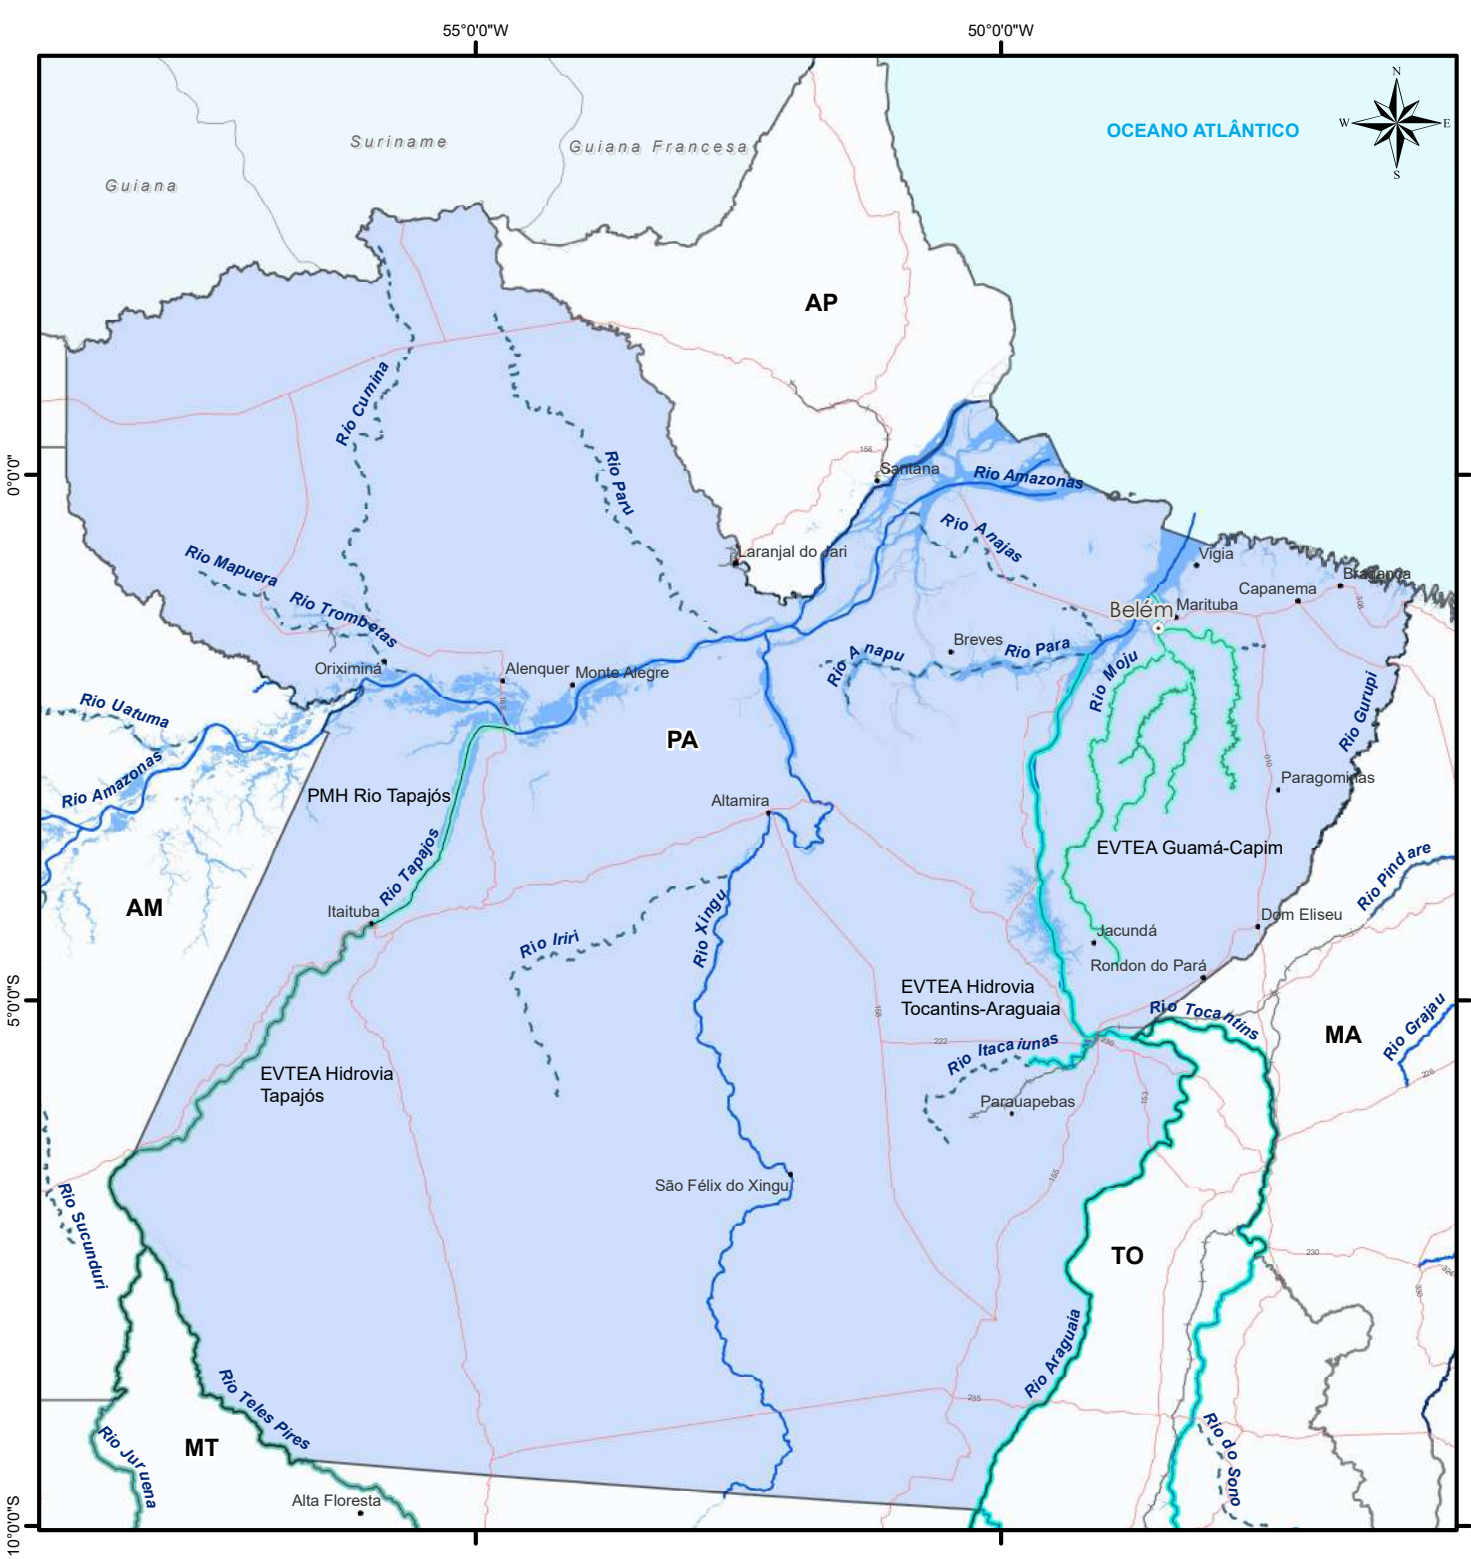

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Estudos e Projetos (km)

EVTEA Hidrovia Tocantins-Araguaia	565,0 km
EVTEA Hidrovia Tapajós	2.516,0 km
EVTEA Guamá-Capim	372,0 km
Total	3.453,0 km
PMH Rio Tapajós/PA	287,89 km



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

PA - PARÁ

Instrumentos de estudos e projetos																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)		Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Financeiro Executado (%)
1	EVTEA e projetos na Hidrovia de Guamá-Capim	PA	Rio Guamá HN-201 e Rio Capim HN-203	00 00133/2017	CONSÓRCIO R.PEOTTA-HIDROTO- ENEFER	14/07/2017	26/06/2021	R\$	3.912.021	R\$	3.111.439	80%	Ativo	-	-	-
2	EVTEA Tapajós	PA	Rio Tapajós HN-106, Rio Teles Pires HN-110, Rio Juruena HN-107	00 00566/2015	CONSÓRCIO R.PEOTTA-HIDROTO- ENEFER	31/07/2015	28/06/2021	R\$	19.077.670	R\$	10.650.496	56%	Ativo	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tapajós	PA	Rio Tapajós HN-106	02 00922/2020	CHD-CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS	15/01/2021	15/01/2026	R\$	9.282.572	R\$	-	0%	Ativo	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$	32.272.262	R\$	13.761.935	43%		TOTAL GERAL		



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR PR



Dragagem Porto de Paranaguá/PR

DNIT

52°30'0"W

50°0'0"W



Superintendência Regional do Paraná

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
■ SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
— Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
— SNV

Intervenções

Quantidade

- Dragagem do Porto de Paranaguá 01

90 45 0 90 km

1:4.222.603

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.



PR - PARANÁ

Instrumentos de construção e recuperação																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Dragagem Porto de Paranaguá	PR	Rio Paranaguá	00 00026/2015	DTA Engenharia	03/11/2015	01/03/2022	R\$ 403.629.205	R\$ 259.588.818	64%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 403.629.205	R\$ 259.588.818	64%		TOTAL GERAL				-



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR PE



Porto de Recife/PE

DNIT

**Superintendência Regional de Pernambuco
MANUTENÇÃO**



Legenda

○ Capitais

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

- - - SNV

Intervenções

Quantidade

■ Dragagem do Porto Organizado de Recife


01

90 45 0 90 km

1:4.200.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em Fevereiro/2021.

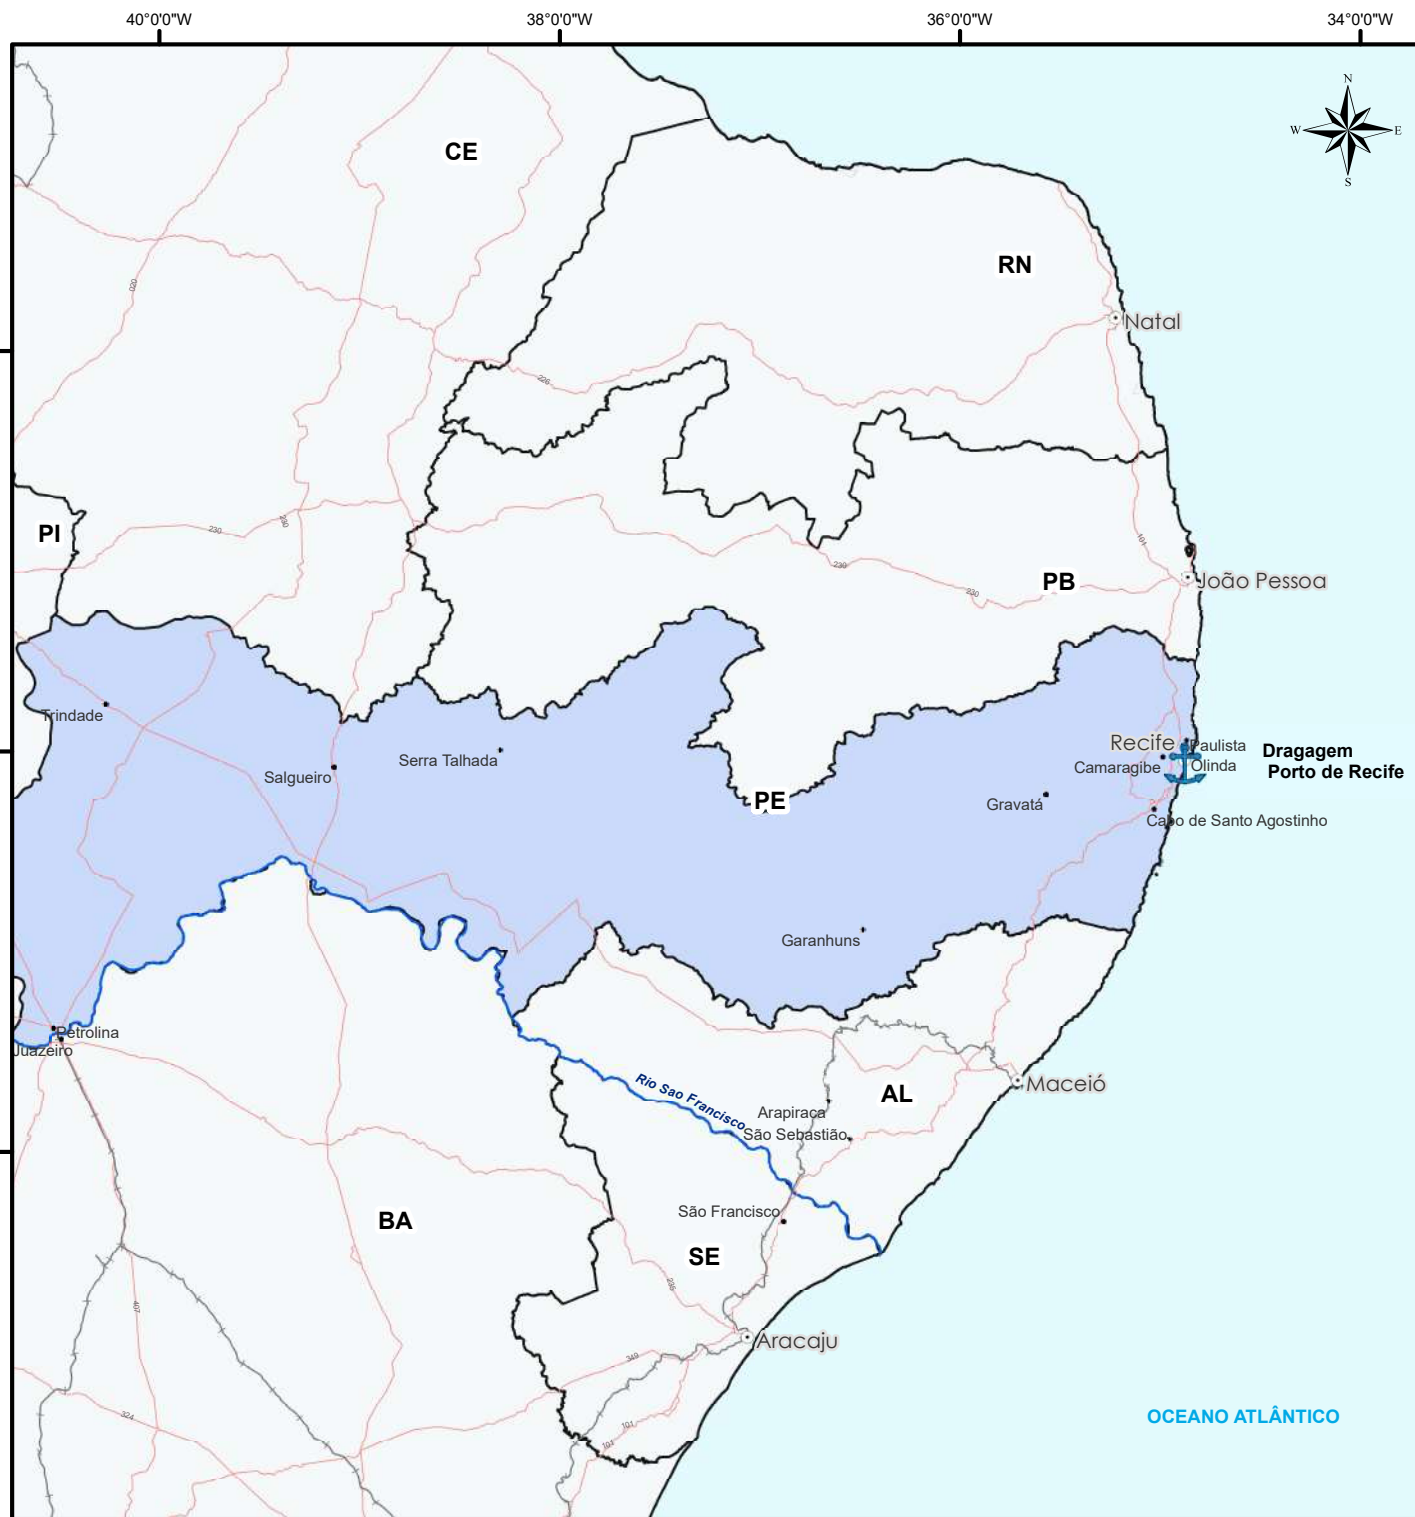

PE - PERNAMBUCO

Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem de Manutenção Porto de Recife	PE	Rio Capibaribe e Rio Beberibe	TC 869/2019	Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - SDEC	26/12/2019	31/10/2021	R\$	28.387.414	R\$	-	0%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$	28.387.414	R\$	-	0%		TOTAL GERAL				-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RO



DNIT

IP4 Cai N'Água/RO

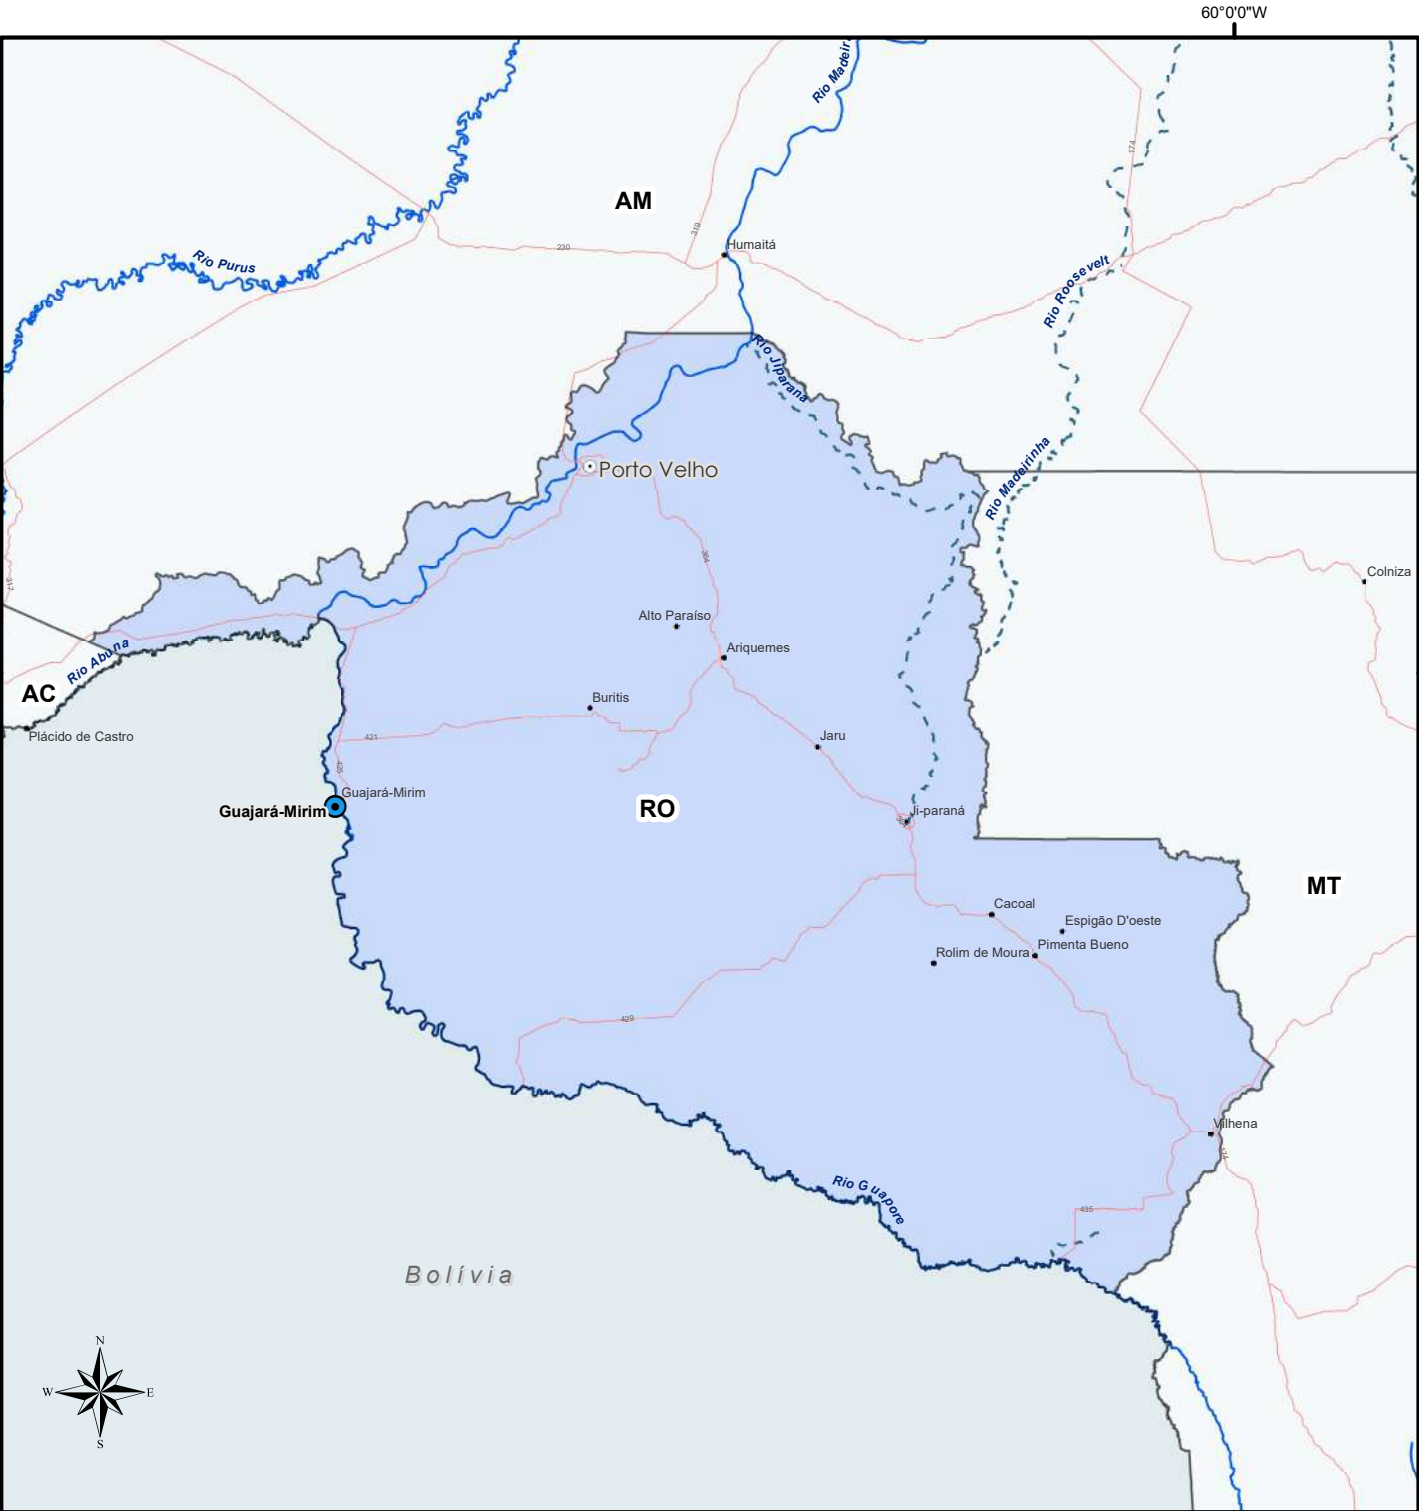

Superintendência Regional de Rondônia
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

IP4 em Obras	Quantidade
Em construção	01


Obs: A Obra só será dada como concluída após emissão do Termo de Recebimento Definitivo.



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

RO - RONDÔNIA

Instrumentos de construção e recuperação																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	IP4 de Guajará-Mirim	RO	Rio Mamoré HN-125	00 00626/2018	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	23/08/2018	10/08/2021	R\$ 6.817.333	R\$ 300.711	4%	Ativo					
TOTAL GERAL								R\$ 6.817.333	R\$ 300.711	4%		TOTAL GERAL				-

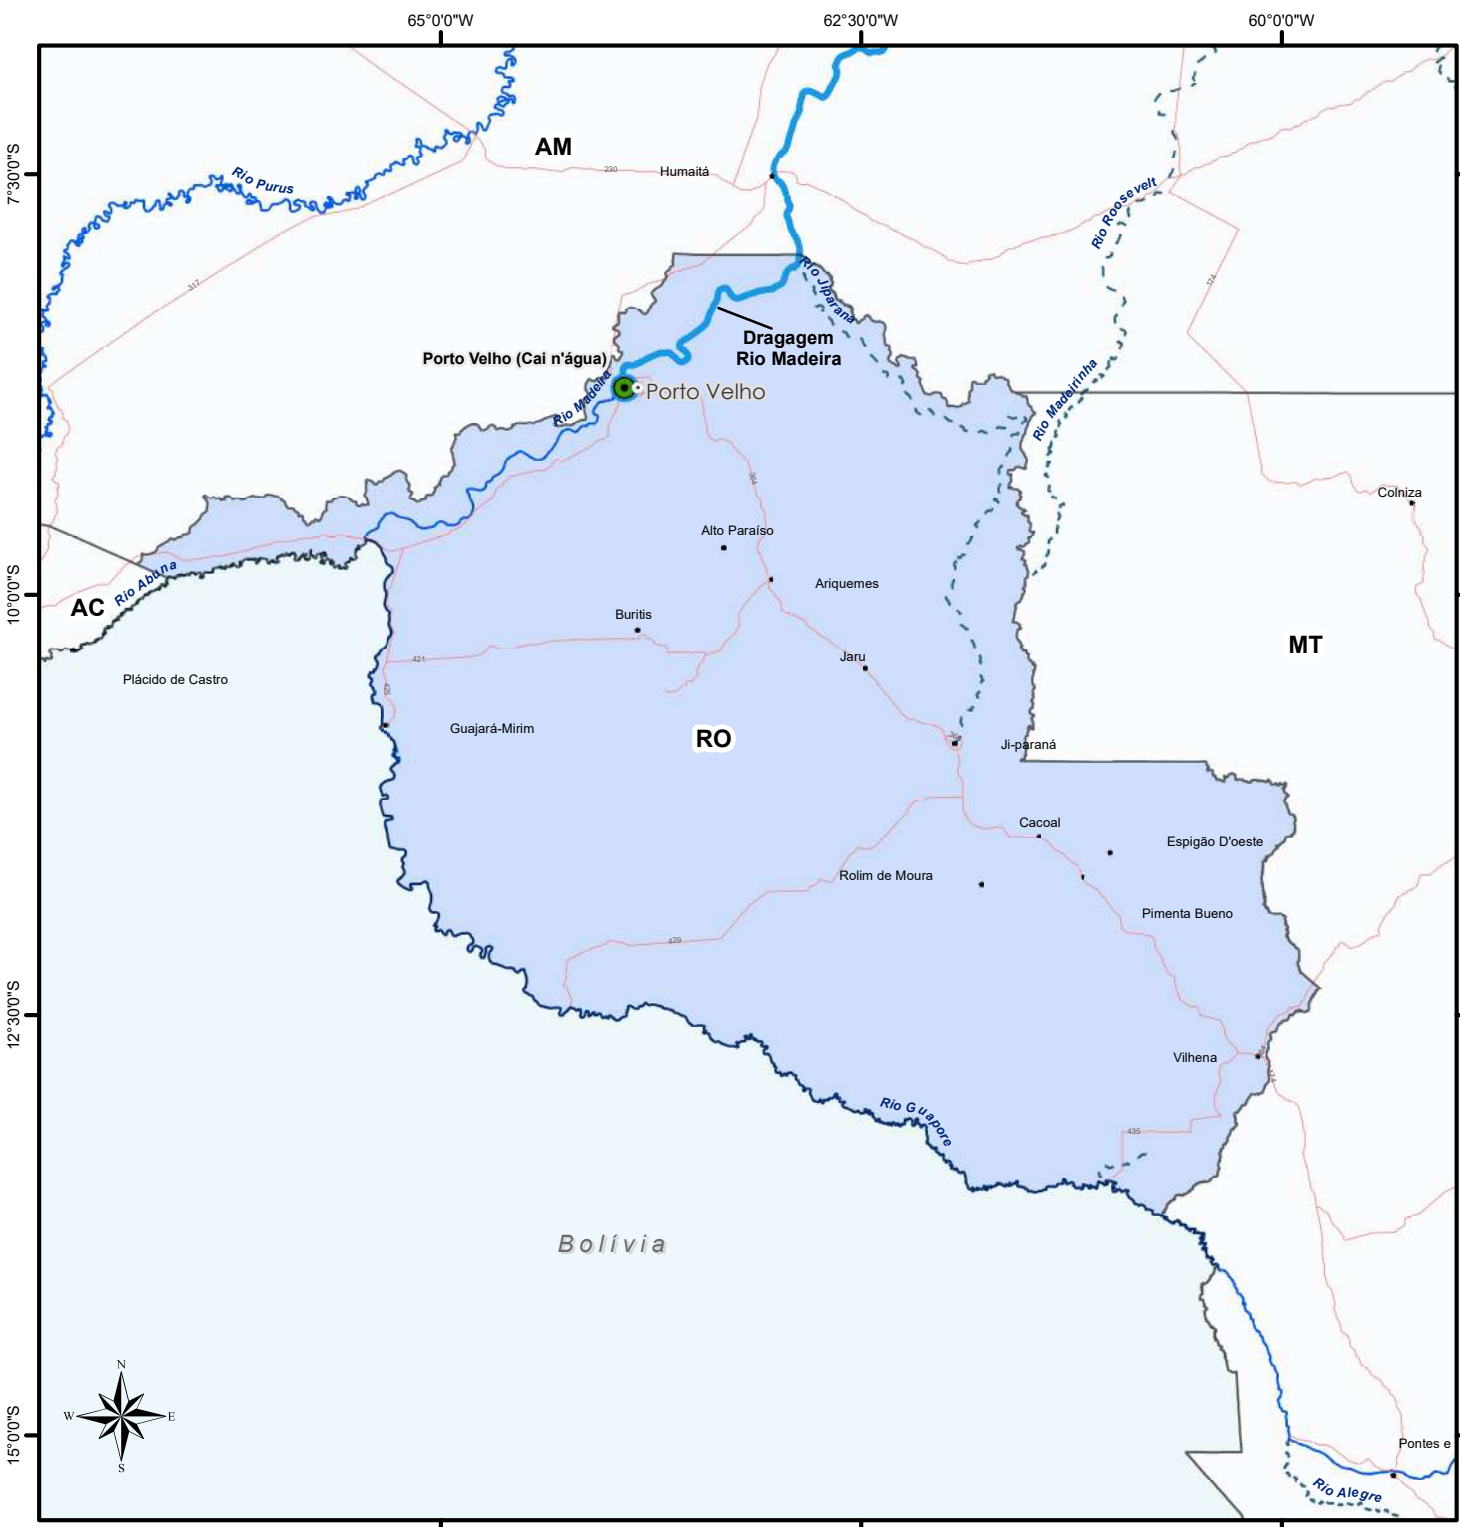

Superintendência Regional de Rondônia
MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Rodovias
- Hidrovias do SNV
 - Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
 - SNV

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte - IP4

- Concluídas em operação
- Concluídas fora de operação

Intervenções Aquaviárias		(km)
Dragagem Rio Madeira		1.086,0 km



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

RO - RONDÔNIA

Instrumentos de manutenção de hidrovia																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Dragagem do Madeira	AM	Rio Madeira HN-117	00 00634/2016	Consórcio JEED-EPC	28/11/2016	27/11/2021	R\$ 84.863.342	R\$ 68.815.864	81%	CONCLUÍDO	00 00010/2017	UMI SAN	21/02/2017	20/02/2022	77%
TOTAL GERAL								R\$ 84.863.342	R\$ 68.815.864	81%		TOTAL GERAL				77%



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RS



Eclusa de Bom Retiro do Sul/RS

DNIT

RS – RIO GRANDE DO SUL

Instrumentos de construção e recuperação																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem Porto de Rio Grande	RS	-	00 00024/2015	Jan de Nul	29/07/2015	23/03/2021	R\$ 481.935.641	R\$ 466.426.783	97%	Ativo	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL									R\$ 481.935.641	R\$ 466.426.783	97%		TOTAL GERAL				-

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul

OPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em Operação	03	75,0 %
Eclusas fora de Operação	01	25,0 %
Total	04	100,0 %
Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	04	100,0 %
Descoberto	00	0,0 %
Total	04	100,0 %

100 50 0 100 km
1:5.000.000
 Sistema de Coordenadas Geográficas
 Datum Sirgas 2000

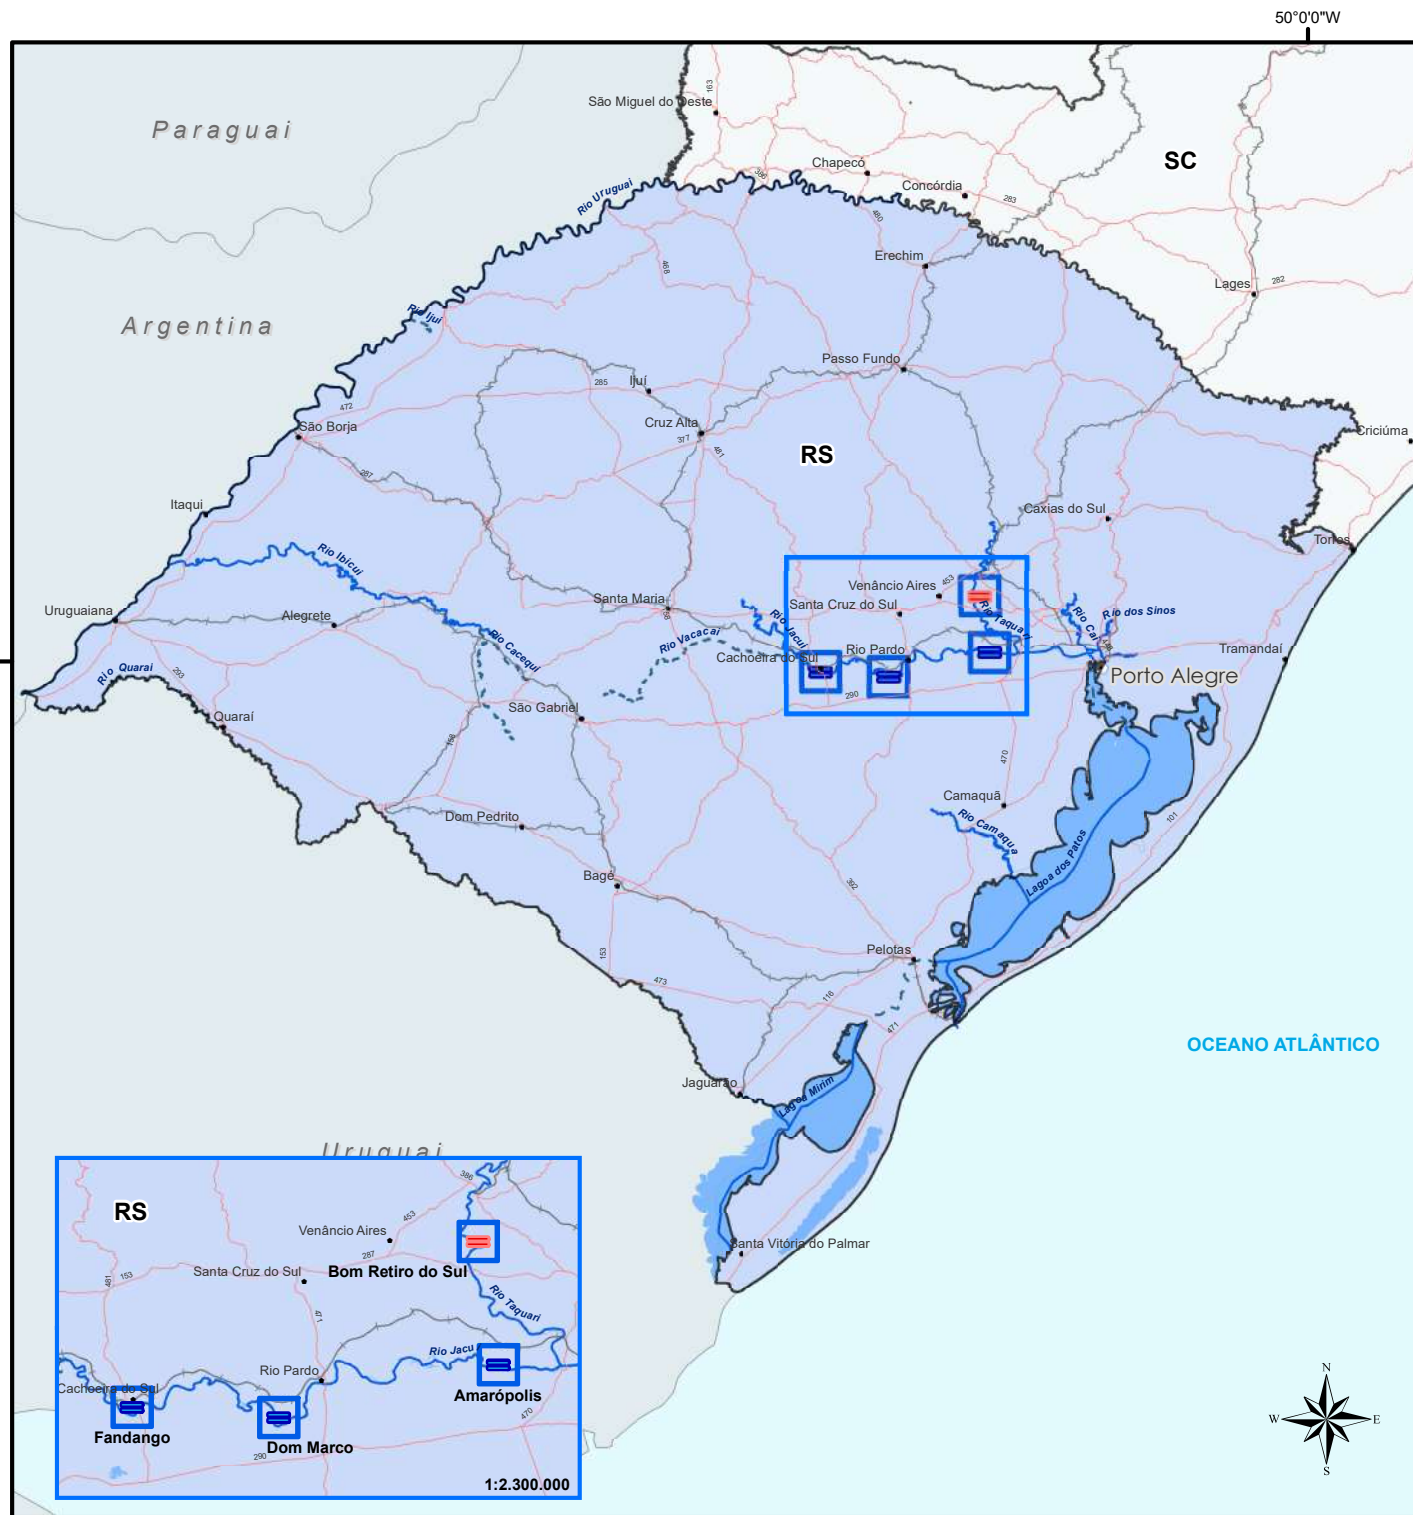

RS – RIO GRANDE DO SUL

Instrumentos de operação de eclusas																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)		Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção da Eclusa de Fandango	RS	Rio Jacuí HN-706	33 00006/2019	Pampulha Engenharia LTDA	07/03/2019	20/01/2022	R\$ 12.523.877	R\$ 10.250.554	82%	Ativo	33 00007/2019	RUMO ENGENHARIA	21/01/2019	06/03/2021	104%		
2	Operação e Manutenção da Eclusa de Dom Marco	RS	Rio Jacuí HN-706															
3	Operação e Manutenção da Eclusa de Amarópolis	RS	Rio Jacuí HN-706															
4	Operação e Manutenção da Eclusa de Bom Retiro do Sul	RS	Rio Taquari HN-710															
TOTAL GERAL								R\$ 12.523.877	R\$ 10.250.554	82%		TOTAL GERAL				104%		

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul
MANUTENÇÃO



Legenda

● Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

— SNV

Eclusas

— Eclusa em operação

— Eclusa fora de operação


Cobertura Contratual - ECLUSAS		Quantidade	%
	Coberto	04	100,0 %
	Descoberto	00	0,0 %
	Total	04	100,0 %

Intervenções Aquaviárias (km)	
—	Dragagem do Rio Taquari 14,0 km

100 50 0 100 km

1:5.000.000


Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

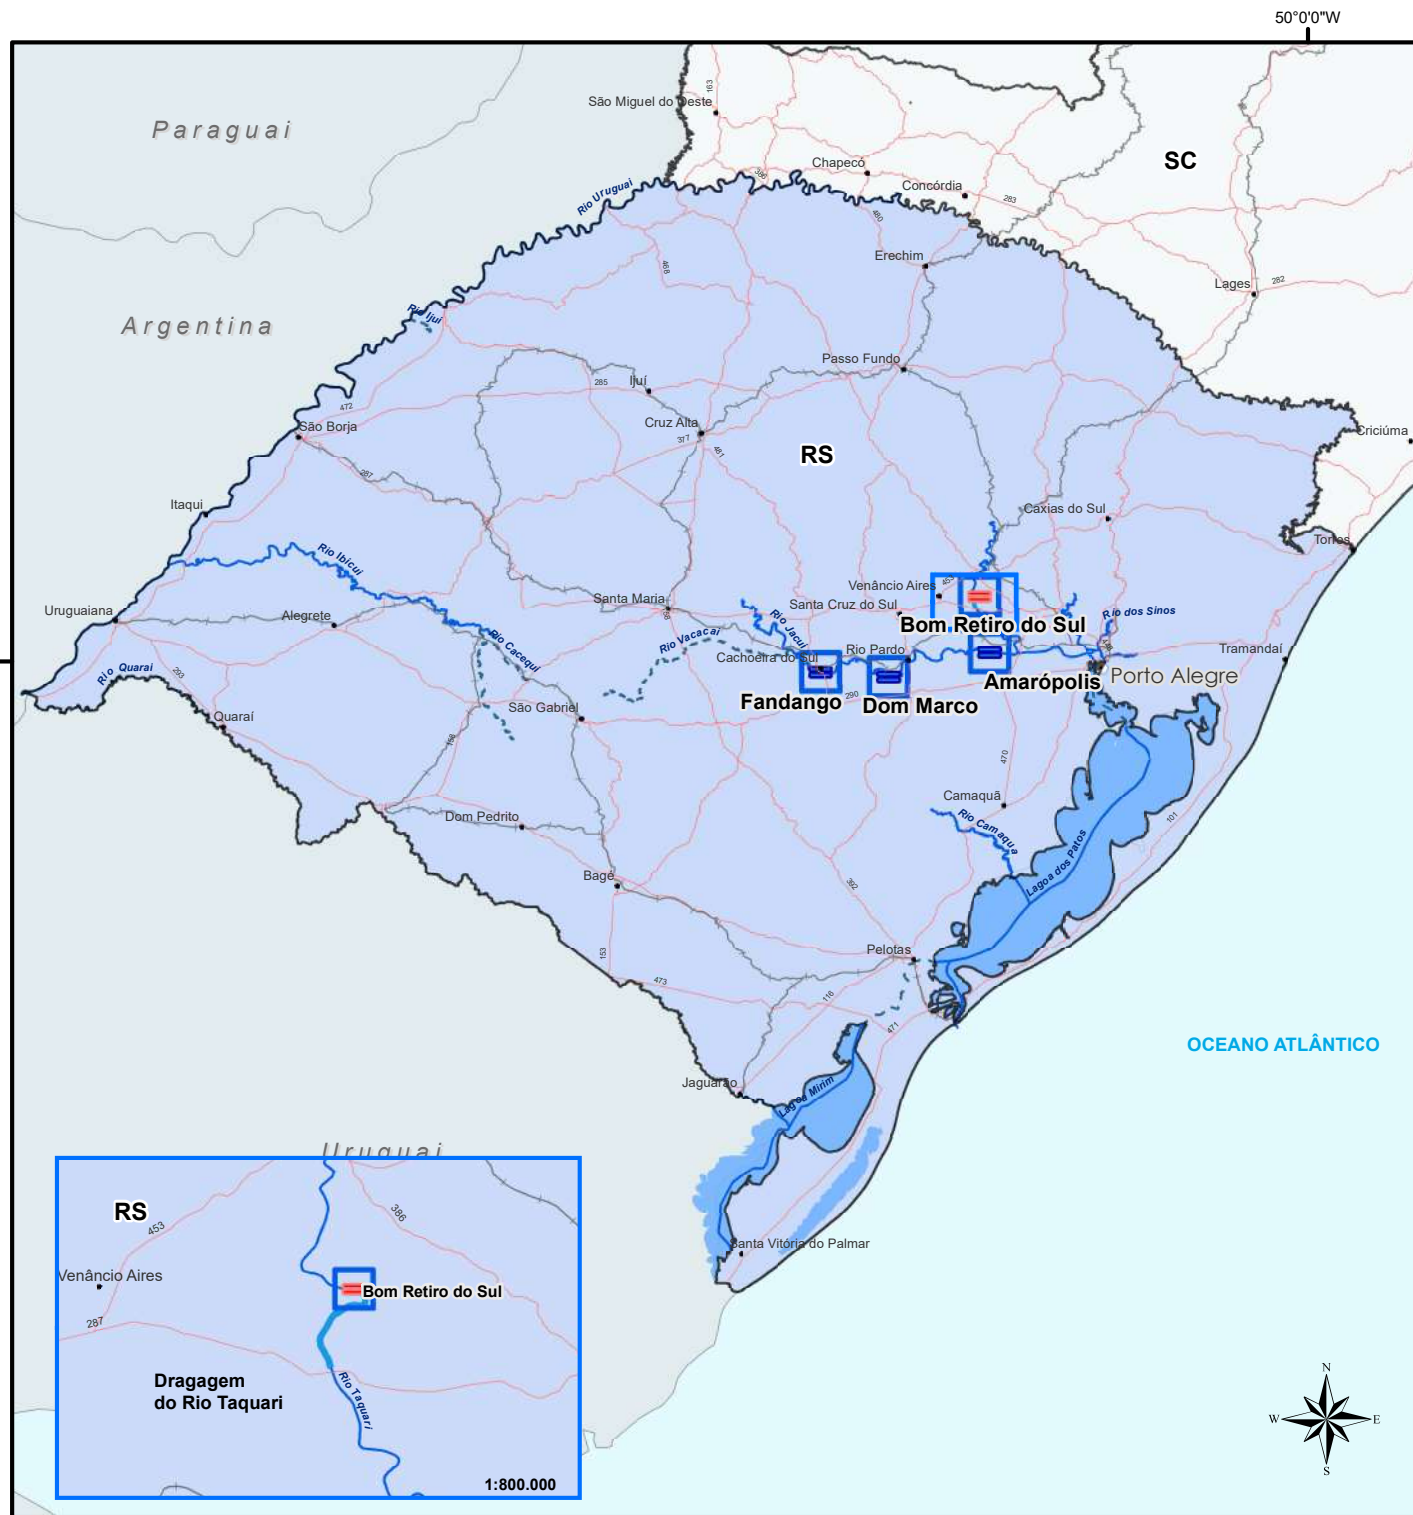

RS – RIO GRANDE DO SUL

Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem do Rio Taquari do km 110 ao km 121	RS	Rio Taquari HN-710	33 00454/2017	SCHEIN - Engenharia e Serviços Aquaviários LTDA	01/11/2017	30/10/2022	R\$	11.196.807	R\$	6.312.939	56%	CONCLUÍDO	33 00033/2018	CHD - Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas	01/09/2018	31/08/2023	52%
TOTAL GERAL								R\$	11.196.807	R\$	6.312.939	56%		TOTAL GERAL			52%	

Instrumentos de manutenção de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção da Eclusa de Fandango	RS	Rio Jacuí HN-706	33 00006/2019	Pampulha Engenharia LTDA	07/03/2019	20/01/2022	R\$ 12.523.877	R\$ 10.250.554	82%	Ativo	-	-	-	-	-	-
2	Operação e Manutenção da Eclusa de Dom Marco	RS	Rio Jacuí HN-706														
3	Operação e Manutenção da Eclusa de Amarópolis	RS	Rio Jacuí HN-706														
4	Operação e Manutenção da Eclusa de Bom Retiro do Sul	RS	Rio Taquari HN-710														
TOTAL GERAL								R\$ 12.523.877	R\$ 10.250.554	82%		TOTAL GERAL				-	

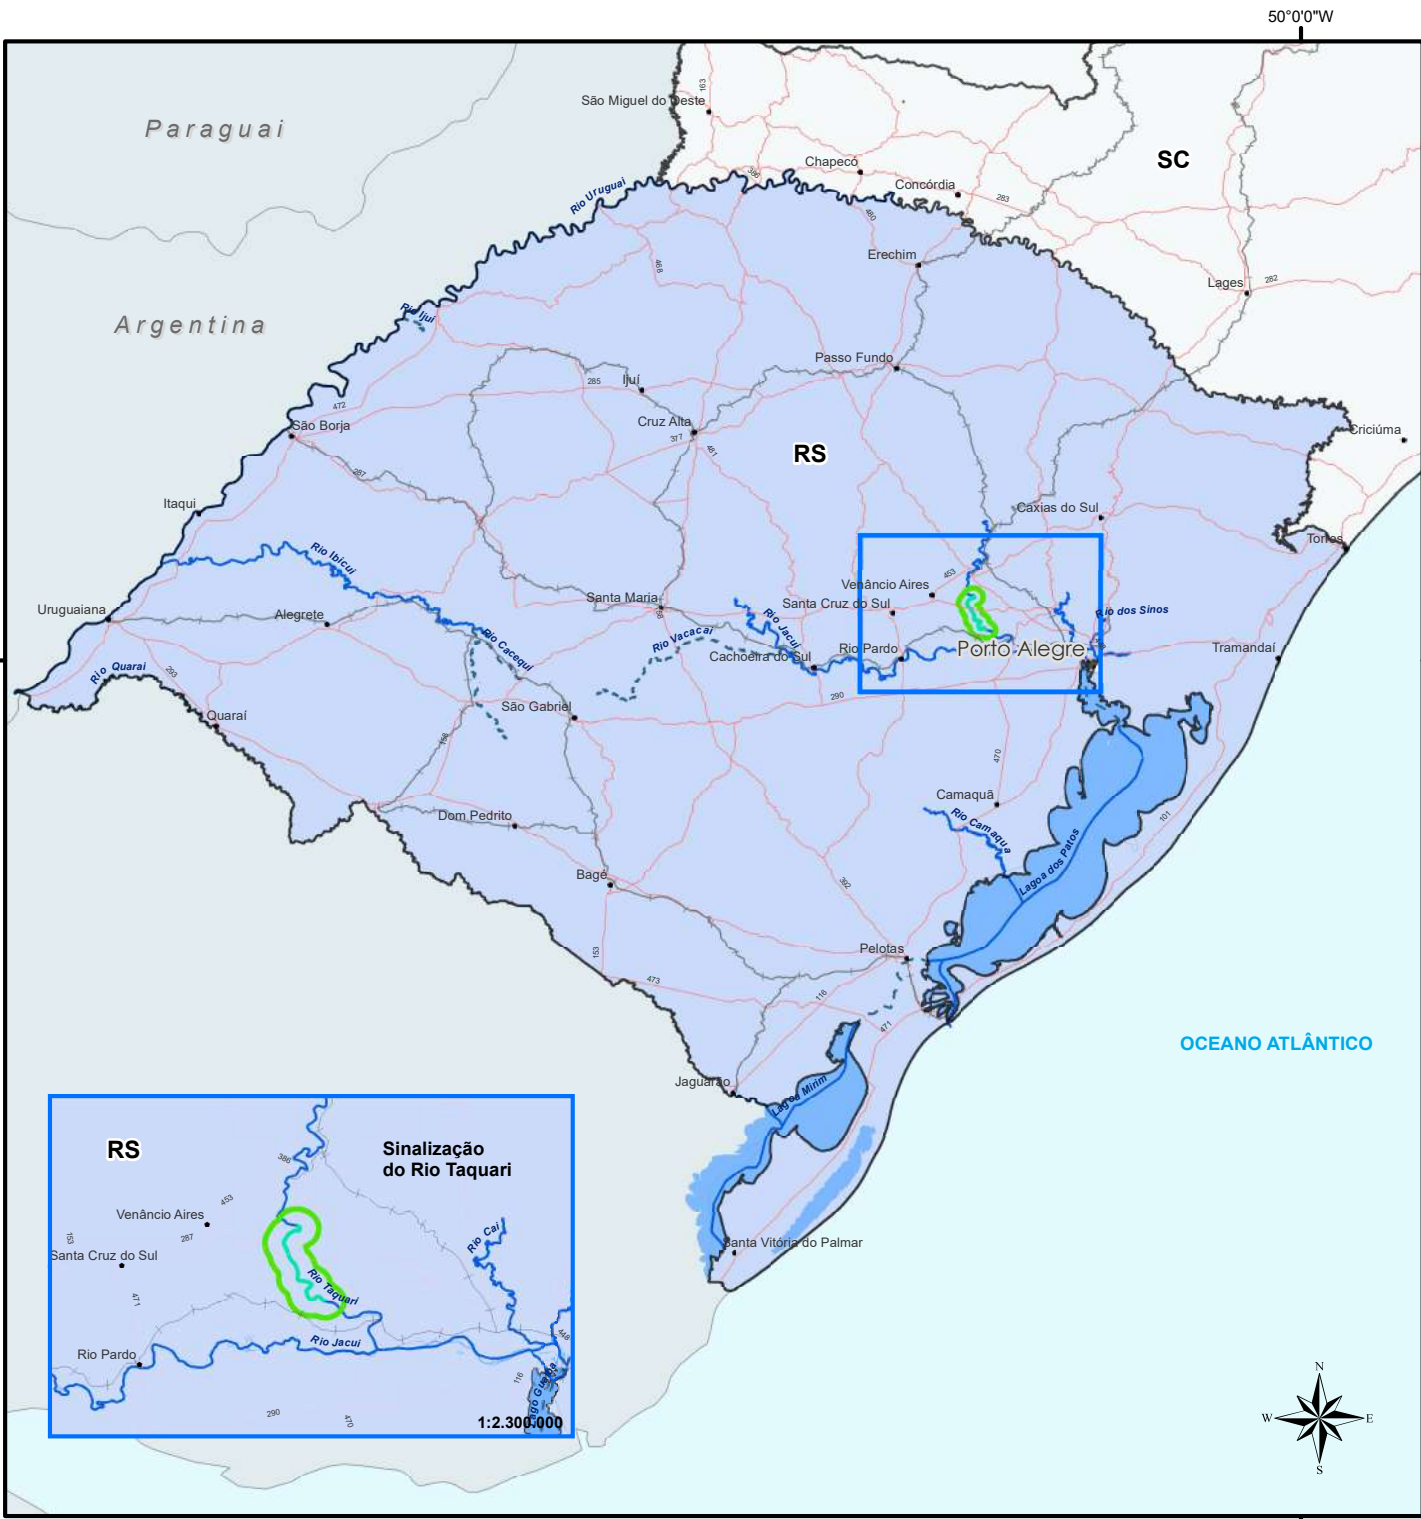

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul

SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Sinalização	(km)
Manutenção de Sinalização Rio Taquari	86,0 km

Cobertura Contratual	Quantidade
Coberto	01
Descoberto	00



1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

RS – RIO GRANDE DO SUL

Instrumentos de sinalização																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Sinalização do Rio Taquari entre km 56 e km 142	RS	Rio Taquari HN-710	33 00033/2018	CHD - Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas	01/09/2018	31/08/2023	R\$ 8.578.960	R\$ 4.472.181	52%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 8.578.960	R\$ 4.472.181	52%		TOTAL GERAL				-

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul

ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

● Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV


— SNV

Eclusas	Quantidade	%
Projeto de Eclusas	04	100,0 %
Total	04	100,0 %

100 50 0 100 km

1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

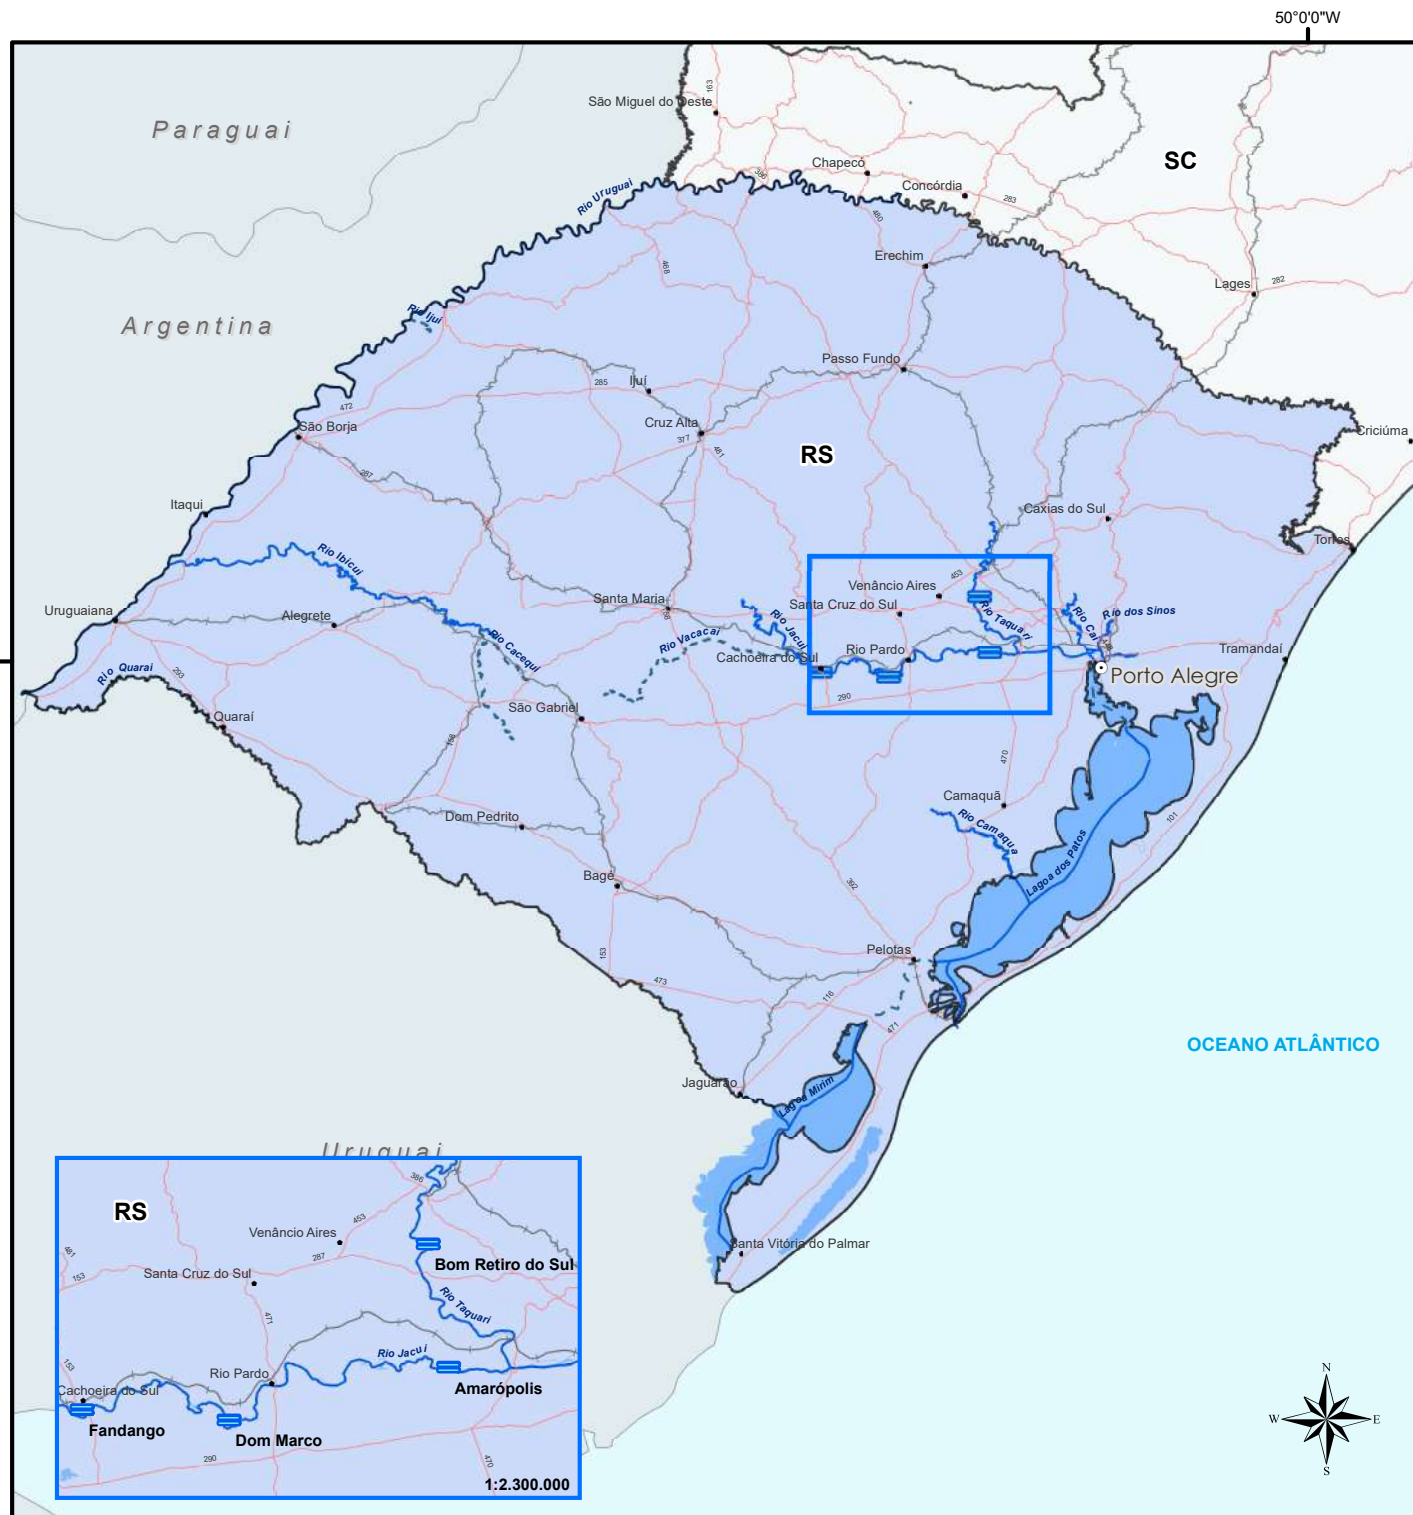

RS – RIO GRANDE DO SUL

Instrumentos de estudos e projetos																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Projeto Eclusa Fandango	RS	Rio Jacuí HN-706	33 00799/2019	Consórcio MAGNA-THEMAG	29/11/2019	28/09/2021	R\$ 833.742	R\$ 10.740	1%	Ativo	-	-	-	-	-
2	Projeto Eclusa Anel de Dom Marco	RS	Rio Jacuí HN-706	33 00798/2019	Consórcio MAGNA-THEMAG	13/01/2020	28/09/2021	R\$ 709.648	R\$ -	0%	Ativo	-	-	-	-	-
3	Projeto Eclusa de Amarópolis	RS	Rio Jacuí HN-706	33 00800/2019	Nova Engevix Engenharia e Projetos	13/01/2020	02/09/2021	R\$ 1.539.310	R\$ 388.363	25%	Ativo	-	-	-	-	-
4	Projeto Eclusa Bom Retiro do Sul	RS	Rio Taquari HN-710	33 00811/2019	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	13/01/2020	28/07/2021	R\$ 923.167	R\$ 53.344	6%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 3.082.700	R\$ 399.103	13%		TOTAL GERAL				-



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR SP



Eclusa de Jupia/SP


DNIT

SP – SÃO PAULO

Instrumentos de construção e recuperação																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Derrocagem de Nova Avanhandava	SP	Rio Tietê HN-913	TC 589/2014	DH - SP	25/03/2015	30/09/2023	R\$ 203.090.043	R\$ 51.809.974	26%	Ativo	-	-	-	-	-
2	Escavação de canal de acesso à eclusa de Ibitinga	SP	Rio Tietê HN-913	TC 218/2012	DH - SP	09/05/2012	28/02/2022	R\$ 9.938.291	R\$ 9.521.371	96%	Ativo					
TOTAL GERAL								R\$ 213.028.334	R\$ 61.331.345	29%		TOTAL GERAL				-

SP – SÃO PAULO

Instrumentos de operação de eclusas																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Operação da Eclusa de Jupia	SP	Rio Paraná HN-900	31 00734/2018	RIO PARANÁ ECLUSA S/A - MATRIZ	18/09/2018	30/09/2023	R\$ 8.157.916	R\$ 574.331	7%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 8.157.916	R\$ 574.331	7%		TOTAL GERAL				-

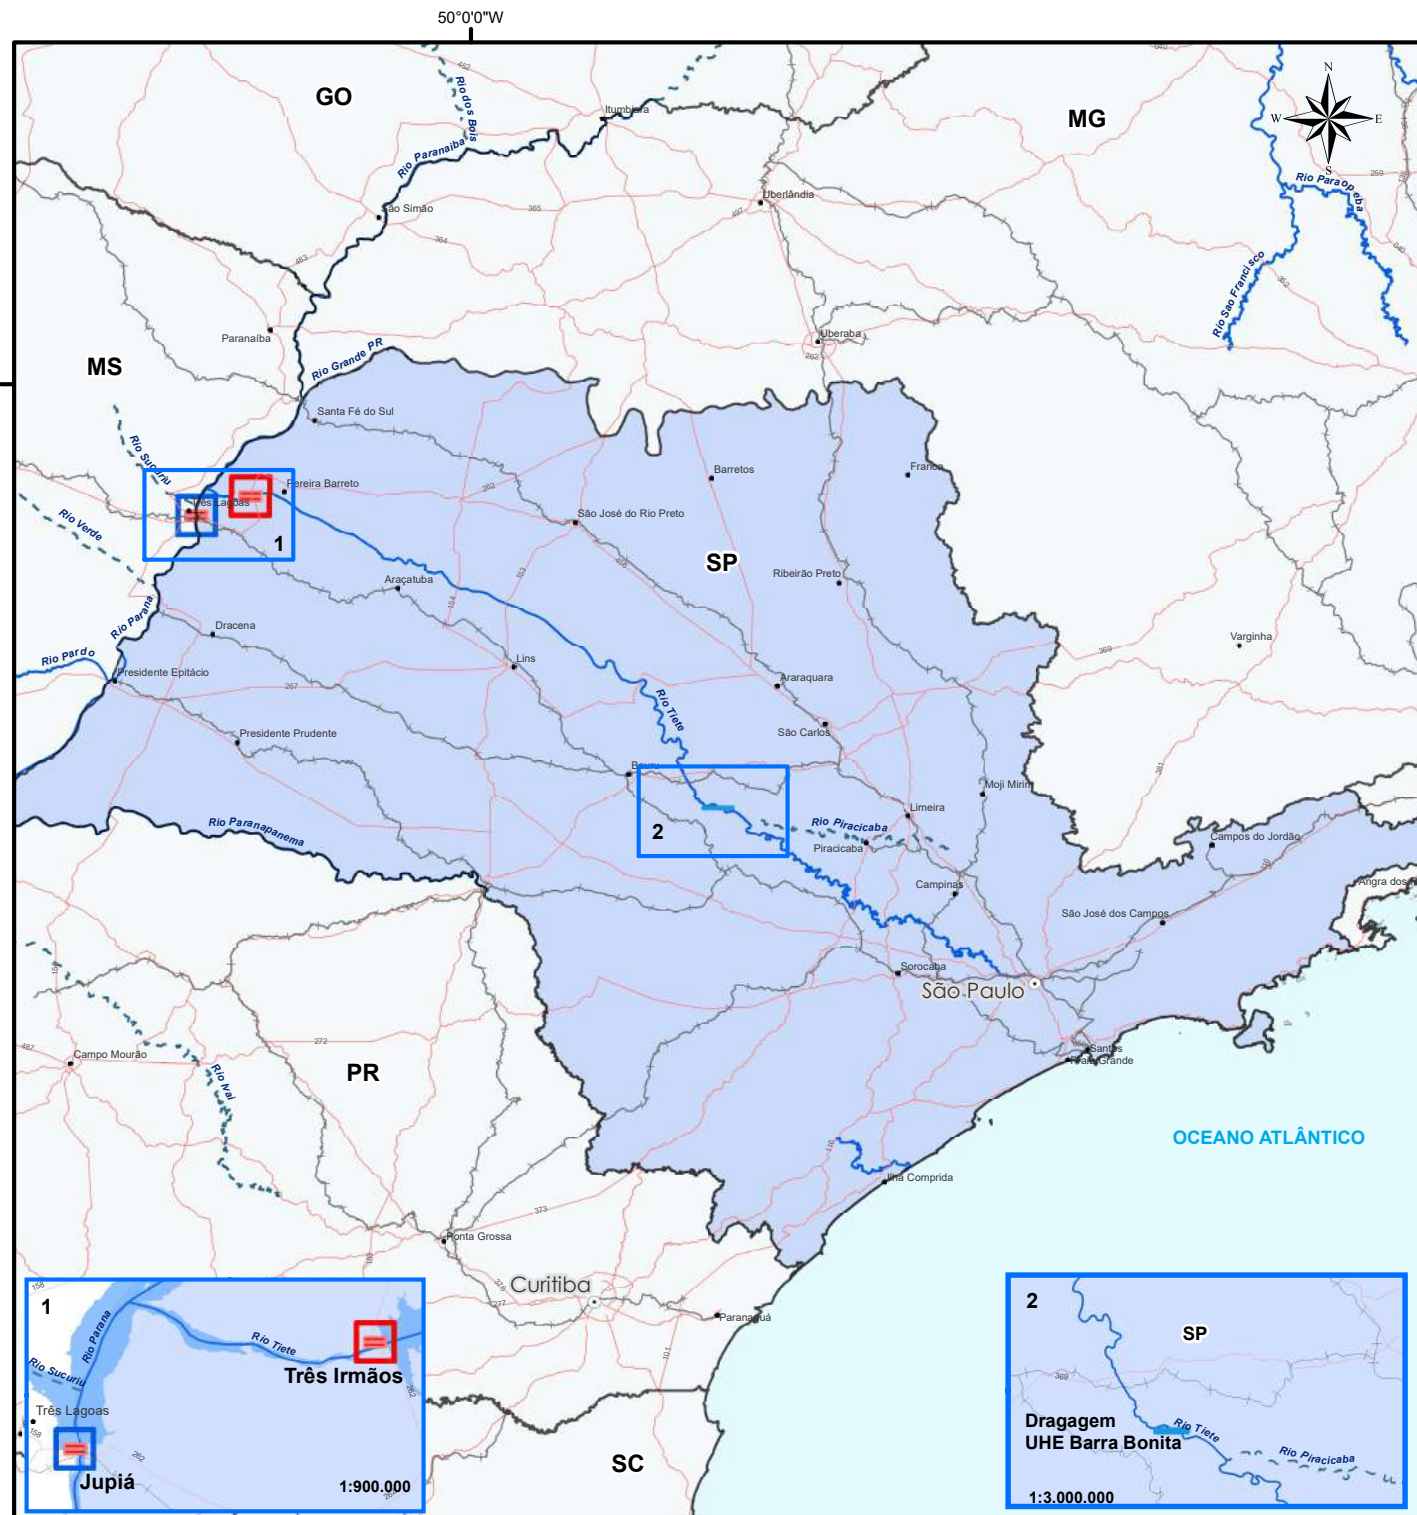

Superintendência Regional de São Paulo
MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV
- SNV

Eclusas

- Eclusas em Operação
- Eclusas fora de Operação

Cobertura Contratual		Quantidade	%
	Coberto	02	100,0 %
	Descoberto	00	0,0 %
Total		02	100,0 %

Intervenções Aquaviárias (km)

- Dragagem do canal da UHE Barra Bonita 17,0 km



SP – SÃO PAULO

Instrumentos de manutenção de hidrovia																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	Dragagem de sedimentos na rota de navegação do reservatório de Barra Bonita	SP	Rio Tietê HN-913	TC 685/2013	DH - SP	23/10/2013	31/03/2021	R\$ 22.400.260	R\$ 22.400.260	100%	Ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 22.400.260	R\$ 22.400.260	100%		TOTAL GERAL				-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR TO



Rio Tocantins

DNIT

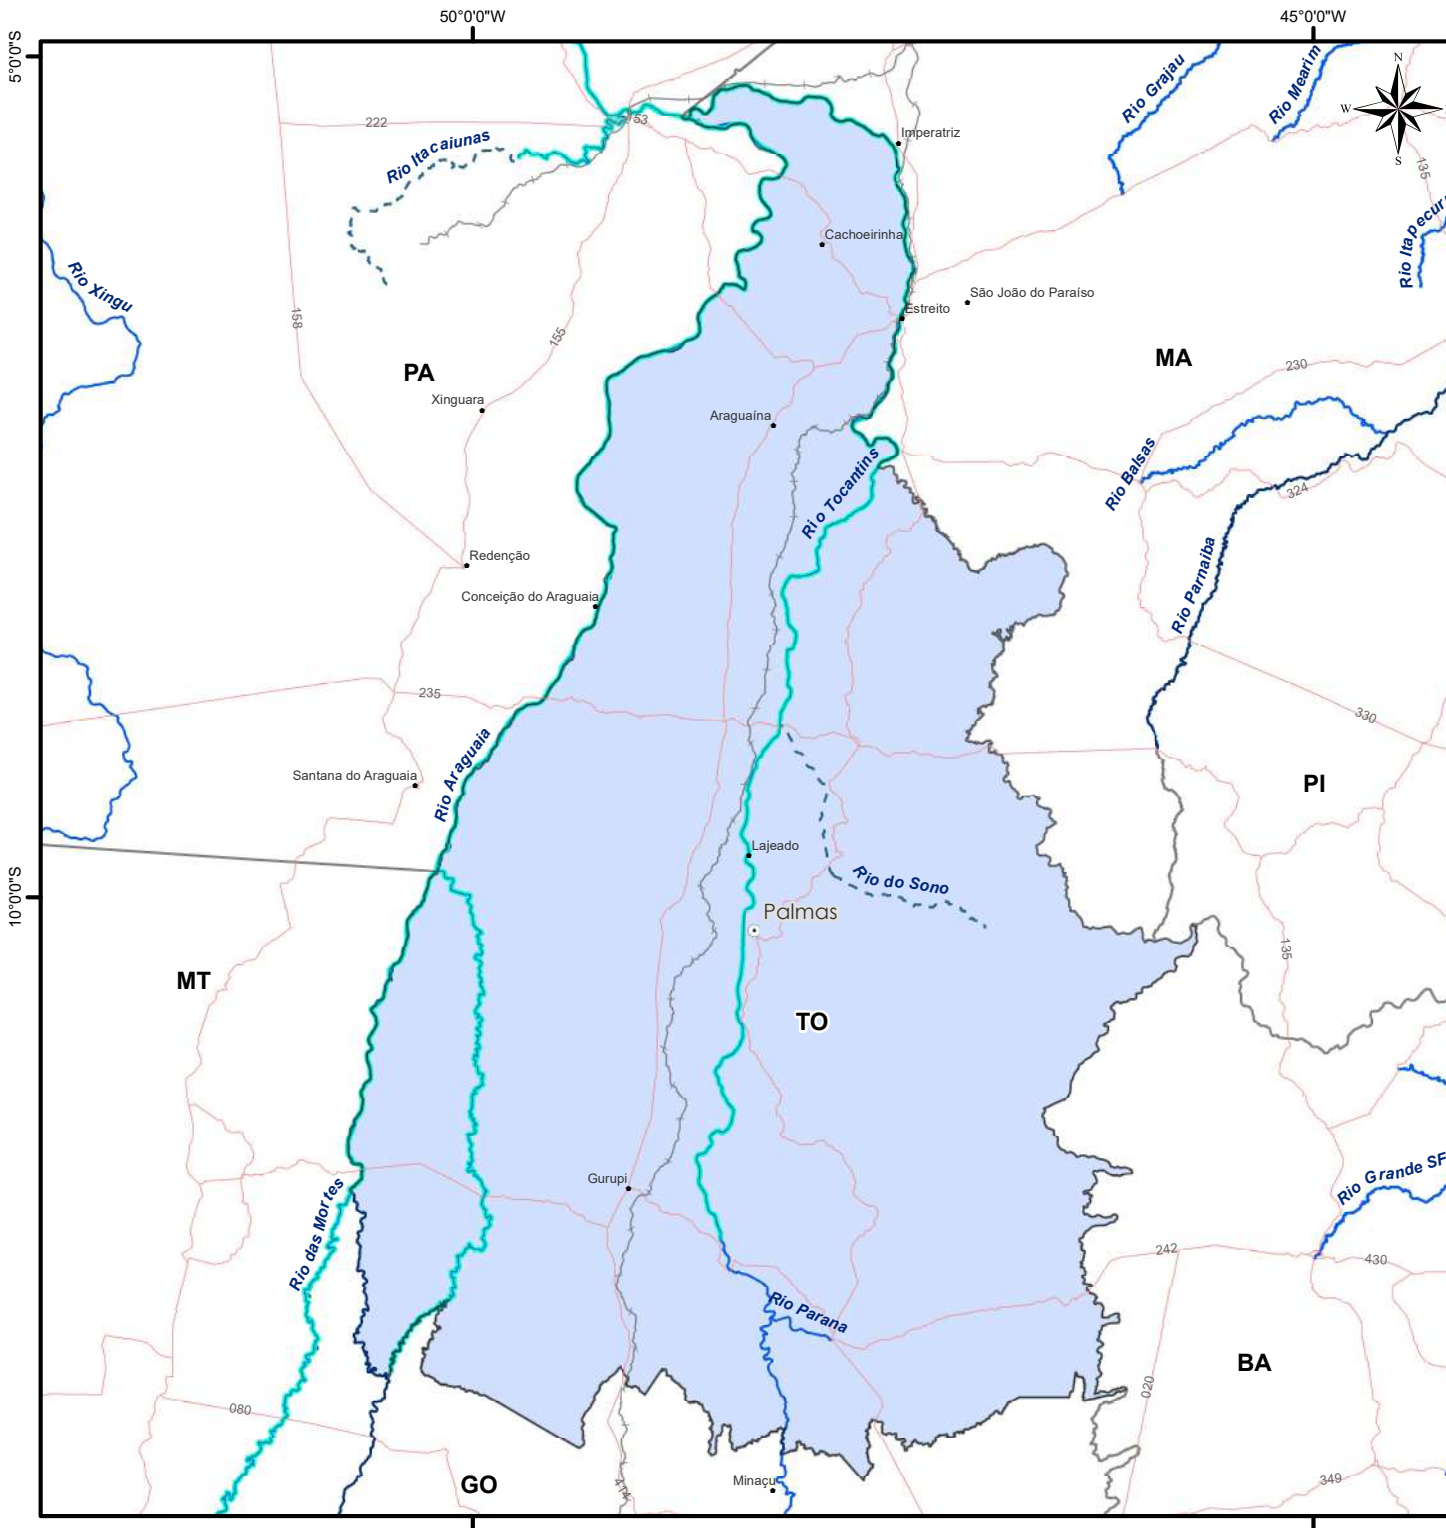

Legenda

○ Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

— Ferrovias

— Rodovias

Hidrovias do SNV

— Anexo 5 Lei 5.917/73 - PNV

- - - SNV

Estudos e Projetos	(km)
EVTEA Hidrovia Tocantins-Araguaia	3.810,0 km
Total	3.810,0 km

100 50 0 100 km

1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

TO - TOCANTINS

Instrumentos de estudos e projetos																
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Financeiro Executado (%)
1	EVTEA na Hidrovia do Tocantins-Araguaia	TO	Rio Tocantins HN-200 e Rio Araguaia HN-209	34 00565/2015	CONSÓRCIO R. PEOTTA-HIDROTO- ENEFER	13/07/2015	10/07/2021	R\$ 10.555.151	R\$ 5.178.036	49%	ativo	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 10.555.151	R\$ 5.178.036	49%		TOTAL GERAL				-








ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

INDICADORES



DNIT

INDICADORES ESTRATÉGICOS



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos																	Indicadores Operacionais							
Indicador SR/ Mês	1.1 Índice de obras de IP4 concluída com termo de recebimento provisório		2.1 Índice de obras em hidroviárias concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		4.1 Índice de obras de recuperação de IP4 concluídas		4.2 % de IP4 com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de IP4 (Dias)		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório		4.2.1 Movimentação de passageiros nas IP4		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	0	2	0	0	0	0	89%	95%	84%	100%	75%	100%	63%	100%	0	0	-	-	-	-	-	-
fev/21	0	0	0	0	0	0	0	0	89%	95%	86%	100%	75%	100%	38%	100%	0	0	-	-	-	-	-	-
mar/21		0		1		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
abr/21		0		1		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
mai/21		4		3		2		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
jun/21		0		0		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
jul/21		2		0		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
ago/21		1		0		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
set/21		1		2		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
out/21		0		2		1		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
nov/21		0		0		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-
dez/21		0		0		0		0		95%		100%		100%		100%		0	-	-	-	-	-	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ALAGOAS (SR-AL)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas (acumulado)



Legenda: Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/21	0	0
fev/21	0	0
mar/21		0
abr/21		0
mai/21		1
jun/21		0
jul/21		0
ago/21		0
set/21		0
out/21		0
nov/21		0
dez/21		0

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO AMAZONAS (SR-AM)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

1 – Índice de intervenções de obras de IP4 concluídas(acumulado)




2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)

Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de implantação/ampliação hidroviárias para a SR em 2021.



4 – Disponibilidade de IP4



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	1.1 Índice de obras de IP4 concluída com termo de recebimento provisório		4.1 Índice de obras de recuperação de IP4 concluídas		4.2 % de IP4 com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de IP4 (Dias)		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório		4.2.1 Movimentação de passageiros nas IP4	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	0	0	93%	100%	88%	100%	0	0	-	-
fev/21	0	0	0	0	93%	100%	85%	100%	0	0	-	-
mar/21		0		0		100%		100%		0	-	-
abr/21		0		0		100%		100%		0	-	-
mai/21		1		0		100%		100%		0	-	-
jun/21		0		0		100%		100%		0	-	-
jul/21		0		0		100%		100%		0	-	-
ago/21		1		0		100%		100%		0	-	-
set/21		1		0		100%		100%		0	-	-
out/21		0		0		100%		100%		0	-	-
nov/21		0		0		100%		100%		0	-	-
dez/21		0		0		100%		100%		0	-	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA (SR-BA)

INDICADORES ESTRATÉGICOS


2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)

Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de implantação/ampliação hidroviárias para a SR em 2021.



Legenda: Realizado

5 – Disponibilidade de Eclusas




INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos							Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	100%	100%	0%	100%	-	-	-	-
fev/21	0	0	100%	100%	0%	100%	-	-	-	-
mar/21		0		100%		100%	-	-	-	-
abr/21		0		100%		100%	-	-	-	-
mai/21		0		100%		100%	-	-	-	-
jun/21		0		100%		100%	-	-	-	-
jul/21		0		100%		100%	-	-	-	-
ago/21		0		100%		100%	-	-	-	-
set/21		0		100%		100%	-	-	-	-
out/21		0		100%		100%	-	-	-	-
nov/21		0		100%		100%	-	-	-	-
dez/21		0		100%		100%	-	-	-	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃO (SR-MA)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)



Legenda: Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos					Indicadores Operacionais	
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		4.1 Índice de obras de recuperação de IP4 concluídas		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	0	0	0	0
fev/21	0	0	0	0	0	0
mar/21		0		0		0
abr/21		0		0		0
mai/21		0		0		0
jun/21		0		0		0
jul/21		0		0		0
ago/21		0		0		0
set/21		1		0		0
out/21		0		0		0
nov/21		0		0		0
dez/21		0		0		0

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL (SR-MS)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2. Índice de intervenções de obras hidroviárias concluídas



Legenda: Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/21	0	0
fev/21	0	0
mar/21		0
abr/21		1
mai/21		0
jun/21		0
jul/21		0
ago/21		0
set/21		0
out/21		0
nov/21		0
dez/21		0

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARÁ (SR-PA)


INDICADORES ESTRATÉGICOS

1 – Índice de intervenções de obras de IP4 concluídas (acumulado)



2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)


Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de implantação/ampliação hidroviárias para a SR em 2021.




3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas (acumulado)



4 – Disponibilidade de IP4



5 – Disponibilidade de Eclusas



Legenda:

Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos														Indicadores Operacionais						
Indicador / Mês	1.1 Índice de obras de IP4 concluída com termo de recebimento provisório		2.1 Índice de obras em hidroviárias concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		4.2 % de IP4 com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de IP4 (Dias)		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		4.2.1 Movimentação de passageiros nas IP4		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	-
fev/21	0	0	0	0	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	-	-	-	-	-	-
mar/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
abr/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
mai/21		3		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
jun/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
jul/21		2		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
ago/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
set/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
out/21		0		0		1		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
nov/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-
dez/21		0		0		0		100%		100%		100%		100%	-	-	-	-	-	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO (SR-PE)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas (acumulado)



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/21	0	0
fev/21	0	0
mar/21		0
abr/21		0
mai/21		1
jun/21		0
jul/21		0
ago/21		0
set/21		0
out/21		0
nov/21		0
dez/21		0


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL (SR-RS)

INDICADORES ESTRATÉGICOS


2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)

3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas (acumulado)

Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de portos organizados para a SR em 2021.

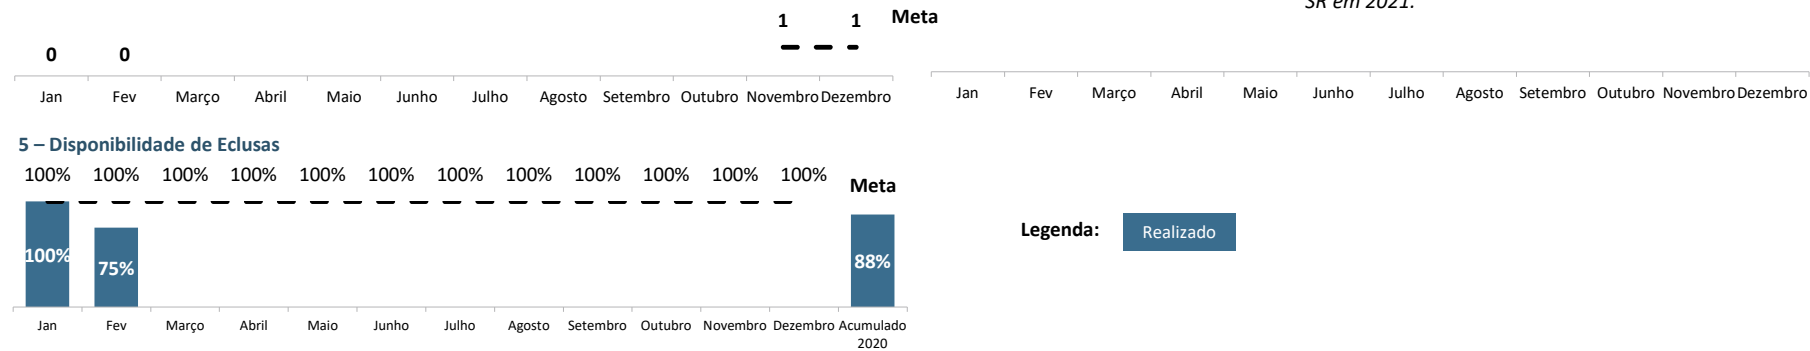

5 – Disponibilidade de Eclusas



Legenda:

Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
fev/21	0	0	0	0	100%	100%	52%	100%	-	-	-	-
mar/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
abr/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
mai/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
jun/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
jul/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
ago/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
set/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
out/21		1		0		100%		100%	-	-	-	-
nov/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
dez/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RONDÔNIA (SR-RO)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)



Legenda: Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/21	0	0
fev/21	0	0
mar/21		0
abr/21		0
mai/21		1
jun/21		0
jul/21		0
ago/21		0
set/21		0
out/21		0
nov/21		0
dez/21		0


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO (SR-SP)

INDICADORES ESTRATÉGICOS


2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas (acumulado)



3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas (acumulado)



5 – Disponibilidade de Eclusas



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidroviárias concluídas com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		5.1 1% de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/21	0	0	0	0	0%	100%	50%	100%	-	-	-	-
fev/21	0	0	0	0	0%	100%	50%	100%	-	-	-	-
mar/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
abr/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
mai/21		1		0		100%		100%	-	-	-	-
jun/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
jul/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
ago/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
set/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
out/21		1		0		100%		100%	-	-	-	-
nov/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-
dez/21		0		0		100%		100%	-	-	-	-

Glossário

Ancoradouro: É o local onde a embarcação ancora, lança a âncora ao largo. Também é chamado de fundeadouro.

Atracadouro: É uma estrutura de apoio náutico avançada em direção à água, suspensa, apoiada em pilares ou flutuante, utilizada como apoio à atracação, embarque, desembarque e trânsito de pessoas e embarcações, para atividades de turismo, lazer e pesca ou para o apoio de um emissário submarino ou subfluvial.

Barragem: É uma barreira artificial feita em cursos hídricos para retenção de grandes quantidades de água. Sua utilização visa sobretudo abastecer zonas residenciais, agrícolas, industriais, produzir energia elétrica ou regularizar um caudal a fim de permitir a navegação. É o mesmo que açude ou represa.

Canal de Acesso: É o canal que liga o alto-mar com as instalações portuárias, podendo ser natural ou artificial e dotado de profundidade adequada além da devida sinalização, com o objetivo de dar acesso das embarcações ao porto.

Confluência: Local de junção entre trechos de drenagem.

Demolição: Ato de se destruir alguma construção seguindo normas técnicas e de segurança a fim de dar outro destino ao espaço antes ocupado por ela.

Derrocagem: Consiste em um processo de retirada ou destruição de pedras ou rochas submersas, que impedem a plena navegação. A sua execução visa promover a readequação do canal com finalidade de economicidade.

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária – DIR: Responsável pela manutenção, recuperação e construção de vias de transporte interurbanas federais.

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP: Responsável pelo gerenciamento dos investimentos plurianuais, por prover estatísticas do setor de infraestrutura e subsidiar com o informações o ministério de infraestrutura.

Diretoria Administração e Finanças – DAF: Responsável pela administração das atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, TI, RH e aos recursos logísticos.

Diretoria de Infraestrutura Ferroviária – DIF: Responsável pela realização de obras na malha ferroviária e gestão do patrimônio ferroviário.

Dolphins: Colunas de concreto posicionadas no rio para proteção de pilar, além de servir de referência para o operador da eclusa e, em alguns casos, de atracadouros de embarcações.

Glossário

Dragagem: Serviço de desassoreamento, alargamento, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagoas, mares, baías e canais de acesso a portos. O principal objetivo é realizar a manutenção ou aumentar a profundidade.

Dragagem de Manutenção: Obra/serviço de engenharia destinado a limpeza, desobstrução e remoção de material do fundo de corpos d'água, com o objetivo de garantir a segurança da navegação.

Eclusa: É uma obra de engenharia que permite que embarcações superem desníveis em cursos de água. São normalmente construídas em barragens, quedas de águas, corredeiras ou hidrelétricas.

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA: Para o DNIT, compreendem o conjunto de estudos necessários à verificação da existência de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a execução de uma determinada obra de infraestrutura de transportes, ou conjunto delas, nos segmentos considerados, dentre as alternativas propostas, consubstanciado, principalmente nos estudos de tráfego, capacidade da hidrovía e seu nível de serviço, aliados às pesquisas complementares e outras similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de engenharia, socioeconômicos e ambientais necessários.

Fiscalização: Atividade de competência do DNIT, visando a assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de leis, instrumentos de outorga, regulamentos e demais normas pertinentes, a ser realizada por servidor ou de entidade ou órgão conveniado, habilitado para o exercício da fiscalização.

Hidrovía: São os trechos de rios navegáveis com canal delimitado, sinalizado e com gabarito hidrovário mantido, onde ocorrem o transporte aquático ou aquaviário realizado por embarcações (barcos, navios, barcas) que, por sua vez, podem ser: Marítimas (mares), Fluviais (rios) e Lacustres (lagos).

Implantação de Hidrovía: Obras ou serviços de engenharia a serem executadas com o objetivo de tornar o corpo hídrico uma hidrovía.

Infraestrutura Aquaviária: Conjunto de áreas e recursos destinados a possibilitar a operação segura de embarcações, compreendendo o canal de acesso, estruturas de atracação, bacia de evolução e respectivo balizamento e sinalização náutica.

Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4: Instalação portuária localizada fora da poligonal do Porto Organizado, utilizada no embarque e desembarque de passageiros e cargas, que operam exclusivamente com embarcações de navegação interior.

Glossário

Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

Ponte de Acesso: É uma estrutura que conecta a infraestrutura portuária ao continente.

Sistema Hidroviário Nacional: É a relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano Nacional de Viação.

Sistema Nacional de Viação: É constituído pela infraestrutura viária e pela estrutura operacional dos diferentes meios de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.


Superintendência Regional – SR: São órgãos descentralizados, aos quais compete programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execução de planos e programas visando ao diagnóstico, ao prognóstico e às ações nas áreas de engenharia e operações, rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias, objetivando garantir a fluidez do tráfego e a navegabilidade dos rios, em condições operacionais e econômicas ideais, com segurança e zelo pela preservação do meio ambiente.



ANEXO

Histórico de Indicadores Administrações Hidroviários

Está disponibilizado no endereço “https://linktr.ee/AHs_DAQ”, podendo também ser acessado pelo QR code abaixo, os indicadores referentes aos anos de 2016 à 2018 das administrações hidroviárias (Conforme o Decreto de nº 10.367, as intervenções aquaviárias foram divididas entre as superintendências regionais que correspondem à unidade federativa).

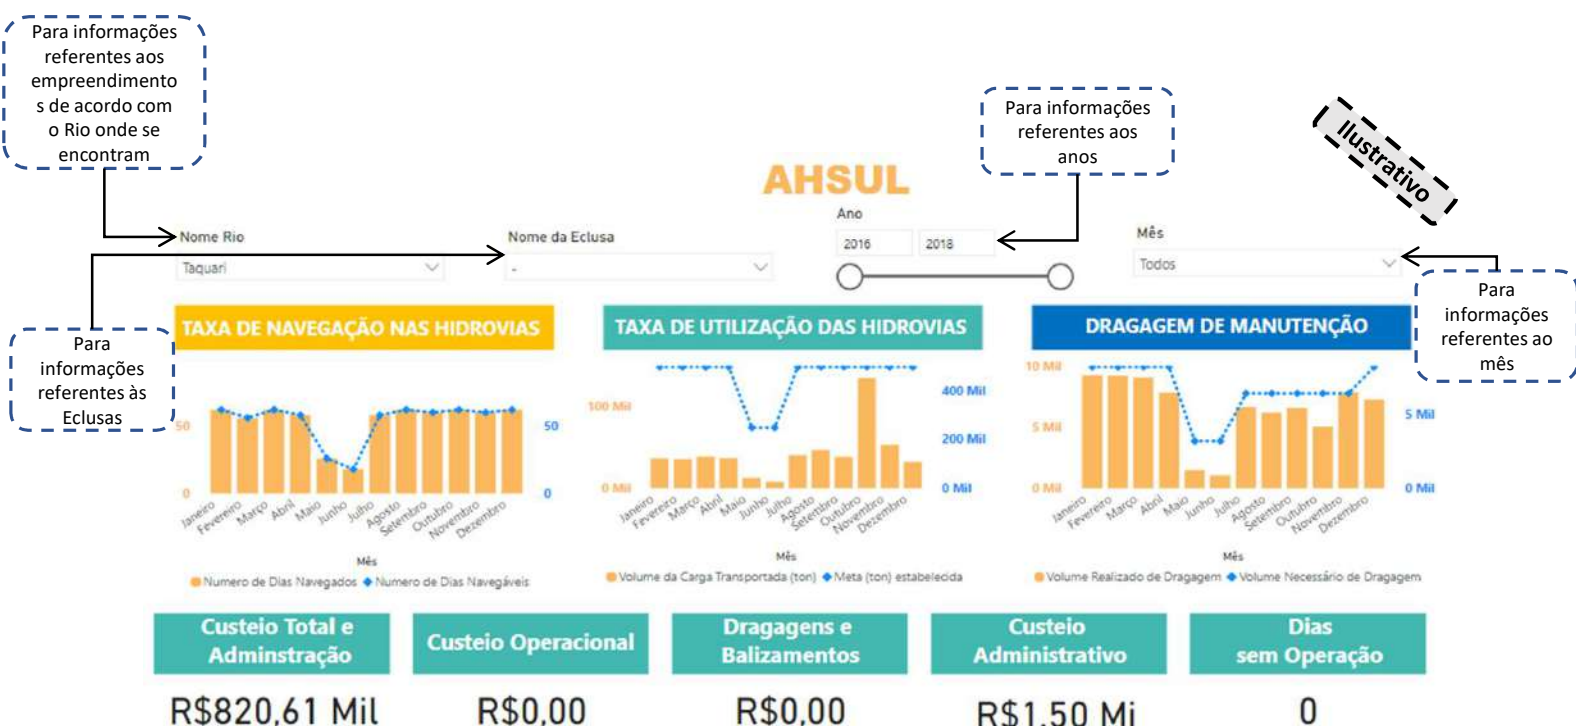

Acesso ao painel de indicadores por administração hidroviária
