



ATLAS

DNIT
Infraestrutura Aquaviária



Outubro | 2024

PRESIDENTE DO BRASIL

Luiz Inácio Lula da Silva

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –DNIT

Fabricio de Oliveira Galvão – Diretor Geral

Fabio Pessoa da Silva Nunes – Diretor de Infraestrutura Rodoviária

Luiz Guilherme Rodrigues de Mello – Diretor de Planejamento e Pesquisa

Marcos de Brito Campos Júnior – Diretora de Administração e Finanças

José Eduardo Guidi – Diretor de Infraestrutura Ferroviária

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA

Erick Moura de Medeiros

COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS AQUAVIÁRIAS

André Martins de Araújo

COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES AQUAVIÁRIAS

José de Ribamar Mendes Cantanhede



SUMÁRIO

1. Intervenções Aquaviárias no Brasil

1. Bacias Hidrográficas
2. Construção e Recuperação
3. Operação
4. Manutenção
5. Sinalização
6. Estudos e Projetos

2. Intervenções Aquaviárias por Superintendência Regional¹

3. INDICADORES

4. GLOSSÁRIO

ANEXO

¹Superintendências Regionais classificadas em ordem alfabética.

Atlas de Infraestrutura Aquaviária

No dia 10 de outubro de 2022, entrou em vigor o Decreto de nº 11.225, de 07 de outubro de 2022, que altera Estrutura Regimental do DNIT. A partir disso, as intervenções aquaviárias foram divididas entre as superintendências regionais que correspondem à unidade federativa.

O atlas é composto por instrumentos contratuais ativos e paralisados com atuação dentro do Sistema Nacional de Viação – SNV (Lei federal 12.379 de 06 de janeiro de 2011) e por meio da Portaria Nº 1.169 de 30 de agosto de 2022, sob responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura Aquaviária – DAQ.

As tabelas e mapas presentes no Atlas são referentes aos dados do mês anterior, sendo atualizados sempre no dia 10 do mês da publicação.

Os instrumentos contratuais são referentes à execução de:

- obras de implantação e recuperação portuárias e aquaviárias;
- operação e manutenção de portos, hidrovias e eclusas;
- manutenção e sinalização das hidrovias;
- estudos e projetos em hidrovias e portos.

A estrutura do Atlas propõe a apresentação das intervenções aquaviárias, com base no tipo de atividade realizada:

- Construção e Recuperação;
- Operação;
- Manutenção;
- Sinalização;
- Estudos e Projetos.



MODAL DO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO (SNV)

Legenda

- Capital
- Superintendência Regional
- SNV**
 - Ferrovias
 - Rodovias SNV
- Hidrovias**
 - Hidrografia
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Para acessar a tabela com os Rios do SNV, PNV e Priorizados, escaneie o QR Code ou acesse o link:
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/atlas-aquaviario/SNV_PNV.pdf



Fonte:
IBGE: Hidrografia escala 1:2.500.000. Limite Estadual, Limite dos países América do Sul.
www.inde.gov.br

Rodovias, Ferrovias e Hidrovias.
<http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo>
- Superintendências Regionais conforme decreto n.º 10.367 de 22 de maio de 2020.

550 275 0 550 km

1:25.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000



BACIAS HIDROGRÁFICAS

Legenda:

- Capitais
- SNV
- Ferrovias
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional
- Rodovias SNV
- Hidrovias
- PNV
- SNV

Bacias Hidrográficas

- Amazônica
- Atlântico Leste
- Atlântico NO Ocidental
- Atlântico NO Oriental
- Atlântico Sudeste
- Atlântico Sul
- Paraguai
- Paraná
- Parnaíba
- São Francisco
- Tocantins - Araguaia
- Uruguai

Fonte:
IBGE: Hidrografia escala 1:2.500.000. Limite Estadual, Limite dos países América do Sul. Bacias Hidrográficas ano 2020. www.inde.gov.br
DNIT: Vetorização das Hidrovias conforme à Instrução Normativa nº 19, de 18/05/2020; Rodovias, Ferrovias e Hidrovias. <http://www.dnit.gov.br/planejamento-e-pesquisa/dnit-geo>
- Superintendências Regionais conforme decreto n.º 10.367 de 22 de maio de 2020.

550 275 0 550 km

1:25.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000



CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO

Legenda

Capitais

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte

Instalações portuárias fora de operação

Delegada

Superintendências Regionais - SRs

SNV

Ferrovia

Rodovia

Hidrovia

PNV

SNV

Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Intervenções

Quantidade



Porto de Porto Velho

01



Instalação portuária em Construção

02



Recuperação de Instalação portuária

05



Instalação Portuária Delegada

05

Obras Aquaviárias


Derrocagem

600 300 0 600 km

1:27.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em outubro/2024.

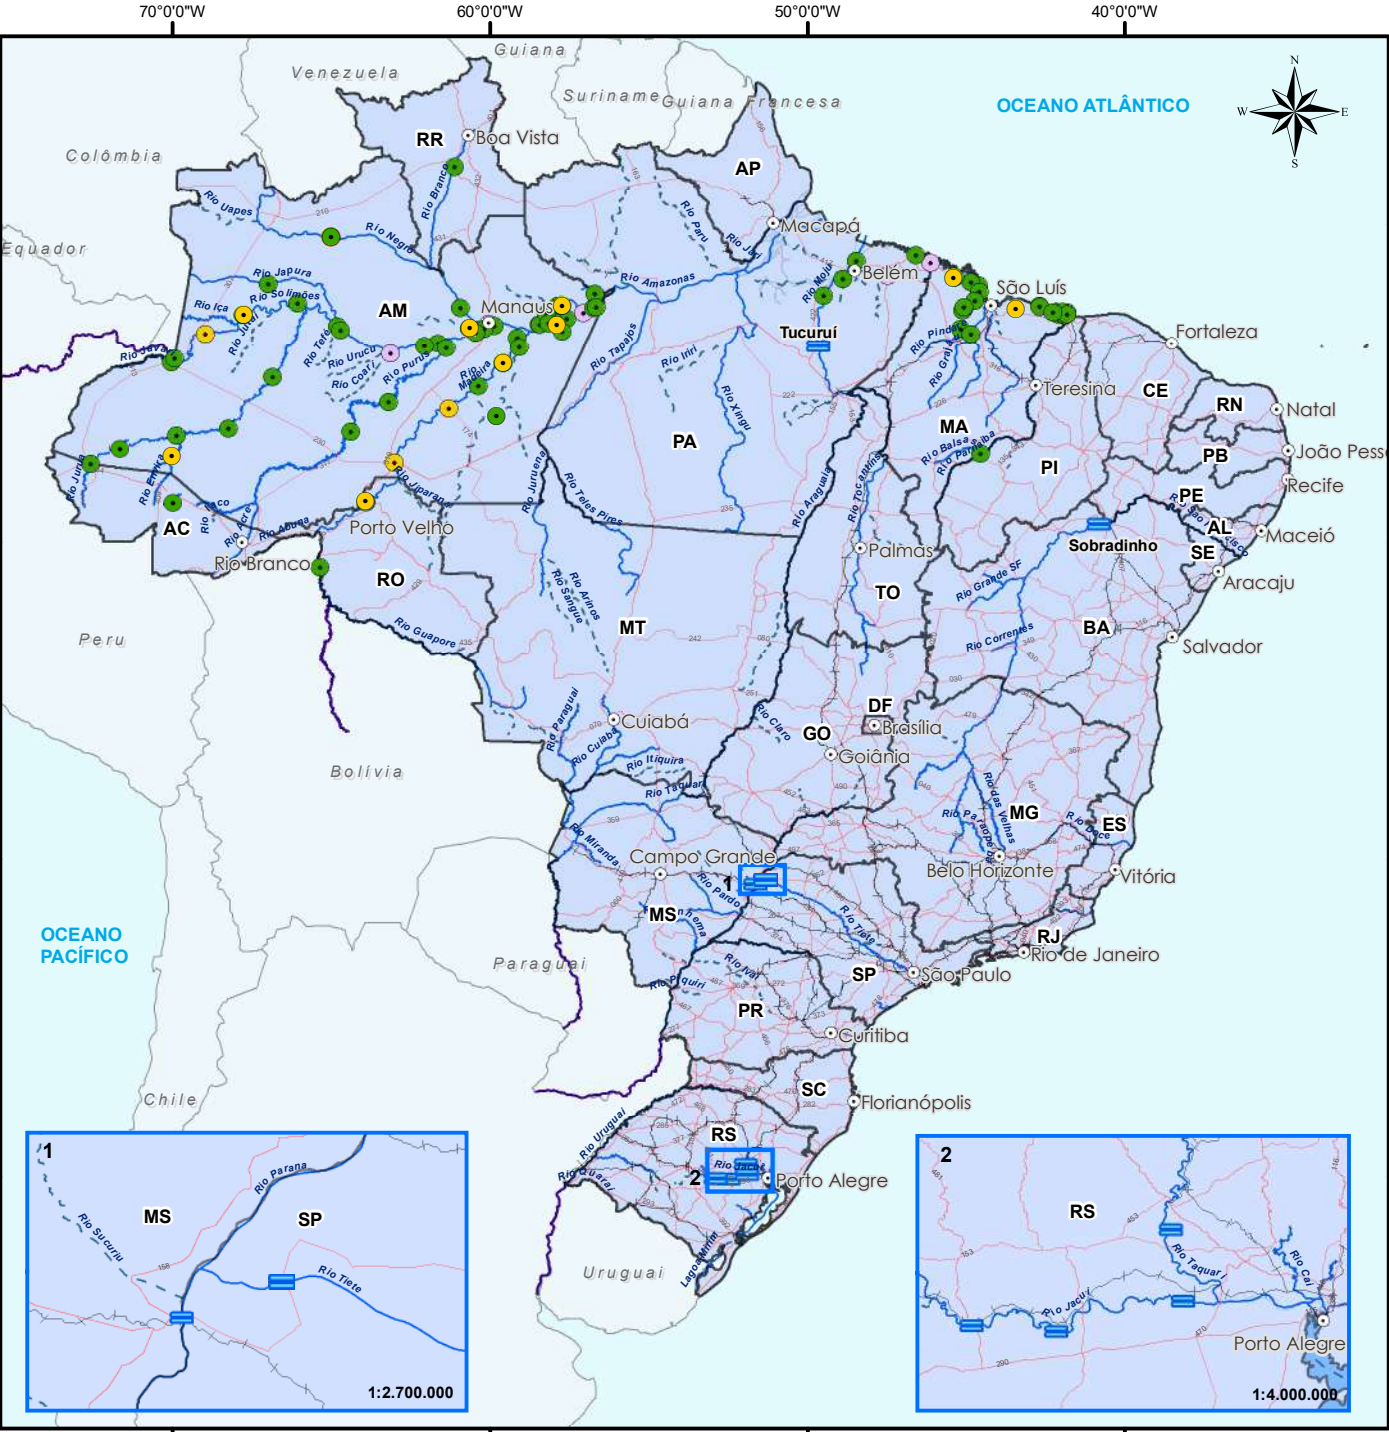

OPERAÇÃO

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

Barragens com Eclusas:
DNIT Total
08

SNV

- Ferrovias
- Rodovias SNV


Hidrovias

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional


Instalações Portuárias de Pequeno Porte	Quantidade	%
Instalações Portuárias em operação	62	84%
Instalações Portuárias fora de operação	12	16%
Delegada	5	100%

Eclusas	Quantidade	%
Em operação	8	100,00%
Fora de operação	0	0,00%
Total	8	100,00%

(*) As Estruturas de Apoio a Navegação se referem aos pequenos ports localizados no Estado do Maranhão e Piauí.



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

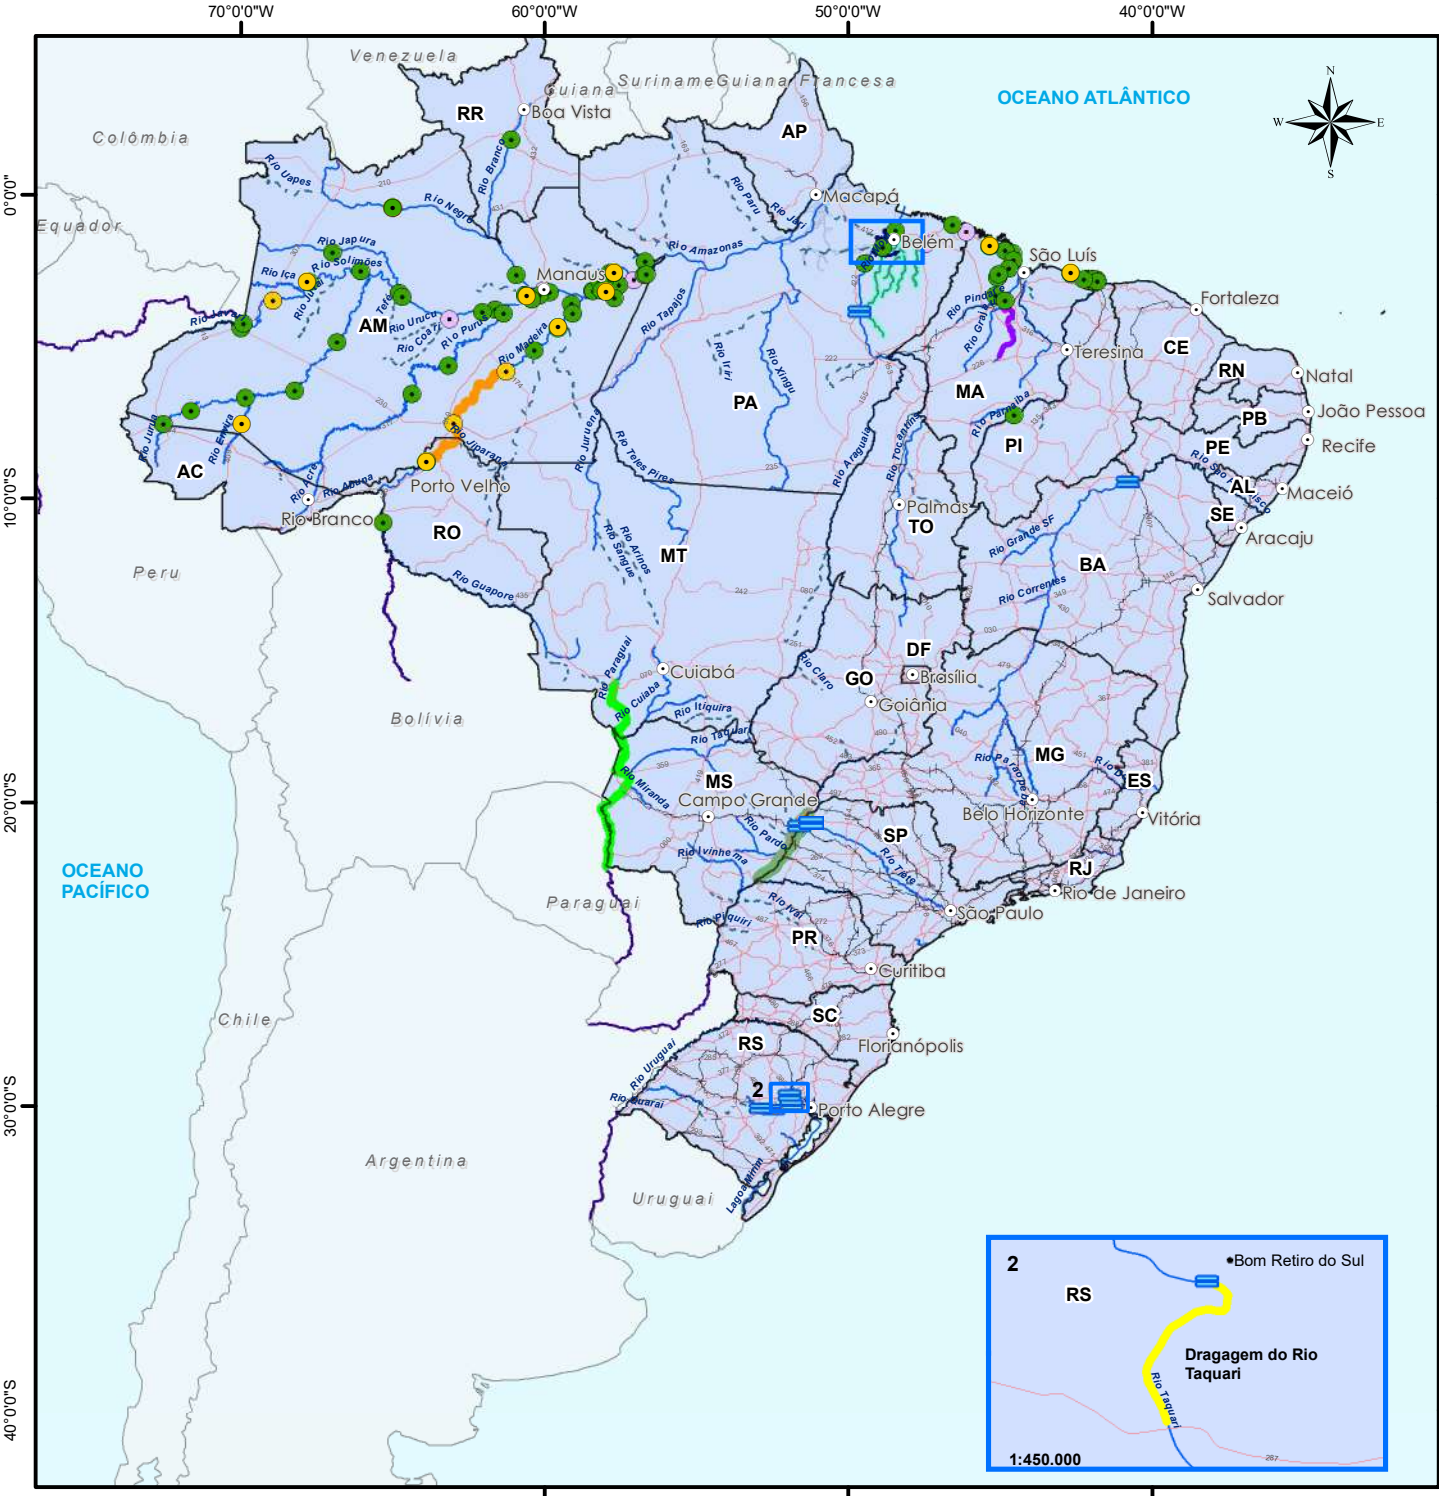

MANUTENÇÃO

Legenda

Capitais

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte

- Concluídas em operação
- Concluídas fora de operação
- Delegada

Eclusas sob jurisdição DNIT

- Em operação
- Fora de operação
- Hidrovia Guama-Capim

SNV


- Ferrovias
- Rodovias SNV


Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios Fora de Jurisdição Nacional
- SR - Superintendência Regional

Intervenções Aquaviárias (km)

Dragagem	2.787,181km
Dragagem Rio Taquari	11,054 km
Dragagem do Madeira	598,323 km
Manutenção e recuperação da hidrovia do R.Paraguai	1.300,0 km
Desobstrução da hidrovia do Mearim e Grajaú	568 km
Manutenção e Balizamento - Hidrovia do Rio Paraná	309,804 km



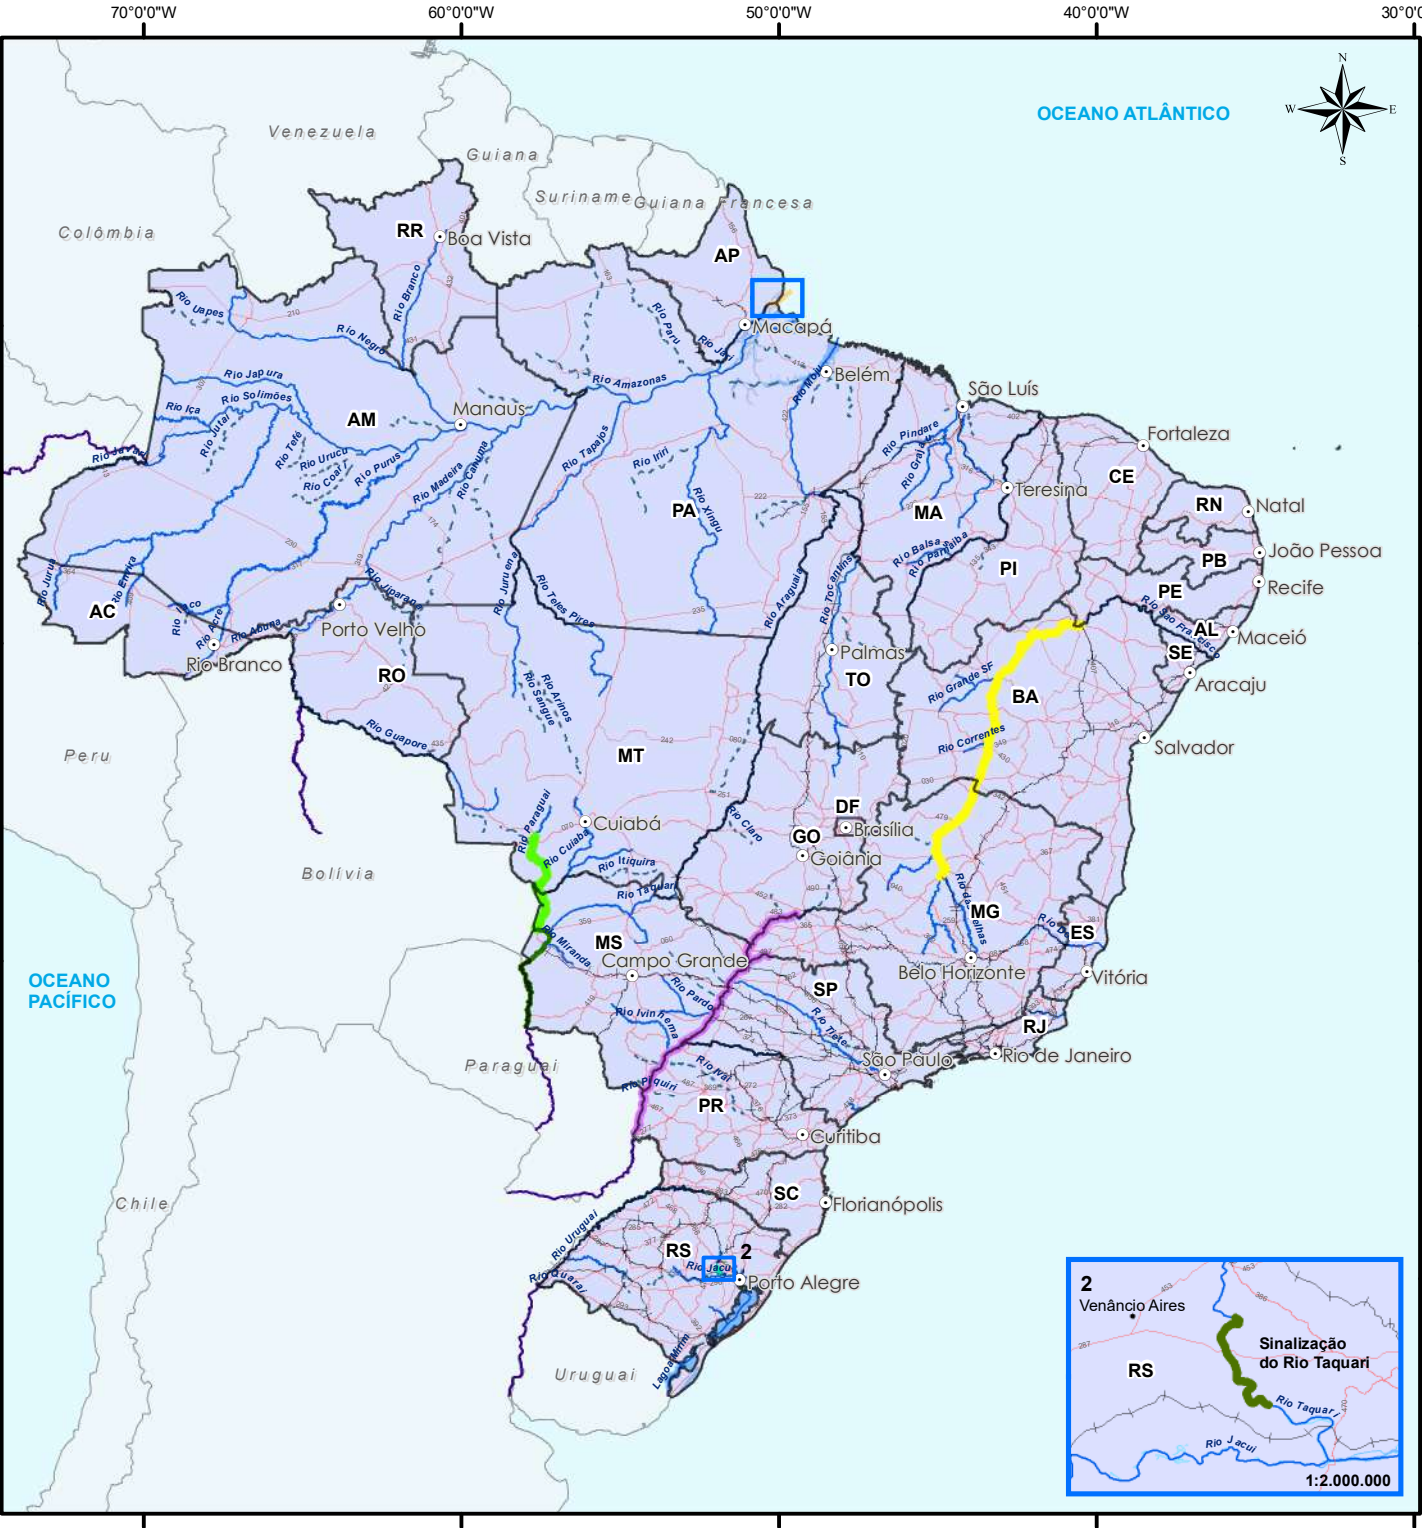


SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Ferrovias
 - Rodovias SNV
- Hidrovias
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Sinalização (linear)	(km)
Implantação de Sinalização	776,7 km
Manutenção de Sinalização	86,0 km
Sinalização Implantada	5.054,2 km
Manutenção, Recuperação e Sinalização da Hidrovia do Rio Paraguai	1.300,0 km
Diagnóstico do balizamento e sinalização do Rio São Francisco	568,0 km
Sinalização do Rio Paraguai	
Sinalização do Rio Paraná - Lotes de 1 a 4	
Sinalização do Rio São Francisco	
Sinalização do Rio Taquari	

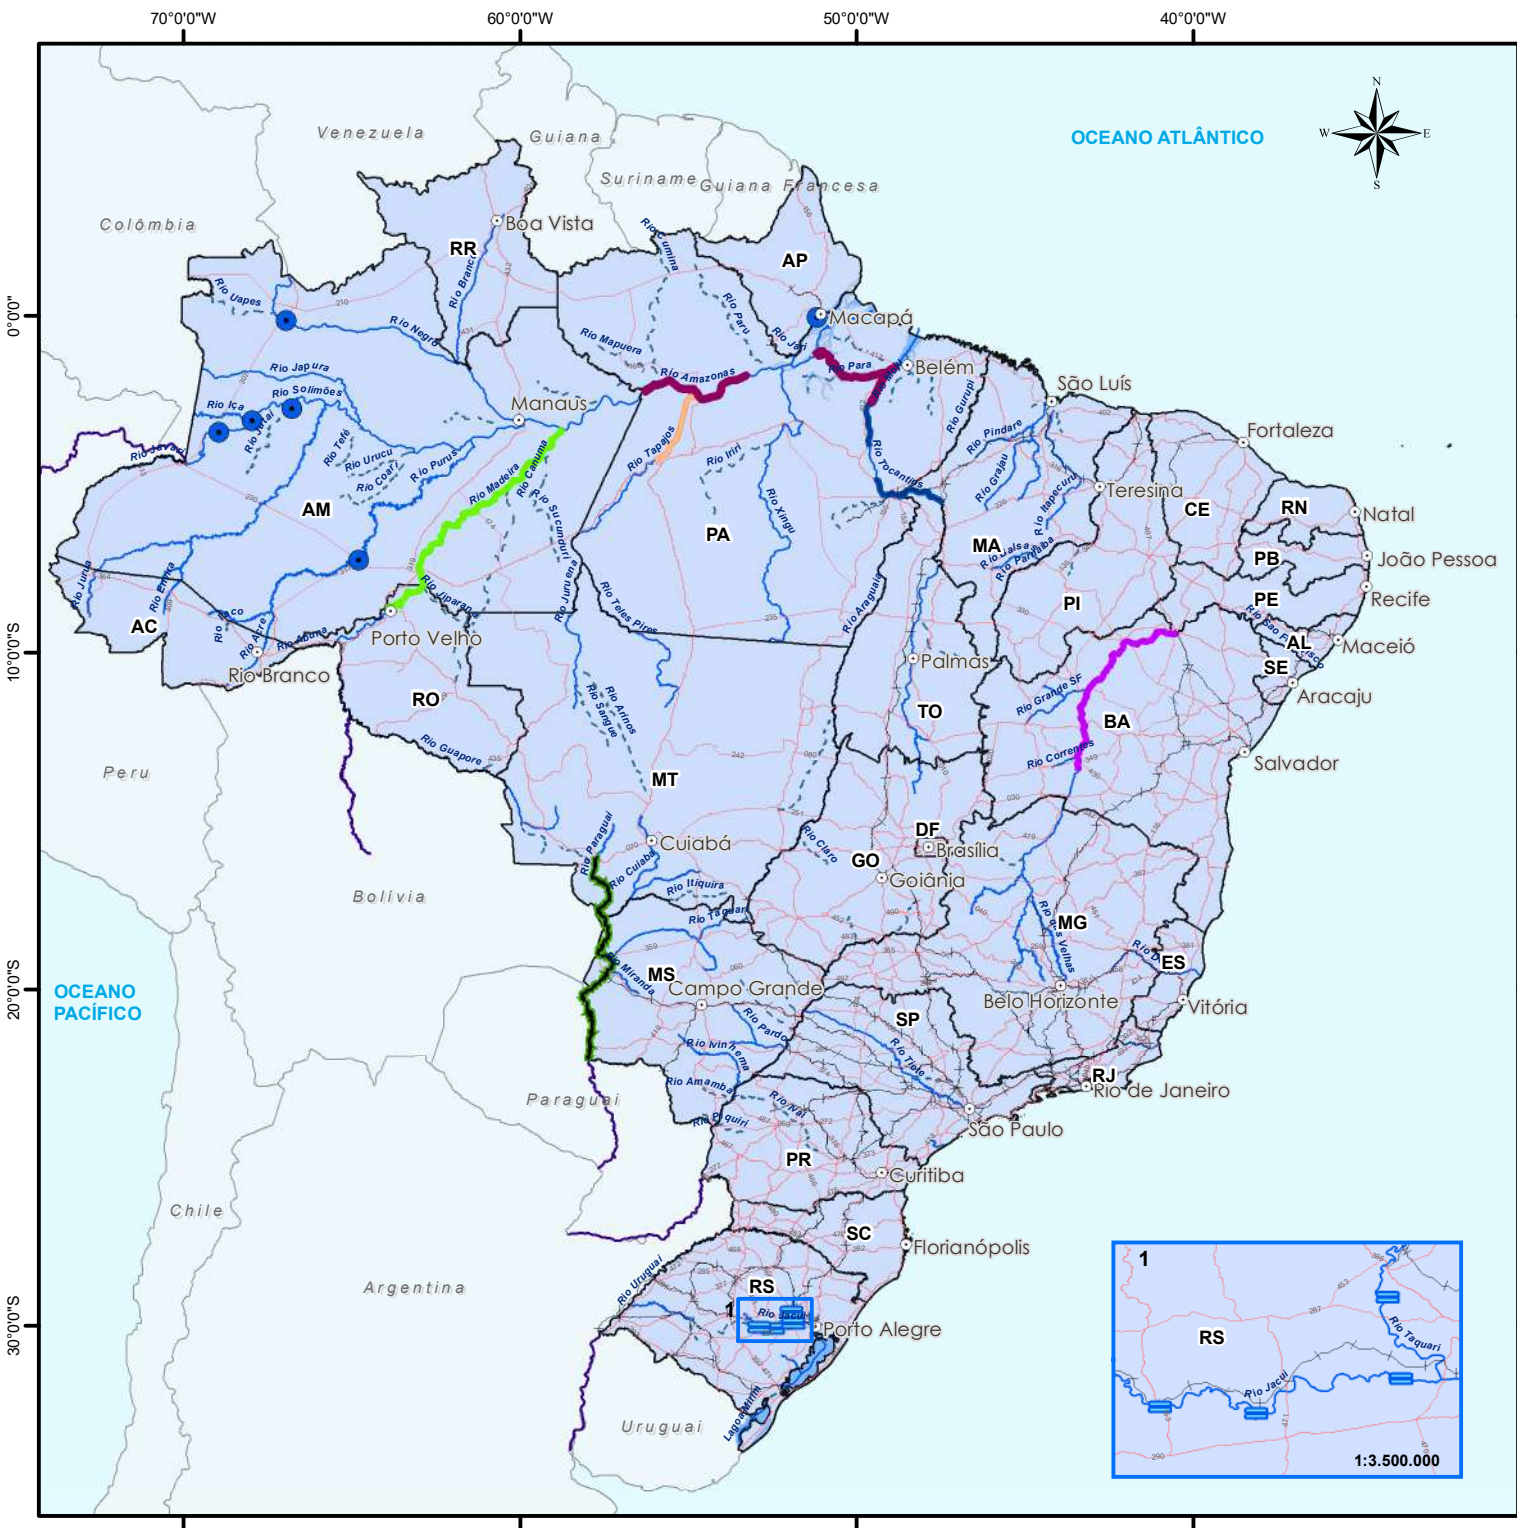

ESTUDOS E PROJETOS

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Ferrovias
 - Rodovias SNV
- Hidrovias
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Estudos e Projetos (km)	
Estudos e Projetos	11.031,9 km
PMH Rio Tapajós/PA	287,89 km
PMH Rio Tocantins	525,00 km
PMH Rio Madeira	1.086,00 km
PMH Rio São Francisco	568,00 km
PMH Paraguai	1.248,166 km
Campanhas Educativas Rio Amazonas (Levantamentos hidrográficos)	875,063 km

Estudos e Projetos	Quantidade
Projetos em eclusas	04



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR AP

Terminal Portuário de Santana - AP

DNIT



Superintendência Regional do Amapá

ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV

Estudos e Projetos		Quantidade
Estudos e Projetos de instalações portuárias		01



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	le Santana - AP (RDCI)	AP	Rio Amazonas	00 00238/2022	PPB Engenharia LTDA e FN CRESPO NETO E CIA LTDA.	13/06/2022	30/06/2025	R\$ 26.785.130	R\$ 8.795.178	33%	ATIVO	02 00583/2022	LAGHI ENGENHARIA LTDA	11/11/2022	11/02/2025	R\$ 2.292.901	62%
TOTAL GERAL								R\$ 26.785.130	R\$ 8.795.178	33%		TOTAL GERAL				R\$ 2.292.901	62%



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR AM



Rio Amazonas

DNIT



CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Rodovias
- Delegada
- Em operação
- Fora de operação

Hidroviás do SNV

-  PNV
 SNV
 Principais Rios fora da Jurisdição Nacional
 Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

IP4 em Obras	Quantidade
☒ Em construção	01
☐ IP4 em recuperação	05


Obs: A Obra só será dada como concluída após emissão do Termo de Recebimento Definitivo.



1:12.500.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000


Dados emitidos em outubro/2024.

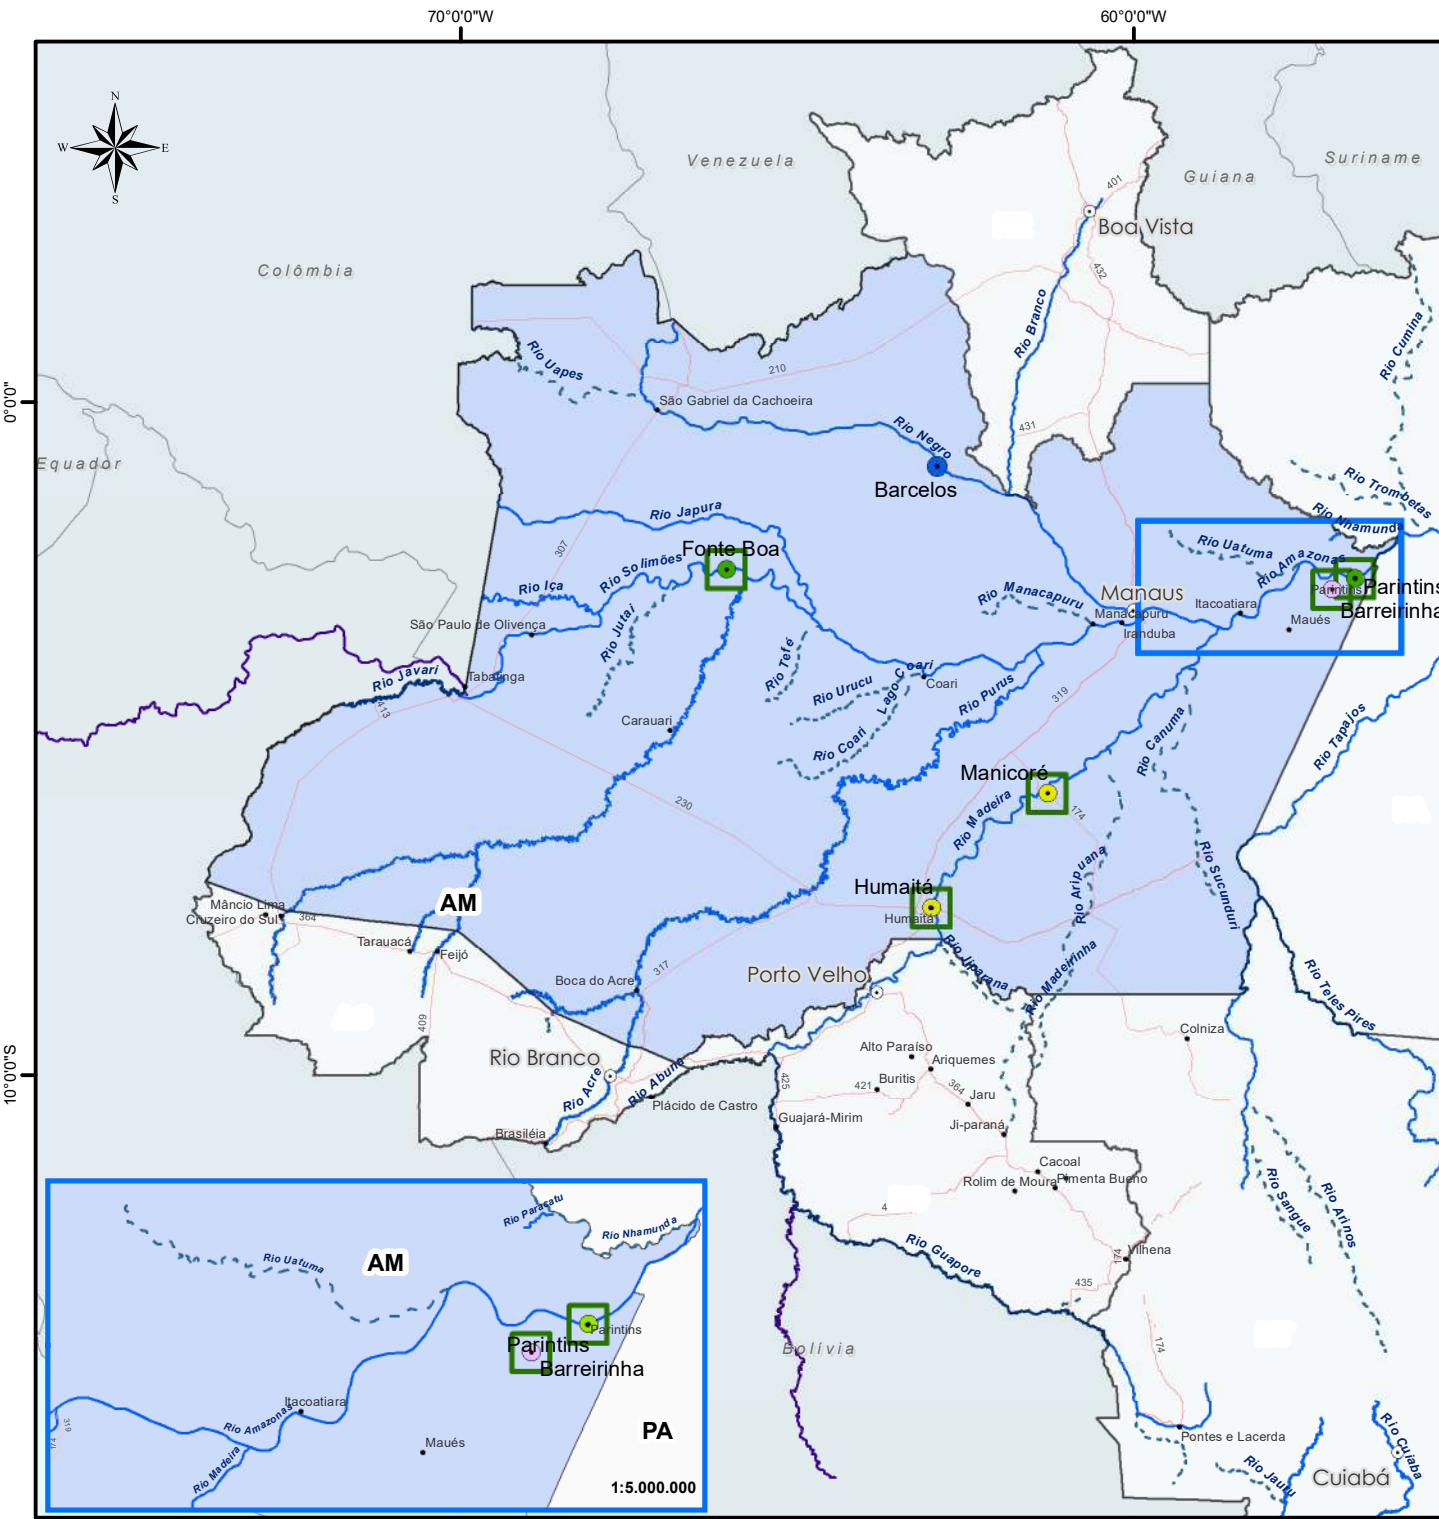

Instrumentos de construção e recuperação																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Projeto Executivo e Recuperação da IP4 Manicoré/AM (RDCI)	AM	Bacia Amazônica	01 00051/2022	ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	12/01/2022	30/12/2025	R\$ 20.557.394	R\$ -	0%	ATIVO	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	30/12/2024	R\$ 15.121.461	38%	
2	IP4 de Barcelos - (RDCI)	AM	Rio Negro HN-129	00 00503/2020	JURUÁ ESTALEIROS E NAVEGAÇÃO LTDA.	12/08/2020	18/01/2025	R\$ 18.939.337	R\$ 18.352.127	97%	ATIVO	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	30/12/2024	R\$ 4.822.556	78%	
TOTAL GERAL								R\$ 39.496.731	R\$ 18.352.127	46%		TOTAL GERAL				R\$ 15.121.461	38%	

AM - AMAZONAS

Instrumentos de operação de IP4																		
	Denominação	UF	Rio (HN)	IP4 Cobertas	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 6)	AM	Rio Amazonas	Autazes/AM, Barcelos/AM, Caracaraí/RR, Careiro da Várzea/AM, Itacoatiara - Novo Terminal/AM, Itacoatiara/AM, Novo Airão/AM, Santa Isabel do Rio Negro/AM, São Raimundo-Manaus/AM	01 00032/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/02/2021	19/01/2025	R\$ 50.917.622	R\$ 47.163.351	93%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/11/2021	15/08/2025	R\$ 15.678.920	38%
	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 3)	AM	Rio Amazonas	Apui/AM, Borba/AM, Cai n'Água-Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO, Humaitá/AM, Manicoré/AM, Nova Olinda do Norte/AM, Novo Aripuanã/AM, Uruçurituba/AM	01 00353/2021	CONSORCIO AMAZONPORTS	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 45.896.207	R\$ 36.470.570	79%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2021	15/08/2025	R\$ 4.822.556	78%
	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 4	AM	Rio Amazonas	Alvarães/AM, Carauari/AM, Eirunepé/AM, Envira/AM, Guajará/AM, IPIXUNA/AM, Itamarati/AM, Tefé (Lago Tefé)/AM	01 00354/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 47.212.352	R\$ 37.760.172	80%	ATIVO	01 00040/2021	LAGHI ENGENHARIA LTDA	22/02/2021	15/05/2025	R\$ 4.822.556	78%
	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 2	AM	Rio Amazonas	Benjamin Constant/AM, Coari/AM, Fonte Boa/AM, Japurá/AM, Jutai/AM, Santo Antônio do Içá/AM, São Paulo de Olivença/AM, Tabatinga/AM, Tonantins/AM	01 00352/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 38.984.522	R\$ 25.746.768	66%	ATIVO	01 00040/2021	LAGHI ENGENHARIA LTDA	22/02/2021	15/05/2025	R\$ 12.921.781	21%
TOTAL GERAL									R\$ 183.010.703	R\$ 147.140.861	80%		TOTAL GERAL				R\$ 15.678.920	38%

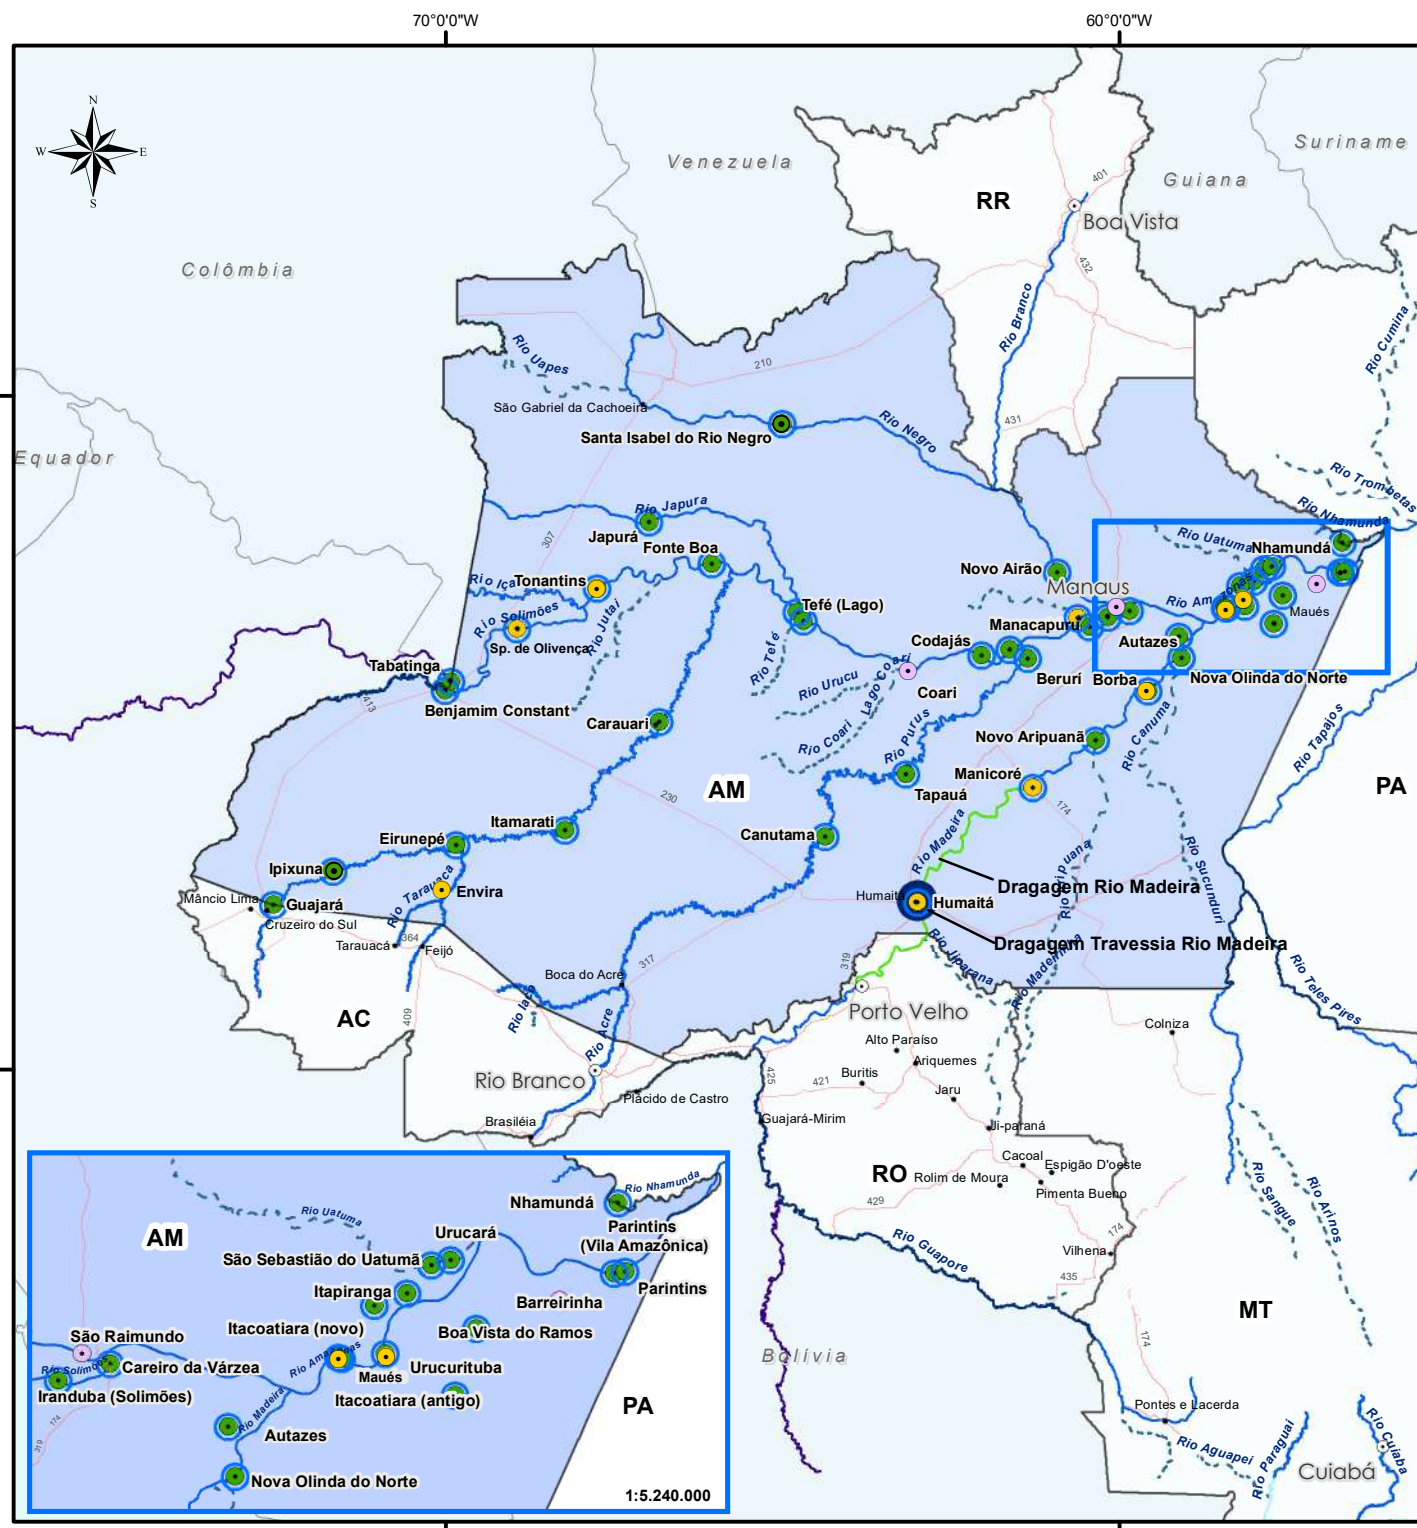

Superintendência Regional do Amazonas
MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Rodovias
- Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional


Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte

Concluídas em operação	35
Concluídas fora de operação	9
Delegada	3

Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	44	100,0 %
Descoberto	00	00,0 %
Total	44	100,0 %

Intervenções Aquaviárias	(km)
Dragagem Rio Madeira	620,0 km
Dragagem Travessia do Rio Madeira	8,35 km

Obs: A Obra só será dada como concluída após emissão do Termo de Recebimento Definitivo.




Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

AM - AMAZONAS

Instrumentos de manutenção de IP4																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Programas Ambientais das IP4 da Ahimoc - Lote V.	AM	Rio Solimões HN-132, Rio Juruá HN-143 e Rio Japurá HN-142	27 00857/2018	CARUSO JR ESTUDOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA	31/12/2018	09/03/2025	R\$ 988.595	R\$ 525.437	53%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ 5.037.398	39%
2	Programas Ambientais das IP4 da Ahimoc - Lote III.	AM	Rio Amazonas HN-100	27 00855/2018	CARUSO JR ESTUDOS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA	31/12/2018	09/03/2025	R\$ 774.190	R\$ 447.872	58%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ 10.724.205	78%
3	Programas Ambientais das IP4 da Ahimoc - Lote I.	AM	Rio Branco HN-130, Rio Negro HN-129, Rio Solimões HN-132	27 00853/2018	VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	31/12/2018	09/03/2025	R\$ 494.919	R\$ 395.741	80%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ 15.678.920	38%
4	Programas Ambientais das IP4 da Ahimoc - Lote II.	AM	Rio Madeira HN-117	27 00854/2018	VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	31/12/2018	09/03/2025	R\$ 384.986	R\$ 310.194	81%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ 10.724.205	78%
5	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 6)	AM	Rio Amazonas	01 00032/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01/02/2021	19/01/2025	R\$ 50.917.622	R\$ 47.163.351	93%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10/11/2021	15/08/2025	R\$ 15.678.920	38%
6	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - (Lote 3)	AM	Rio Amazonas	01 00353/2021	CONSORCIO AMAZONPORTS	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 45.896.207	R\$ 36.470.570	79%	ATIVO	01 00621/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/12/2021	15/08/2025	R\$ 4.822.556	78%
7	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 4	AM	Rio Amazonas	01 00354/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 47.212.352	R\$ 37.760.172	80%	ATIVO	01 00040/2021	LAGHI ENGENHARIA LTDA	22/02/2021	15/05/2025	R\$ 4.822.556	78%
8	Operação e Manutenção de IP4 por Nível de Serviço - Lote 2	AM	Rio Amazonas	01 00352/2021	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/08/2021	16/04/2025	R\$ 38.984.522	R\$ 25.746.768	66%	ATIVO	01 00040/2021	LAGHI ENGENHARIA LTDA	22/02/2021	15/05/2025	R\$ 12.921.781	21%
9	Programas Ambientais das IP4 da Ahimoc - Lote IV.	AM	Rio Purus HN-134 e Rio Madeira HN-117	27 00856/2018	VERITAS - SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE LTDA	31/12/2018	09/03/2025	R\$ 388.461	R\$ 272.607	70%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ 12.930.535	92%
TOTAL GERAL								R\$ 186.041.854	R\$ 149.092.712	80%		TOTAL GERAL				R\$ 15.678.920	38%

Instrumentos de manutenção de hidrovia																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Dragagem do Rio Madeira (HN-117)	RO	Rio Madeira HN-117	22 00220/2021	Consórcio Jan De Nul - JEED	18/06/2021	17/06/2025	R\$ 138.869.342	R\$ 112.352.571	81%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 2.292.901	72%
2	Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM)	AM	Rio Madeira HN-117	22 00250/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/07/2022	29/09/2027	R\$ 9.723.224	R\$ 4.676.630	48%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 2.292.901	72%
TOTAL GERAL								R\$ 148.592.566	R\$ 117.029.201	79%		TOTAL GERAL				R\$ 2.292.901	72%

- Os trechos contemplados pelos serviços de Dragagem do Rio Madeira (HN-117) estão localizados nos Estados do Amazonas e Rondônia, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).
- Os serviços de Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM) estão localizados no Estado do Amazonas, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).

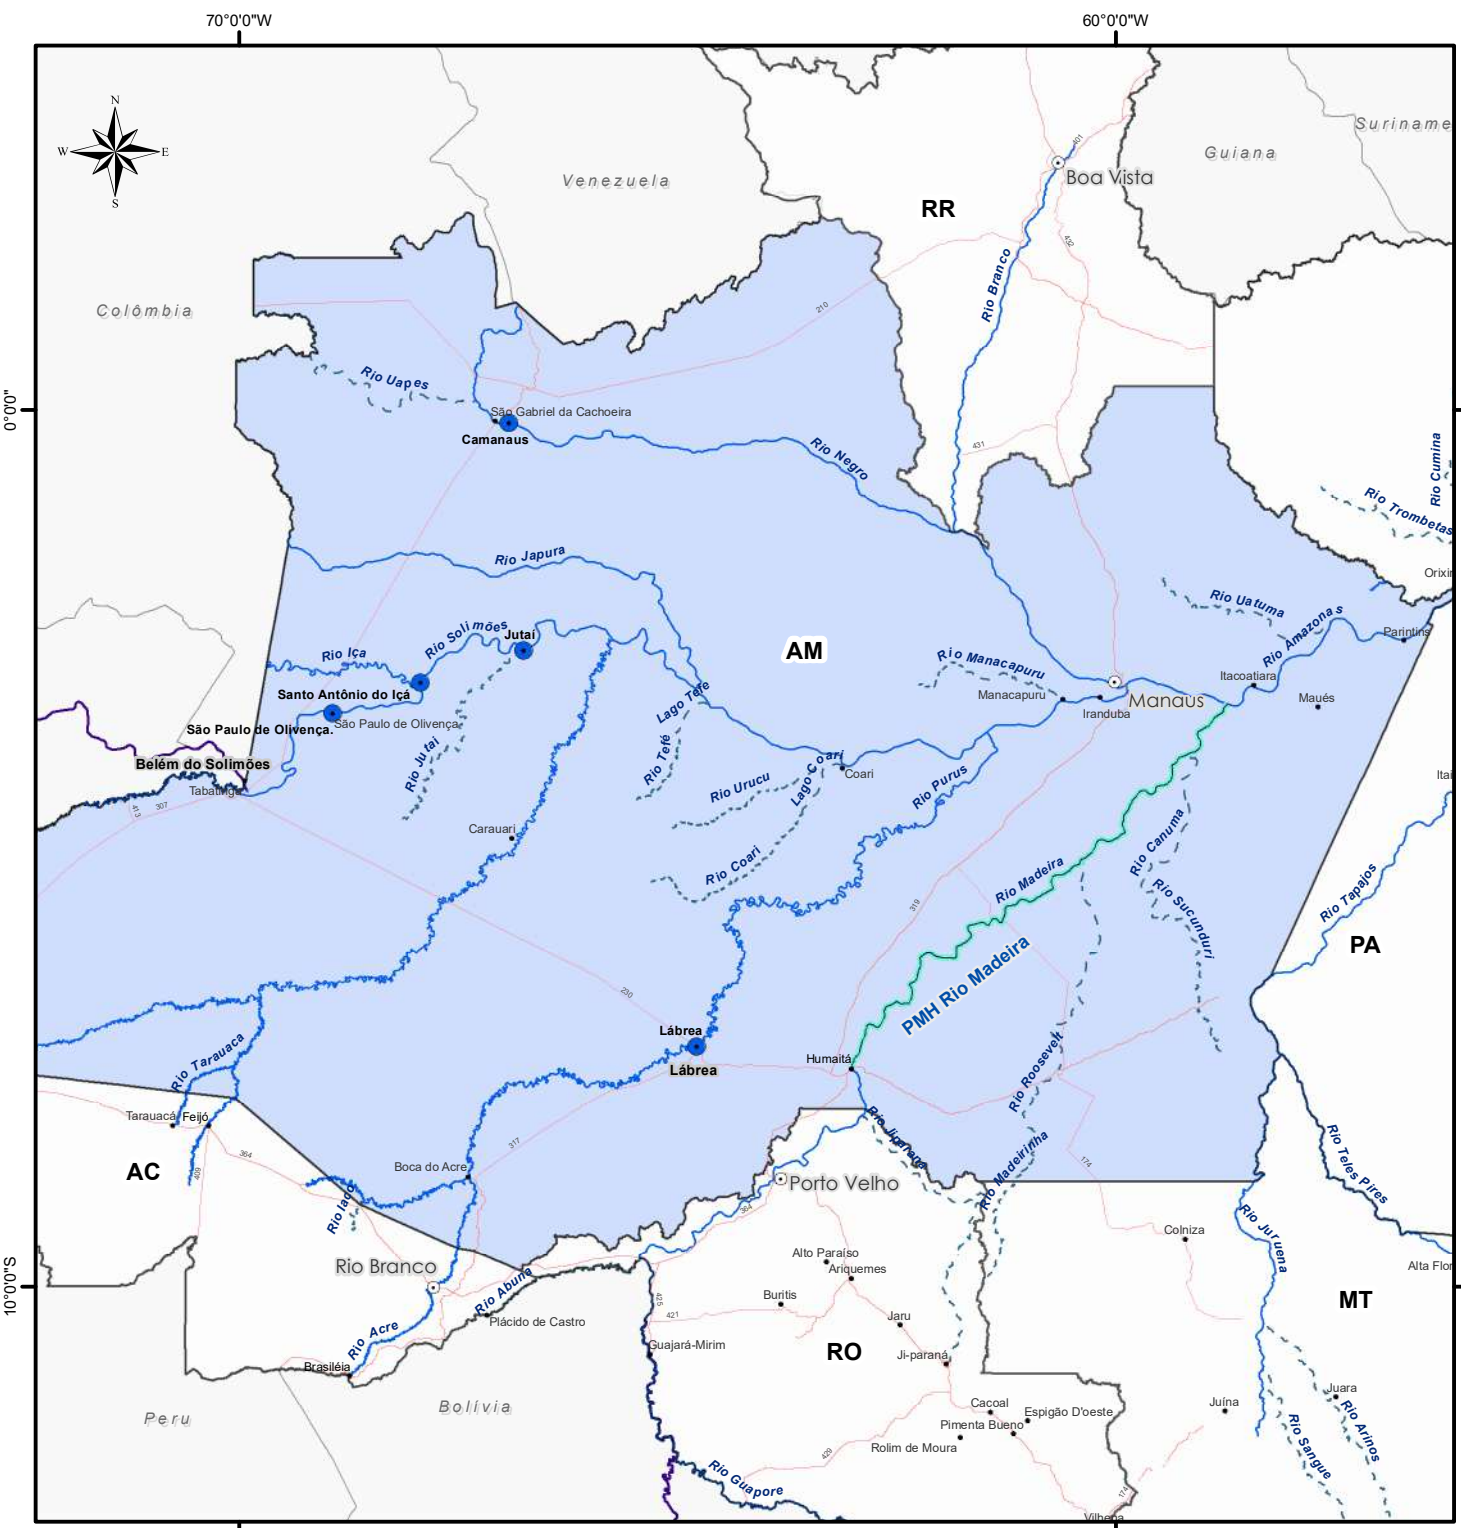

Superintendência Regional do Amazonas
ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Estudos e Projetos		Quantidade
Instalações portuárias em Estudos		05

Estudos e Projetos		(km)
PMH Rio Madeira		1.048,0 km



#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Projeto de IP4 de São Paulo de Olivença	AM	Rio Solimões HN-132	27 00940/2018	INTERNAVE ENGENHARIA	02/09/2019	12/04/2025	R\$ 777.157	R\$ 521.821	67%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	Projeto de IP4 de São Raimundo	AM	Rio Amazonas HN-100	27 00629/2016	Consórcio São Raimundo	01/02/2017	02/06/2025	R\$ 2.408.562	R\$ 1.095.028	45%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 2	AM	Rio Madeira HN-117	01 00909/2020	LAGHI ENGENHARIA LTDA E RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 13.394.748	R\$ 3.809.655	28%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
4	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 3	AM	Rio Madeira HN-117	01 00910/2020	LAGHI ENGENHARIA LTDA E RURAL TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/02/2021	05/01/2026	R\$ 16.061.416	R\$ 3.896.416	24%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
5	Projeto Executivo e Recuperação da IP4 Manicoré/AM (RDCI)	AM	Bacia Amazônica	01 00051/2022	ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	12/01/2022	30/12/2025	R\$ 20.557.394	R\$ -	0%	ATIVO	27 00903/2019	CONSÓRCIO SUPERHIDRO	13/01/2020	30/12/2024	R\$ 15.121.461	38%
TOTAL GERAL								R\$ 53.199.277	R\$ 9.322.919	18%		TOTAL GERAL				R\$ 15.121.461	38%




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR BA



Eclusa de Sobradinho/BA

DNIT

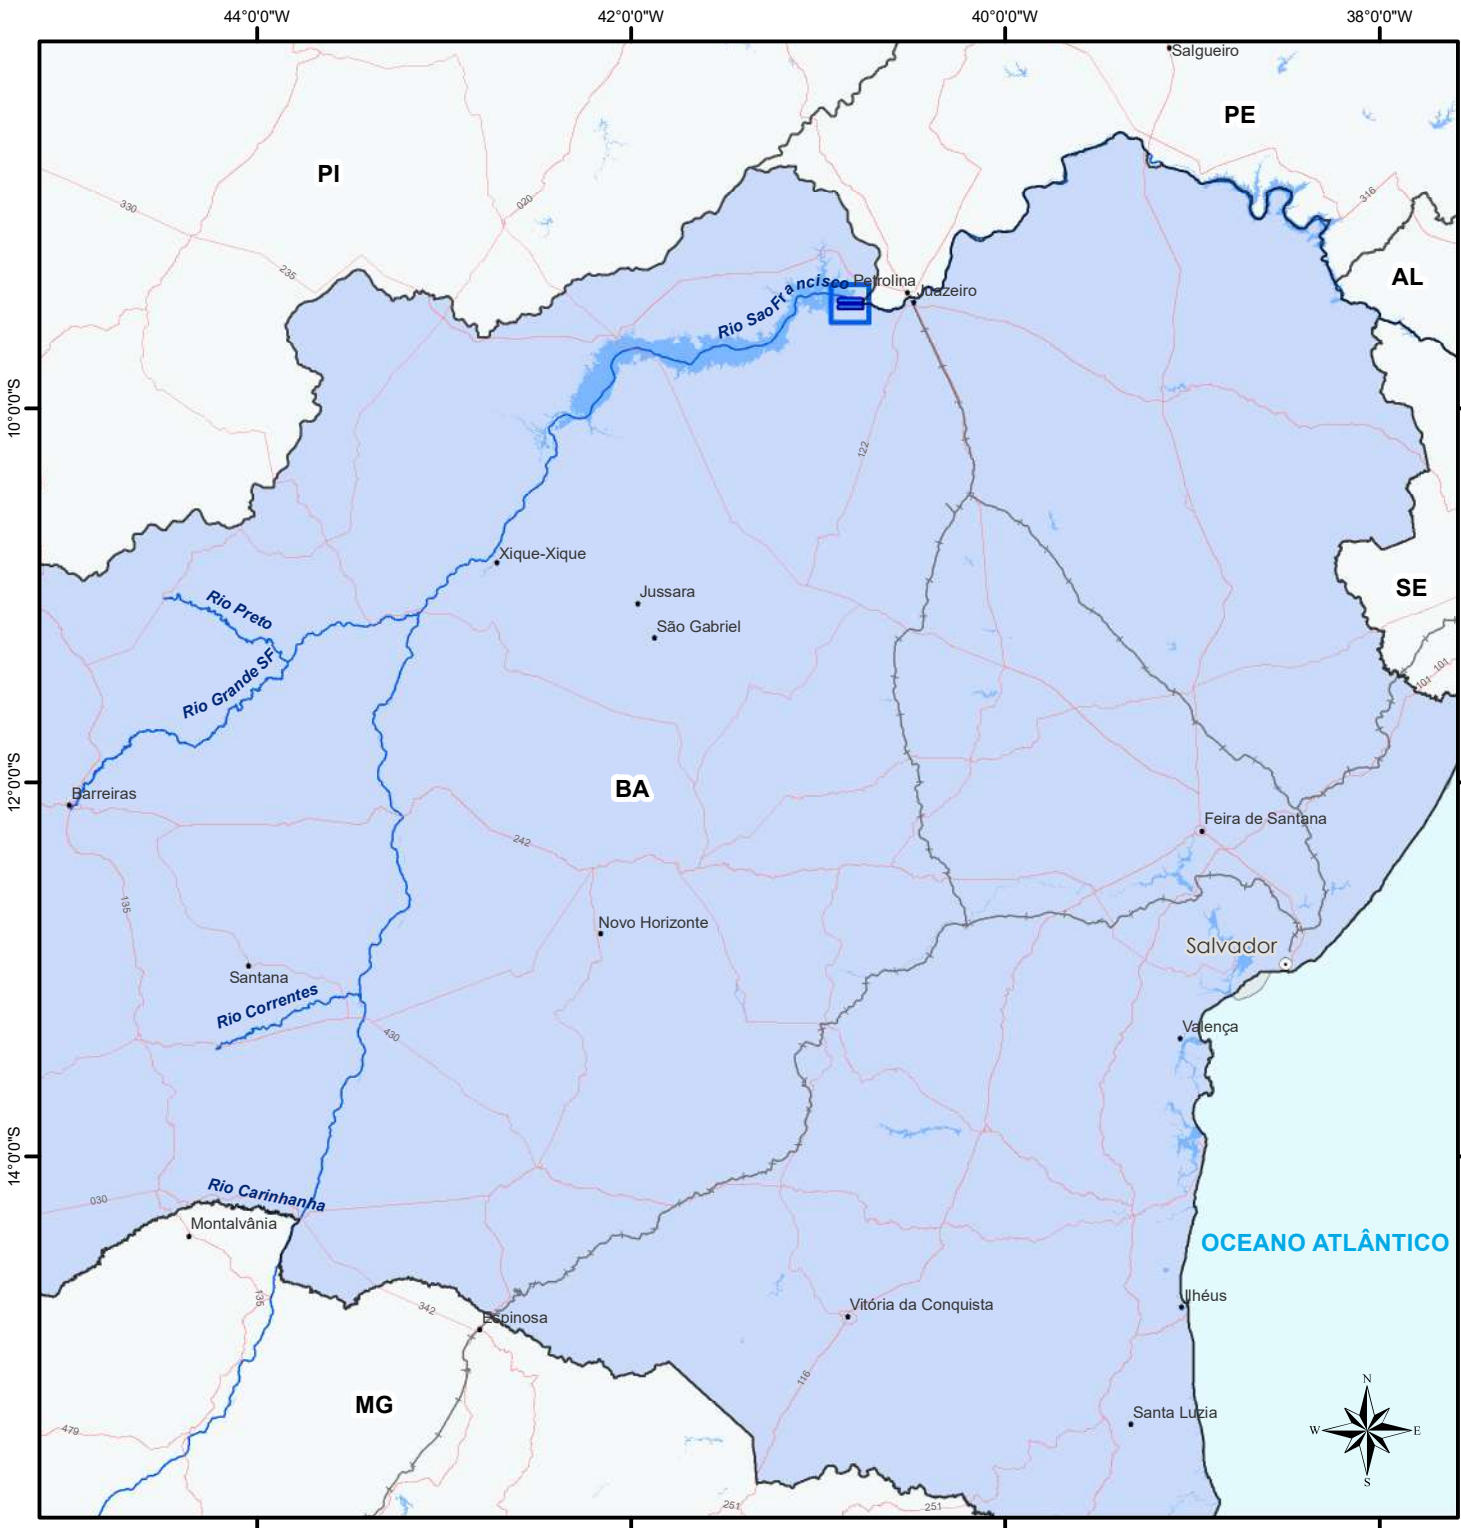

Superintendência Regional da Bahia

OPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV


Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em operação	01	100,0 %
Eclusas fora de operação	00	0,0 %
Total	01	100,0 %

Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	01	100,0 %
Descoberto	00	0,0 %
Total	01	100,0 %



1:4.500.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de operação de eclusas																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Operação da Eclusa de Sobradinho (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00577/2021	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A	27/12/2021	26/12/2026	R\$ 29.410.915	R\$ 12.240.357	42%	ATIVO	05 00671/2021	SIRCOP SERVICOS AQUAVIARIOS E AERONAUTICOS LTDA	27/12/2021	26/10/2026	R\$ 6.168.517	48%	
TOTAL GERAL								R\$ 29.410.915	R\$ 12.240.357	42%		TOTAL GERAL				R\$ 6.168.517	48%	

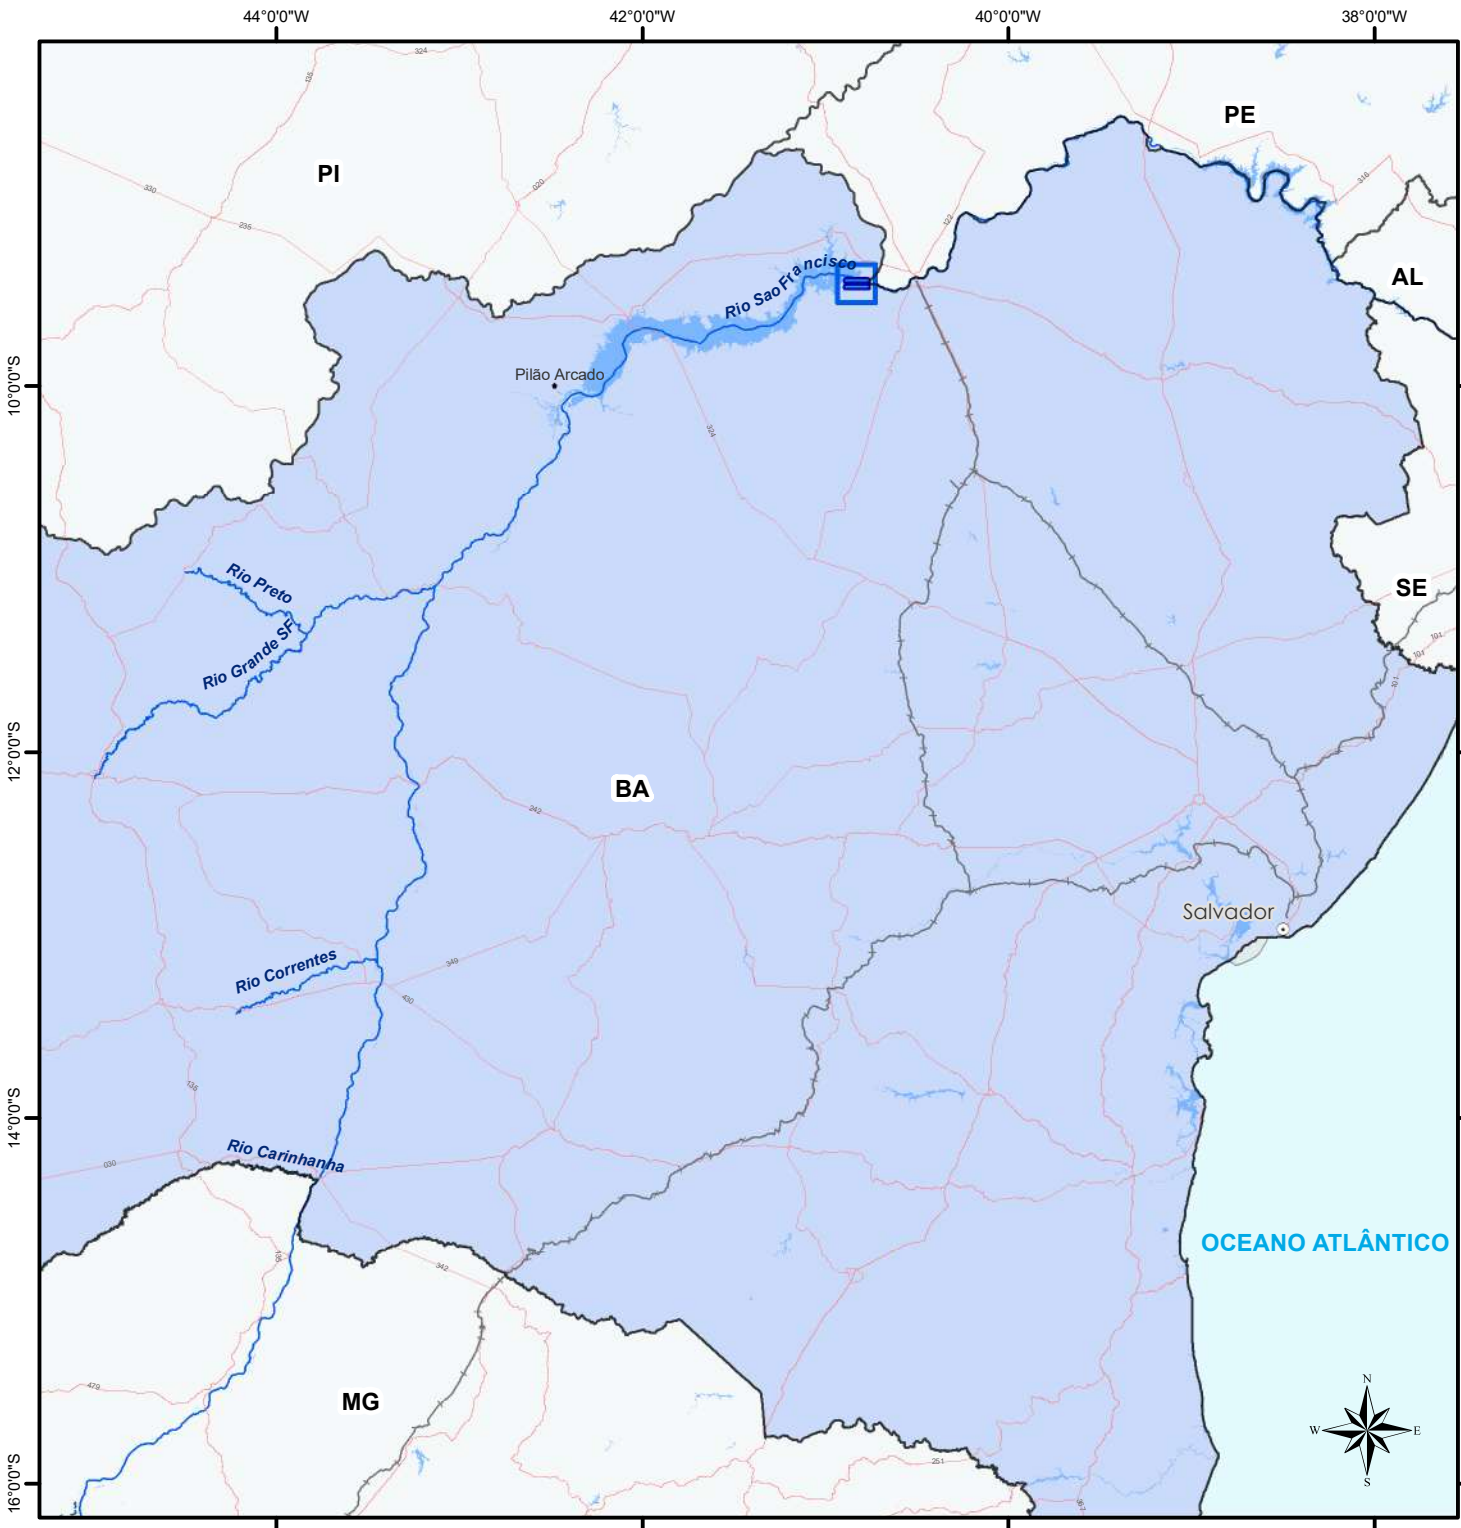

Superintendência Regional da Bahia
MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias


Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV

Eclusas


- Eclusas em Operação 01
- Eclusas fora de Operação 00

Cobertura Contratual		Quantidade	%
	Coberto	01	100,0 %
	Descoberto	00	0,0 %
Total		01	100,0 %



1:4.600.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de operação de eclusas																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Operação da Eclusa de Sobradinho (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00577/2021	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A	27/12/2021	26/12/2026	R\$ 29.410.915	R\$ 12.240.357	42%	ATIVO	05 00671/2021	SIRCOP SERVICOS AQUAVIARIOS E AERONAUTICOS LTDA	27/12/2021	26/10/2026	R\$ 6.168.517	48%	
TOTAL GERAL								R\$ 29.410.915	R\$ 12.240.357	42%		TOTAL GERAL				R\$ 6.168.517	48%	

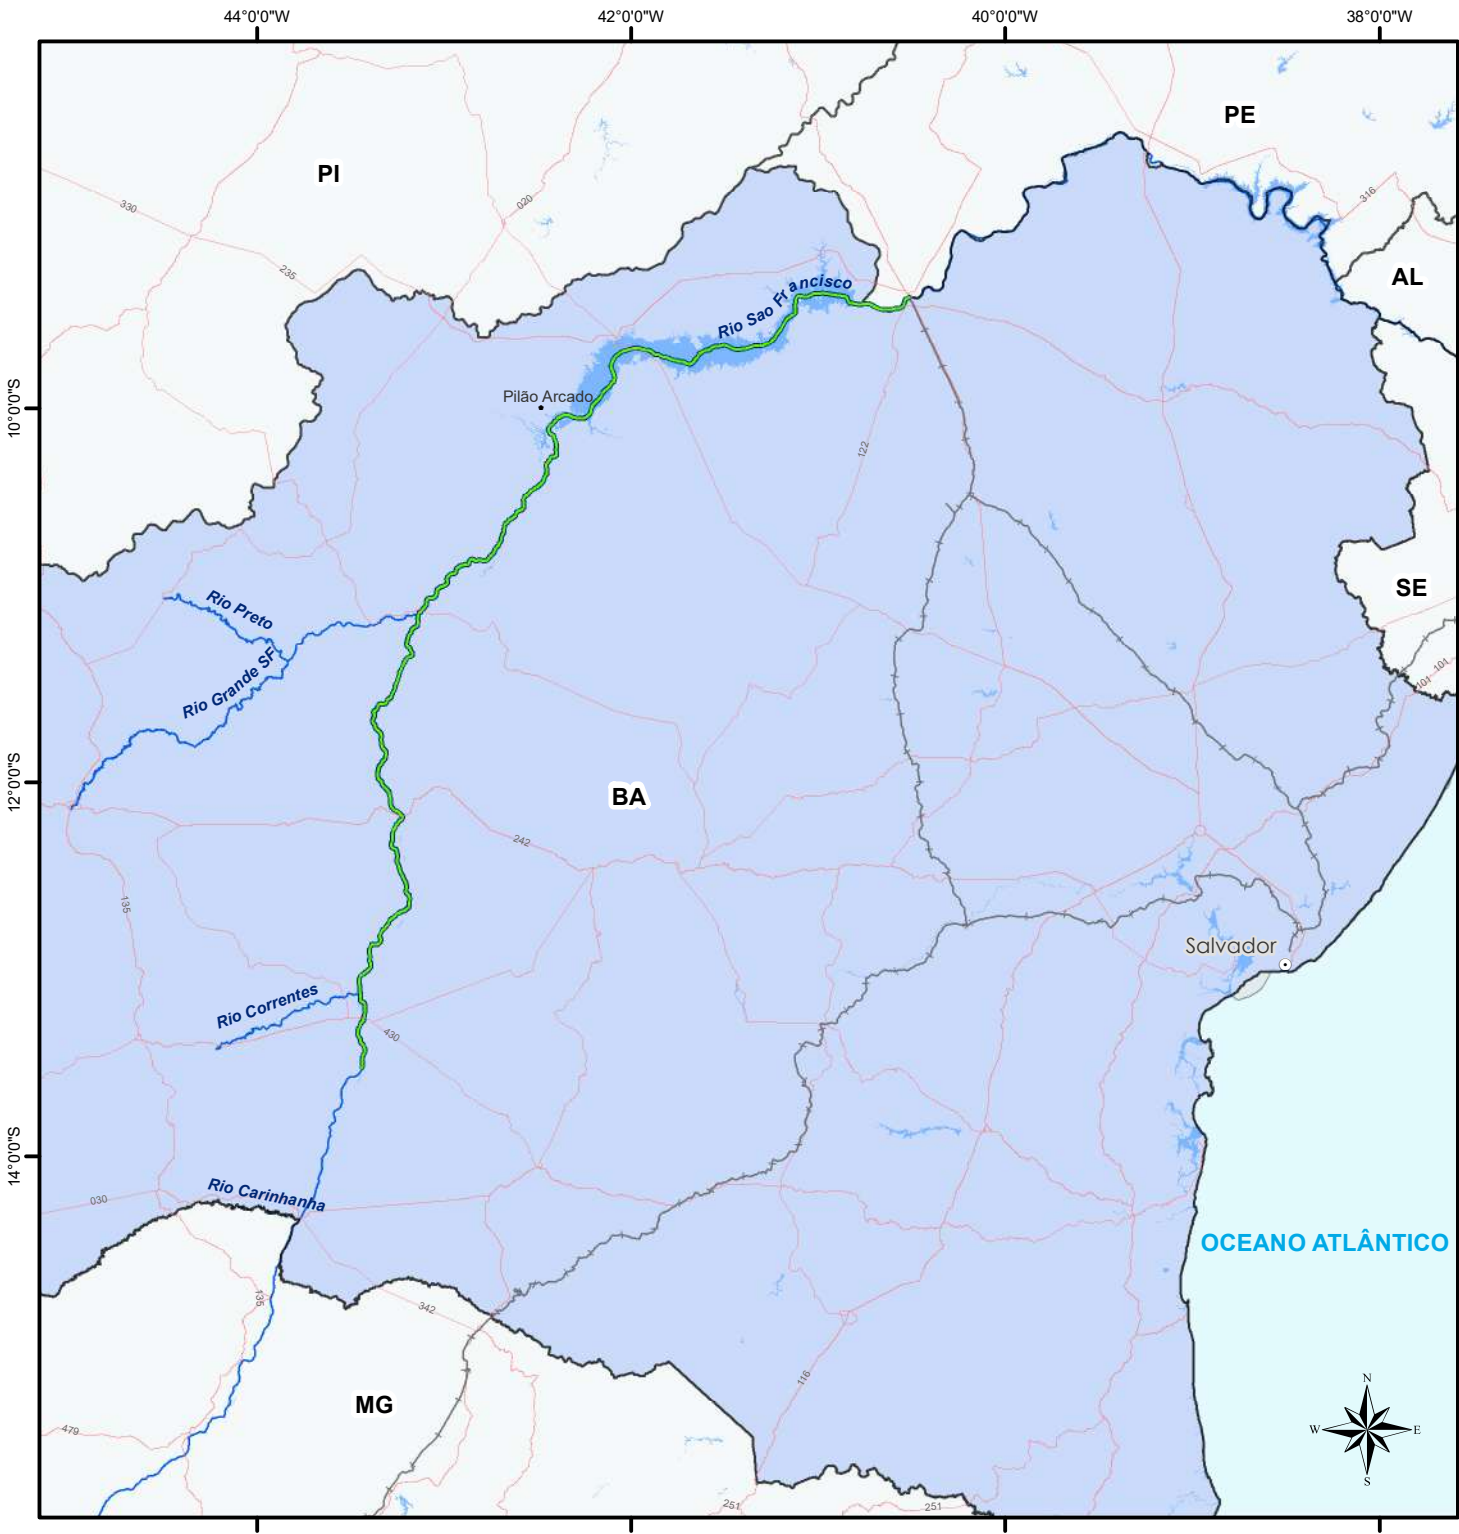

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV

Estudos e Projetos (km)

- PMH Rio São Francisco (Lote 1 e 2) 568,0 km

100 50 0 100 km

1:4.500.000


Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco - Lote 1 (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00330/2021	UMI SAN SERVIÇOS DE APOIO À NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	01/09/2021	30/08/2026	R\$ 6.004.881	R\$ 1.185.515	20%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ -	-
2	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco - Lote 2 (HN-500)	BA	Rio São Francisco HN-500	05 00331/2021	UMI SAN SERVIÇOS DE APOIO À NAVEGAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	01/09/2021	30/08/2026	R\$ 5.611.389	R\$ 1.282.729	23%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ -	-
TOTAL GERAL								R\$ 11.616.271	R\$ 2.468.244	21%		TOTAL GERAL				R\$ -	-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR MA



Rio Parnaíba

DNIT

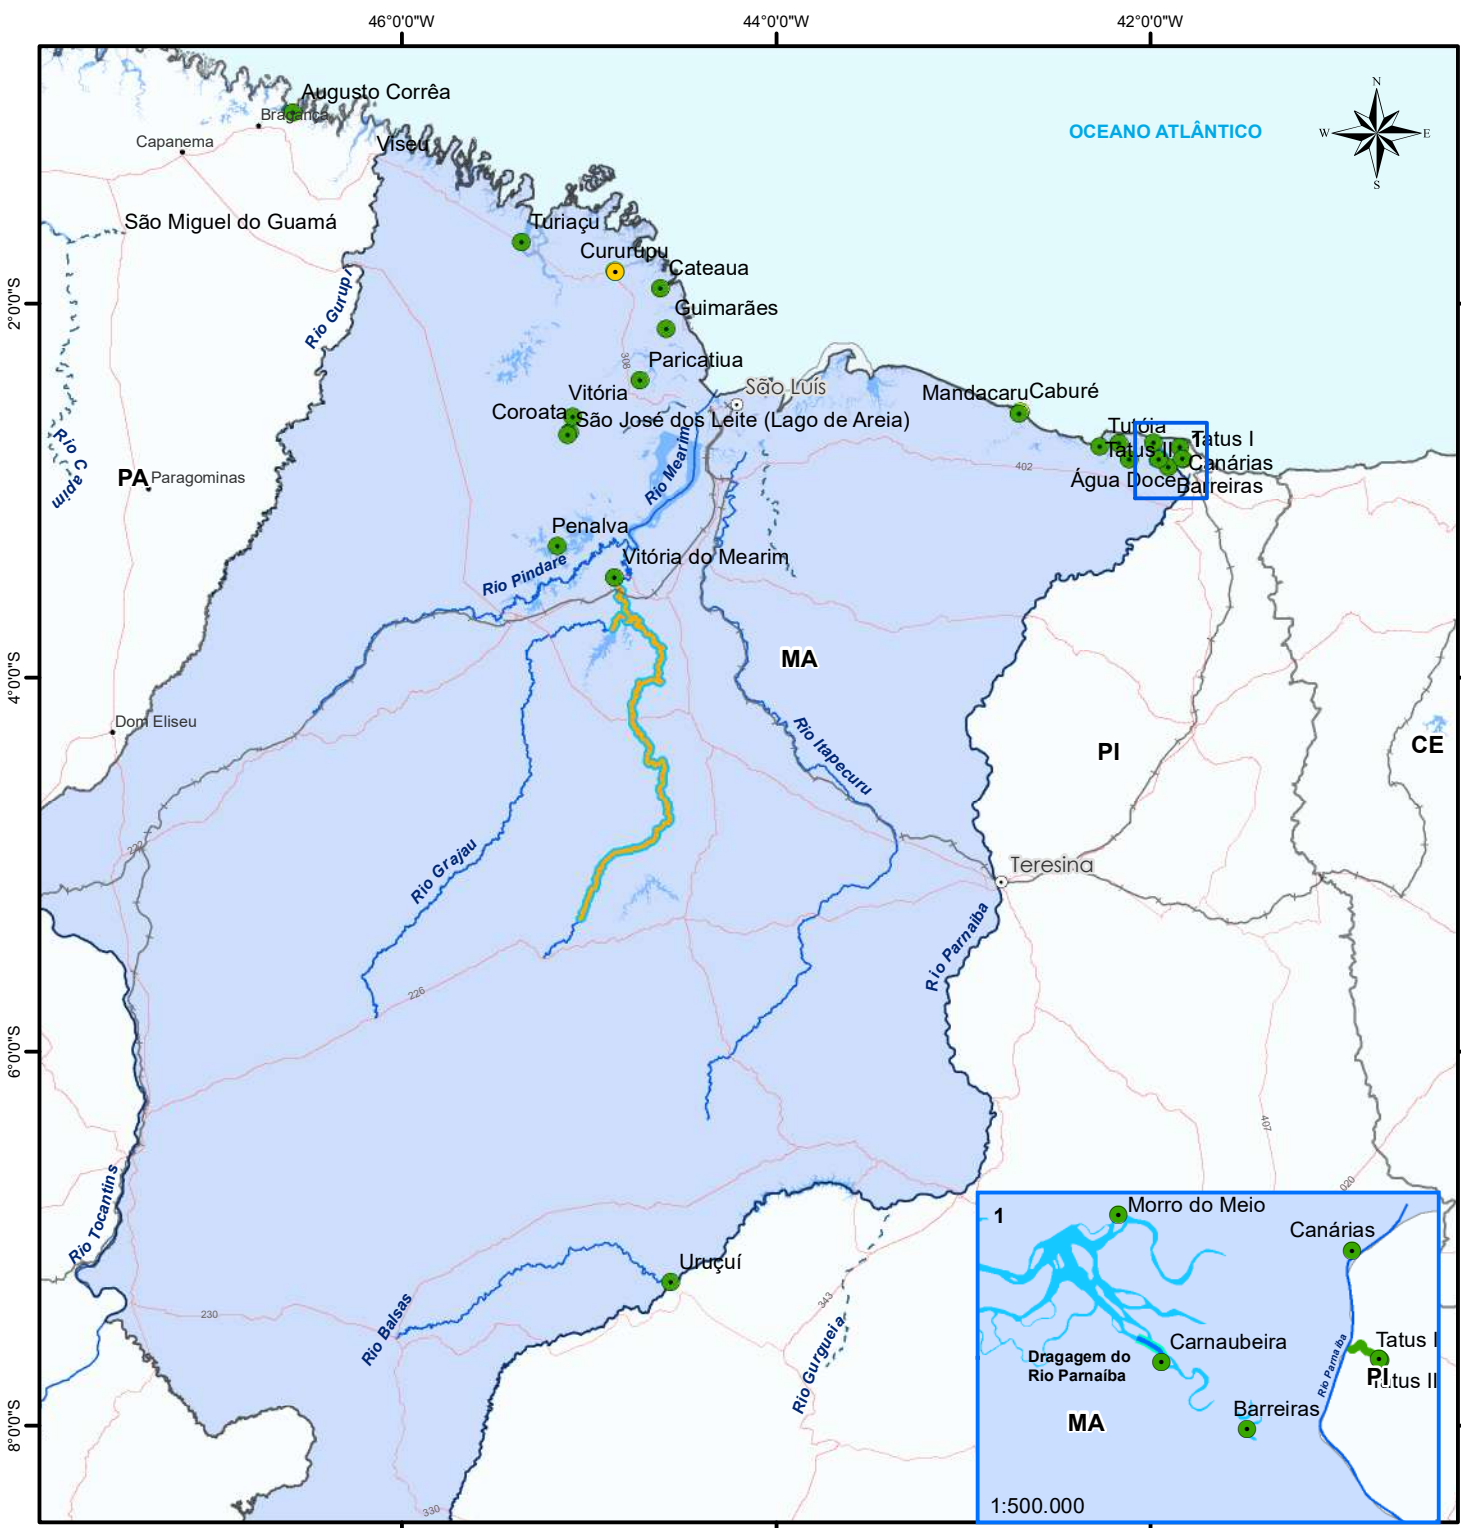


Superintendência Regional do Maranhão

MANUTENÇÃO



- Legenda**
- Capitais
 - SR - Superintendência Regional
 - SNV**
 - Ferrovias
 - Rodovias
 - Hidrovias do SNV**
 - PNV
 - SNV
 - Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte**
 - Concluídas em operação
 - Concluídas fora de operação

Intervenções Aquaviárias		(km)
Dragagem do canal navegável Rio Parnaíba		2,7 km
Desobstrução da hidrovia do Mearim e Grajaú		455,00 km
Dragagem do Rio Parnaíba (Passo dos Tatus/ Ilha Grande PI)		2,82 km



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de manutenção de IP4																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Manutenção dos Terminais Hidroviários - Atlântico Nordeste e Parnaíba (HN-400)	MA	Parnaíba	15 00477/2023	S E R SERVICOS, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	25/08/2023	25/08/2025	R\$ 12.431.196	R\$ 5.450.534	44%	ATIVO	15 00586/2021	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	10/11/2021	09/02/2025	R\$ 4.822.556	75%
TOTAL GERAL								R\$ 12.431.196	R\$ 5.450.534	44%		TOTAL GERAL				R\$ 4.822.556	75%

Instrumentos de manutenção de hidrovía																	
	tervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Desobstrução/destocamento da Hidrovía do Mearim e Grajaú (HN-302,HN-305)	MA	Rio Mearim HN-302 e Rio Grajaú HN-305	15 00682/2021	PACHECO E OLIVEIRA LTDA	13/12/2021	30/06/2025	R\$ 4.970.565	R\$ 4.907.371	99%	ATIVO	15 00586/2021	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	10/11/2021	09/02/2025	R\$ 4.822.556	75%
	Dragagem do Rio Parnaíba - Passo dos Tatus/Ilha Grande PI (HN-400)	MA	Rio Parnaíba HN-400	15 00682/2022	PACHECO E OLIVEIRA LTDA	22/12/2022	13/10/2024	R\$ 2.325.847	R\$ 1.479.093	64%	ATIVO	15 00586/2021	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	10/11/2021	09/02/2025	R\$ 4.822.556	75%
TOTAL GERAL								R\$ 7.296.412	R\$ 6.386.464	88%		TOTAL GERAL				R\$ -	-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR MS



DNIT

Hidrovia do Paraguai

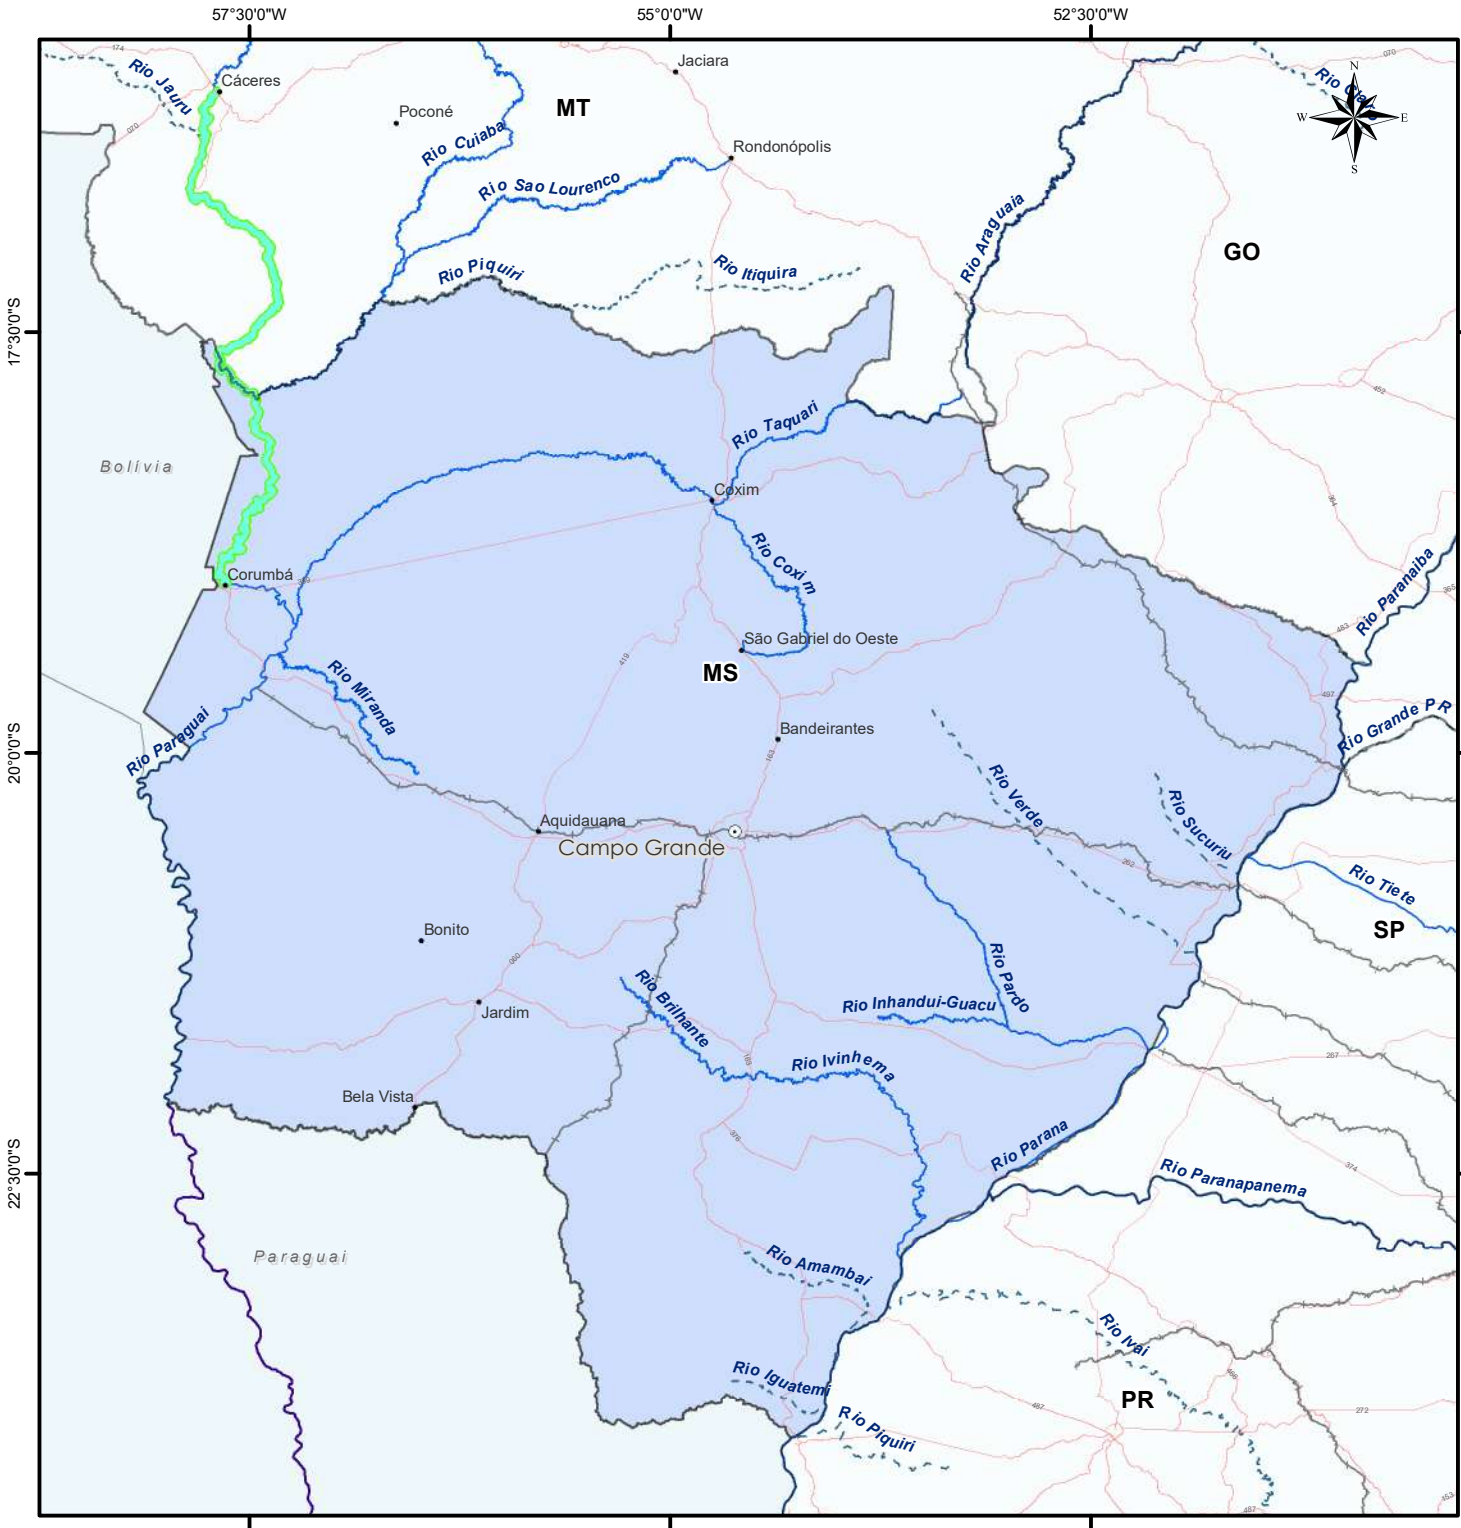

Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul
MANUTENÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional


Intervenções Aquaviárias

- Manutenção, Recuperação da Sinalização da Hidrovia do Rio Paraguai



1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
	tervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
	Dragagem e Sinalização do Rio Paraguai HN-950 (Tramo Norte)	PA	Rio Paraguai HN-950	19 00316/2023	CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA	13/06/2023	17/05/2028	R\$ 14.989.838	R\$ 2.306.660	15%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ -	-	
TOTAL GERAL								R\$ 14.989.838	R\$ 2.306.660	15%		TOTAL GERAL				R\$ -	-	

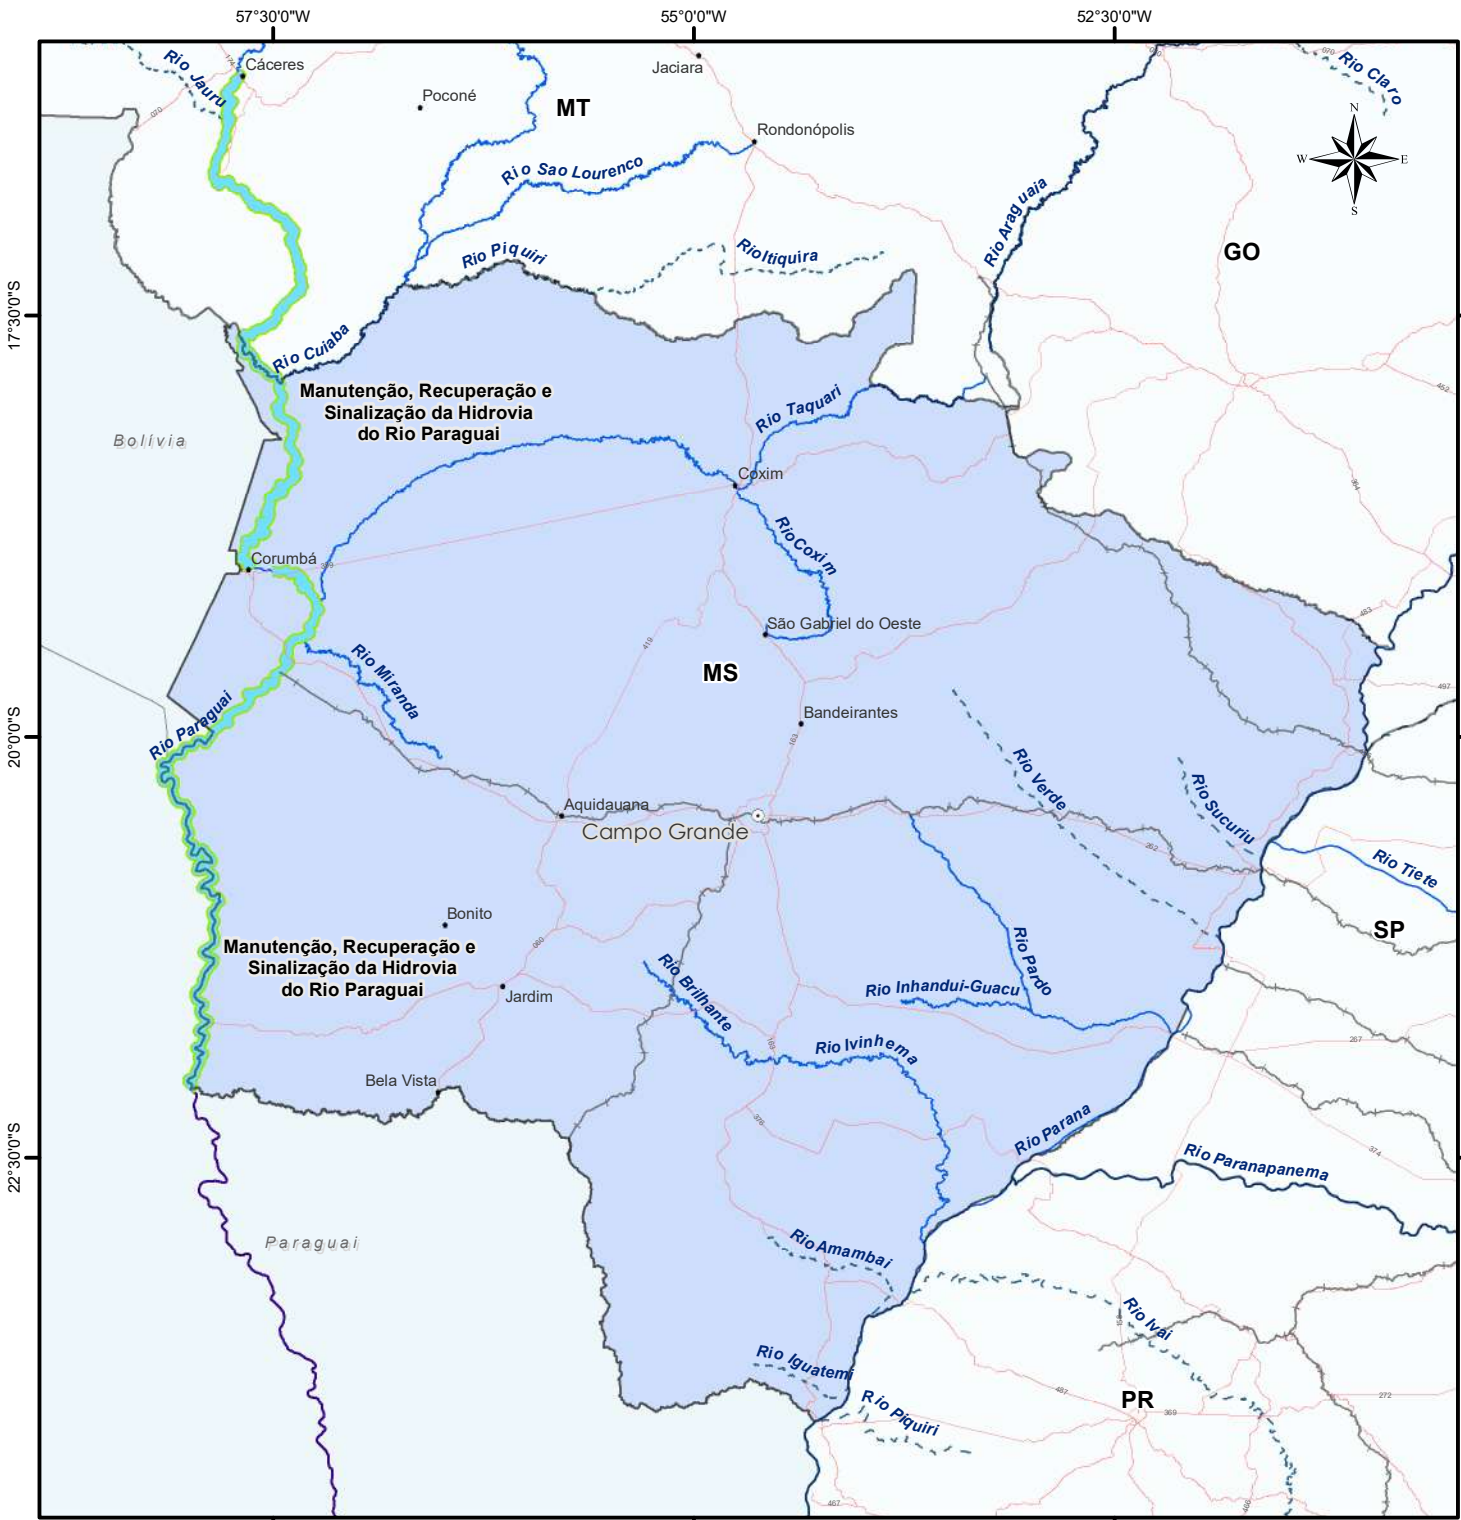

Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Sinalização


- Manutenção, Recuperação e Sinalização da Hidrovia do Rio Paraguai



1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
	tervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
	Dragagem e Sinalização do Rio Paraguai HN-950 (Tramo Norte)	PA	Rio Paraguai HN-950	19 00316/2023	CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA	13/06/2023	17/05/2028	R\$ 14.989.838	R\$ 2.306.660	15%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ -	-	
TOTAL GERAL								R\$ 14.989.838	R\$ 2.306.660	15%		TOTAL GERAL				R\$ -	-	

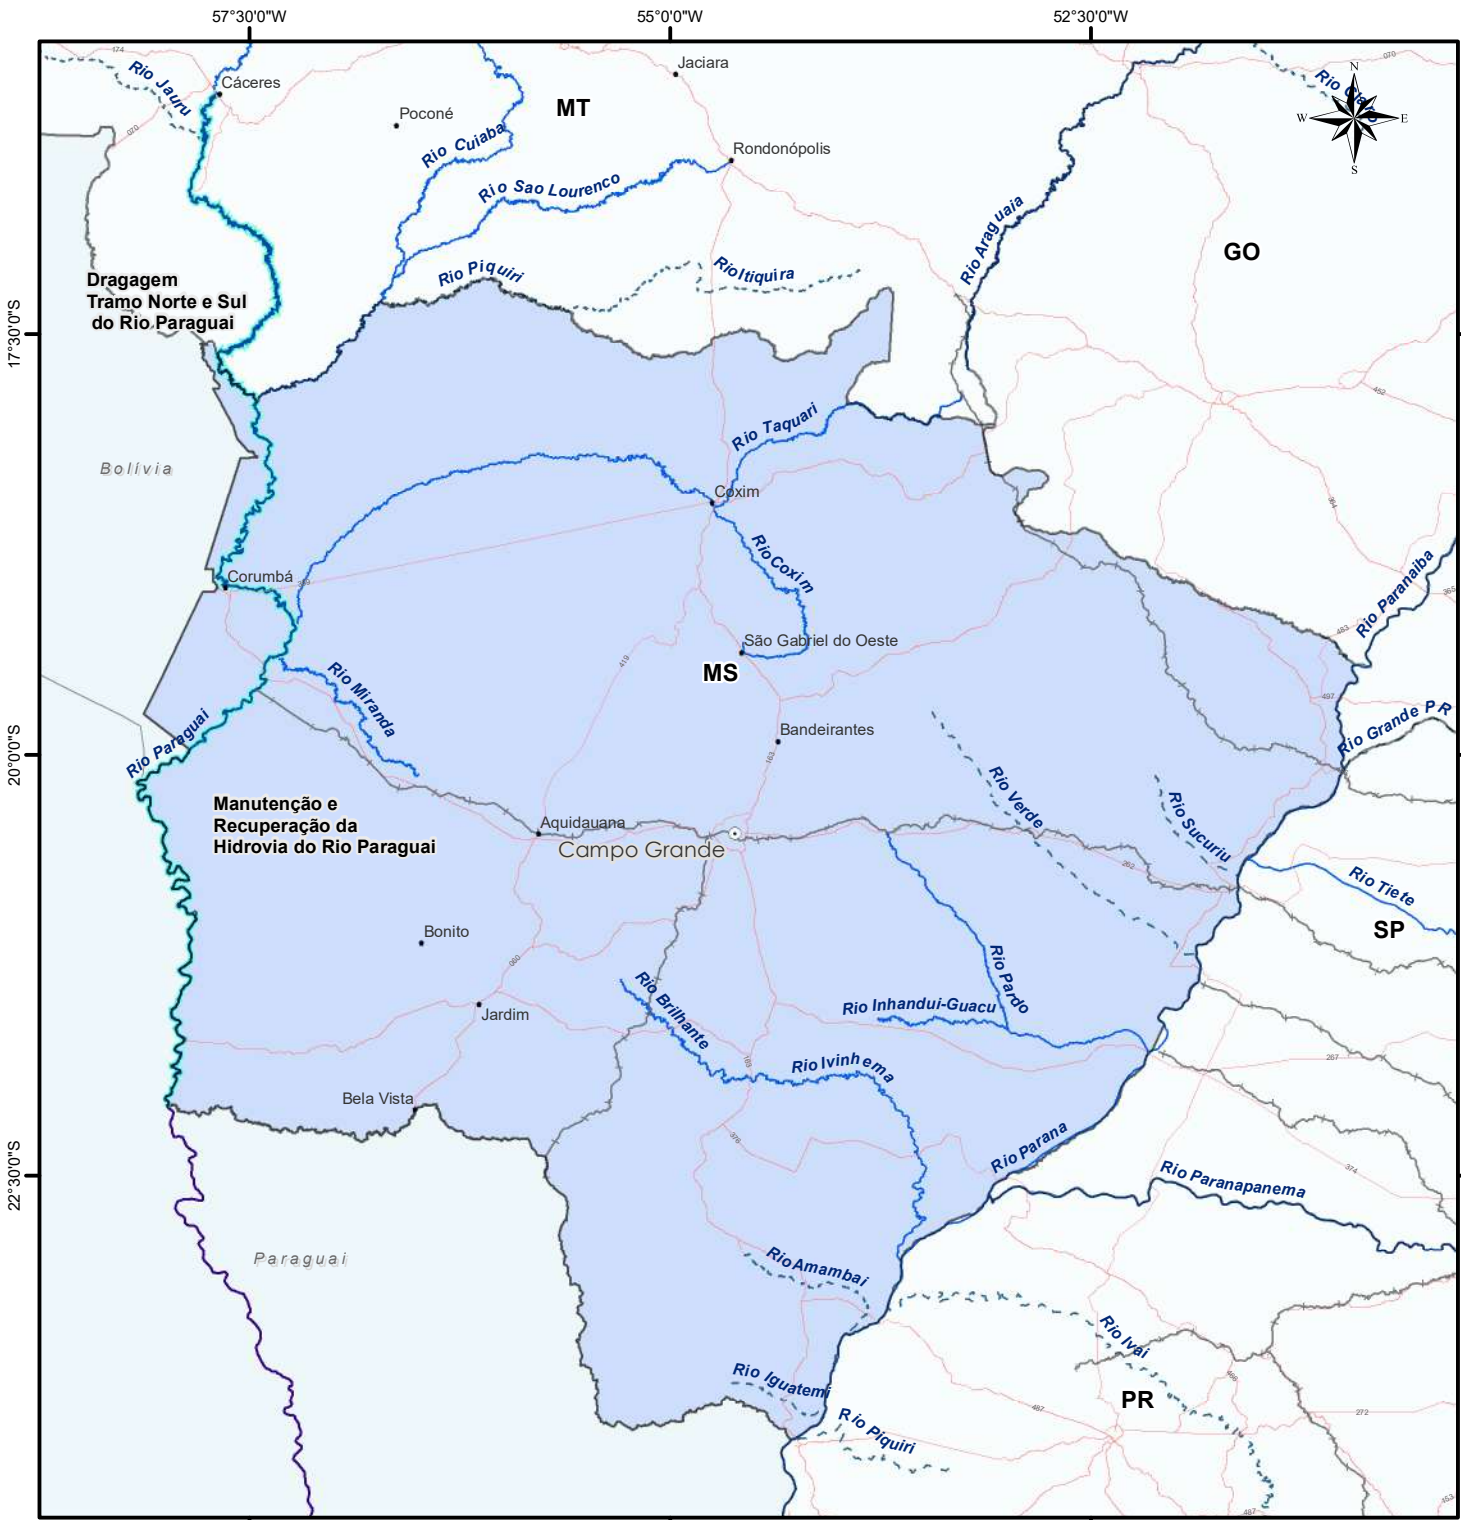

Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Estudos e Projetos

- PMH Paraguai

100 50 0 100 km

1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - (Lote 02)	MS	Rio Paraguai HN-950	19 00431/2022	Progaia Engenharia e Meio Ambiente Ltda.	05/10/2022	08/09/2027	R\$ 10.715.039	R\$ 2.240.460	21%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - (Lote 03)	MS	Rio Paraguai HN-950	19 00469/2022	CONSÓRCIO PROGAIA, R PEOTTA, ENVIRONLINK	05/10/2022	08/09/2027	R\$ 8.618.955	R\$ 1.888.165	22%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - (Lote 04)	MS	Rio Paraguai HN-950	19 00485/2022	BELOV ENGENHARIA S.A	25/10/2022	28/09/2027	R\$ 9.958.546	R\$ 1.921.224	19%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 29.292.540	R\$ 6.049.849	21%		TOTAL GERAL				R\$ -	-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR PA



IP4 Visau/PA

DNIT

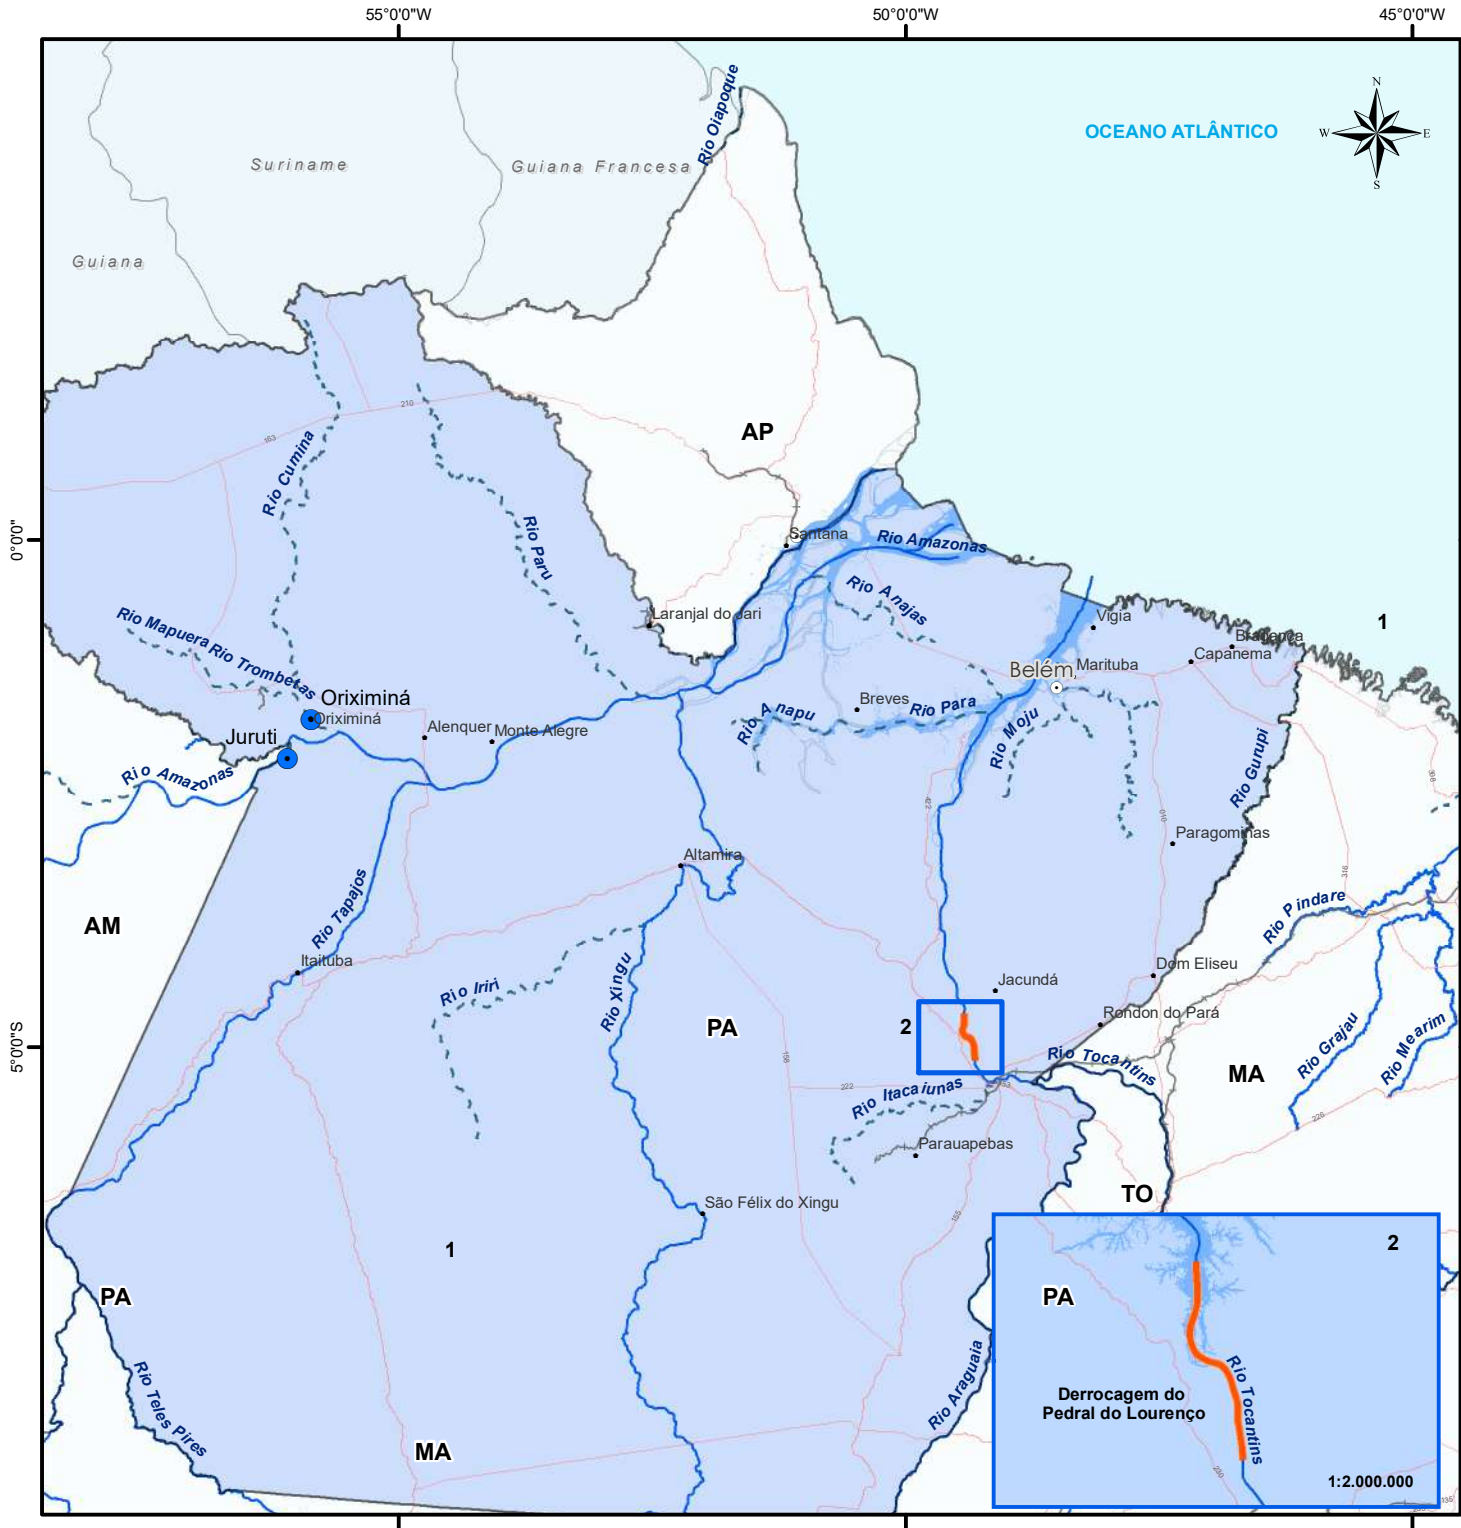

Superintendência Regional do Pará
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV

Instalações Portuárias de Pequeno Porte	Quantidade	%
Em construção	02	100,0%


Obras Aquaviárias

- Derrocagem do Pedral do Lourenço



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de construção e recuperação																	
	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Derrocagem do Pedral do Lourenço	PA	Rio Tocantins HN-200	00 00245/2016	Consórcio DTA-O'Martin	16/06/2016	16/04/2025	R\$ 996.212.623	R\$ 14.270.856	1%	ATIVO	00 00599/2016	Consórcio Hidrotopo/ Caruso	09/11/2016	16/04/2025	R\$ 18.123.177	16%
TOTAL GERAL								R\$ 996.212.623	R\$ 14.270.856	1%		TOTAL GERAL				R\$ 18.123.177	16%

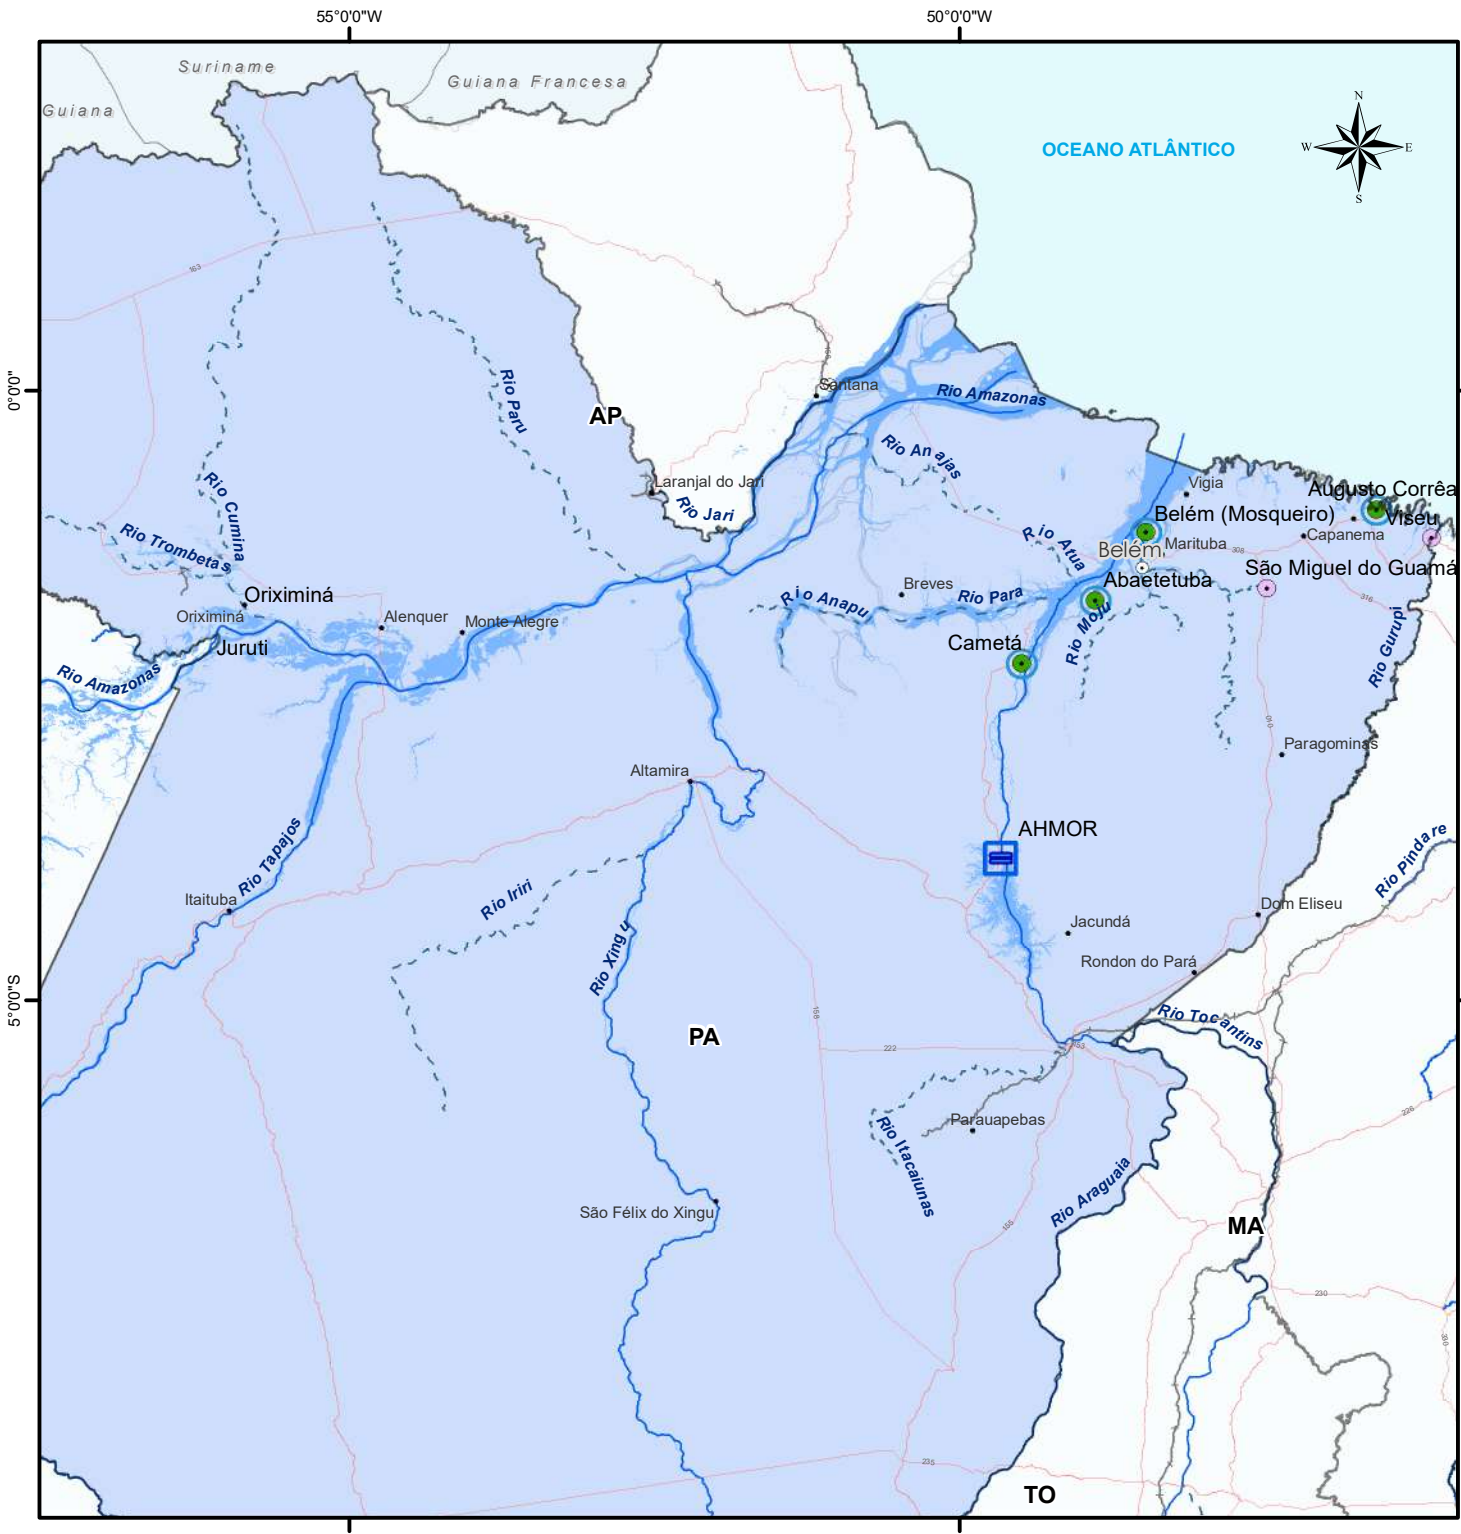

Superintendência Regional do Pará
OPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV

Instalações Portuárias de Pequeno Porte	Quantidade	%
---	------------	---

Concluídas em operação	04	66,66%
Concluídas fora de operação	00	0,0 %
Delegada	02	33,33%

Corbertura Contratual	Quantidade	%
-----------------------	------------	---

Coberto	01	100,0 %
Descoberto	00	0,0 %
Total	01	100,0%


Eclusas	Quantidade	%
---------	------------	---

Eclusas em Operação (*)	01	100,0 %
Eclusas fora de Operação	00	0,0 %
Total	01	100,0%

Corbertura Contratual	Quantidade	%
-----------------------	------------	---

Coberto	01	100,0 %
Descoberto	00	0,0 %
Total	01	100,0%

(*) Eclusa disponível para operação em casos emergenciais.



1:6.900.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em outubro/2024.

Instrumentos de operação de eclusas																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Operação e Manutenção das Eclusa do Tucuruí	PA	Rio Tocantins HN-200	02 00800/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/02/2022	13/01/2027	R\$ 36.295.034	R\$ 18.283.367	50%	ATIVO	02 00096/2022	TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA	11/04/2022	11/04/2027	R\$ 7.319.891	45%	
TOTAL GERAL								R\$ 36.295.034	R\$ 18.283.367	50%		TOTAL GERAL				R\$ 7.319.891	45%	

Instrumentos de operação de IP4																												
	renção	UF	Rio (HN)	IP4 Cobertas	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)										
	Operação e Manutenção das IP4 do Pará - O&M	PA	Bacia Tocantins-Araguaia	Abaetetuba/PA, Augusto Corrêa/PA, Belém Mosqueiro/PA, Cametá/PA, Juruti/PA, Oriximiná/PA, Santarém/PA, São Miguel Do Guamá/PA, Viseu/PA	02 00696/2021	VILHENA SERVIÇOS LTDA	19/12/2021	17/10/2025	R\$	22.060.877	R\$	8.752.184	40%	ATIVO	-	-	-	-	R\$	-	-							
				TOTAL GERAL									R\$	22.060.877	R\$	8.752.184	40%	TOTAL GERAL				R\$	-	-				

Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção das Eclusa do Tucuruí	PA	Rio Tocantins HN-200	02 00800/2021	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01/02/2022	13/01/2027	R\$ 36.295.034	R\$ 18.283.367	50%	ATIVO	02 00096/2022	TRANSGLOBAL SERVIÇOS LTDA	11/04/2022	11/04/2027	R\$ 7.319.891	45%
TOTAL GERAL								R\$ 36.295.034	R\$ 18.283.367	50%		TOTAL GERAL				R\$ 7.319.891	45%

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	EVTEA e projetos na Hidrovia de Guamá-Capim	PA	Rio Guamá HN-201 e Rio Capim HN-203	00 00133/2017	CONSÓRCIO R.PEOTTA-HIDROTO-ENEFER	14/07/2017	04/01/2025	R\$ 4.099.517	R\$ 3.111.439	76%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
2	EVTEA Tapajós	PA	Rio Tapajós HN-106, Rio Teles Pires HN-110, Rio Juruena HN-107	00 00566/2015	CONSÓRCIO R.PEOTTA-HIDROTO-ENEFER	31/07/2015	31/12/2024	R\$ 19.077.670	R\$ 12.738.836	67%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
3	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tapajós	PA	Rio Tapajós HN-106	02 00922/2020	CHD-CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS LTDA.	15/01/2021	04/01/2026	R\$ 11.139.452	R\$ 6.952.372	62%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
4	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tocantins - Lote 2 (HN-200)	PA	Rio Tocantins (HN-200)	02 00234/2021	CONSÓRCIO PROGAIA/ENVIRONLINK	07/07/2021	07/07/2026	R\$ 6.900.414	R\$ 2.175.318	32%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
5	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tocantins - Lote 1 (HN-200)	PA	Rio Tocantins (HN-200)	02 00233/2021	CONSÓRCIO CONCREMAT/BELOV,	02/08/2021	19/07/2026	R\$ 8.181.498	R\$ 1.302.210	16%	ATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$ 49.398.551	R\$ 26.280.175	53%		TOTAL GERAL				R\$ -	-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR PI



DNIT

Instalação Portuária de Tatus II/PI

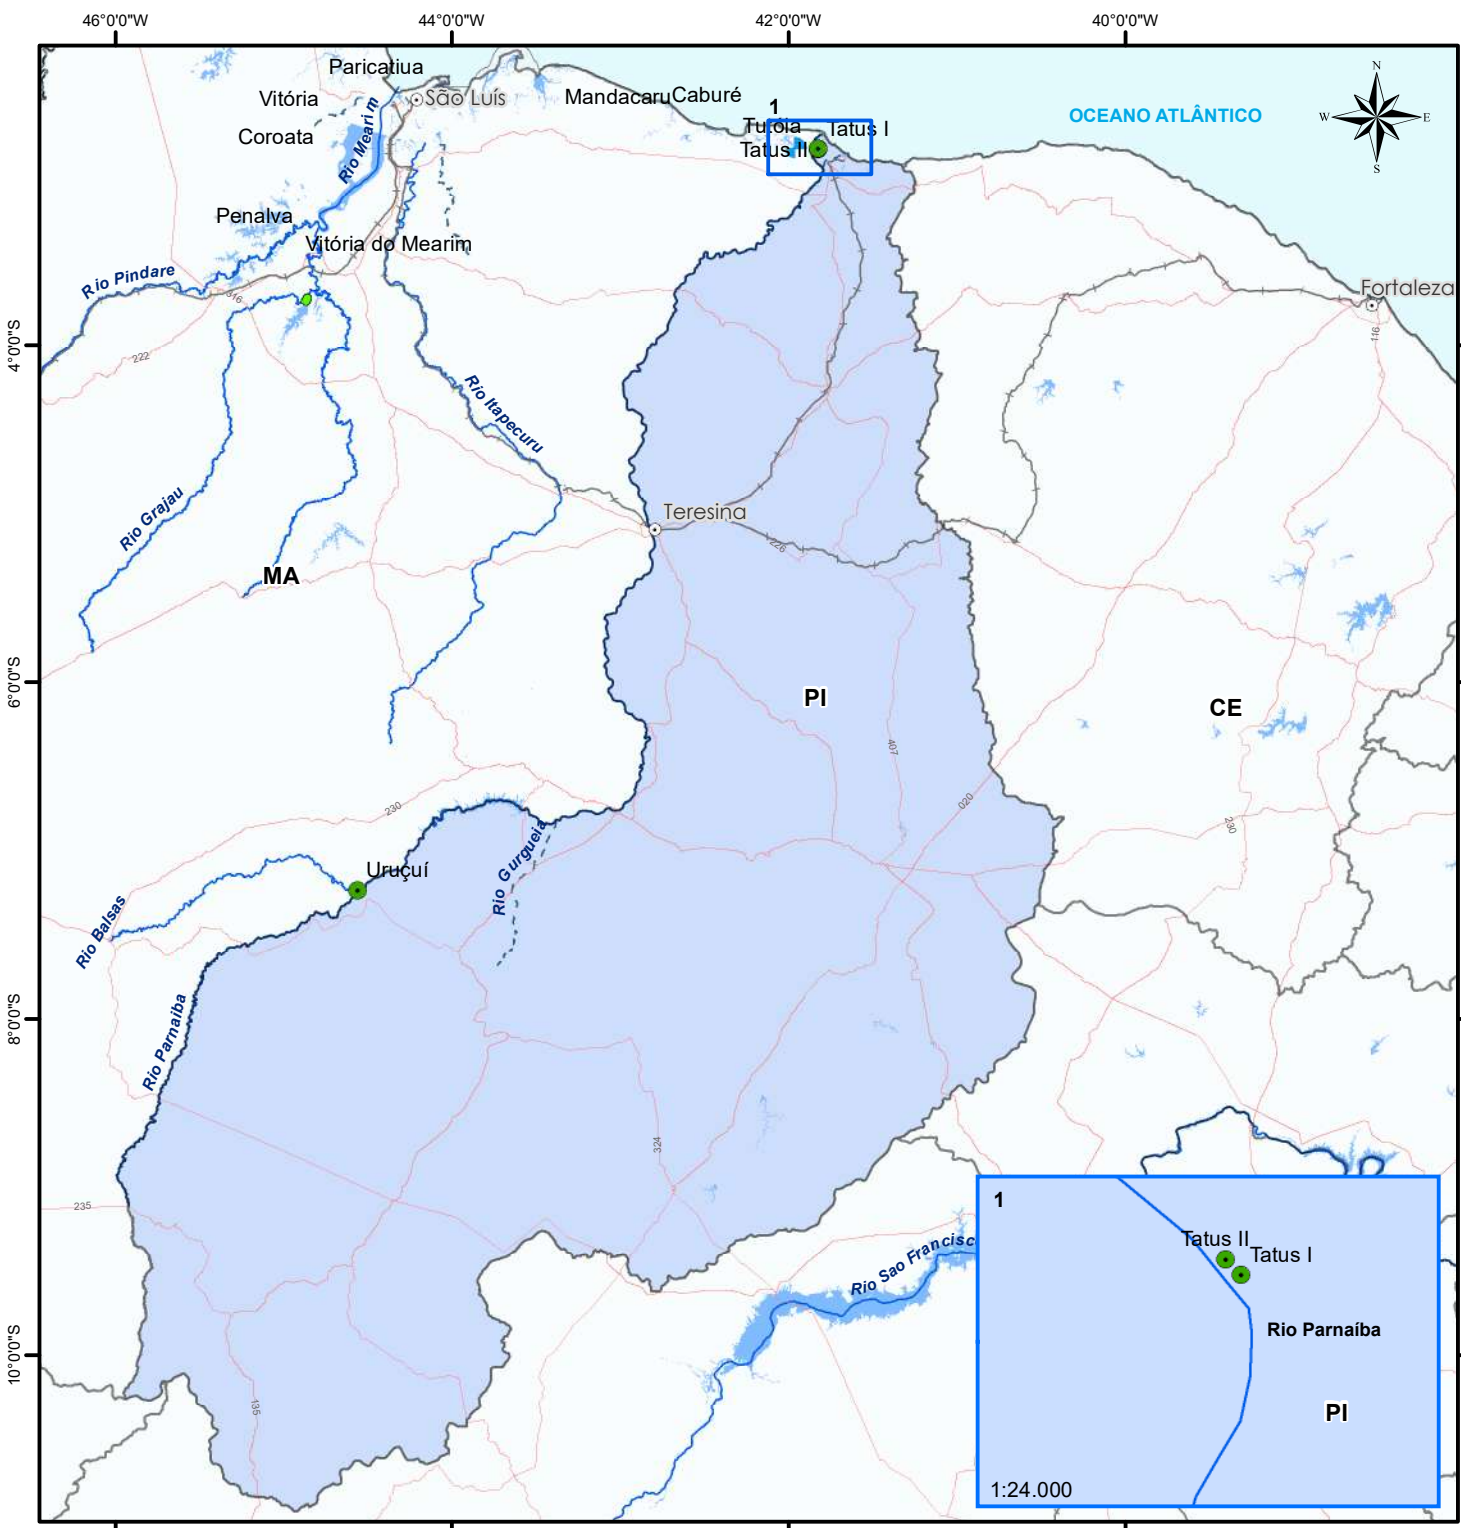

Superintendência Regional do Piauí

OPERAÇÃO

Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV

Instalações Portuárias de Pequeno Porte	Quantidade	%
Concluídas em operação	03	100%
Concluídas fora de operação	00	00%
Delegada	00	00%



1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de manutenção de IP4																				
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (%)	
1	Manutenção dos Terminais Hidroviários - Atlântico Nordeste e Parnaíba (HN-400)	PI	Parnaíba	15 00477/2023	S E R SERVICOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	25/08/2023	25/08/2025	R\$	12.431.196	R\$	5.450.534	44%	ATIVO	15 00586/2021	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	10/11/2021	09/02/2025	R\$	4.822.556	75%
TOTAL GERAL								R\$	12.431.196	R\$	5.450.534	44%	TOTAL GERAL				R\$	4.822.556	75%	



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RO



IP4 Cai N'Água/RO

DNIT



Superintendência Regional de Rondônia
MANUTENÇÃO




Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Rodovias
 - Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte

- Concluídas em operação
- Concluídas fora de operação


Intervenções Aquaviárias (km)	
Dragagem Rio Madeira	620,0 km
Dragagem Travessia do Rio Madeira	8,35 km



Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de manutenção de hidrovia																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Dragagem do Rio Madeira (HN-117)	RO	Rio Madeira HN-117	22 00220/2021	Consórcio Jan De Nul - JEED	18/06/2021	17/06/2025	R\$ 138.869.342	R\$ 112.352.571	81%	ATIVO	22 00221/2021	Consórcio Laghi-Prosul Madeira,	08/06/2021	01/06/2025	R\$ 2.292.901	72%	
2	Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM)	AM	Rio Madeira HN-117	22 00250/2022	JEED ENGENHARIA LTDA	01/07/2022	29/09/2027	R\$ 9.723.224	R\$ 4.676.630	48%	ATIVO	22 00221/2021		08/06/2021	01/06/2025	R\$ 2.292.901	72%	
TOTAL GERAL								R\$ 148.592.566	R\$ 117.029.201	79%		TOTAL GERAL				R\$ 2.292.901	72%	

- Os trechos contemplados pelos serviços de Dragagem do Rio Madeira (HN-117) estão localizados nos Estados do Amazonas e Rondônia, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).
- Os serviços de Dragagem de Travessia no Rio Madeira (Trecho Humaitá/AM) estão localizados no Estado do Amazonas, sendo a Fiscalização e Gestão do Contrato de responsabilidade da Superintendência de Rondônia (SR-RO).

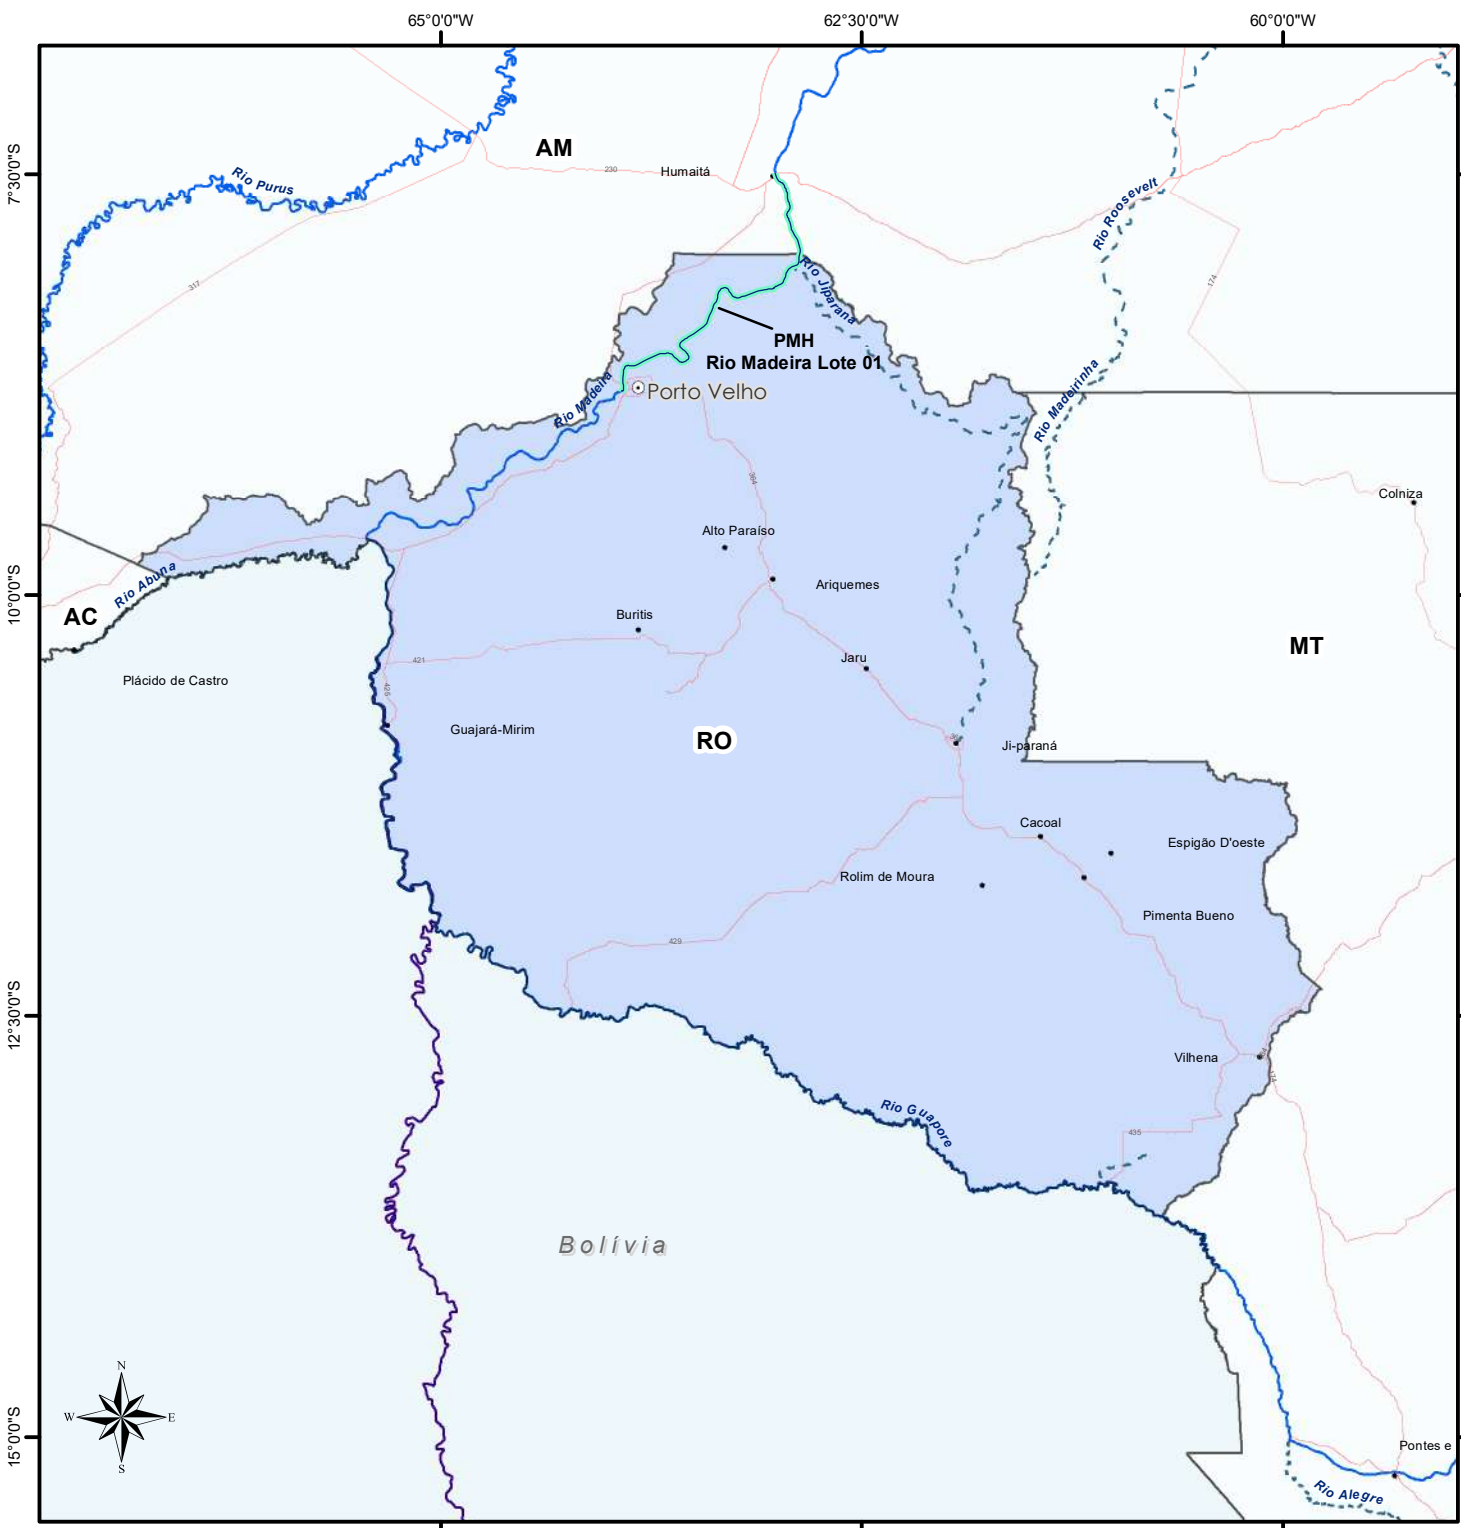

Superintendência Regional de Rondônia

ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV


- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Estudos e Projetos (km)

PMH Rio Madeira	245,0 km
-----------------	----------



1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
	Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lote 1	AM/RO	Rio Madeira HN-117	22 00908/2020	CHD - CARTOGRAFIA, HIDROLOGIA E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS LTDA	01/02/2021	05/01/2026	R\$	13.936.301	R\$	6.013.076	43%	ATIVO	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$	13.936.301	R\$	6.013.076	43%	TOTAL GERAL				R\$	-




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RR

IP4 Caracará/RR

DNIT

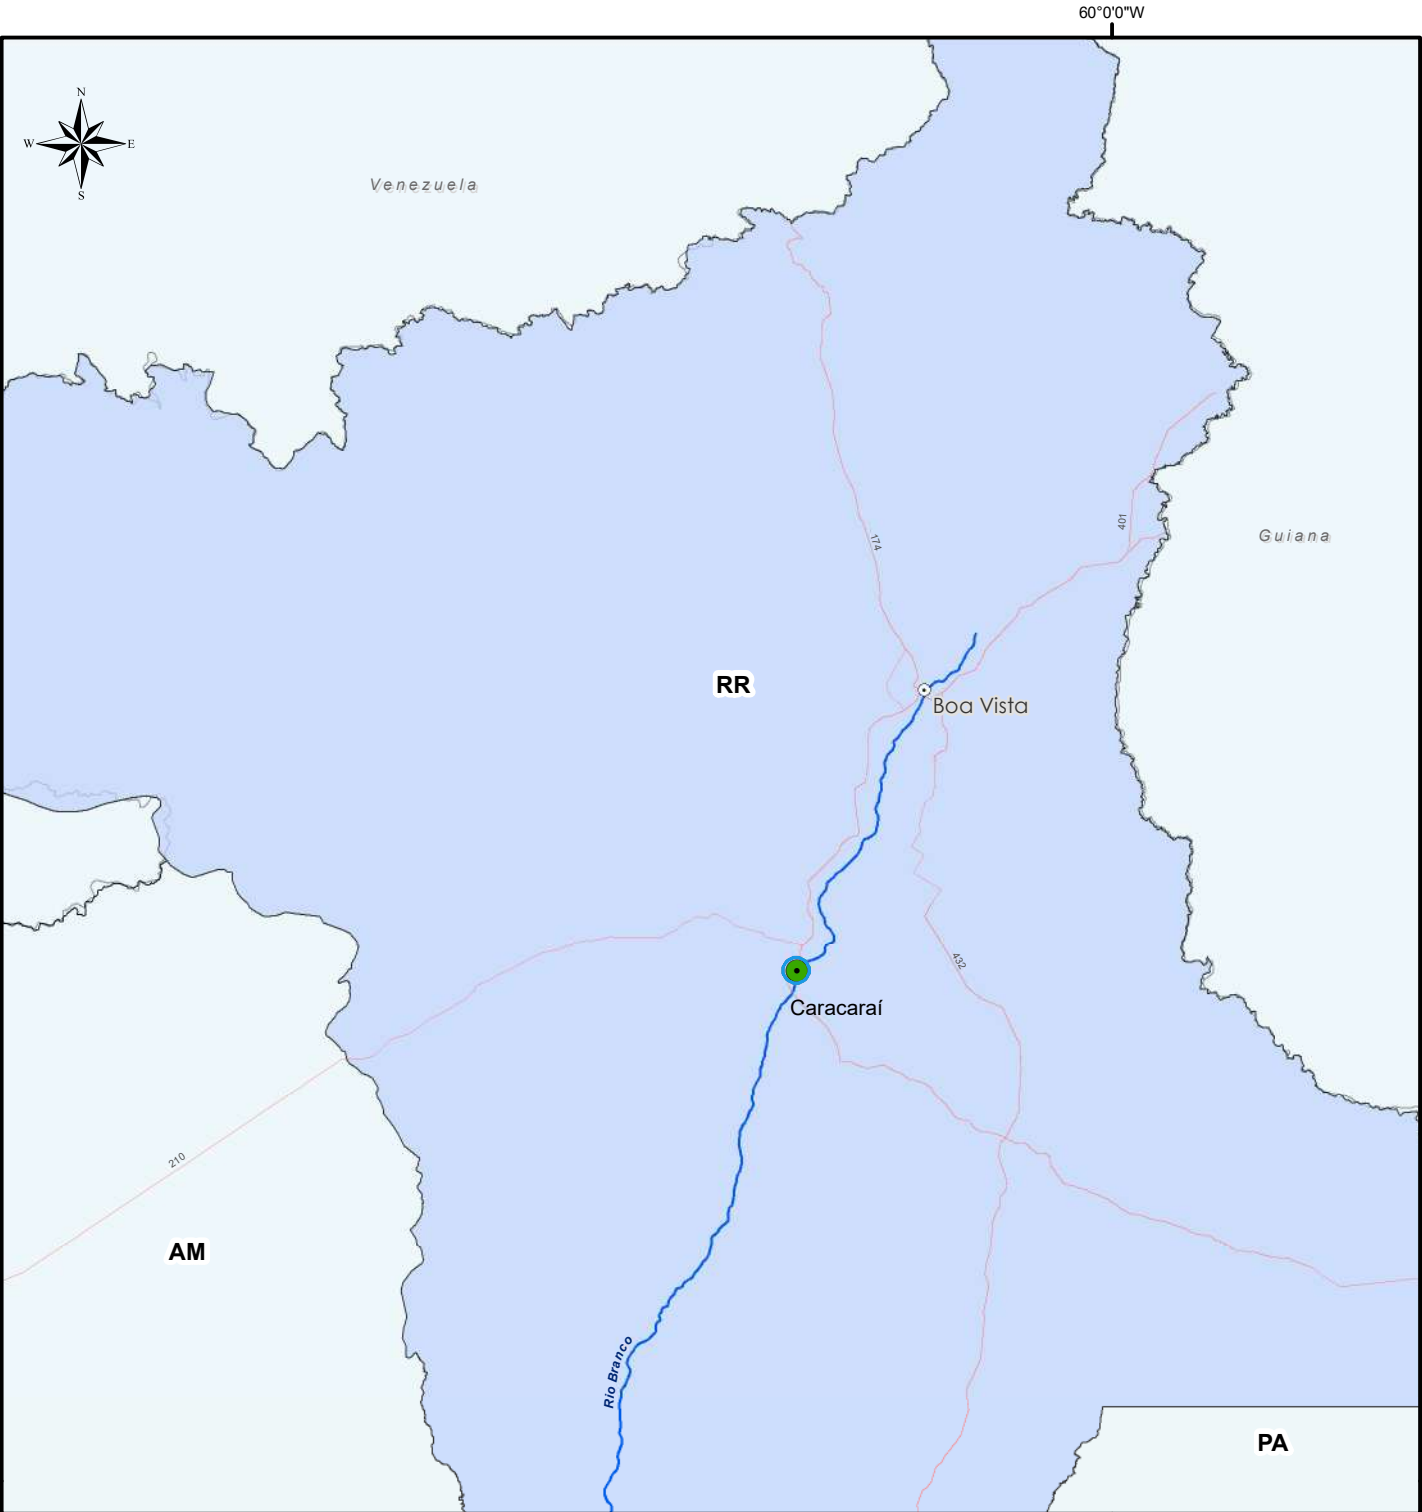

Superintendência Regional de Roraima
OPERAÇÃO




Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Rodovias
 - Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Instalações Portuárias de Pequeno Porte		Quantidade	%
	Concluídas em operação	01	100%
	Concluídas fora de operação	00	00%
Total		01	100,0%

Cobertura Contratual		Quantidade	%
	Coberto	01	100,0%
	Descoberto	00	00,0%
Total		01	100,0%



1:3.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR RS




Eclusa de Bom Retiro do Sul/RS

DNIT

Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção das Eclusas do Sul (HN-706,HN-710)	RS	Rio Jacuí HN -706 e Rio Taquari HN -710	10 00655/2021	PAMPULHA ENGENHARIA LTDA	24/11/2021	23/11/2026	R\$ 38.977.255	R\$ 19.674.026	50%	ATIVO	10 00560/2021	RUMO ENGENHARIA	24/11/2021	23/11/2026	R\$ 3.199.682	53%
TOTAL GERAL								R\$ 38.977.255	R\$ 19.674.026	50%		TOTAL GERAL				R\$ 3.199.682	53%

* Eclusas do Sul (Eclusa de Fandango, Eclusa Anel de Dom Marco, Eclusa Amarópolis e Eclusa Bom Retiro do Sul) .

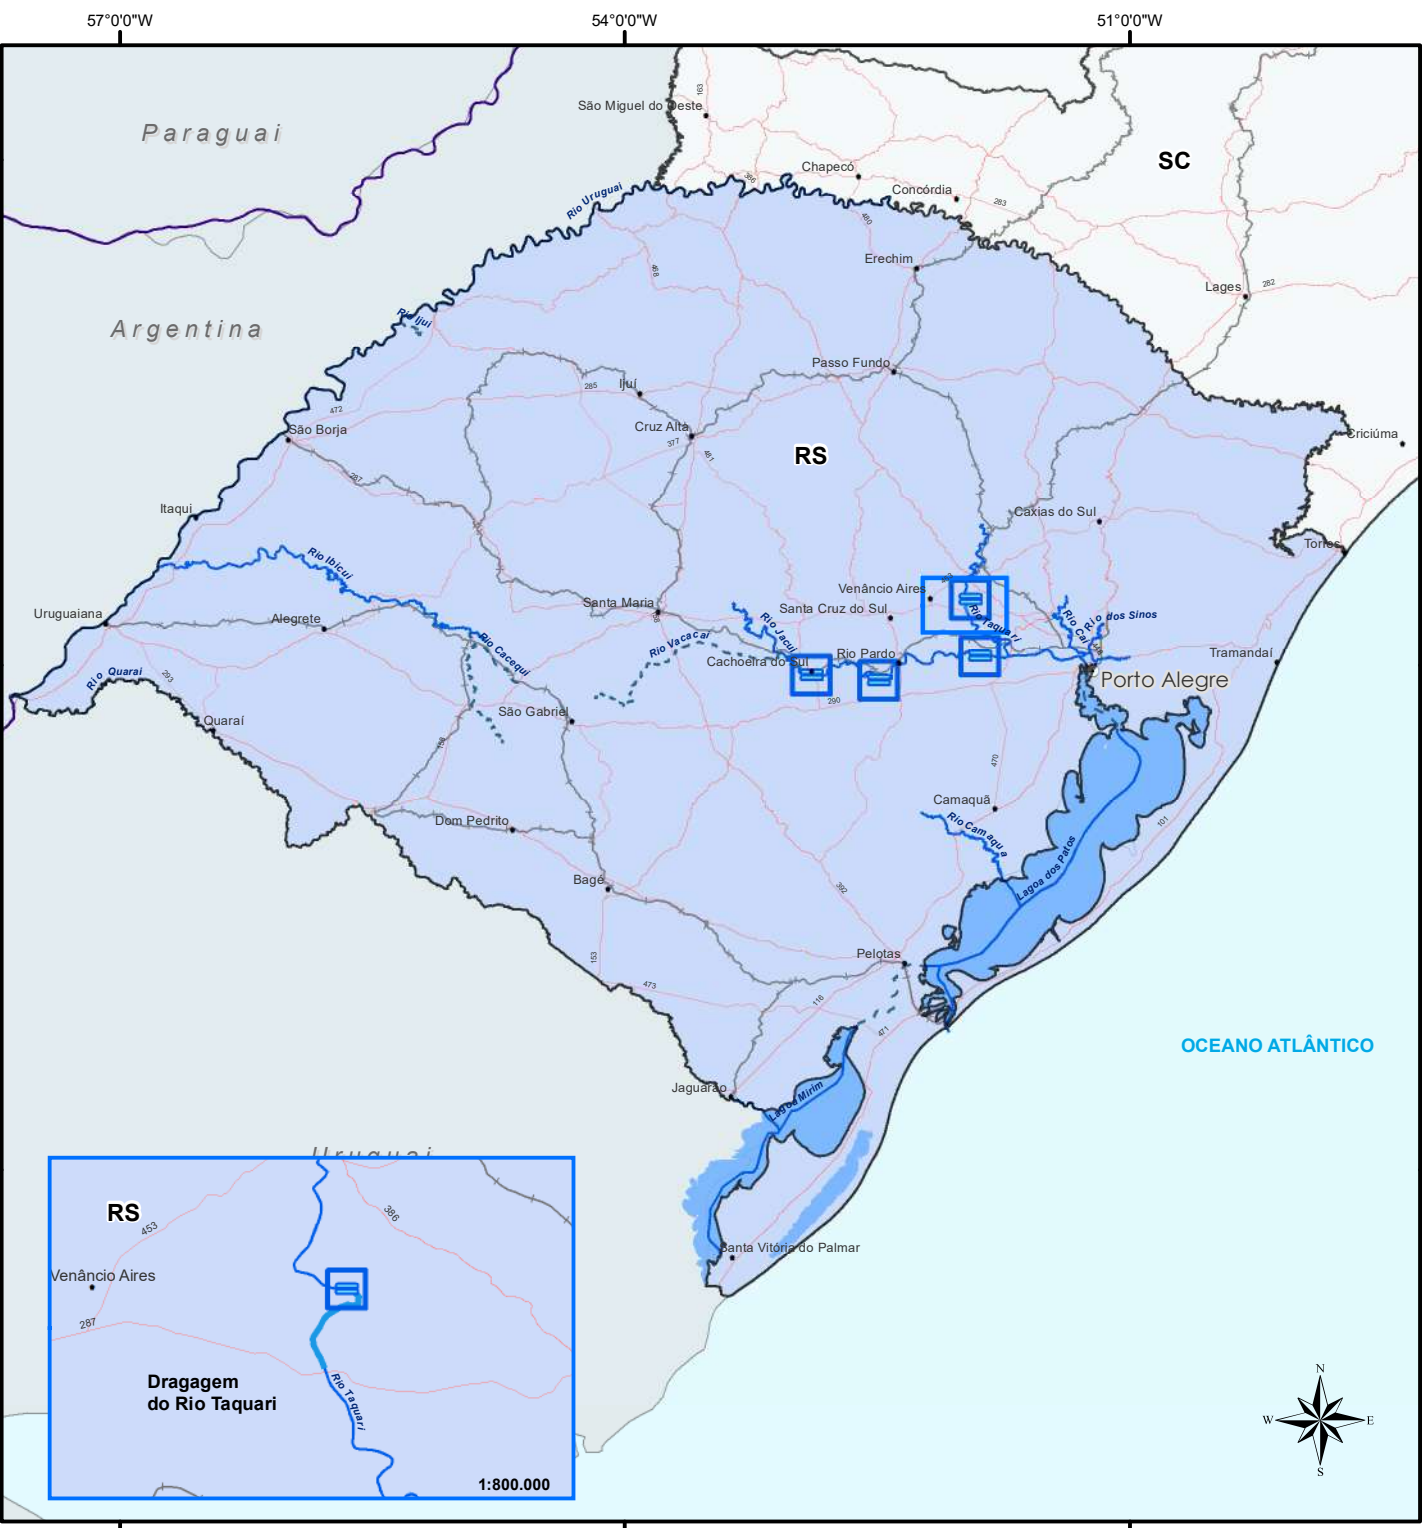

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul
MANUTENÇÃO



Legenda


- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Ferrovias
 - Rodovias
- Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Eclusas

- Eclusa em operação
- Eclusa fora de operação

Cobertura Contratual - ECLUSAS		Quantidade	%
Coberto		04	100,0%
Descoberto		00	00,0%
Total		04	100,0%

Intervenções Aquaviárias		(km)
Dragagem do Rio Taquari		14,0 km




1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de operação de eclusas																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Operação e Manutenção das Eclusas do Sul (HN-706,HN-710)	RS	Rio Jacuí HN -706 e Rio Taquari HN -710	10 00655/2021	PAMPULHA ENGENHARIA LTDA	24/11/2021	23/11/2026	R\$ 38.977.255	R\$ 19.674.026	50%	ATIVO	10 00560/2021	RUMO ENGENHARIA	24/11/2021	23/11/2026	R\$ 3.199.682	53%	
TOTAL GERAL								R\$ 38.977.255	R\$ 19.674.026	50%		TOTAL GERAL			R\$ 3.199.682	53%		

* Eclusas do Sul (Eclusa de Fandango, Eclusa Anel de Dom Marco, Eclusa Amarópolis e Eclusa Bom Retiro do Sul) .

Instrumentos de manutenção de hidrovia																				
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)		
1	Dragagem do Rio Taquari	RS	Rio Taquari HN-710	10 00109/2021	JEED ENGENHARIA LTDA	25/03/2021	24/03/2026	R\$	23.810.768	R\$	10.794.349	45%	ATIVO	10 00272/2023	CHD - Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas	20/06/2023	20/08/2026	R\$	1.399.804	33%
TOTAL GERAL									R\$	23.810.768	R\$	10.794.349	45%		TOTAL GERAL			R\$	1.399.804	33%

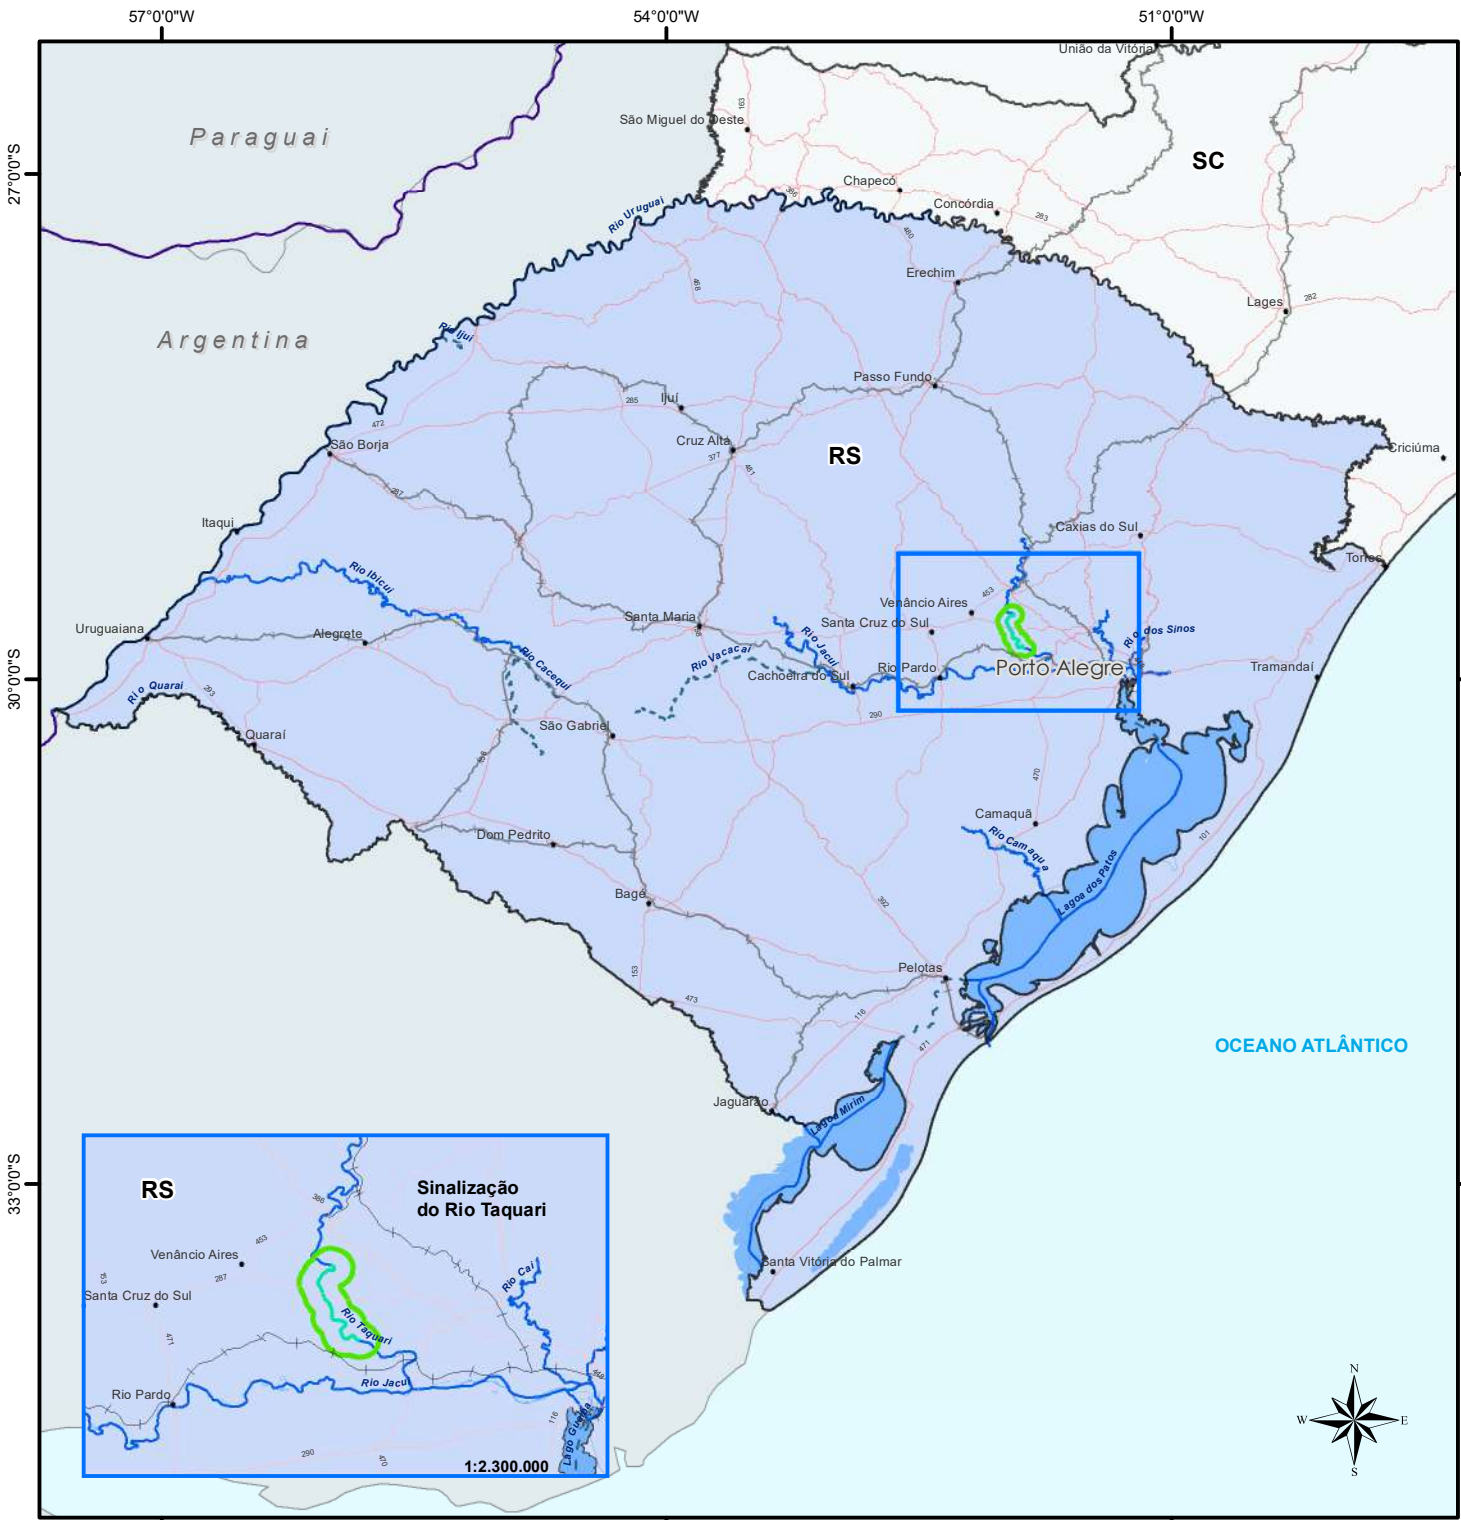

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul
SINALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA



Legenda


- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Ferrovias
 - Rodovias
- Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV
 - Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Sinalização	(km)
Manutenção de Sinalização Rio Taquari	86,0 km

Cobertura Contratual	Quantidade
Coberto	01
Descoberto	00

100 50 0 100 km
1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Instrumentos de sinalização																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Sinalização do Rio Taquari	RS	Rio Taquari HN-710	10 00436/2023	SEA AND PORT SERVIÇOS LTDA.	14/08/2023	15/10/2026	R\$ 3.988.469	R\$ 1.091.080	27%	ATIVO	10 00272/2023	CHD - Cartografia, Hidrologia e Digitalização de Mapas LTDA	20/06/2023	20/08/2026	R\$ 9.125.007	64%
TOTAL GERAL								R\$ 3.988.469	R\$ 1.091.080	27%		TOTAL GERAL				R\$ -	-

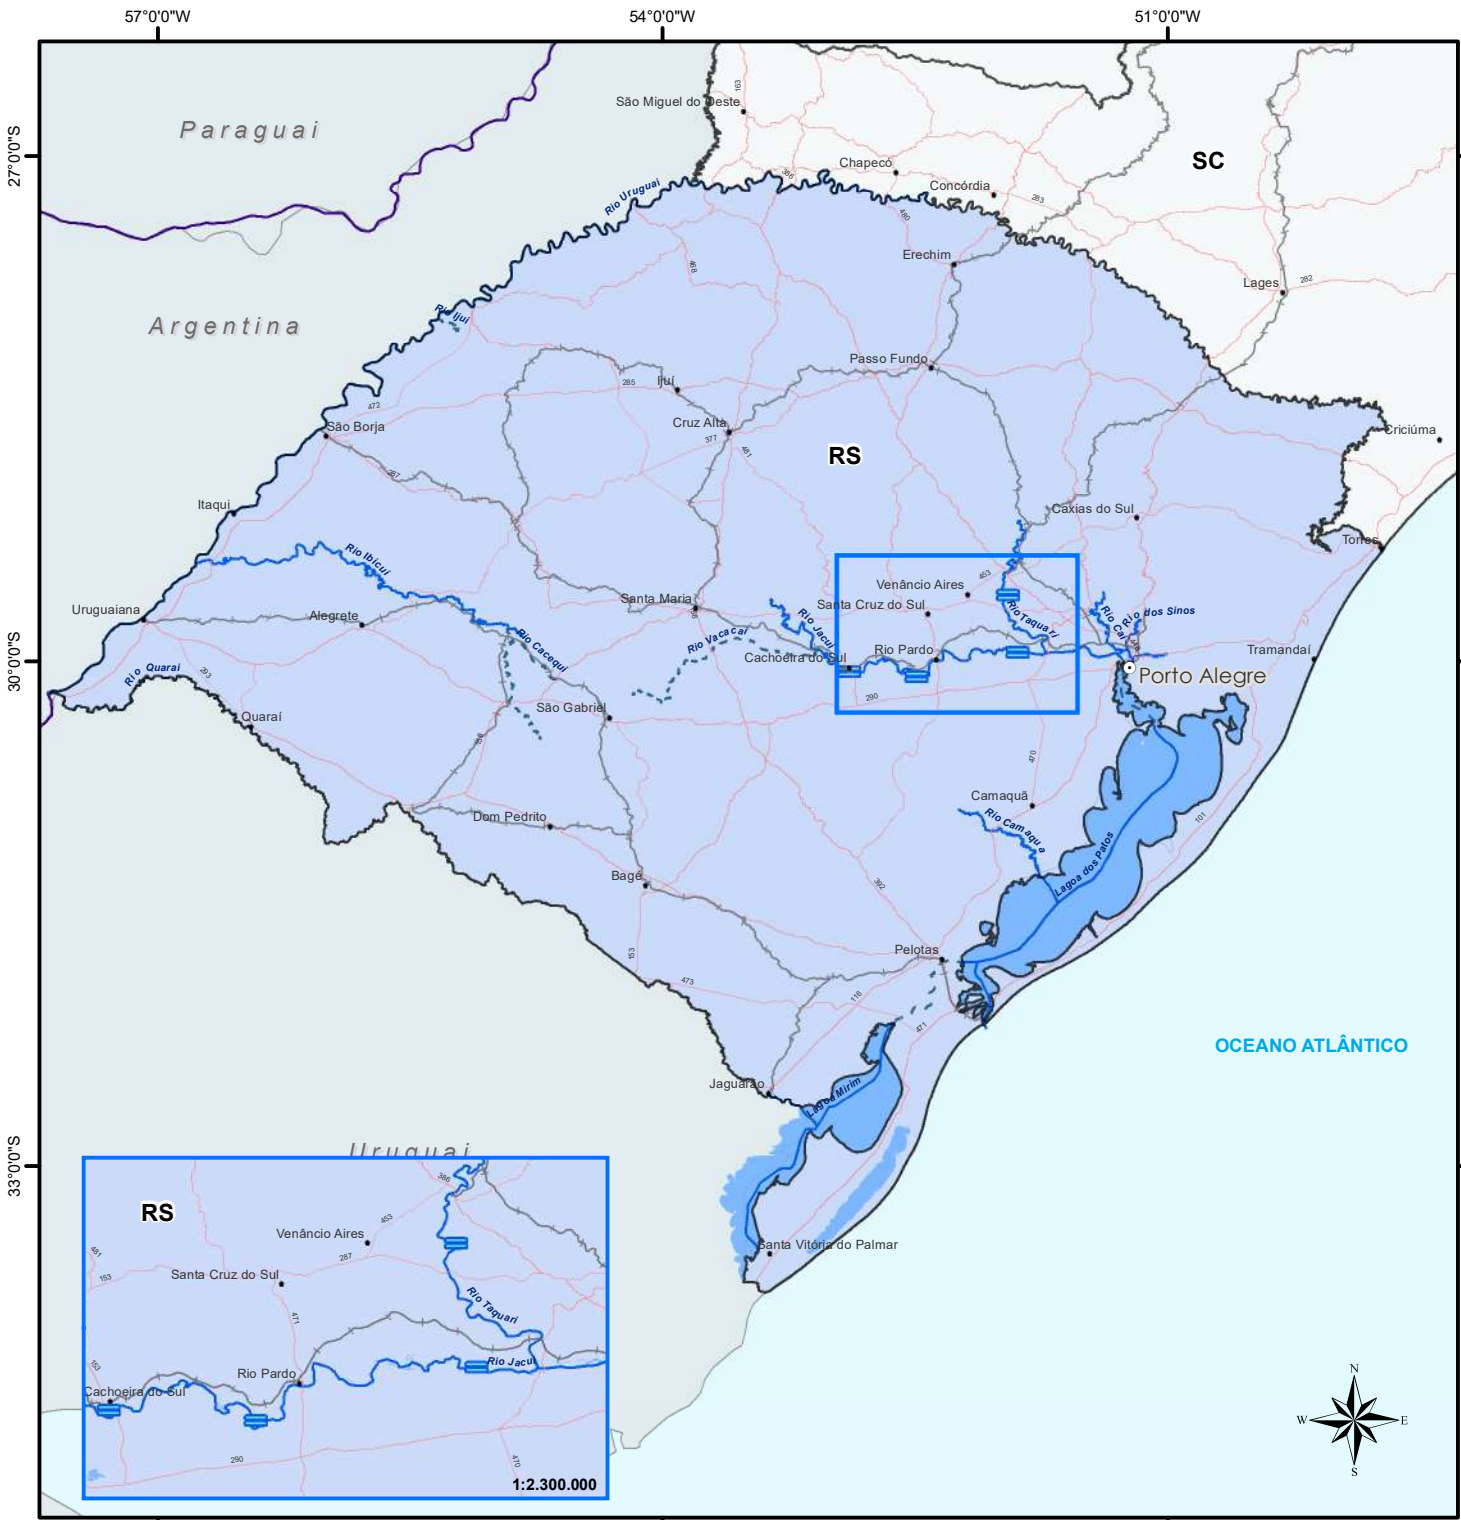

Superintendência Regional do Rio Grande do Sul
ESTUDOS E PROJETOS



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional


SNV

- Ferrovias
- Rodovias

Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV
- Principais Rios fora da Jurisdição Nacional

Eclusas	Quantidade	%
Projetos de Eclusas	04	100,0 %
Total	04	100,0 %



1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

RS – RIO GRANDE DO SUL

#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Projeto de Modernização Eclusa Fandango	RS	Rio Jacuí HN-706	00 00799/2019	Consórcio MAGNA-THEMAG	29/11/2019	10/12/2024	R\$	1.138.214	R\$	624.131	55%	ATIVO	-	-	-	-	-
2	Projeto de Modernização Eclusa Anel de Dom Marco	RS	Rio Jacuí HN-706	00 00798/2019	Consórcio MAGNA-THEMAG	20/06/2023	10/12/2024	R\$	930.478	R\$	521.346	56%	ATIVO	-	-	-	-	-
3	Plano de Segurança de Barragens (Anel de Dom Marco e Fandango)	RS	Rio Jacuí HN-706	10 00271/2023	LEV BRASIL - ESTUDOS E PROJETOS EM CIÊNCIAS DA TERRA E DO MAR LTDA	01/08/2023	31/03/2025	R\$	562.567	R\$	448.261	80%	ATIVO	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL								R\$	2.631.259	R\$	1.593.738	61%		TOTAL GERAL			R\$	-

Obs.: Projetos das Eclusas de Amarópolis e Bom Retiro do Sul - Convertidos em Anteprojetos (devido rescisão de contrato das Eclusas de Amarópolis e Bom Retiro do Sul, os produtos elaborados subsidiaram anteprojetos para publicação de RDCi para as reformas dessas Eclusas).




ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

SR SP



Eclusa de Jupiá/SP

DNIT

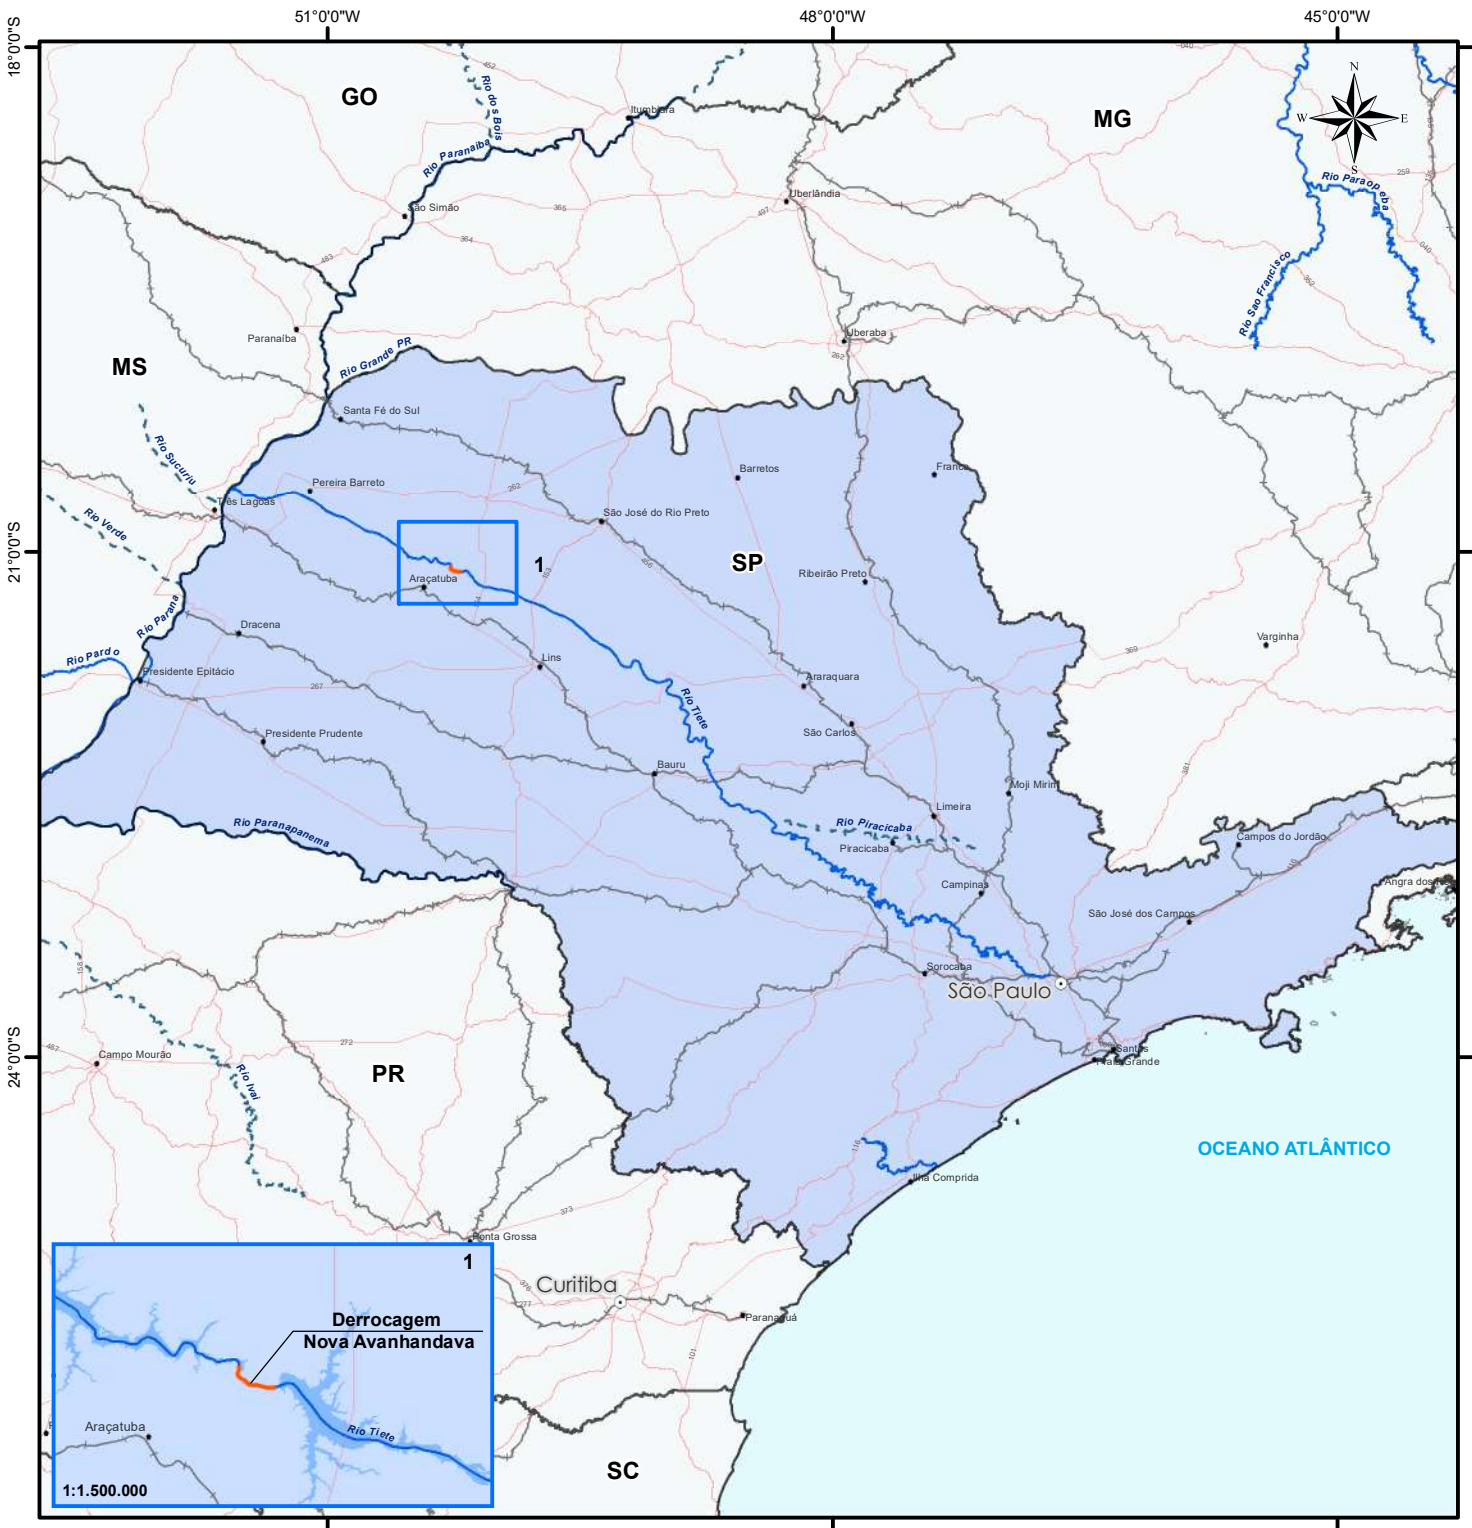

Superintendência Regional de São Paulo
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional
- SNV
 - Ferrovias
 - Rodovias
- Hidrovias do SNV
 - PNV
 - SNV

Obras Aquaviárias


- Derrocagem de Nova Avanhandava

100 50 0 100 km

1:5.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000



Instrumentos de construção e recuperação																		
	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
	Derrocagem de Nova Avanhandava	SP	Rio Tietê HN-913	TC 589/2014	DH - SP	25/03/2015	30/06/2026	R\$ 435.220.907	R\$ 59.253.793	14%	ATIVO	-	-	-	-	R\$ -	-	
TOTAL GERAL								R\$ 435.220.907	R\$ 59.253.793	14%		TOTAL GERAL			R\$ -	-		

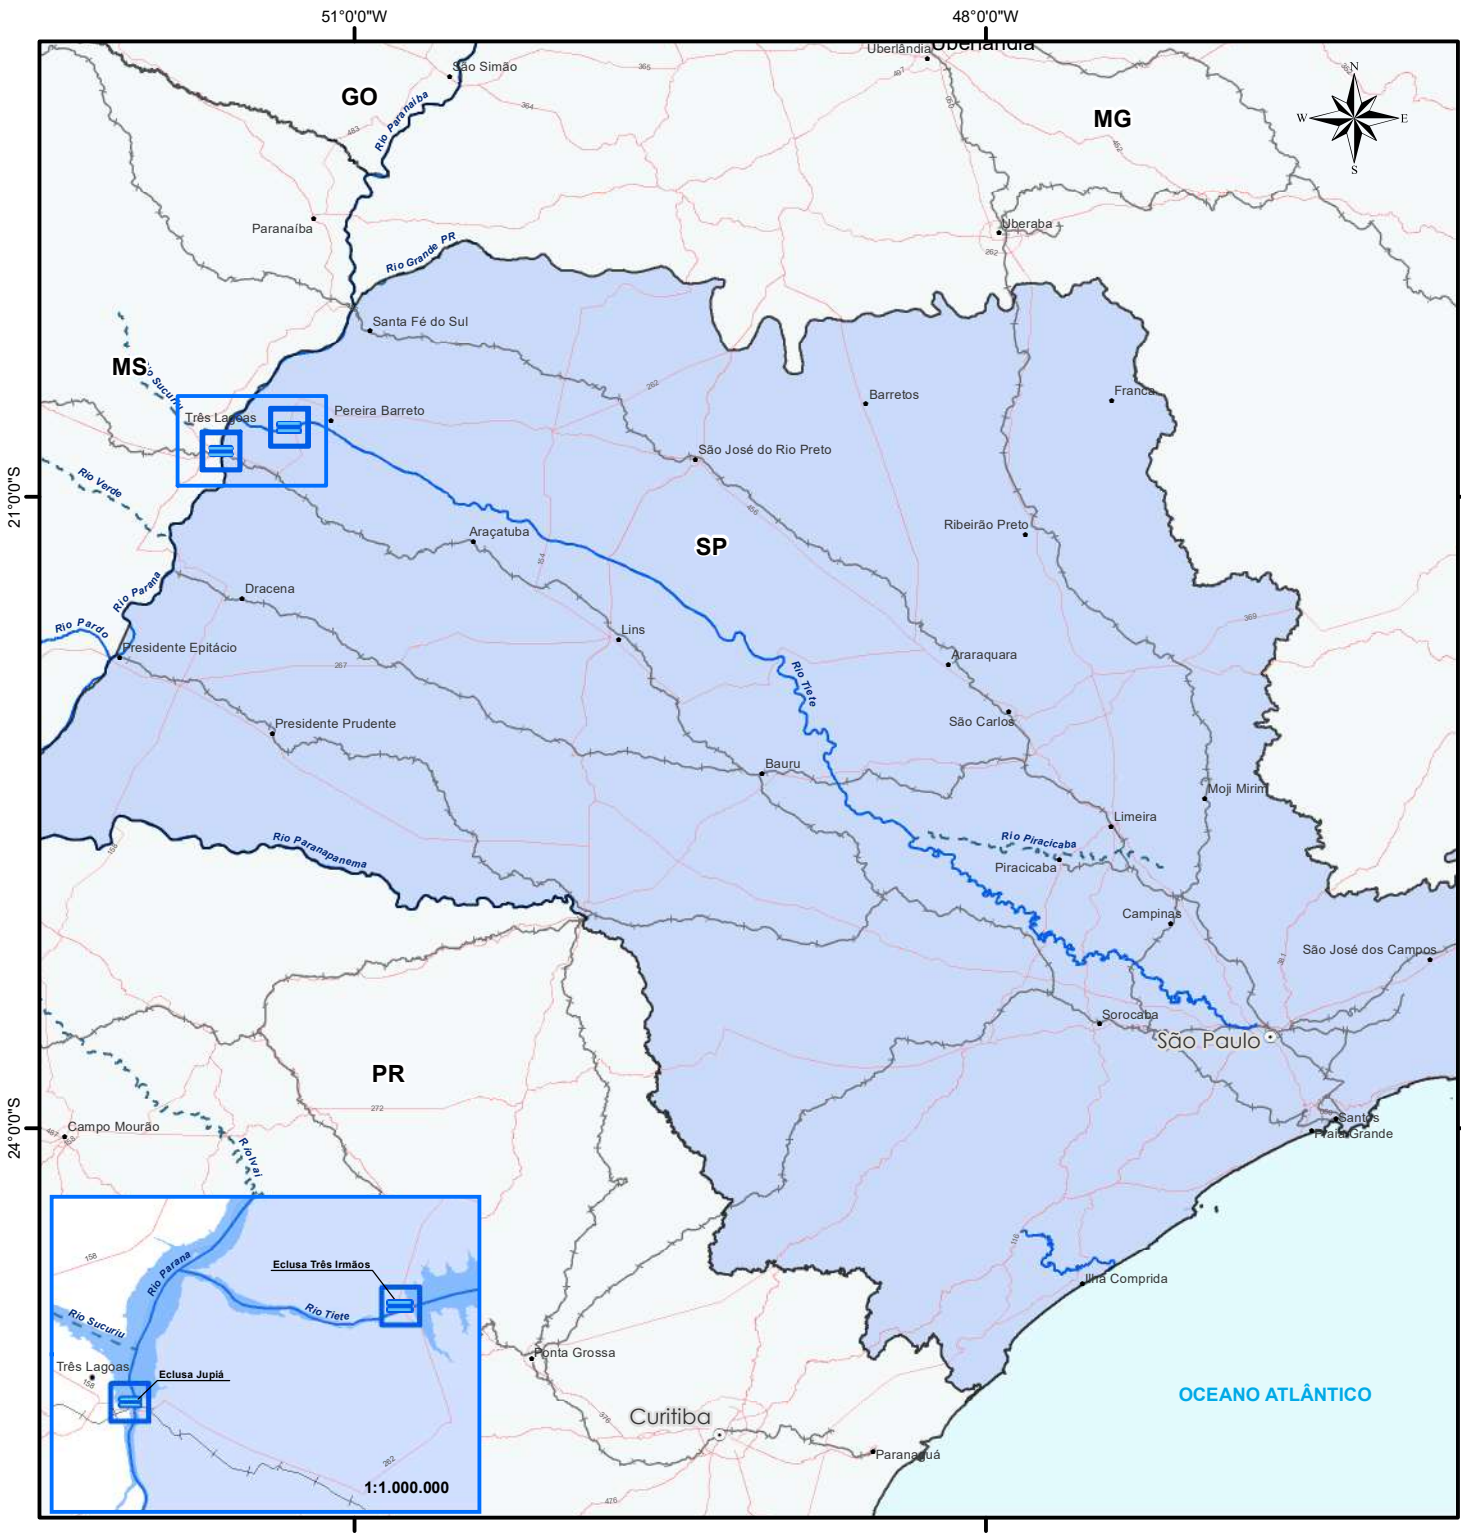

Superintendência Regional de São Paulo
OPERAÇÃO



Legenda

- Capitais
- SR - Superintendência Regional

SNV

- Ferrovias
- Rodovias


Hidrovias do SNV

- PNV
- SNV


Eclusas	Quantidade	%
Eclusas em operação	02	100,0%
Eclusas fora de operação	00	00,0%
Total	02	100,0%
Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	02	100,0%
Descoberto	00	00,0%
Total	02	100,0%



1:4.000.000
Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

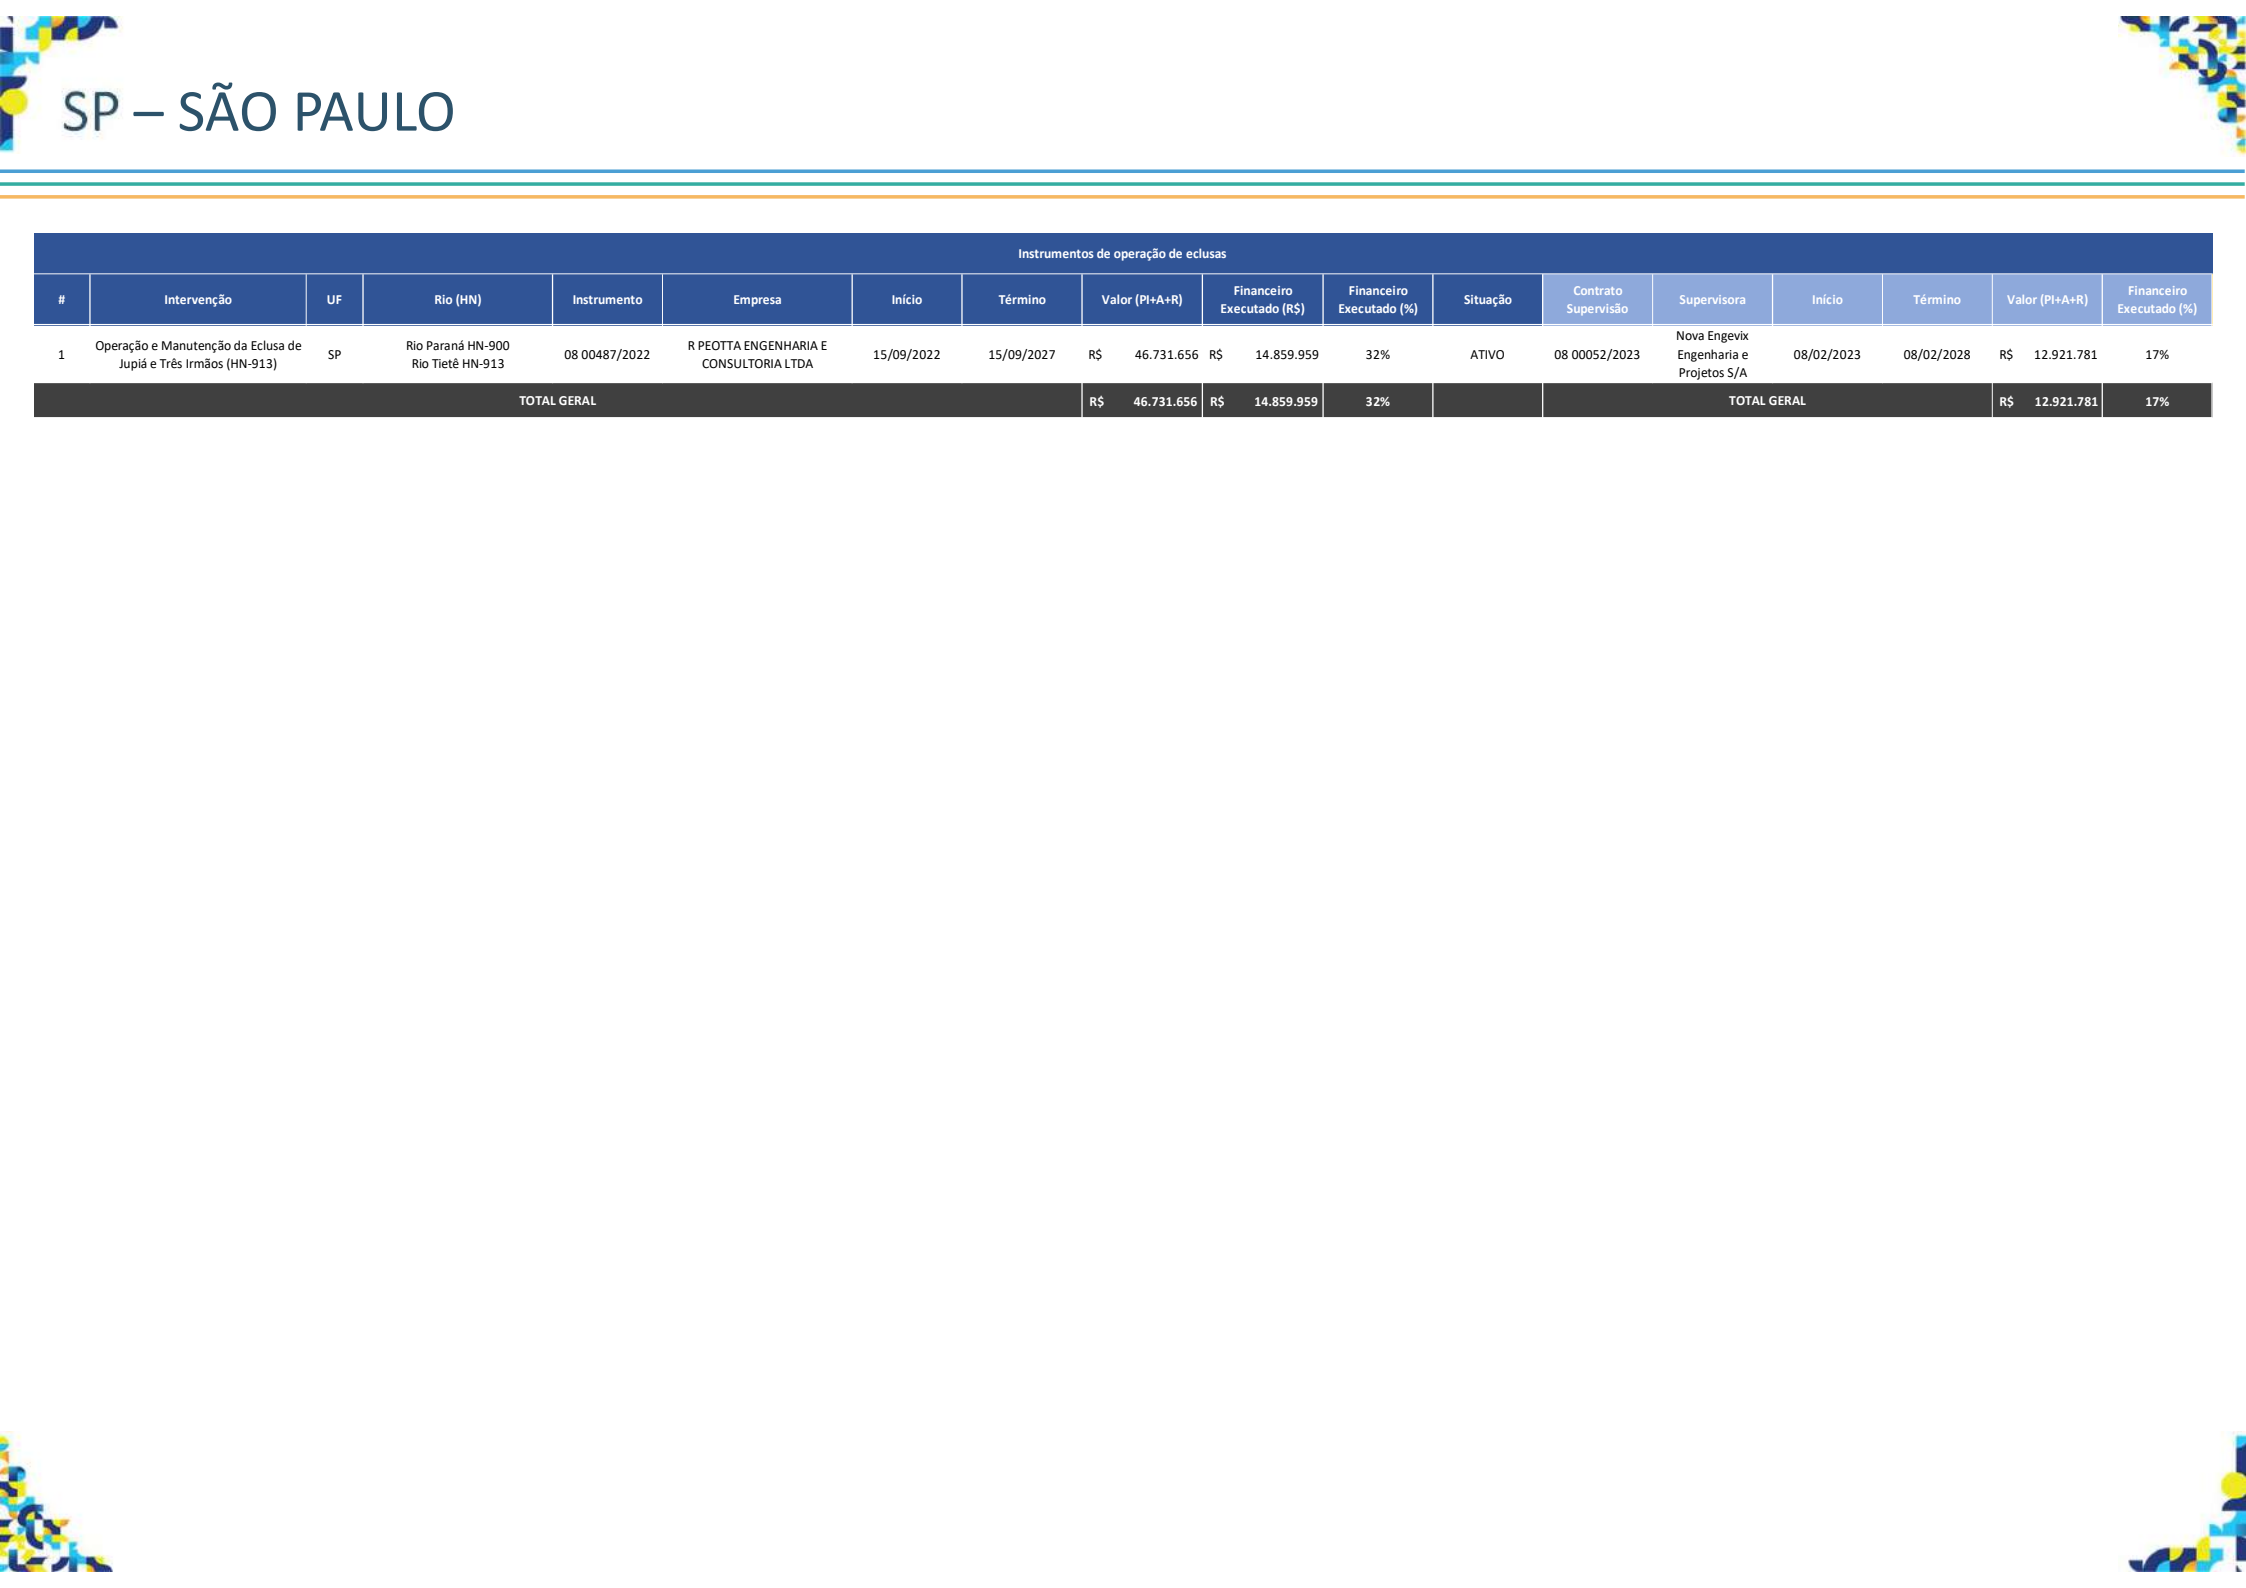

Instrumentos de operação de eclusas																	
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)
1	Operação e Manutenção da Eclusa de Jupia e Três Irmãos (HN-913)	SP	Rio Paraná HN-900 Rio Tietê HN-913	08 00487/2022	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15/09/2022	15/09/2027	R\$ 46.731.656	R\$ 14.859.959	32%	ATIVO	08 00052/2023	Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A	08/02/2023	08/02/2028	R\$ 12.921.781	17%
TOTAL GERAL								R\$ 46.731.656	R\$ 14.859.959	32%		TOTAL GERAL				R\$ 12.921.781	17%

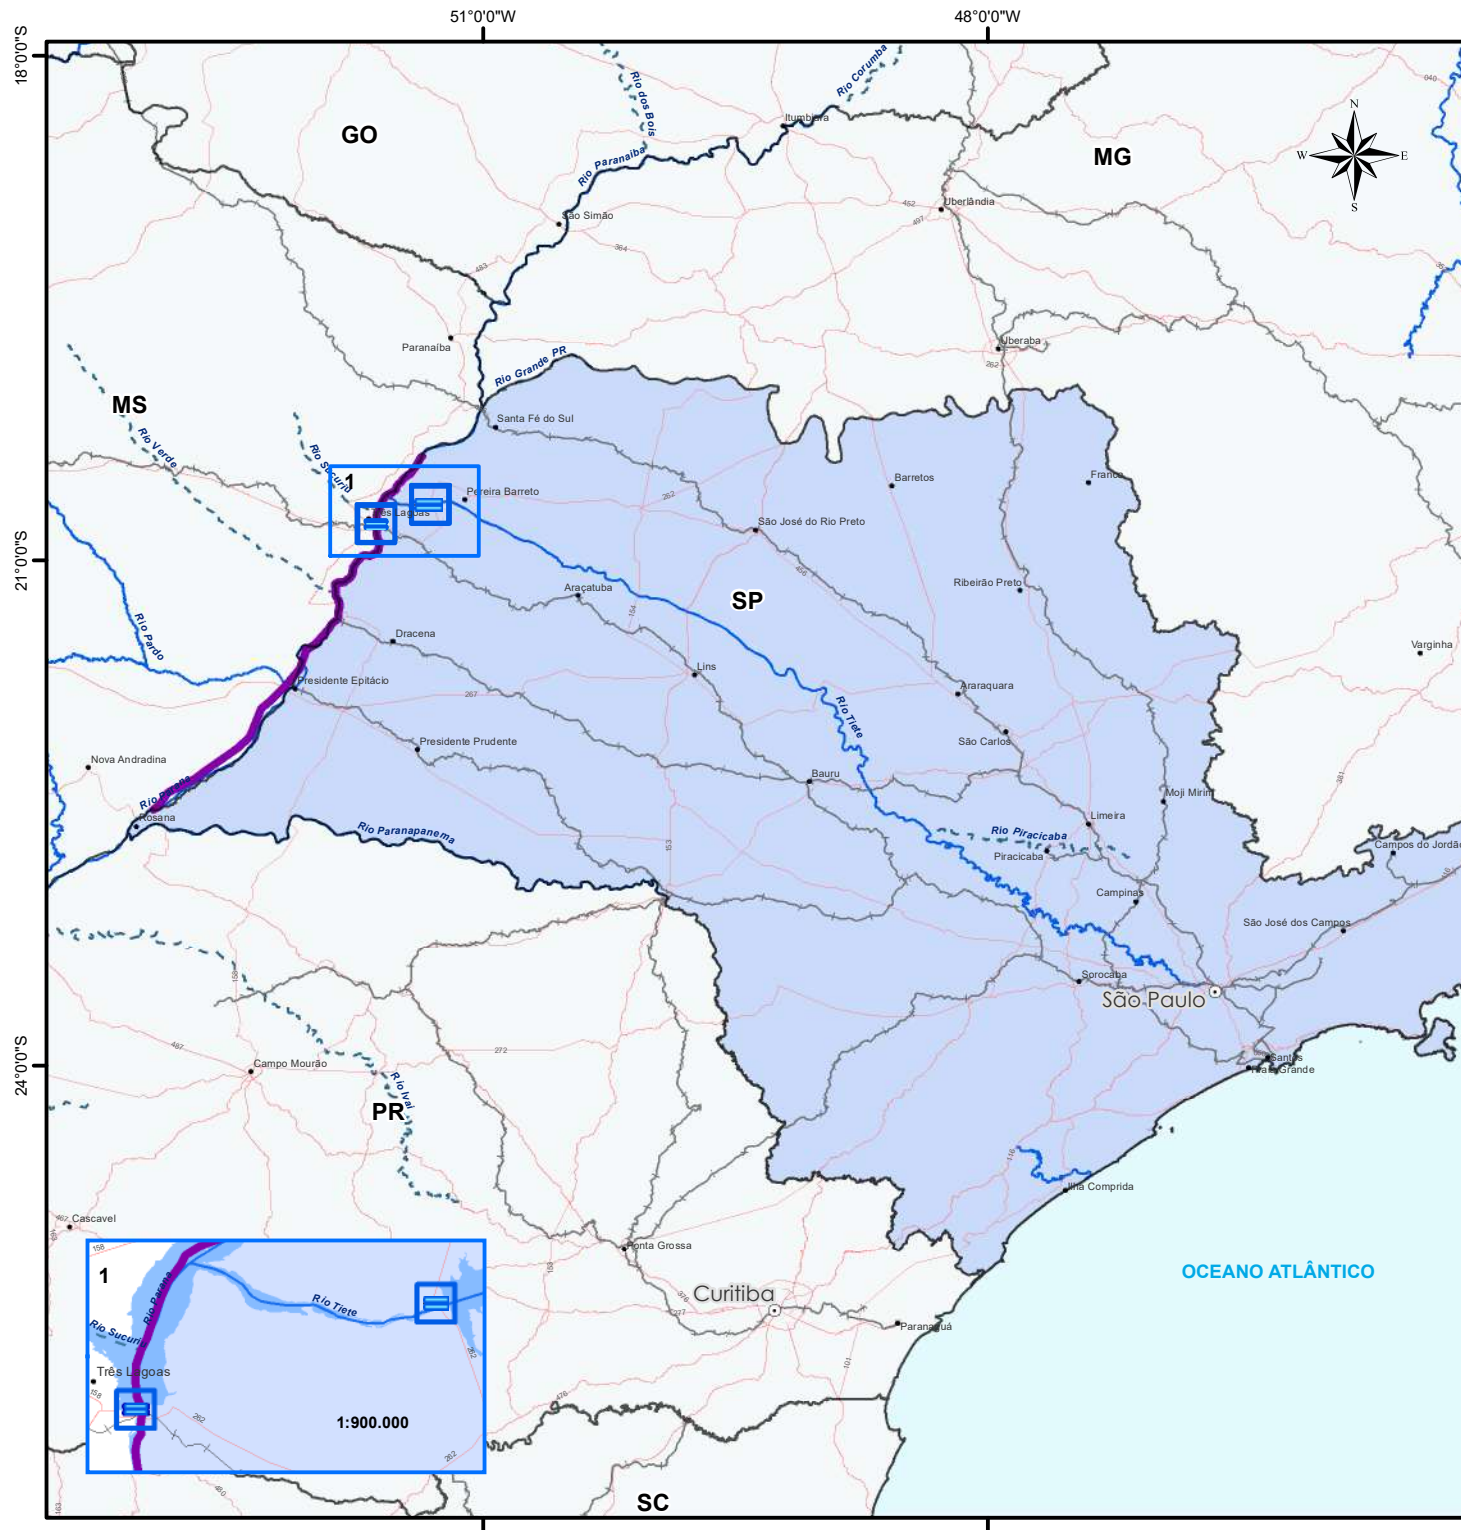

Superintendência Regional de São Paulo
MANUTENÇÃO



Legenda

Capitais

SR - Superintendência Regional

SNV

Ferrovias

Rodovias

Hidrovias do SNV

PNV

SNV

Manutenção e Balizamento - Hidrovia do Rio Paraná

Eclusas

Em operação

Fora de operação


Cobertura Contratual	Quantidade	%
Coberto	02	100,0%
Descoberto	02	00,0%
Total	02	100,0%

100 50 0 100 km

1:5.000.000

Sistema de Coordenadas Geográficas
Datum Sirgas 2000

Dados emitidos em outubro/2024.

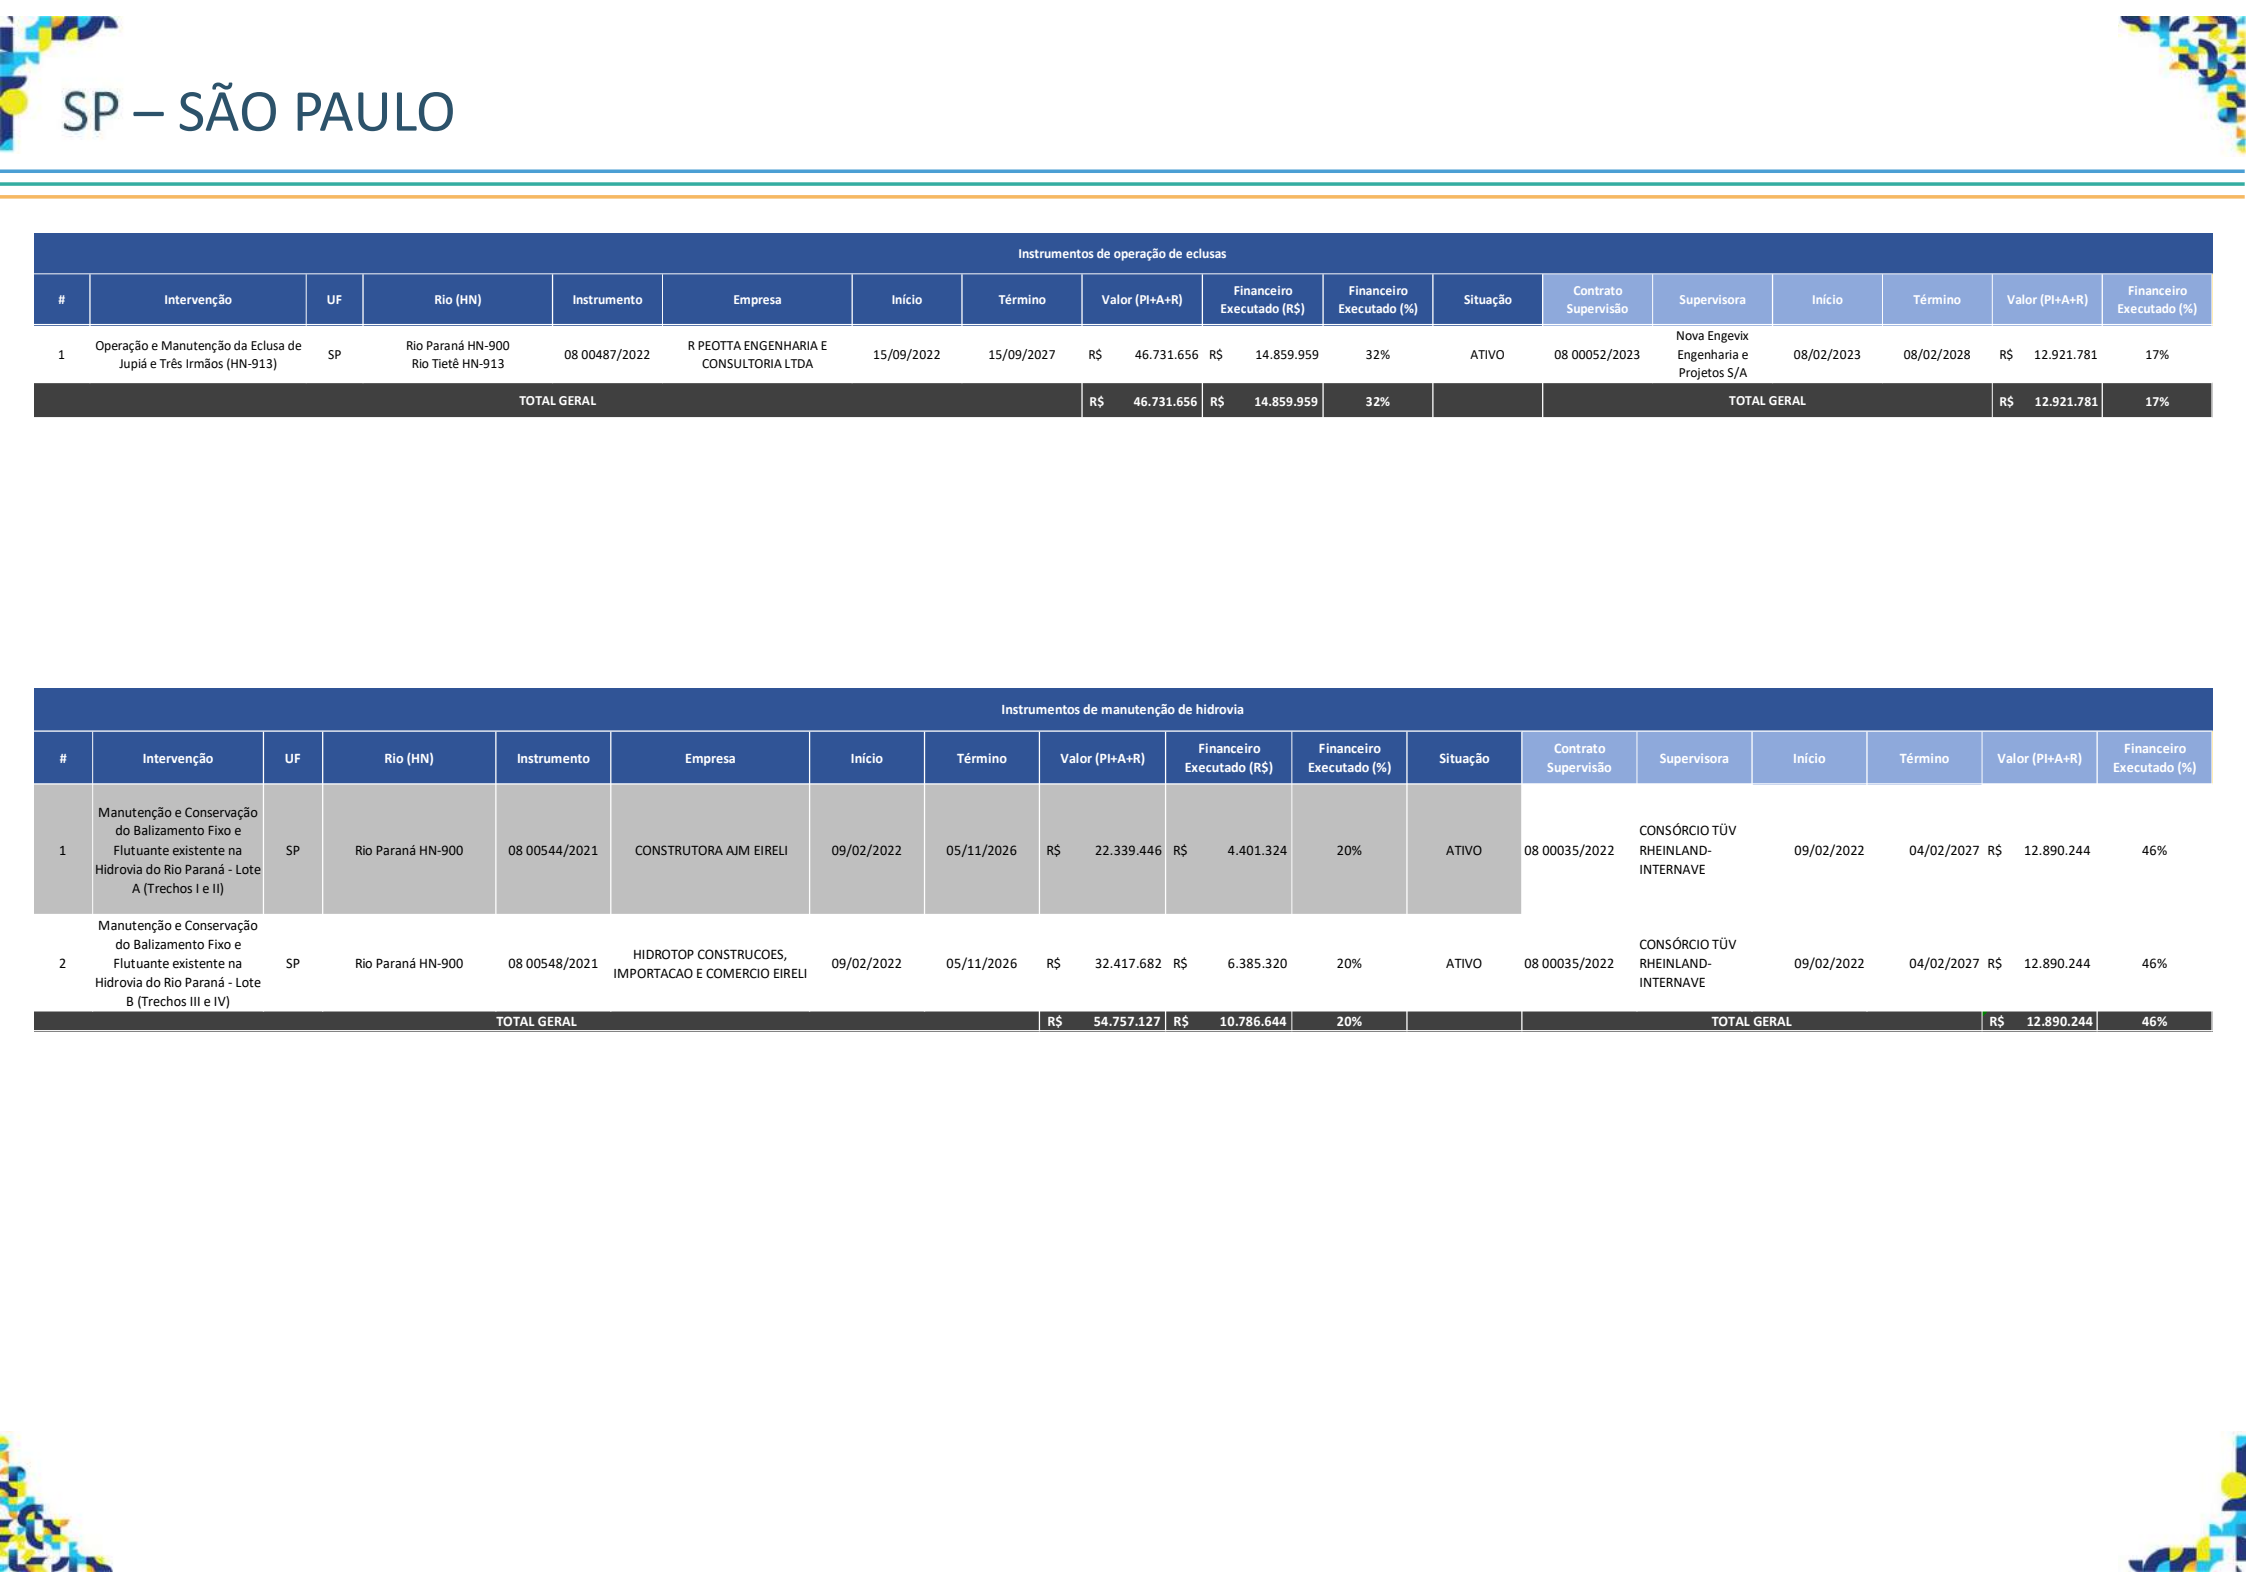

Instrumentos de operação de eclusas																		
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)	Financeiro Executado (%)	
1	Operação e Manutenção da Eclusa de Jupia e Três Irmãos (HN-913)	SP	Rio Paraná HN-900 Rio Tietê HN-913	08 00487/2022	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	15/09/2022	15/09/2027	R\$ 46.731.656	R\$ 14.859.959	32%	ATIVO	08 00052/2023	Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A	08/02/2023	08/02/2028	R\$ 12.921.781	17%	
TOTAL GERAL								R\$ 46.731.656	R\$ 14.859.959	32%		TOTAL GERAL				R\$ 12.921.781	17%	

Instrumentos de manutenção de hidrovia																				
#	Intervenção	UF	Rio (HN)	Instrumento	Empresa	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (R\$)	Financeiro Executado (%)	Situação	Contrato Supervisão	Supervisora	Início	Término	Valor (PI+A+R)		Financeiro Executado (%)	
1	Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovia do Rio Paraná - Lote A (Trechos I e II)	SP	Rio Paraná HN-900	08 00544/2021	CONSTRUTORA AJM EIRELI	09/02/2022	05/11/2026	R\$	22.339.446	R\$	4.401.324	20%	ATIVO	08 00035/2022	CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND-INTERNAVE	09/02/2022	04/02/2027	R\$	12.890.244	46%
2	Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovia do Rio Paraná - Lote B (Trechos III e IV)	SP	Rio Paraná HN-900	08 00548/2021	HIDROTOP CONSTRUCOES, IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	09/02/2022	05/11/2026	R\$	32.417.682	R\$	6.385.320	20%	ATIVO	08 00035/2022	CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND-INTERNAVE	09/02/2022	04/02/2027	R\$	12.890.244	46%
TOTAL GERAL								R\$	54.757.127	R\$	10.786.644	20%		TOTAL GERAL			R\$	12.890.244	46%	



ATLAS
DNIT
Infraestrutura Aquaviária

INDICADORES




DNIT

INDICADORES ESTRATÉGICOS


1 – Índice de intervenções de obras de Instalações Portuárias concluídas – 2024 (acumulado)

4
Meta




3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas - 2024 (acumulado)

1
Meta




5 – Disponibilidade de Eclusas

Meta
100%




2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas - 2024 (acumulado)

9
Meta



4 – Disponibilidade de Instalações Portuárias

Meta
85%




Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos														Indicadores Operacionais									
Indica1doSR/ Mês	1.1 Índice de obras de instalações Portuárias concluída com termo de recebimento provisório		2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		4.2 % de Instalações Portuárias com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de Instalações Portuárias (Dias)		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório		4.2.1 Movimentação de passageiros nas Instalações Portuárias		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 N° de Eclusagens		
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	
jan/24	0	4	7	9	0	0	100%	100%	88%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	167051,00 t	-	457	-	
fev/24	0	4	8	9	0	0	100%	100%	86%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	97267,00 t	-	374	-	
mar/24	0	4	8	9	0	0	100%	100%	86%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	507126,53 t	-	765	-	
abr/24	3	4	8	9	1	1	100%	100%	86%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	270230,04 t	-	373	-	
mai/24	4	4	8	9	1	1	100%	100%	86%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	156821,62 t	-	57	-	
jun/24	4	4	8	9	1	1	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	165157,48 t	-	65	-	
jul/24	4	4	8	9	1	1	100%	100%	88%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	194501,94 t	-	55	-	
ago/24	4	4	8	9	1	1	100%	100%	86%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	435700,91 t	-	574	-	
set/24	4	4	8	9	1	1	100%	100%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	0	0	-	-	282091,33 t	-	340	-	
out/24																							
nov/24																							
dez/24																							
																		-	-	2275947,85 t	-	3061	-

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas - 2024 (acumulado)



Jan Fev Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro




INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	1.1 Índice de obras de Instalações Portuárias concluída com termo de recebimento provisório		4.1 Índice de obras de recuperação de Instalações Portuárias concluídas		4.2 % de Instalações Portuárias com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de Instalações Portuárias (Dias)		4.1.1 Índice de Obras de recuperação concluídas com termo de recebimento provisório		4.2.1 Movimentação de passageiros nas Instalações Portuárias	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/24	0	0	0	0	100%	100%	86%	85%	0	0	-	-
fev/24	0	0	0	0	100%	100%	82%	85%	0	0	-	-
mar/24	0	0	0	0	100%	100%	82%	85%	0	0	-	-
abr/24	0	0	0	0	100%	100%	82%	85%	0	0	-	-
mai/24	0	0	0	0	100%	100%	85%	85%	0	0	-	-
jun/24	0	0	0	0	100%	100%	84%	85%	0	0	-	-
jul/24	0	0	0	0	100%	100%	84%	85%	0	0	-	-
ago/24	0	0	0	0	100%	100%	89%	85%	0	0	-	-
set/24	0	0	0	0	100%	100%	80%	85%	0	0	-	-
out/24												
nov/24												
dez/24												
Total Acumulado - 2024											-	-


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA BAHIA (SR-BA)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas – 2024 (acumulado)



5 – Disponibilidade de Eclusas




INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos							Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
fev/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
mar/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
abr/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
mai/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
jun/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
jul/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
ago/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
set/24	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
out/24										
nov/24										
dez/24										
Total Acumulado - 2024							0 t	-	0	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃO (SR-MA)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas - 2024 (acumulado)




Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/24	2	2
fev/24	2	2
mar/24	2	2
abr/24	2	2
mai/24	2	2
jun/24	2	2
jul/24	2	2
ago/24	2	2
set/24	2	2
out/24		
nov/24		
dez/24		

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2. Índice de intervenções de obras hidroviárias concluídas – 2024 (acumulado)








Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/24	1	2
fev/24	2	2
mar/24	2	2
abr/24	2	2
mai/24	2	2
jun/24	2	2
jul/24	2	2
ago/24	2	2
set/24	2	2
out/24		
nov/24		
dez/24		

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARÁ (SR-PA)

INDICADORES ESTRATÉGICOS



*Santarém está fora de operação

Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos															Indicadores Operacionais					
Indicador / Mês	1.1 Índice de obras de Instalações Portuárias concluída com termo de recebimento provisório		2.1 Índice de obras em hidroviária concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		4.2 % de Instalações Portuárias com contrato de operação e manutenção		4.3 Disponibilidade de Instalações Portuárias (Dias)		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		4.2.1 Movimentação de passageiros nas Instalações Portuárias		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/24	1	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
fev/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
mar/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
abr/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
mai/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
jun/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
jul/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
ago/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
set/24	2	2	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	0 t	-	0	-
out/24																				
nov/24																				
dez/24																				
Total Acumulado - 2024															-	-	0 t	-	0	-

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RONDÔNIA (SR-RO)


INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas – 2024 (acumulado)

Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de implantação/ampliação hidroviárias para a SR em 2024.



3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas - 2024 (acumulado)



Legenda: Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos		
Indicador / Mês	3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório	
	Realizado	Meta
jan/24	0	1
fev/24	0	1
mar/24	0	1
abr/24	1	1
mai/24	1	1
jun/24	1	1
jul/24	1	1
ago/24	1	1
set/24	1	1
out/24		
nov/24		
dez/24		

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL (SR-RS)

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas - 2024 (acumulado)




3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas – 2024 (acumulado)

Até o momento, não há previsão de conclusão de obras de portos organizados para a SR em 2024.



5 – Disponibilidade de Eclusas



Legenda: Realizado


INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos							Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/24	2	2	100%	100%	100%	100%	167051,00 t	-	457	-
fev/24	2	2	100%	100%	100%	100%	97267,00 t	-	374	-
mar/24	2	2	100%	100%	100%	100%	145433,00 t	-	456	-
abr/24	2	2	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
mai/24	2	2	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
jun/24	2	2	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
jul/24	2	2	100%	100%	100%	100%	37891,00 t	-	23	-
ago/24	2	2	100%	100%	100%	100%	151018,00 t	-	459	-
set/24	2	2	100%	100%	100%	100%	96023,00 t	-	271	-
out/24										
nov/24										
dez/24										
Total Acumulado - 2024							815981,00 t	-	2352	-


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO (SR-SP)

INDICADORES ESTRATÉGICOS


2 – Índice intervenções de obras hidroviárias concluídas – 2024 (acumulado)



3 – Índice de intervenções de obras de portos organizados concluídas – 2024 (acumulado)



5 – Disponibilidade de Eclusas



Legenda: Realizado

INDICADORES TÁTICOS E OPERACIONAIS

Indicadores Táticos									Indicadores Operacionais			
Indicador / Mês	2.1 Índice de obras em hidrovias concluída com termo de recebimento provisório		3.1 Índice de obras de portos organizados concluídas com termo de recebimento provisório		5.1 % de eclusas com contrato de operação e manutenção		5.2 Disponibilidade de Eclusas (Dias)		5.1.1 Movimentação de cargas nas eclusas		5.1.2 Nº de Eclusagens	
	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
jan/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
fev/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	0 t	-	0	-
mar/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	180644,25 t	-	73	-
abr/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	148932,04 t	-	62	-
mai/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	156821,62 t	-	57	-
jun/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	165157,48 t	-	65	-
jul/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	156610,94 t	-	32	-
ago/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	284682,91 t	-	116	-
set/24	2	2	0	0	100%	100%	100%	100%	186068,33 t	-	67	-
out/24												
nov/24												
dez/24												
Total Acumulado - 2024									1278917,57 t	-	472	-

Glossário

Ancoradouro: É o local onde a embarcação ancora, lança a âncora ao largo. Também é chamado de fundeadouro.

Atracadouro: É uma estrutura de apoio náutico avançada em direção à água, suspensa, apoiada em pilares ou flutuante, utilizada como apoio à atracação, embarque, desembarque e trânsito de pessoas e embarcações, para atividades de turismo, lazer e pesca ou para o apoio de um emissário submarino ou subfluvial.

Barragem: É uma barreira artificial feita em cursos hídricos para retenção de grandes quantidades de água. Sua utilização visa sobretudo abastecer zonas residenciais, agrícolas, industriais, produzir energia elétrica ou regularizar um caudal a fim de permitir a navegação. É o mesmo que açude ou represa.

Canal de Acesso: É o canal que liga o alto-mar com as instalações portuárias, podendo ser natural ou artificial e dotado de profundidade adequada além da devida sinalização, com o objetivo de dar acesso das embarcações ao porto.

Confluência: Local de junção entre trechos de drenagem.

Demolição: Ato de se destruir alguma construção seguindo normas técnicas e de segurança a fim de dar outro destino ao espaço antes ocupado por ela.

Derrocagem: Consiste em um processo de retirada ou destruição de pedras ou rochas submersas, que impedem a plena navegação. A sua execução visa promover a readequação do canal com finalidade de economicidade.

Diretoria de Infraestrutura Rodoviária – DIR: Responsável pela manutenção, recuperação e construção de vias de transporte interurbanas federais.

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP: Responsável pelo gerenciamento dos investimentos plurianuais, por prover estatísticas do setor de infraestrutura e subsidiar com o informações o ministério de infraestrutura.

Diretoria Administração e Finanças – DAF: Responsável pela administração das atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento, orçamento, finanças, contabilidade, TI, RH e aos recursos logísticos.

Diretoria de Infraestrutura Ferroviária – DIF: Responsável pela realização de obras na malha ferroviária e gestão do patrimônio ferroviário.

Dolphins: Colunas de concreto posicionadas no rio para proteção de pilar, além de servir de referência para o operador da eclusa e, em alguns casos, de atracadouros de embarcações.

Glossário

Dragagem: Serviço de desassoreamento, alargamento, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagoas, mares, baías e canais de acesso a portos. O principal objetivo é realizar a manutenção ou aumentar a profundidade.

Dragagem de Manutenção: Obra/serviço de engenharia destinado a limpeza, desobstrução e remoção de material do fundo de corpos d'água, com o objetivo de garantir a segurança da navegação.

Eclusa: É uma obra de engenharia que permite que embarcações superem desníveis em cursos de água. São normalmente construídas em barragens, quedas de águas, corredeiras ou hidrelétricas.

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA: Para o DNIT, compreendem o conjunto de estudos necessários à verificação da existência de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a execução de uma determinada obra de infraestrutura de transportes, ou conjunto delas, nos segmentos considerados, dentre as alternativas propostas, consubstanciado, principalmente nos estudos de tráfego, capacidade da hidrovia e seu nível de serviço, aliados às pesquisas complementares e outras similares, bem como aos demais trabalhos e estudos de engenharia, socioeconômicos e ambientais necessários.

Fiscalização: Atividade de competência do DNIT, visando a assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de leis, instrumentos de outorga, regulamentos e demais normas pertinentes, a ser realizada por servidor ou de entidade ou órgão conveniado, habilitado para o exercício da fiscalização.

Hidrovia: São os trechos de rios navegáveis com canal delimitado, sinalizado e com gabarito hidroviário mantido, onde ocorrem o transporte aquático ou aquaviário realizado por embarcações (barcos, navios, barcas) que, por sua vez, podem ser: Marítimas (mares), Fluviais (rios) e Lacustres (lagos).

Implantação de Hidrovia: Obras ou serviços de engenharia a serem executadas com o objetivo de tornar o corpo hídrico uma hidrovia.

Infraestrutura Aquaviária: Conjunto de áreas e recursos destinados a possibilitar a operação segura de embarcações, compreendendo o canal de acesso, estruturas de atracação, bacia de evolução e respectivo balizamento e sinalização náutica.

Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4: Instalação portuária localizada fora da poligonal do Porto Organizado, utilizada no embarque e desembarque de passageiros e cargas, que operam exclusivamente com embarcações de navegação interior.

Glossário

Obra: Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

Ponte de Acesso: É uma estrutura que conecta a infraestrutura portuária ao continente.

Sistema Hidroviário Nacional: É a relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano Nacional de Viação.

Sistema Nacional de Viação: É constituído pela infraestrutura viária e pela estrutura operacional dos diferentes meios de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Superintendência Regional – SR: São órgãos descentralizados, aos quais compete programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execução de planos e programas visando ao diagnóstico, ao prognóstico e às ações nas áreas de engenharia e operações, rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias, objetivando garantir a fluidez do tráfego e a navegabilidade dos rios, em condições operacionais e econômicas ideais, com segurança e zelo pela preservação do meio ambiente.



ANEXOS

Divisão de Trechos e Subtrechos dos Corpos Hídricos priorizados

Está disponibilizado no endereço “https://linktr.ee/daq_dnit”, podendo também ser acessado pelo QR code abaixo, o trabalho desenvolvido pela setorial COIAQ, presente na Nota Técnica nº 139/2021, que detalha a divisão dos trechos e subtrechos dos corpos hídricos priorizados, aprimorando a precisão das suas extensões, bem como otimizando o mapeamento geográfico.

DIVISÃO DE TRECHOS E SUBTRECHOS DOS CORPOS HIDRÍCOS PRIORIZADOS				
Nome	Código	Nº Trecho	Ext. (km)	Descrição do Trecho
Lagoa dos Patos	HN-700	33	82,40	Do município de Tapes (RS), até a confluência com o lago Guaíba.
Lagoa dos Patos	HN-700	22	10,90	Do município de São Lourenço do Sul (RS), até a confluência com o rio Camaquã/RS.
Rio Tietê	HN-913	190	60,90	Do município de Mogi das Cruzes, até a confluência com o Rio Baquirivu Guacu.
Lagoa dos Patos	HN-700	32	29,20	Do município de Arambare (RS), até o município de Tapes (RS).
Rio São Francisco	HN-500	150	22,70	Do limite estadual entre Bahia e Sergipe, na jusante da represa Xingo, até a confluência com o rio Sal/BA.
Rio Parnaíba	HN-400	95	48,70	Do final do Trecho 9.4, até a confluência com o rio Riozinho/PI.
Rio Parnaíba	HN-400	94	50,10	Do final do Trecho 9.3, até o 50 km a montante.
Rio Solimões	HN-132	94	25,90	Do final do trecho 9.3, até a cidade de Jutai/IP4/AM, próximo a confluência com o rio Jutai/AM.
Rio Tapajós	HN-106	93	46,50	Do final do trecho 9.2, até a confluência com os rios Teles Pires e Juruena.
Rio Solimões	HN-132	93	50,20	Do final do trecho 9.2, até 50km a montante.
Rio Tapajós	HN-106	92	50,00	Do final do trecho 9.1, próximo ao igarapé Traíra, até 50km a montante.
Rio Parnaíba	HN-400	92	44,30	Do final do Trecho 9.1, até a cidade de Ribeiro Gonçalves/PI/Ponte.
Rio Solimões	HN-132	83	40,60	Do final do trecho 8.2, até a confluência com o rio Juruá/AM.
Rio Solimões	HN-132	82	50,20	Do final do trecho 8.1, até 50km a montante.
Rio Parnaíba	HN-400	73	10,70	Do final do Trecho 7.2, até a cidade de Notorque/MA.
Rio Madeira	HN-117	72	28,30	Do final do trecho 7.1 próximo a confluência com o igarapé Boca do
Total			33.447,70	

Data de Atualização: 30/06/2022 | Frequência de Atualização: Pontual

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Powered by



Acesso ao painel com a divisão de trechos e subtrechos dos corpos hídricos priorizados



ESCANEE-ME
