


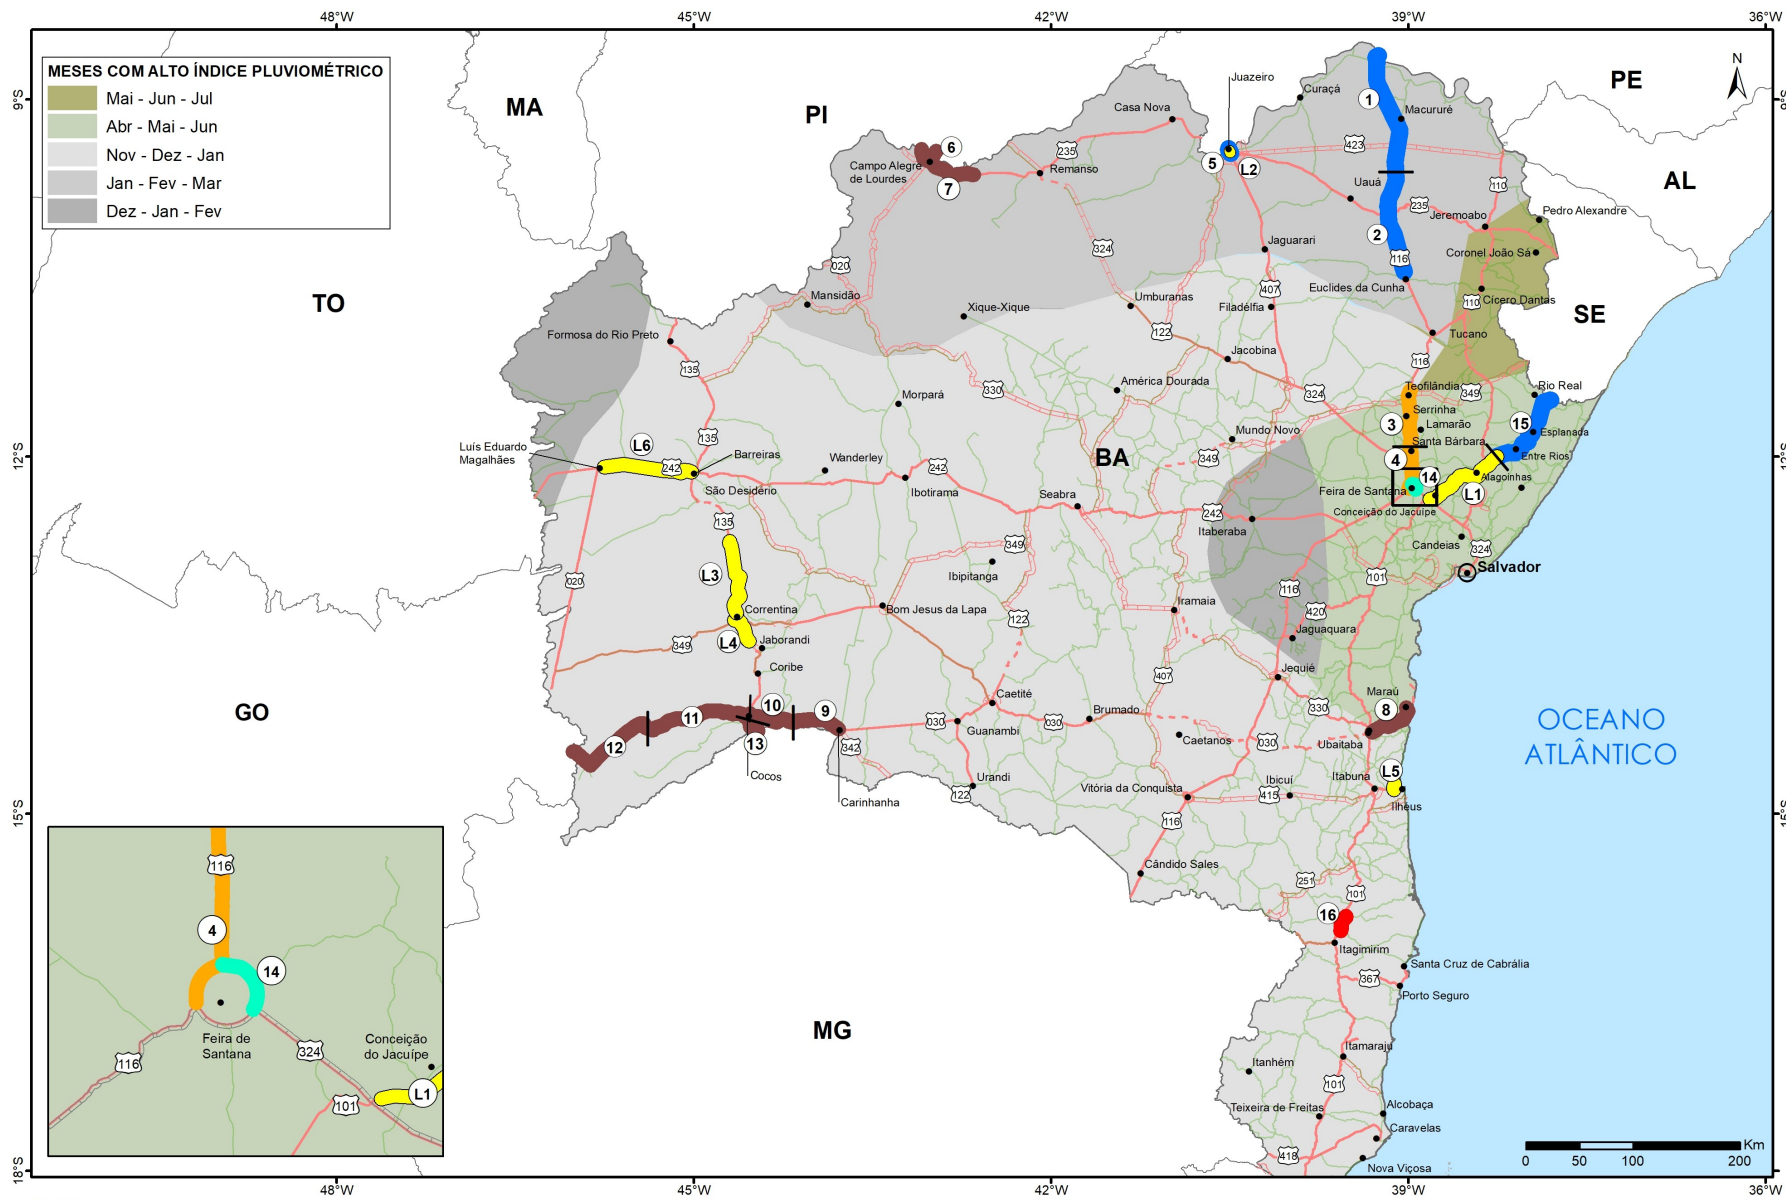

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
BAHIA

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH.	7,20 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	93,52 Km
IMPLANTAÇÃO	429,30 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	217,13 Km
A LICITAR	
Total	747,15 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta											SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)											SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+H)	EXEC.	FINANC.							05/0028/2015	CONSORCIO HOLLUSIA/STP
1	124128	13X7	3	1	05/00875/2014	CONSORCIO OCL / LCM / PRODEC	BR-116	0,00	113,36	113,36	21/10/2014	31/01/2027	R\$ 357.377.604,95	89,37%		Executando terraplenagem, drenagem, sinalização e restauração. SR solicitou prioridade às interseções de Abaré, Chorrochó, Macururé e Carabas.	05/0028/2015	CONSORCIO HOLLUSIA/STP					
2	124127	13X7	3	2	05/00858/2014	CONSORCIO LCM-CL-JDS	BR-116	113,36	211,83	98,47	10/08/2014	28/01/2027	R\$ 288.537.295,63	45,47%		Obra paralisada. Há restrição orçamentária.	05/0028/2015	CONSORCIO HOLLUSIA/STP					
3	1992	13X7	3	5	00/00376/2024	CONSORCIO SVO / TOP / NAVISERVICE / BASITEC	BR-116	334,23	387,41	53,18	21/10/2024	29/09/2028	R\$ 618.808.097,80	15,31%		Terraplenagem no sag parcialmente executado pelo contrato anterior, drenagem, regularização de subleito, sub-base, base, componente ambiental e obras complementares em execução.	05/0011/2016	ENECON S.A.					
4	1993	13X7	3	6	05/00876/2014	CONSORCIO ALMORA BARRETO/IMP/BA SITEC	BR-116	387,41	427,75	40,34	11/01/2014	25/04/2025	R\$ 467.168.005,85	99,92%		Obra concluída. Aguarda-se assinatura do termo de recebimento definitivo.	05/0011/2016	ENECON S.A.					
5	1991	14L/V	3	Unico	05/00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-407	0,00	5,30	5,3	15/05/2023	30/10/2026	R\$ 231.894.203,03	75,53%		Executando a OAE 1, obras complementares, sinalização, base, sub-base e drenagem. Prorrogação da execução e vigência solicitada e em análise.	05/0023/2023	CONSORCIO JBR / ASTEP					
5	1991	14L/V	3	Unico	05/00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-235	318,40	322,40	52,9	17/03/2023	30/10/2026	R\$ 231.894.203,03	75,53%		Executando a OAE 1, obras complementares, sinalização, base, sub-base e drenagem. Prorrogação da execução e vigência solicitada e em análise.	05/0023/2023	CONSORCIO JBR / ASTEP					
6	3893	7V/18	3	Unico	05/00105/2024	COISAMA PROJETOS E CONSTRUCOES	BR-020	775,50	787,50	11,8	20/02/2024	10/10/2028	R\$ 32.523.763,48	83,33%		Execução de iluminação, proteção ambiental, obras complementares, sinalização e drenagem superficial. 1º RPO aprovada, aguardando termo aditivo.	05/0004/2022	CONSORCIO GEOSISTEMAS-SETEC					
7	2003	7F51	2-3	2	05/00140/2017	CONSORCIO BR-235 (S.A. PAULISTA / ASTEC)	BR-235	601,30	683,60	62,3	13/04/2017	25/03/2027	R\$ 178.255.592,56	65,43%		Contrato paralisado desde jun/24 devido à conclusão das desapropriações nos contornos de Campo Alegre de Lourdes e Angico.	05/00189/2017	RTA BIGHERBROS CONSULTORES					
8	2006	7X/4	2-3	3	00/00390/2024	CONSORCIO CONSERVA-PRANVAGUARDA	BR-030	845,50	898,40	52,9	30/07/2024	15/05/2027	R\$ 244.782.930,35	5,32%		Drenagem em execução. L1 restanta aos 20 km iniciais. RPO para alterações técnicas, quantitativos e substituição de área extraída por comercial em análise.	05/00176/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA					
9	2004	7V/19	2-3	2	05/00212/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	220,50	280,10	42,9	15/06/2023	25/11/2026	R\$ 137.419.317,38	93,24%		Obra em andamento com serviços de drenagem, transporte e aquisição de materiais referentes a 2º RPO aprovada em andamento.	05/0004/2022	RTA BIGHERBROS CONSULTORES					
10	2004	7V/19	2-3	1	05/00059/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	191,50	237,50	46	03/10/2022	21/12/2026	R\$ 154.505.398,49	88,08%		Execução de sinalização e obras complementares. 2º RPO foi aprovada e o respectivo termo aditivo assinado.	05/0004/2022	RTA BIGHERBROS CONSULTORES					
11	4120	16S3	3	2	00/00392/2024	CONSORCIO GAB/SO/PA/NAVISERVICE/BA SITEC	BR-030	90,60	190,80	100,2	07/10/2024	31/12/2026	R\$ 508.529.125,65	1,12%		Estudos e projetos em elaboração, geométrico aprovado. Montagem do canteiro de obras em andamento. Supervisão contratada. Entraves com rede elétrica.	Edital 0145/25-00	BM LICITAÇÃO					
12	4120	16S3	3	1	00/00391/2024	CONSORCIO CAUPO MULTI/ODAL	BR-030	0,00	90,60	90,6	07/11/2024	01/01/2028	R\$ 358.002.878,30	0,41%		Estudos e projetos em elaboração e análises. Supervisão contratada, com ordem de início emitida.	Edital 0146/25-00	BM LICITAÇÃO					
13	2007	1009	2-3	5	05/00626/2014	CONSORCIO TORQUESSISTEMAS	BR-135	443,90	466,80	22,9	21/08/2014	15/04/2025	R\$ 122.308.811,52	100%		Obra concluída em 2024. Aguardando emissão do Termo de Recebimento Definitivo.	05/0030/2015	DEPRA ENGENHARIA E CONSULTORIA					
14	2002	7XMO	3	Unico	05/00287/2025	CONSORCIO FEIRA DE SANTANA (COESA - CDS)	BR-324	512,50	519,70	7,2	08/05/2025	28/11/2026	R\$ 187.218.093,01	7,67%		Terraplenagem, remoção, transporte de materiais e drenagem em execução. Supervisora: GEOSISTEMAS-HIDROCONSULT, vencedora, aguardando assinatura do contrato.	Edital 0488/24-05	BM LICITAÇÃO					
15	1994	10S5	2-3-7	1/2	05/00286/2025	CONSORCIO SV/OTOP/NAVISERVICE/CEBTG	BR-101	0,00	83,58	83,58	15/08/2025	15/01/2030	R\$ 307.833.263,51	4,96%		Obra em andamento com execução de serviços de obras complementares e restauração e construção de OABs. Foi assinado o contrato de supervisão.	Edital 0037/25-05	BM LICITAÇÃO					
16	136052	169F	Unico	Unico	05/00066/2026	RIVOLUCION/CONSTRUTORA LTDA	BR-101	548,5	695,1	16,9	14/01/2026	13/01/2027	R\$ 92.189.481,89	36,27%		Obra emergencial em andamento. Terrap., enrocamento, drenagem, sinalização, taludes, monitoramento da ponte existente, nova ponte e componente ambiental em execução. Projetos em elaboração e análise.	A LICITAR	A LICITAR					

Obra a licitar											PROCESSO DA LICITAÇÃO											SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)													SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	1996	10S5	2-3-7	3/4	BR-101	83,58	166,40	Adequação - Div. SEBA - Entr. BR-324/BA - Lotes 3 e 4		50600.021701/2024-77												Em fase de levantamento de remanescentes. Previsão de publicação de edital em 2026.	Edital 0037/25-05	BM LICITAÇÃO												
L2	1991	14L/V	3		BR-235/407	319,40	322,40	Contratação de remanescente para execução das águas, OABs e drenagens														TR sendo elaborado para contratação de remanescente. Previsão de publicação de edital em 2026.	05/00323/2023	CONSORCIO JBR / ASTEP (SUPERVISAO JUAZEIROBA)												
L3		1009	2-3	2	BR-135	267,00	344,70	Pavimentação do Lote 2		50606.001283/2024-51											Edital em elaboração para contratação integrada. Previsão de publicação do edital em 2026.	Edital 0145/25-00	BM LICITAÇÃO													
L4	2528	1009	2-3	3	BR-135	340,00	378,00	Pavimentação do Lote 3		50605.003696/2023-90											Edital em elaboração. Projetos executivos aprovados. Previsão de publicação do edital em 2026.	A LICITAR	A LICITAR													
L5	136054	167L	Unico	Unico	BR-415	10,80	17,00	Pavimentação do trecho Entr. BA-292 - Entr. BR-415 (A)														Projeto básico aprovado. Em processo de elaboração de edital para contratação sem-integrada. Empreendimento incluído no PAC obra.	A LICITAR	A LICITAR												
L6	2545	169F	Unico	Unico	BR-242			Adequação de Trecho Rodoviário - Barreiras - Luiz Eduardo Magalhães														Projetos em execução pela DPE.	A LICITAR	A LICITAR												

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+H+R.
