
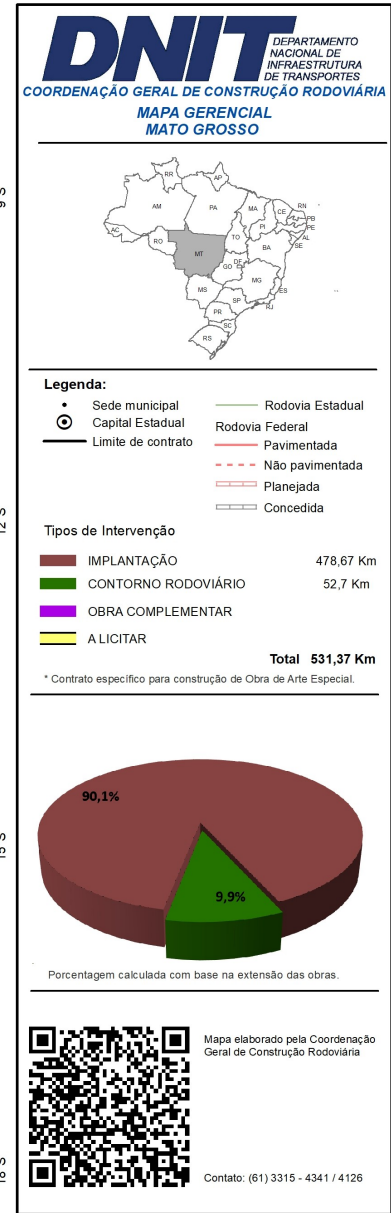


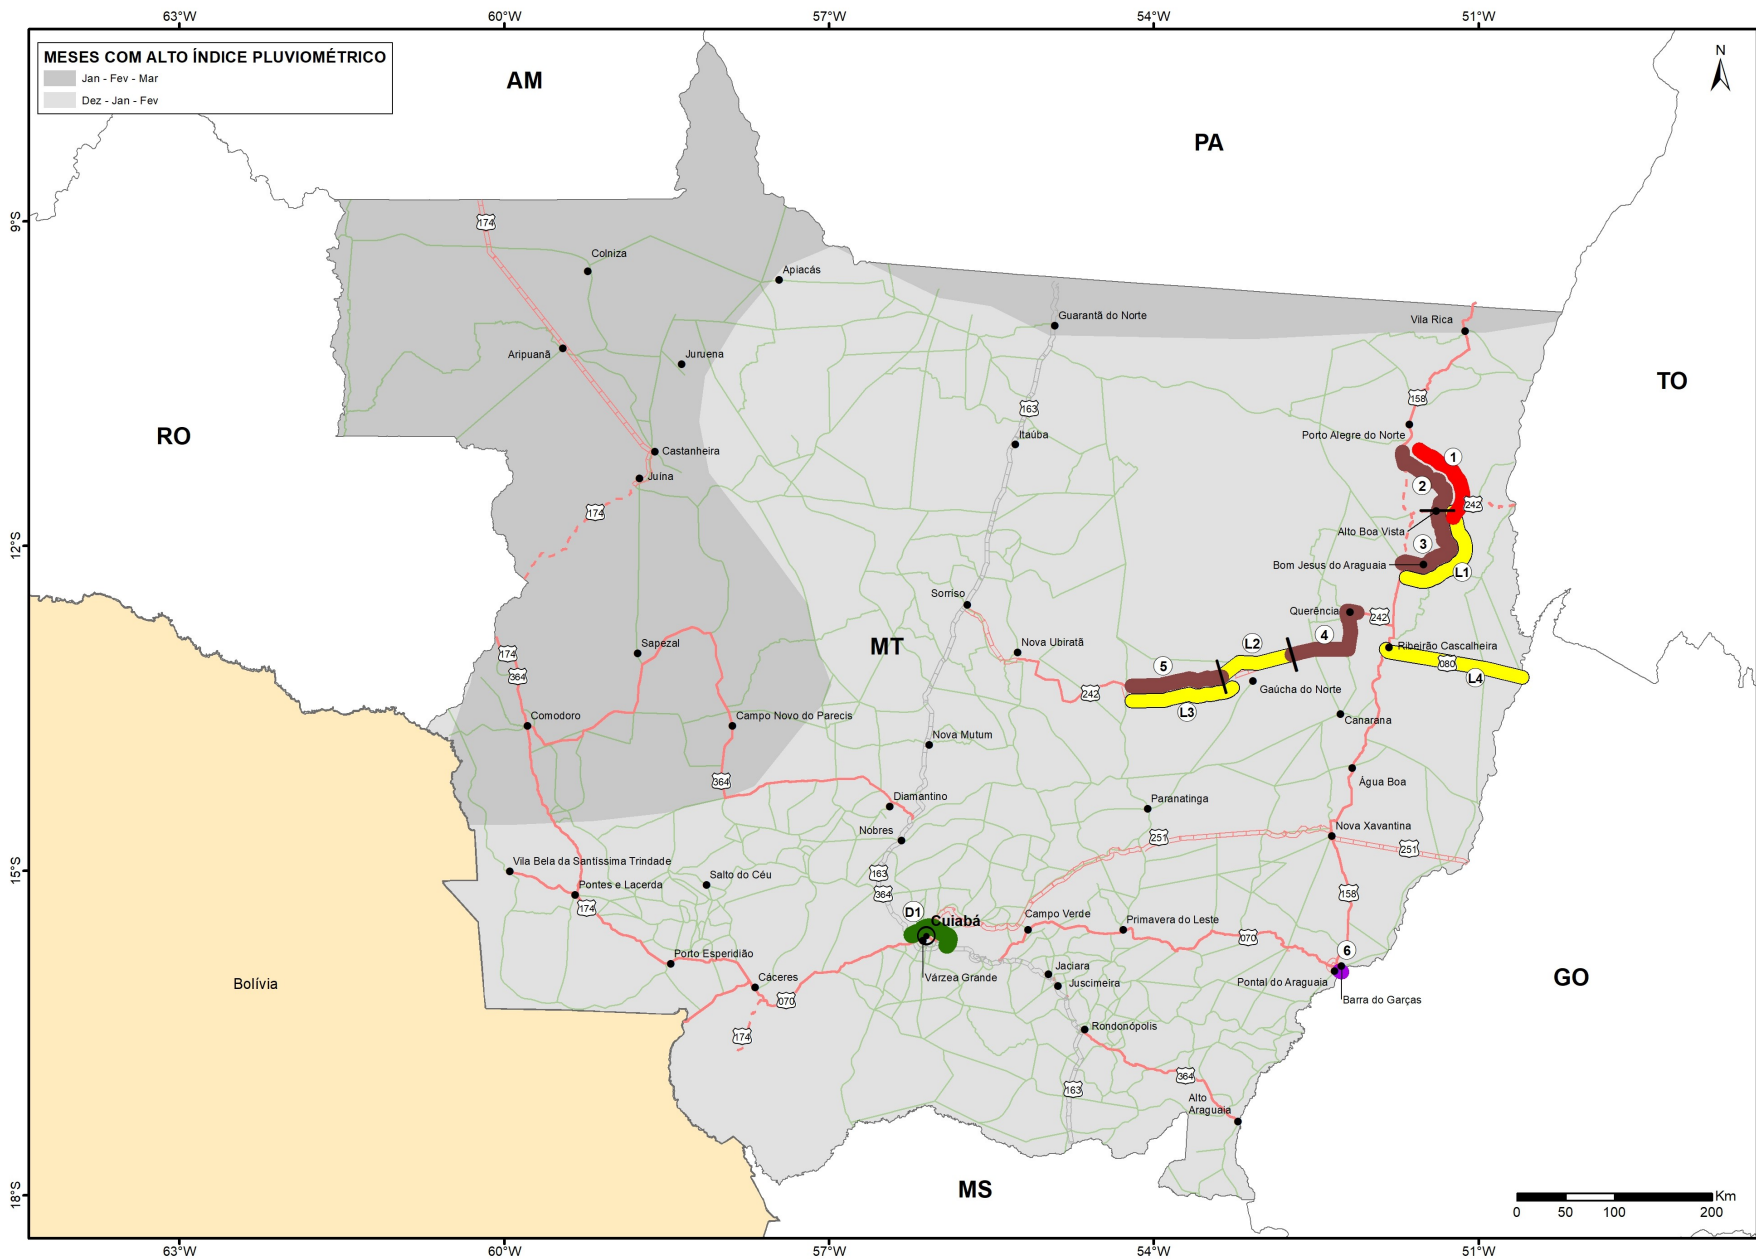

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2037	11VA	2-3-6	A	11 00824/2025	CONSTRUTORA AMZ BRASIL LTDA	BR-158	0,00	93,99	93,99	04/12/2025	12/05/2027	R\$ 42.301.800,00	0%	A empresa não apresentou as garantias, dessa forma o contrato foi anulado. Houve retorno à fase de propostas, porém a licitação restou fracassada.	11 00551/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	2037	11VA	2-3-6	A	11 00208/2025	CONSORCIO BANDERANTES - DESTESA - RTA	BR-158	0,00	93,99	93,99	20/05/2025	30/12/2028	R\$ 316.234.600,95	5,78%	Obra em andamento. Projetos de desapropriação e pavimentação em elaboração. Projeto do contorno de Alto Boa Vista revisado para nova análise.	11 00561/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	2038	11VA	2-3-6	B	11 00158/2022	CONSORCIO BANDERANTES - DESTESA - RTA	BR-158	93,99	195,42	101,43	23/05/2022	12/07/2028	R\$ 388.867.441,99	1,28%	Em fase de projetos. Projetos enviados ao EIA/IA para continuidade do licenciamento. Projetos de desapropriação em análise e correção.	11 00587/2023	CONSORCIO SUPERVALE DO VALE DO ARAGUAIA MT
4		10KK	2-3-6	C	11 00259/2016	CONSORCIO BANDERANTES/DESTESA/ASTECC	BR-242	291,98	395,36	103,38	08/03/2016	22/12/2027	R\$ 294.169.064,86	0,33%	Obra não iniciada. Serviços paralisados, conforme ordem de suspensão (8231061), devido à necessidade de resolução das pendências ambientais.	11 00658/2017	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
5	2039	10KK	2-3-6	A	11 00960/2015	CONSORCIO ENPA/CAVALCA/SA/CONTECNICA	BR-242	486,32	575,23	88,91	01/11/2016	24/06/2027	R\$ 399.162.544,08	0,1%	Obra não iniciada, licenças ambientais pendentes. Aprovada a 1ª RFPO (alteração de traçado) aguardando Termo Aditivo. O ECI do Xingu em análise no DNIT conforme orientações da FUNAI.	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA
6		7S80	2-3	Unico	11 00655/2025	CSC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	BR-070	0,00	2,10	2,1	01/11/2025	25/12/2026	R\$ 8.027.622,11	16,94%	Obra em andamento com montagem de gabão sendo executada, houve prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato.		

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				
D1	2038	12KY	6	TC-764/2011	GOV. DE MT	BR-163	0,00	52,70	52,7	Contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande	15/11/2012	12/05/2027	R\$ 323.582.183,87		R\$ 215.721.455,93	R\$ 539.303.639,80	13,54%	OAs e terraplenagem em execução. Exclusão do Seg. 2 aprovada pela diretoria e em trâmite. SINPRA/MT notificada sobre irregularidades da fiscalização.	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2038	11VA	2-3-6	B	BR-158	93,99	195,42	OAs do Lote B da BR-158		Termo de referência concluído, minuta do edital em elaboração.	11 00567/2023	CONSORCIO SUPERVALE DO VALE DO ARAGUAIA MT
L2	2039	10KK	2-3-6	B	BR-242	395,36	486,32	Implantação BR-242/MT - Lote B		Supervisão enviou proposta para inclusão da atualização do projeto no escopo do contrato, essa não apresentou condições de aceitação e deverá passar por revisão.	11 00301/2024	STRATA ENGENHARIA LTDA
L3	2039	10KK	2-3-6	A	BR-242	486,32	575,23	OAs do Lote A da BR-242		4 OAs com projeto executivo em elaboração e 4 aguardando a definição do traçado da rodovia. Não há definição quanto à inclusão da execução no contrato atual ou instrução de nova licitação.	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA
L4	2543	16SK			BR-080	0,00	170,00	Pavimentação - km 0,00 ao km 170,00		Solicitada delegação de competência para licitação do Lote 1A, 28 km iniciais, pela SINPRA. Tratativas para inclusão no PAC OBRA e criação da rubrica orçamentária.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
