


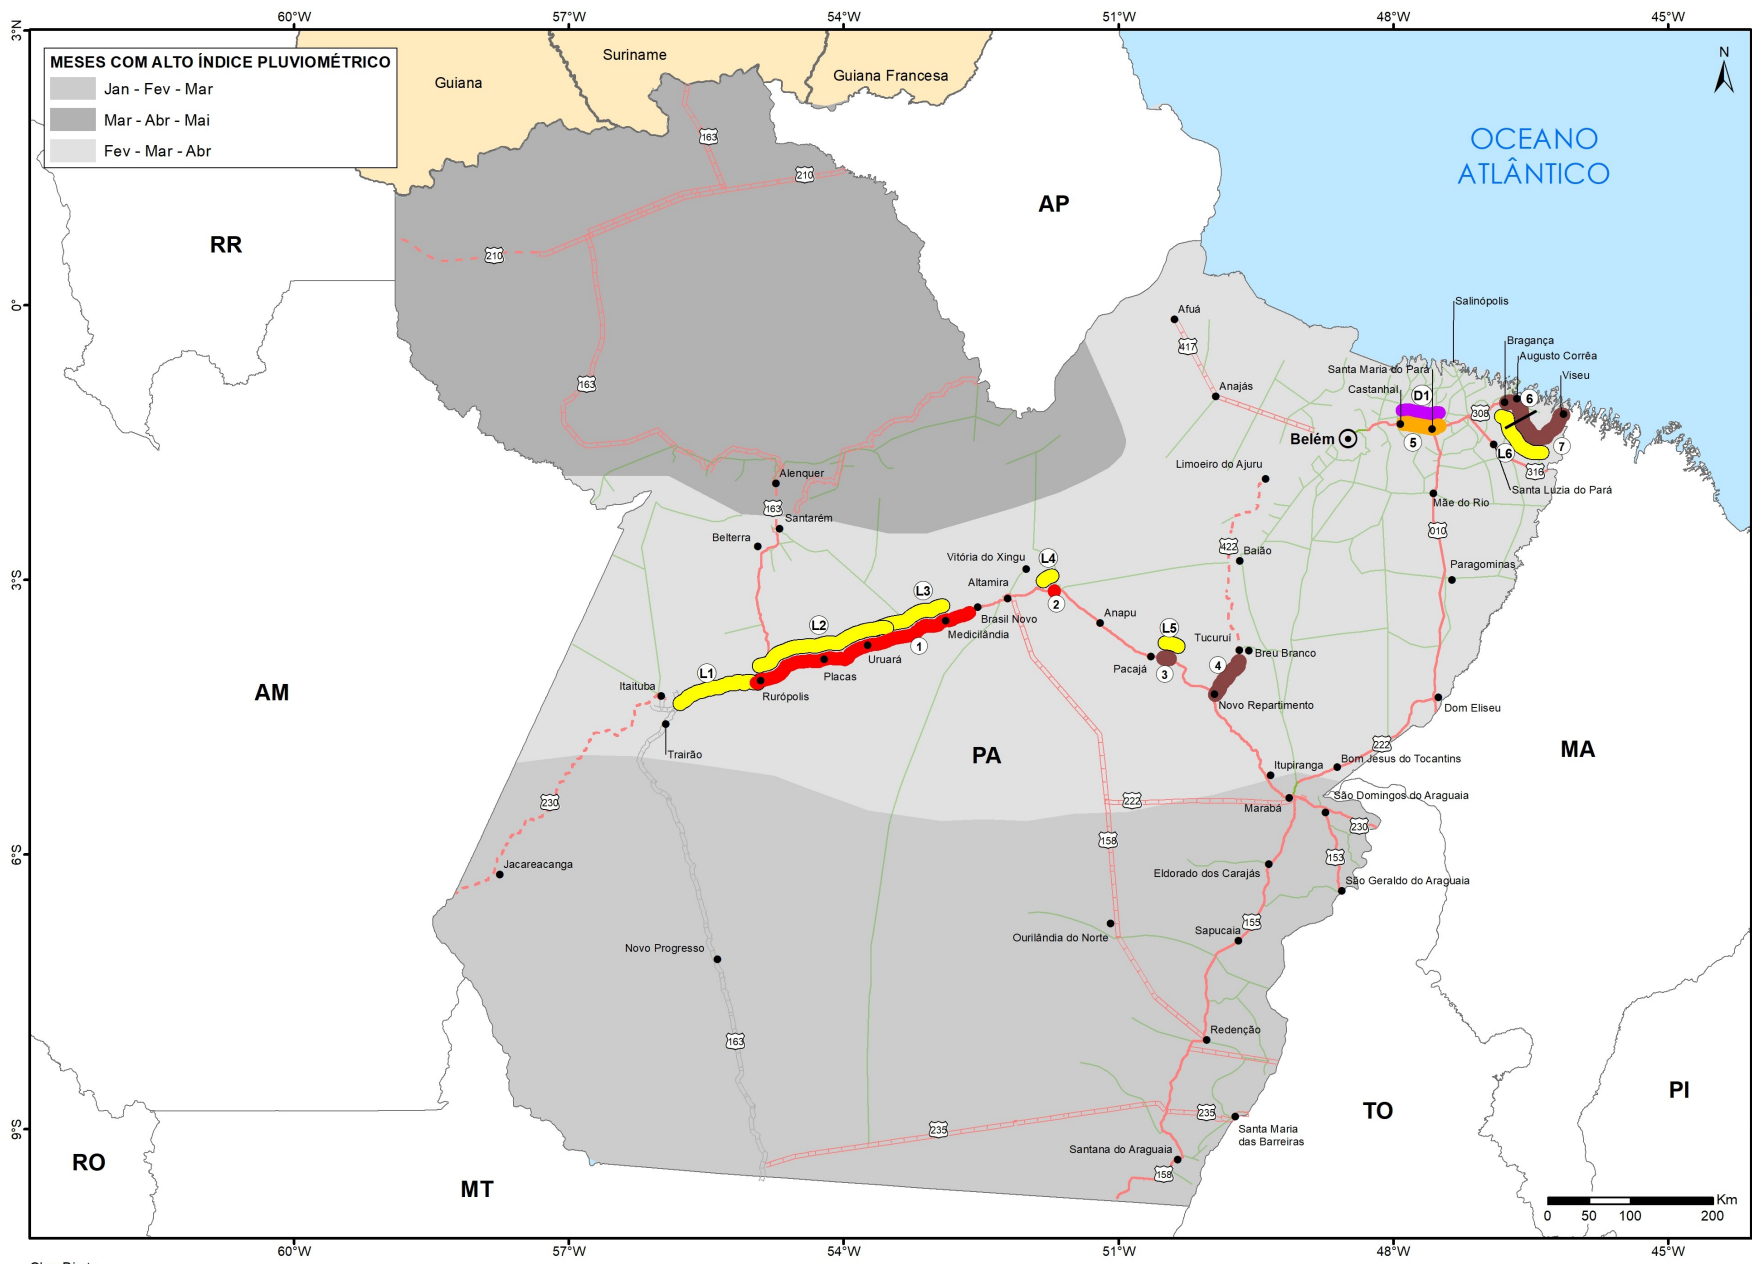

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL PARÁ

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	400,72 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	45,00 Km
OBRAS COMPLEMENTARES**	
OAE*	
A LICITAR	
Total	445,72 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.
** Intervenção para remoção de rede elétrica

80.27%
19.73%

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.
Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta										SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)										SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *										
1	2043	1101	2-3-8		02 00261/2024	PLANEJ.E LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	BR-230	709.40	1006.80	297,5	Projetos e execução de 15 pontes	13/06/2024	10/09/2027	R\$ 52.278.454,60	1,44%	Contrato em fase inicial. A SR informou que empresa iniciou serviços na OAE sobre o Rio Arrepimento.					02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA		
2	2044	161U-10KR	3-2	Unico	00 00011/2021	CONSORCIO CONSTRUBASE/ CIDADE	BR-230	571.00	571.70	0,7	Construção de ponte sobre o rio Xingu	25/05/2021	06/04/2028	R\$ 445.323.678,13	63,97%	Obra em andamento, serviços de infraestrutura concluídos. Patologias identificadas em processo de correção, 2º RFFO e MCP publicados.					02 00519/2023	CONSORCIO STE - ENECON		
3		10KR	2-3	Unico	02 00396/2024	CONSTRUTORA JUNBO LTDA	BR-230	390,87	398,95	8,08	Remanescente do Complexo Ladeira da Velha Rodovia	07/04/2024	01/10/2026	R\$ 55.405.795,41	0%	Contrato em fase de projetos, morosidade na aprovação dos estudos/projetos. Rescisão de contrato unilateral em trâmite e PAAR instaurado.					02 00519/2023	CONSORCIO STE - ENECON		
4	2046	7861	3	Unico	02 00731/2021	CONSORCIO BR-422 (LOM - ARA)	BR-422	0,00	59,34	59,34	Implantação da BR-422	12/10/2021	22/09/2026	R\$ 250.604.136,60	97%	Obra em fase final, foi registrado o cumprimento de um trecho, o que demandará uma 3º RFFO para solucionar.					02 00490/2022	CONSORCIO STE / PROGAIA		
5	2040	7W07	3	Unico	02 00471/2021	TAMASA ENGENHARIA S/A	BR-316	67,60	112,60	45	Duplicação da BR-316	09/06/2021	25/08/2027	R\$ 192.897.658,29	47,52%	Obra em andamento. Revisão de entrega de 15 km em 2026, 2º RFFO em análise na SR, para posterior encaminhamento à CGOANT.					02 00010/2018	DEFFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
6	2047	7562	3	1	02 00341/2024	GONCALVES DIAS ENGENHARIA LTDA	BR-308	203,27	239,27	36	Remanescente de Implantação e Pavimentação do Lote 1	07/01/2024	28/09/2026	R\$ 63.644.762,55	75,04%	Obra em andamento, com publicação do 1º Termo Aditivo referente a 1º RFFO. Em elaboração a 2º RFFO, destinada à substituição de brita por seixo.					02 00007/2026	CONSORCIO SUPERVISOR STE/TECHNE/PROGAIA		
7	2047	7562	3	2	02 00342/2024	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	BR-308	239,27	318,90	79,63	Remanescente de Implantação e Pavimentação do Lote 2	07/04/2024	01/10/2026	R\$ 199.071.346,44	21,47%	Obra em andamento, com pendências relacionadas às desapropriações. 1º Termo Aditivo, referente a 1º RFFO, publicado.					02 00007/2026	CONSORCIO SUPERVISOR STE/TECHNE/PROGAIA		

Obra Delegada										SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)										SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA					
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **											
D1		7W07	3	ACT-433/2023	ESTADO DO PARÁ	BR-316	67,60	112,60	45	Delegar supervisão e execução de remoção de rede elétrica	27/07/2023	28/09/2026	R\$ 0,00	R\$ 23.168.341,45	R\$ 23.168.341,45	0%	Obra em andamento. Equatorial Energia iniciou serviços em 06/11/25 após manifestação do DNIT. Nova variante em implantação, com conclusão prevista para Jul/26									

Obra a licitar										SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)										SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL															
L1	2042	1490	2-3		BR-163	676,31	788,98	Remanescente de Implantação do Contrato 00 00035/2013		Edital nº 90436/2025, para atualização de projetos e supervisão das obras remanescentes do Contrato 035/2013, lançado. Fase de análise da proposta técnica.	Edital 0436/25-02	EM LICITAÇÃO						02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA					
L2	2041	1101	2-3-8	2	BR-230	874,85	999,80	Remanescente de Implantação - Lote 2		Projeto executivo em análise na CGOESP. Previsão de publicação de edital para 2026.								02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA					
L3	2041	1101	2-3-8	1	BR-230	728,00	874,85	Remanescente de Implantação - Lote 1		Projetos em elaboração pela supervisora.								02 00592/2024	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA					
L4	2044	161U	3	Unico	BR-230	569,61	572,28	Acesso à ponte do rio Xingu	50600.03693/2025-66	0216/26-00	Edital nº 0216/2026-00, referente a execução dos acessos, publicado com previsão de abertura das propostas em Jul/26.	02 00519/2023	CONSORCIO SUPERVISÃO OAE BR-230/PA (STE - ENECON)						02 00519/2023	CONSORCIO STE - ENECON				
L5	2045	10KR	2-3	Unico	BR-230	390,87	398,95	Remanescente do Complexo Ladeira da Velha Rodovia		Supervisora realizando o levantamento do remanescente do contrato 02 00398/2024.	Edital 0060/25-02	EM LICITAÇÃO						02 00519/2023	CONSORCIO STE - ENECON					
L6		7562	3		BR-308	204,30	276,40	Construção de 11 OAEs		Licitação será na modalidade integrada, anteprojetos em análise na DFP. Previsão de licitação para Dez/26.								02 0060/25-02	EM LICITAÇÃO					

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
