
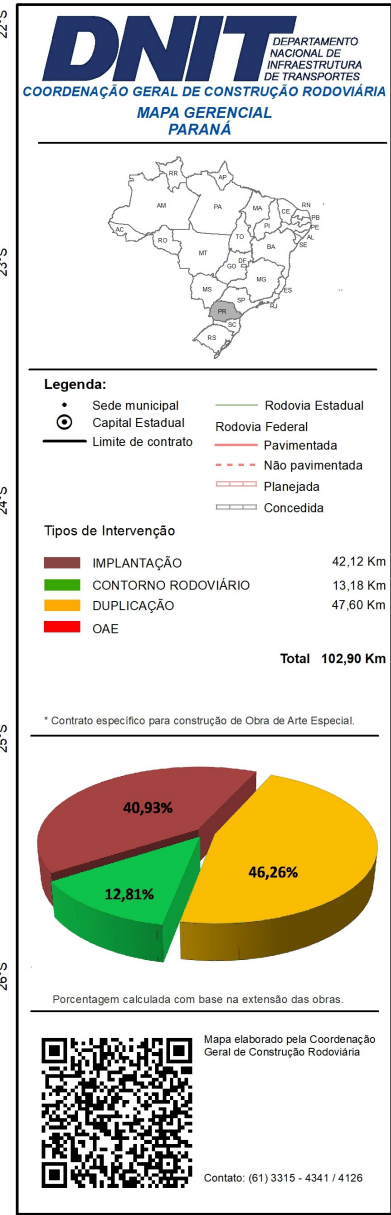


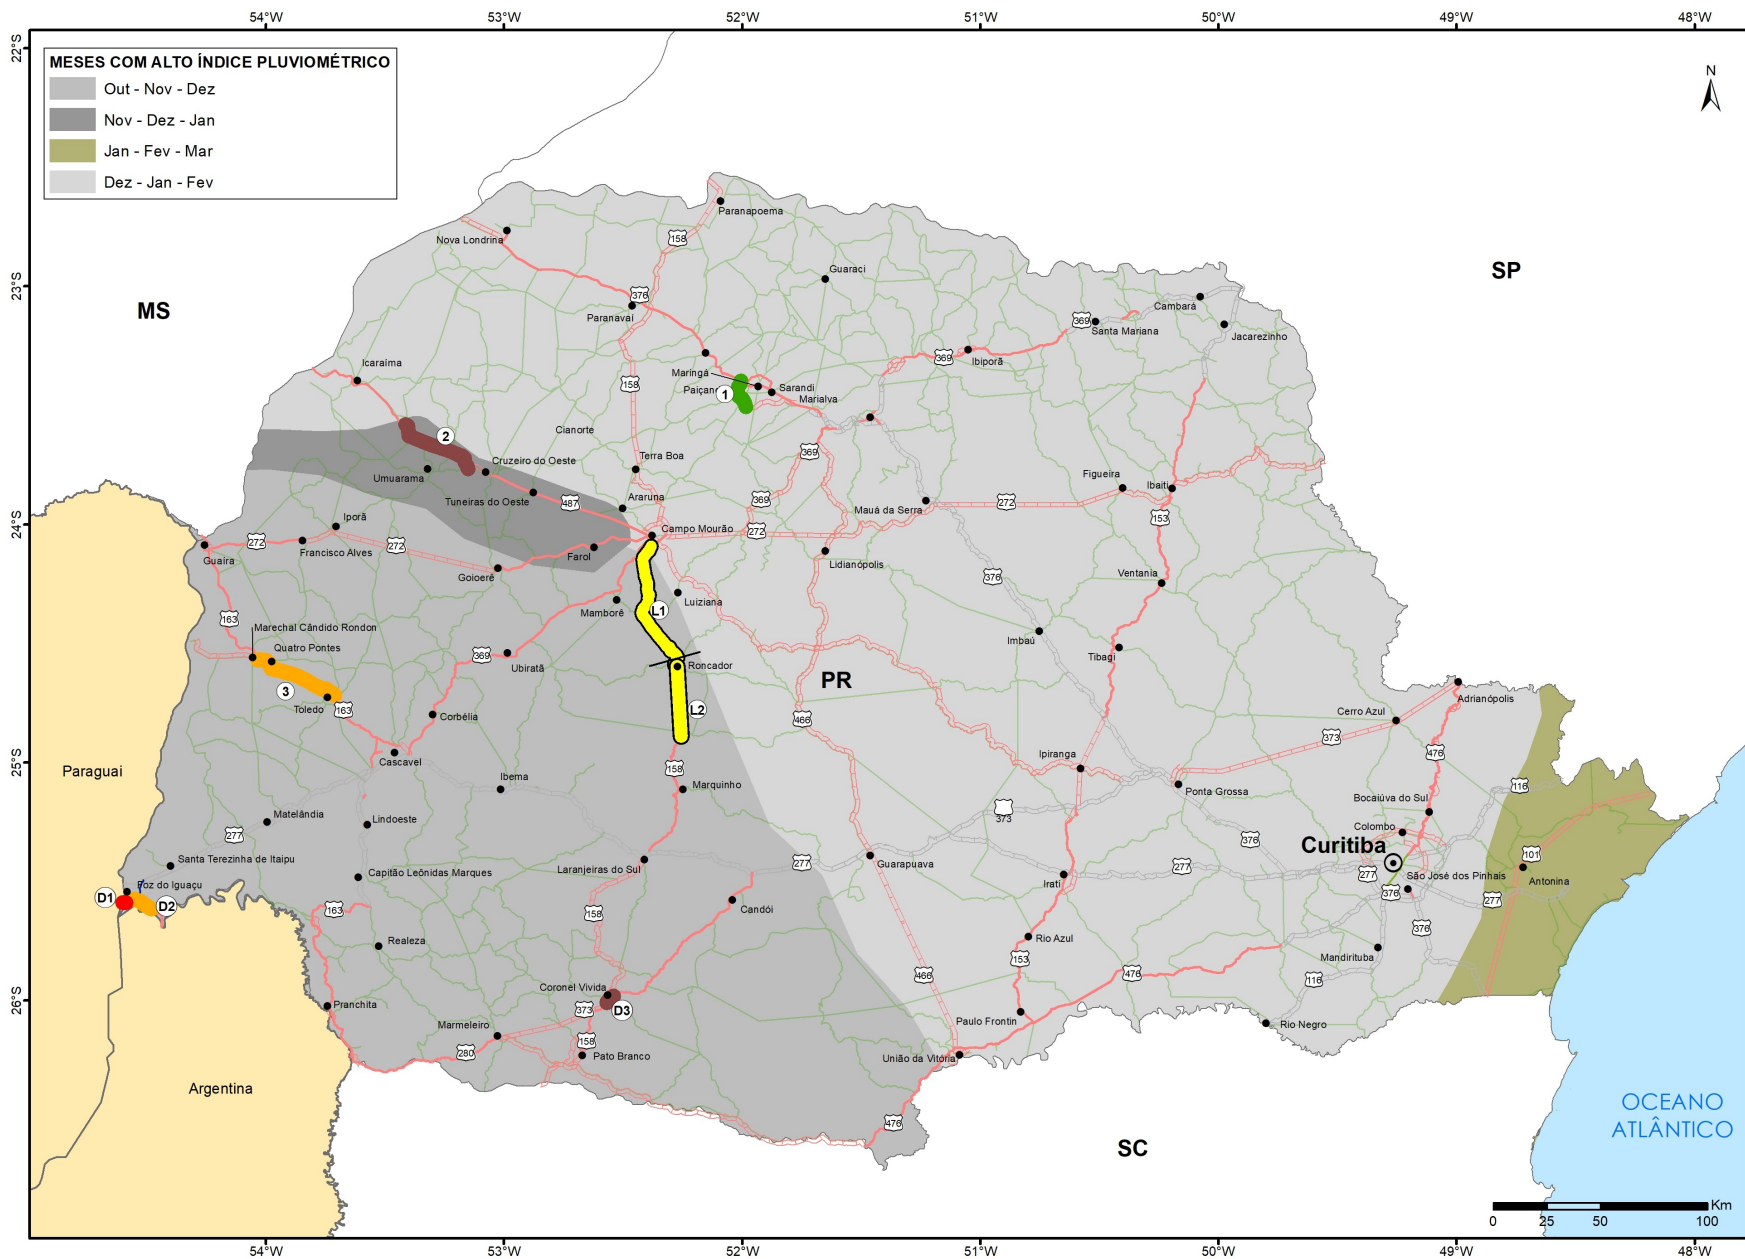

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)			
1	2062	7/25-TM81	2-7	Único	09/00070/2022	CONSORCIO BANDEIRANTES - TUCUMANN - ENGINEM	BR-376	0,00	13,18	13,18	Implantação do Contorno Sul de Maringá	06/01/2022	26/01/2027	R\$ 328.634.472,57	0,42%	Prevista a conclusão da aprovação dos projetos em Ago/26 para dar início às obras em Set/26.	09/00705/2022	CONSORCIO ASTEP / JBR
2	2935	7/23	2-3-7	Único	09/00397/2021	CONSORCIO NEOVA - CASTILHO - STE	BR-487	56,41	93,80	37,39	Implantação e Pavimentação	17/04/2023	20/03/2028	R\$ 343.872.855,89	0,72%	Projetos em fase de análise e aprovação. Expectativa de entrega de todos os projetos em Jun/26. Início das obras em Jul/26.	09/00047/2023	PROSUL - PROJETO SUPER PLANEJ LTDA
3		12/JL	2	Único	09/00837/2014	CONSORCIO CASTILHO / TÉCNICA MARIA	BR-163	235,50	274,40	38,9	Duplicação de Toledo a Mr. Candido Rondon	10/07/2014	28/01/2027	R\$ 461.460.700,01	99,95%	Obra finalizada e com trecho concedido.	09/00498/2023	PROSUL - PROJETO SUPER PLANEJ LTDA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2061			CD-211/2019	GOVERNO DO PARANÁ	BR-277	15,00	15,76	0,76	2º Ponte de Foz do Iguaçu	05/10/2019	30/04/2026	R\$ 0,00	R\$ 448.663.562,60	R\$ 448.663.562,64	0%	Concluído execução dos 15 km de pista, acessos a ponte e serviços da Aduana Brasil-Argentina.		
D2	2063			CD-599/2020	GOVERNO DO PARANÁ	BR-469	10,70	19,40	8,7	Duplicação e Manutenção	13/11/2020	20/03/2028	R\$ 0,00	R\$ 139.477.766,41	R\$ 139.477.766,41	0%	A obra atingiu 87 % de execução. A entrega da obra está prevista para Ago/26.		
D3				ACT-366/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA	BR-158	507,00	508,12	1,12	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	07/02/2023	31/01/2027	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obras em andamento em fase final.		
D3				ACT-366/2023	MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVDA	BR-373	477,89	481,50	3,61	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	07/02/2023	31/01/2027	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0%	Obras em andamento em fase final.		

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)			
L1		20UC	1		BR-158	239,60	294,50	Implantação Campo Mourão - Roncador	50600.034456/2023-87	0437/2025-00	Publicado Edital de contratação de projetos e em fase de análise de propostas	A LICITAR	A LICITAR
L2		20UC	2		BR-158	294,50	335,70	Implantação Roncador - Palmital	50600.034456/2023-87	0437/2025-00	Publicado Edital de contratação de projetos e em fase de análise de propostas	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
