


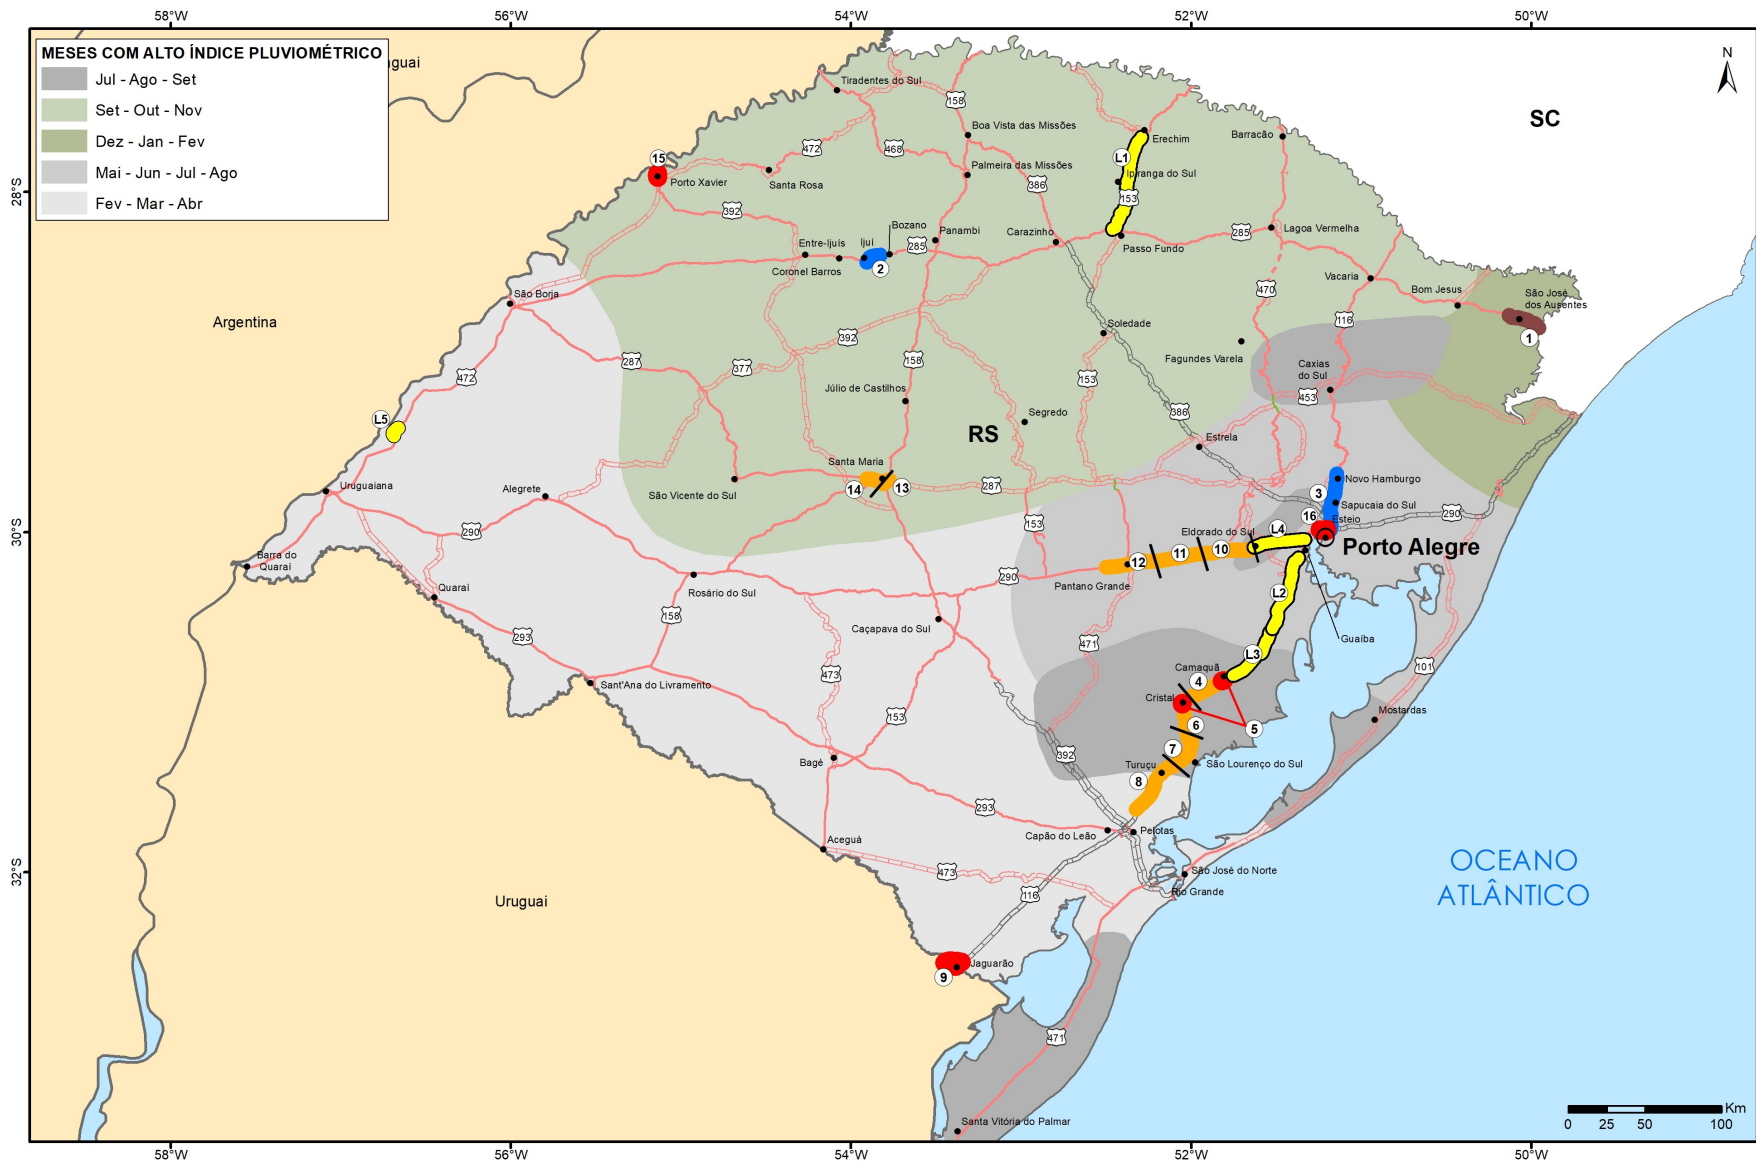

Obra direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+I+R)	EXEC. FINANC.1	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2090	7X78	2-3-7	Unico	10 00094/202	CONSORCIO PLANATERRATRAÇADOIGUATEMI	BR-285	30,00	54,10	24,1	Remanescentes de obras na BR-285	15/03/2021	27/12/2027	R\$ 119.453.916,11	40,87%	Obra em andamento. Previsão de 1º RPFO em set/26. Empresa solicitará alteração do índice de produtividade, devido ao fenômeno climático Viração.	10 00391/2022	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	124130	7X06	3-7	Unico	10 00717/202	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-285	431,50	484,3	32,8	Travessia urbana de Ijuí	27/12/2023	07/06/2027	R\$ 262.992.420,27	15,71%	Obra em andamento. Previsão de RPFO em set/26.	10 00662/2024	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	2083	7X06	2-3	1	10 00621/201	CONSORCIO IMAC / ETERC / SOGEL / IGUATEMI	BR-116	234,70	270,4	35,7	Melhoramento físicos e segurança de tráfego	12/02/2019	21/12/2027	R\$ 845.863.971,51	88,91%	Obra em andamento. 3º RPFO aprovada com reflexo financeiro positivo. Contrato prorrogado até dez./2027.	10 00650/2016	MAGNA ENGENHARIA LTDA
4	2086	7L04	2-3	5	10 00058/202	PLANATERRA TERRAPL. PAVIMENTAÇÃO LTDA	BR-116	397,18	422,3	25,12	Remanescente de duplicação do Lote 5	21/03/2022	02/07/2027	R\$ 246.408.871,22	76,94%	Obra em andamento em ritmo o baixo. Previsão de 2º RPFO prevista para 2026. Execução do contrato prorrogada para jan./2027.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
5	100003	7L04	2-3	10	10 00802/202	CONSORCIO A GASPARV / GARAMBONE	BR-116	400,34	401,2	0,13	Implantação do viaduto Pompeia	12/01/2020	27/11/2026	R\$ 86.255.866,52	99,17%	Ponte sobre o Rio Camaquã concluída. Superestrutura do viaduto Pompeia finalizada, em execução os acabamentos.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
6	2087	7L04	2-3	6	10 00605/202	CONSORCIO PELOTENSE / PLANATERRA	BR-116	422,30	447,9	25,68	Remanescente da duplicação do Lote 6	21/11/2023	03/06/2027	R\$ 140.119.632,50	30,44%	Ponte sobre o Rio Camaquã concluída. Superestrutura do viaduto Pompeia finalizada, em execução os acabamentos.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
7	2088	7L04	2-3	7	10 00041/202	CONSORCIO SULTEPA / BOURSCHIED ENG.	BR-116	448,50	470,1	21,6	Remanescente de duplicação do Lote 7	22/03/2023	15/12/2026	R\$ 69.761.785,96	58,53%	Obra em andamento com execução das vias marginais. Previsão de RPFO em 2026.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
8	100002	7L04	2-3	8/9	10 00427/202	CONS SBS-BOURSCHIED	BR-116	470,10	511,7	41,68	Remanescente da duplicação dos Lotes 8 e 9	28/08/2023	07/02/2027	R\$ 108.504.818,43	46,61%	Obra em andamento. 1º RPFO prevista para principalmente tratar de mudança de jazida.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
9	2526	112N	3	Unico	00 00375/202	CONS CIDADE / PLANATERRA / UNICA	BR-116	0,00	9,20	9,2	Ponte Internacional sobre Rio Jaguarão e acesso	28/07/2024	28/07/2028	R\$ 224.498.374,15	0,27%	Contratação integrada em fase do projeto. Previsão de iniciar as obras em 2026.	10 00230/2025	CONSORCIO ECOPLAN - SKILL
10	2080	123U	2-3	2	00 01070/201	CONS TB ECB - ETEL	BR-290	142,00	172,0	30,08	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	05/11/2021	R\$ 212.694.280,34	9,87%	Termo de Cumprimento das Obrigações assinado. Aguardando reinício das obras.	Edital 016/2025	EM LICITAÇÃO
11	2081	123U	2-3	3	00 00217/201	CONS TRIER CTESA - PRODEC	BR-290	172,00	199,0	27,03	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	14/02/2027	R\$ 299.065.390,23	45,1%	Obra em andamento. Previsão de RPFO em 2026.	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
12	2082	123U	2-3	4	00 01126/201	CONS TRIER CTESA - ESTEJO	BR-290	199,30	228,0	28,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	15/02/2027	R\$ 276.681.414,08	84,94%	Obra em andamento. 1º RPFO em análise no DNIT. 2º prevista para 2026. Tratativas para realocamento do posto da PRF.	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
13	124131	12KG	2-7	1	00 00493/201	CONS CONTINENTAL SOGEL ECOPLAN	BR-158	324,00	324,1	5,1	Travessia de Santa Maria	09/05/2013	27/12/2026	R\$ 215.281.278,95	98,46%	Obra em andamento. Previsão de finalizar em 2026.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
14	124131	12KG	2-7	2	00 00494/201	CONS TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-287	247,70	254,3	6,6	Travessia de Santa Maria	09/05/2013	27/12/2026	R\$ 255.177.196,28	99,24%	Obra em andamento. Previsão de finalizar em 2026.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
14	124131	12KG	2-7	2	00 00494/201	CONS TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-158	329,10	331,9	2,8	Travessia de Santa Maria	09/05/2013	27/12/2026	R\$ 255.177.196,28	99,24%	Obra em andamento. Previsão de finalizar em 2026.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
15	2092	7X06	3	Unico	00 00246/202	CONSORCIO PONTE RIO URUGUAI-RS	BR-392	668,80	671,1	2,35	Construção da Ponte Internacional em Porto Xavier	15/10/2025	22/03/2030	R\$ 214.681.195,71	0%	Ordem de início emitida para elaboração dos projetos básicos e executivos e execução e execução das etapas do licenciamento ambiental.	A LICITAR	A LICITAR
16	2091	14PC	Unico	Unico	10 00325/202	CONSORCIO CIDADE / ARTELESTE	BR-116	00,00	15,30	15,3	2ª Ponte sobre o Rio Guaíba e acessos	30/06/2026	11/12/2029	R\$ 524.935.394,87	0%	Contrato assinado, aguardando início.	A LICITAR	A LICITAR

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EXTAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2495	7X7	Unico	BR-153	BR-153		BR-153/RS Erechim a Passo Fundo			Projeto executivo aprovado na DPP. Previsão de licitar em 2026.	A LICITAR	A LICITAR
L2	2084	7L04	2-3	1 e 2	BR-116	300,54	351,34			Contrato rescindido. Previsão de licitar remanescente em 2026.	Edital 0064/26-10	EM LICITAÇÃO
L3	2085	7L04	2-3	3 e 4	BR-116	351,34	397,20			Levantamento do remanescente será feito após a contratação da nova supervisora. Previsão de licitar em 2027.	Edital 0064/26-10	EM LICITAÇÃO
L4	2079	123U	1	BR-290	112,30	142,00	Remanescente de duplicação do Lote 1			Contrato extinto por decurso de prazo. Remanescente sendo levantado para elaboração de anteprojeto. Previsão de licitar obra em 2026.	Edital 0187/26-10	EM LICITAÇÃO
L5	2076	7X06	3	BR-472	510,53	517,10	Ponte sobre o Rio Itaipu			Aprovação revisão do orçamento. Previsão de licitar contratação integrada em 2026.	10 00588/2023	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+I+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
