


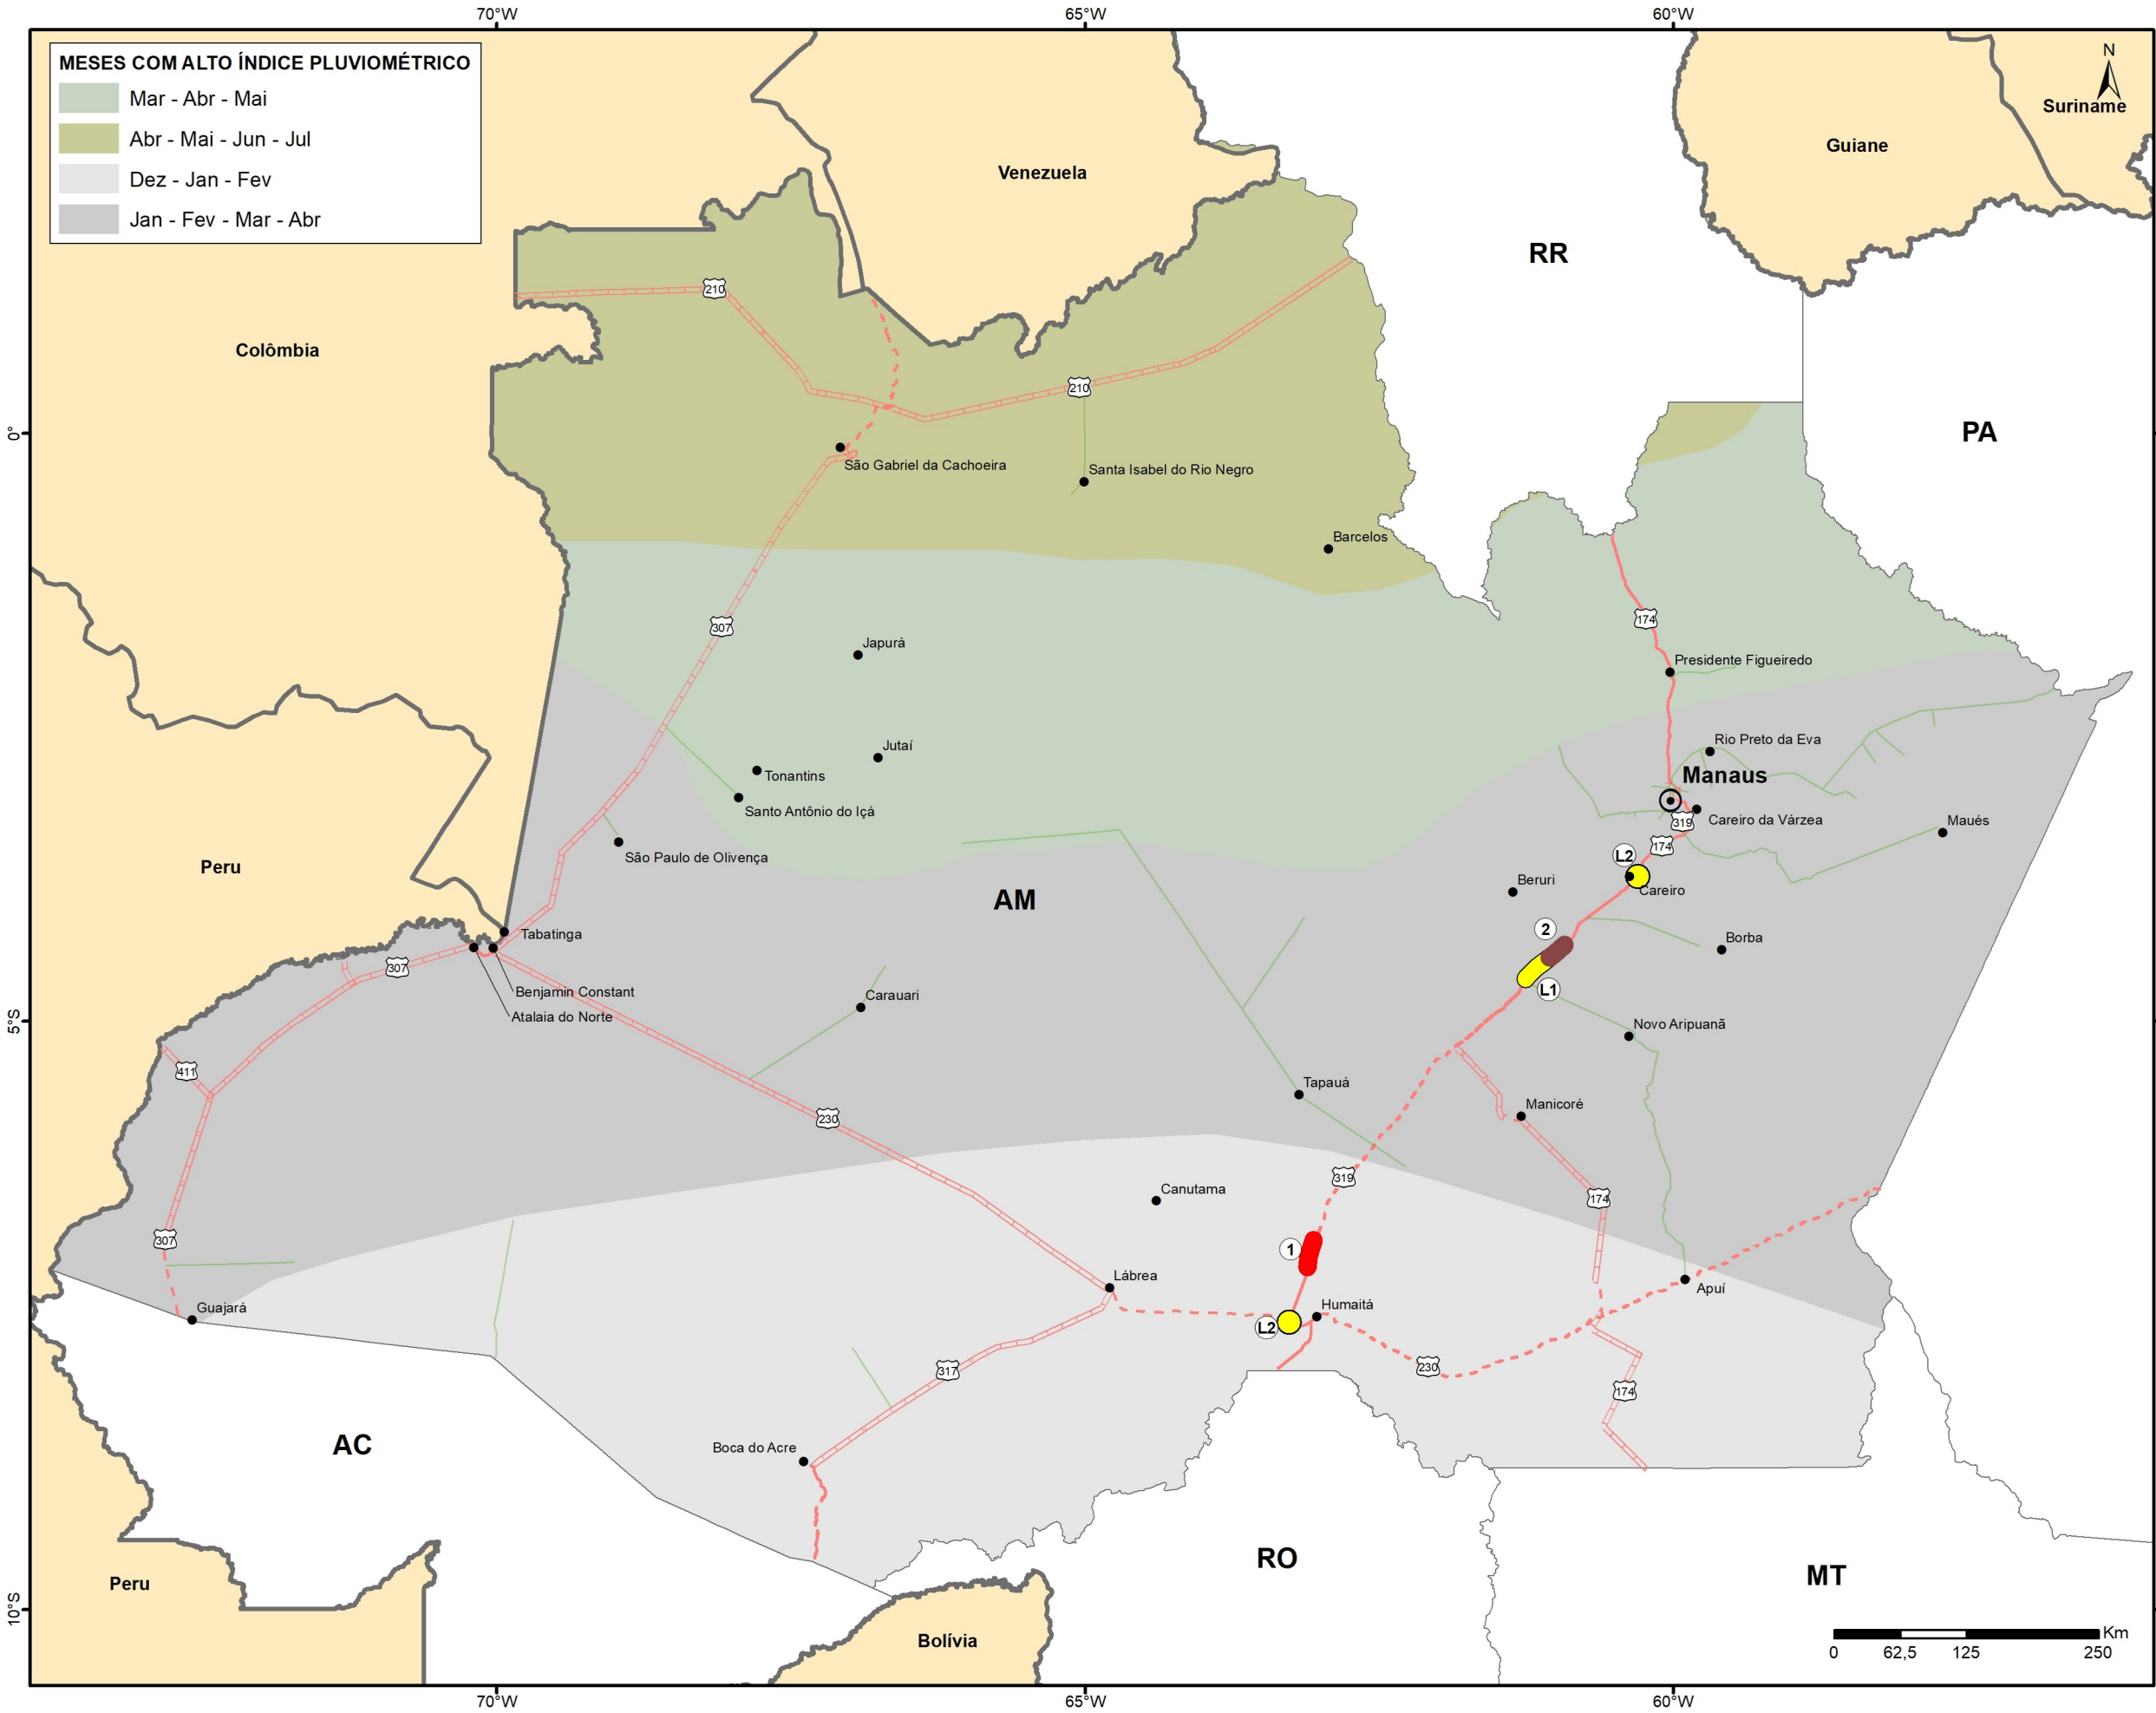


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

- A LICITAR
- IMPLANTAÇÃO
- CONTRATO ESPECÍFICO DE OAE

TOTAL 20,00 Km

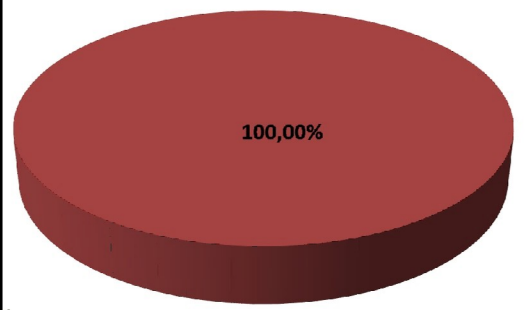

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obras Diretas																
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	
1		1248	2	Unico	00 00389/2024	TECNICA RONDONIA DE OBRAS	BR-319	575,73	601,20	0,00	Elaboração dos projetos e execução das pontes sobre os igarapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio	11/07/2024	29/08/2026	R\$ 18.434.627,60	0%	A emissão da OIS aguarda a contratação de empresa supervisora, que se encontra em processo licitatório, com previsão de assinatura até Out/25
2	123663	1248	2	C1	00 00563/2024	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO	BR-319	198,20	218,20	20,00	Execução de remanescente do Lote C - Segmento 1	16/09/2024	04/03/2027	R\$ 163.496.132,10	3,28%	Obra temporariamente paralisada pelas chuvas, com retomada prevista para Maio/25 com serviços de drenagem.

Obra a licitar																
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA				
L1	123663	1248	2	BR-319	218,20	248,20	Remanescente do Lote C		Remanescente de anteprojetos em elaboração pela supervisora	01 00425/2021	PROSUL - PROJETOS SUP.					
L2		1248	2	BR-319	103,50	665,70	Implantação dos Portais Terrestres de Fiscalização Integrada	50600.036417/2021-52	Previsão de assinatura em Jul/25 de 2 lotes. Por se tratar de contratação integrada, com fase de projetos, as obras deverão iniciar apenas em 2026.	Prev 04 CONTR						

*Percentual de Execução Financeira considerado para o valor PI+A+R.

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
