




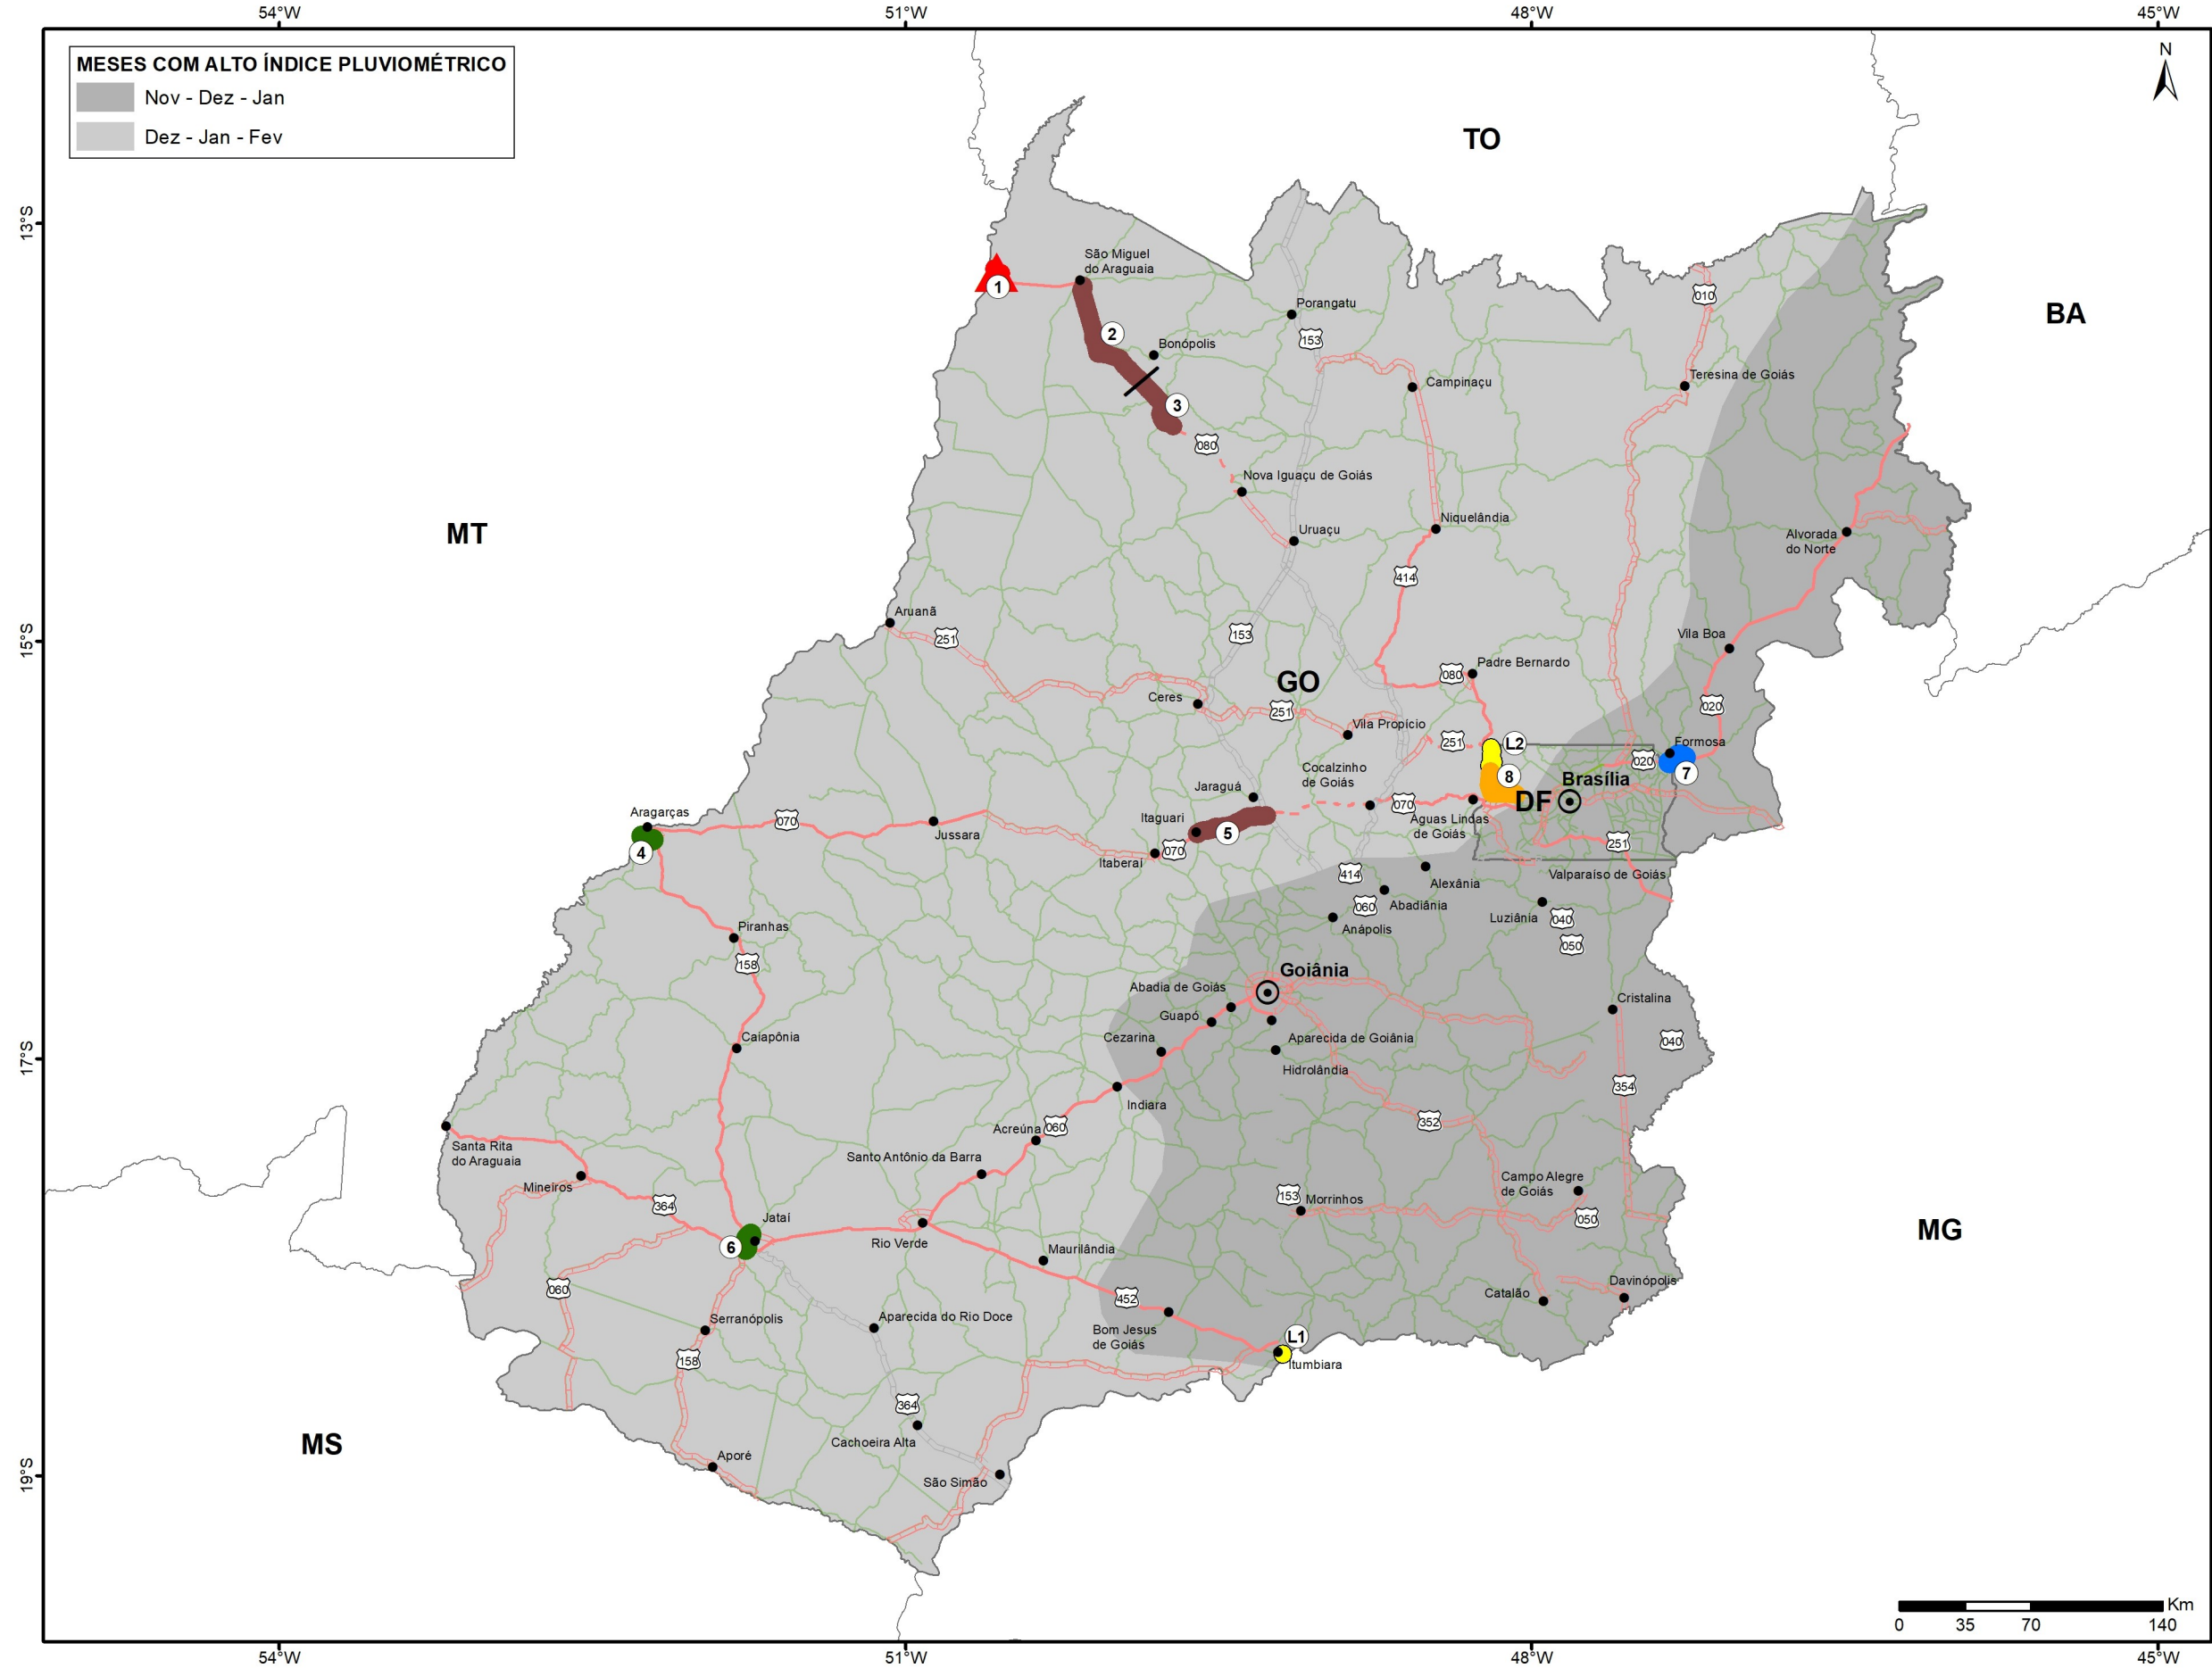

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL

GOIÁS/DISTRITO FEDERAL


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-REST/MELH.	12,00 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	15,20 Km
IMPLANTAÇÃO	106,46 Km
DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	24,60 Km
A LICITAR	
OAE*	
Total	158,26 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

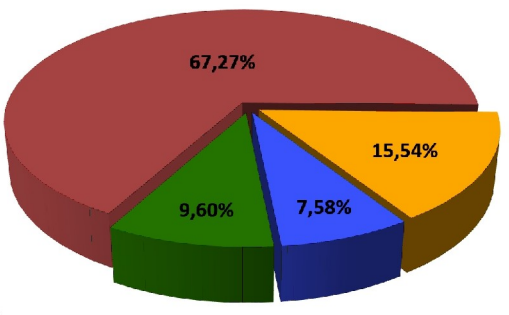

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta															SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)					SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*							
1	2018	7E79	2-3	Unico	12 00961/2015	CONSORCIO COMSA - BK - ENESCIL	BR-080	406,20 410,30	4,1	Ponte sobre rio Araguaia e acessos	30/12/2015	27/02/2025	R\$ 203.625.768,91	88,16%	Ponte concluída. Pendente encaixamentos e acessos. Projeto sendo revisado para evitar desapropriações no lado de Mato Grosso.	12 00439/2024	CONSORCIO DIREÇÃO-ESTRATEGICA				
2	2017	7E79	2-3	Unico	12 00686/2020	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	293,00 363,00	70	Remanescentes de Implantação, incluindo OAEs	19/10/2020	29/04/2025	R\$ 98.299.529,60	93,94%	Obra paralisada devido a uma questão de mudança de consórcio. Previsão de conclusão integral da obra para Ago/25	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA				
3	2017	7E79	2-3	Unico	12 00368/2023	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	273,30 301,20	27,9	Implantação e Pavimentação na BR-080/GO	05/07/2023	21/09/2025	R\$ 61.856.552,96	2,46%	Ordem de início emitida nos 20 km onde a desapropriação foi concluída. Há atraso na aprovação de alguns projetos.	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA				
4	15K0	2	Unico	12 00218/2022	CONSORCIO CAIAPO / EGETRA	BR-070	8,30 14,60	6,3	Remanescente do Contorno de Aragarças	28/06/2022	26/02/2025	R\$ 32.500.946,23	97,75%	Obra concluída. Aguardando a aprovação de RFFO para concluir o contrato. SR pediu delegação de competência para aprovar a revisão.	12 00214/2019	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES					
5	2014	20UC-7XM3	2	12 00350/2024	CONSORCIO CAIAPO/MME	BR-070	129,00 167,70	8,56	Remanescente de implantação do Lote 2	14/06/2024	30/11/2026	R\$ 51.974.301,74	0,04%	Estudos e projetos atrasados em relação ao cronograma vigente. Pendente contratação de supervisora.							
6		7I71	2	Unico	12 00293/2021	CONSORCIO TRENA / CRIAR	BR-060	12,00 23,60	8,9	Remanescente do Contorno de Jataí	21/06/2021	17/04/2025	R\$ 74.143.965,80	92,24%	Obra concluída. Contrato paralisado aguardando monitoramento de solução de drenagem para finalizar.	12 00480/2021	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ.				
7	3030	7R82	2-3-7	Unico	00 00544/2024	TRIER ENGENHARIA S/A	BR-020	0,00 12,00	12	Remanescente da adequação de Formosa	30/08/2024	20/02/2026	R\$ 202.535.254,55	2,7%	Obra em andamento com ritmo adequado. Previsão de RFFO. Há problema de desapropriação e interferência sendo tratados.	12 00588/2024	CONSORCIO DYNATEST / NORDEN				
8	2531	7XT1	2-3-7	1	00 00680/2023	CONSERVA DE ESTRADAS LTDA	BR-080	0,00 24,60	24,6	Duplicação da BR-080/DF	23/12/2023	05/03/2026	R\$ 339.752.587,54	1,26%	Obra em execução com serviços de terraplanagem e canteiro. Previsão de entrega da 1º RFFO para Maio/25 e a 2º RFFO para Jun/25.	12 00384/2024	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA				

Obra a licitar															SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)					SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL													
L1	2532	163X	7	BR-153	703,32 703,60	Ponte sobre o rio Paranaíba em Itumbiara	50612.002182/2024-17	0480/24-12		Licitação em andamento.											
L2	2531	7XT1	2-3-7	BR-080	24,60 40,86	BR-080/DF- Adequação de Taguatinga - Div DF-GO	50600.029434/2024-86	0391/24-12		Processo licitatório finalizado. Aguardando a assinatura do contrato.											

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
