




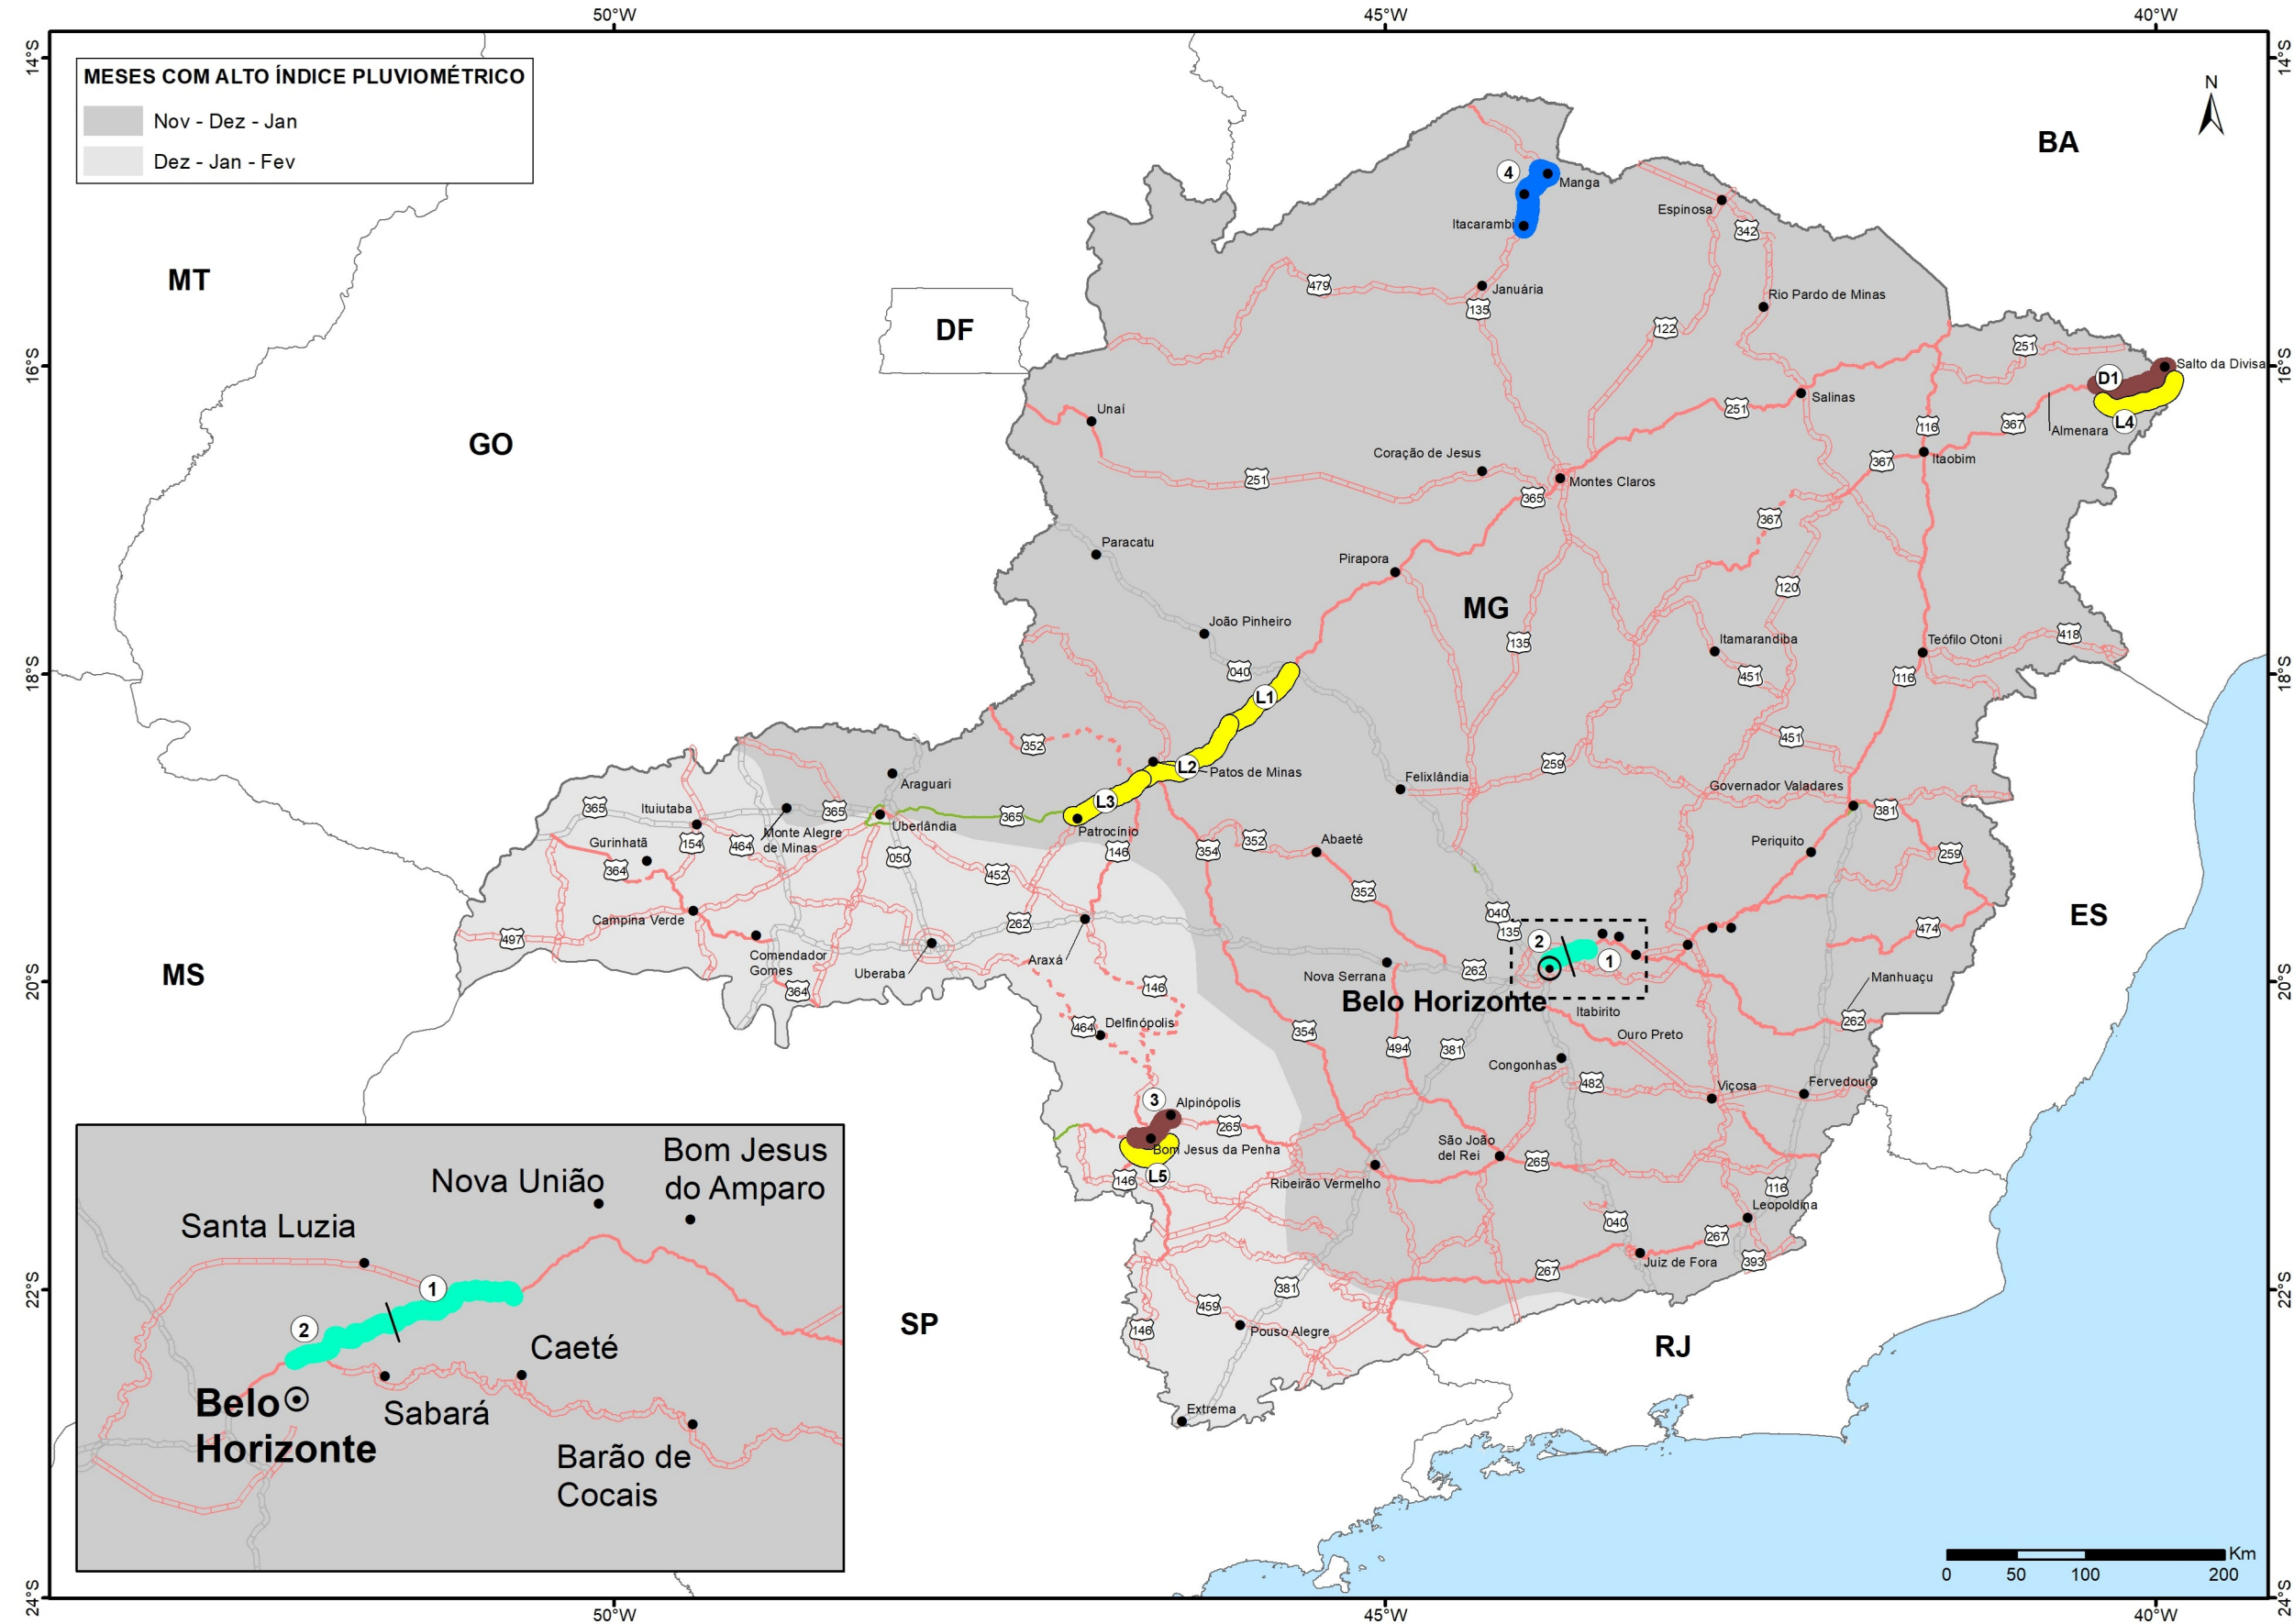

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL

MINAS GERAIS



Legenda:

Sede municipal

Capital Estadual

Limite de contrato

Rodovia Estadual

Rodovia Federal

Pavimentada

Não pavimentada

Planejada

Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH.

IMPLANTAÇÃO

ADEQUAÇÃO-REST./MELH.


A LICITAR

18,00 Km

71,03 Km

57,41 Km

Total 146,44 Km

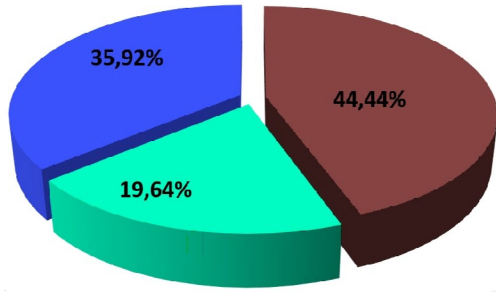

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra Direta																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1		10IX	2-3	8A	00 00619/2024	CONSORCIO BR-381/MG - CLC/CONSERVA	BR-381	422,40 440,40	18	Duplicação da BR-381.	17/10/2024	25/09/2028	R\$ 393.742.699,38	0%	Projetos sendo elaborados. Entrega do Projeto Executivo previsto para Dez/25.		Edital 0483/24-06	Em licitação
2		10IX	2-3	8B	00 00041/2025	CONSORCIO CLC / CONSERVA / TECNOGEO	BR-381	445,00 458,40	13,4	Lote 8B	<Null>	<Null>	R\$ 509.942.738,12	0%	Contrato assinado em 29/05/2025.		Edital 0483/24-06	Em licitação
3	2029	7XJO	2-3	Unico	06 00298/2023	PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA	BR-265	546,80 582,00	9,43	Remanescentes de implantação e pavimentação.	13/06/2023	26/09/2025	R\$ 79.011.287,29	46,58%	Obra em andamento, com 4,91 km já entregues. Dependendo do tratamento do solo mole.		06 00416/2022	TRIANGULAR ENGENHARIA LTDA
4	2028	10IW	2-3	Unico	00 00277/2022	CONSORCIO LCM / APIA / HOLLUS	BR-135	82,00 139,41	57,41	Adequação/Restauração e melhoramentos.	27/09/2022	19/01/2026	R\$ 260.244.803,46	1,95%	Em fase de execução dos projetos. Previsão de ordem de início para Jul/25.		06 00331/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2026	13XG	2-3	TED-403/2022	DEC - Exército Brasileiro	BR-367	0,00 61,60	61,6	Remanescente de implantação do Contrato 06 01040/2018	25/08/2022	04/08/2026	R\$ 328.741.747,74		R\$ 0,00	R\$ 328.741.747,7	12,57%	Em análise pelo fiscal para redução do escopo para 15,35 km. Previsão de entrega de 9 km em 2025.		06 00834/2020	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISÃO

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2498	7XX1	2	BR-365	278,00 336,70	Adequação de capacidade - Lote 1	50606.001034/2024-56		Projetos aprovados. Licitação prevista para Jun/25.			
L2	2498	7XX1	2	BR-365	336,70 418,30	Adequação de capacidade - Lote 2	50606.001034/2024-56		Projetos aprovados. Licitação prevista para Jun/25.			
L3	2498	7XX1	2	BR-365	418,30 476,20	Adequação de capacidade - Lote 3			Projetos sendo analisados pela DPP. Sem LP até o momento.			
L4	2026	13XG	2-3	BR-367	0,00 46,28	Remanescente do TED 403/2022			Supervisora está avaliando projeto. Será feita licitação integrada prevista para Ago/25		06 00120/2025	ENECON ENGENHARIA LTDA
L5	2029	7XJO	2-3	BR-265	573,00 577,80	Tratamento de solo mole na BR-265/MG			Projetos aprovados e licitação prevista para Maio/25.			

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
