


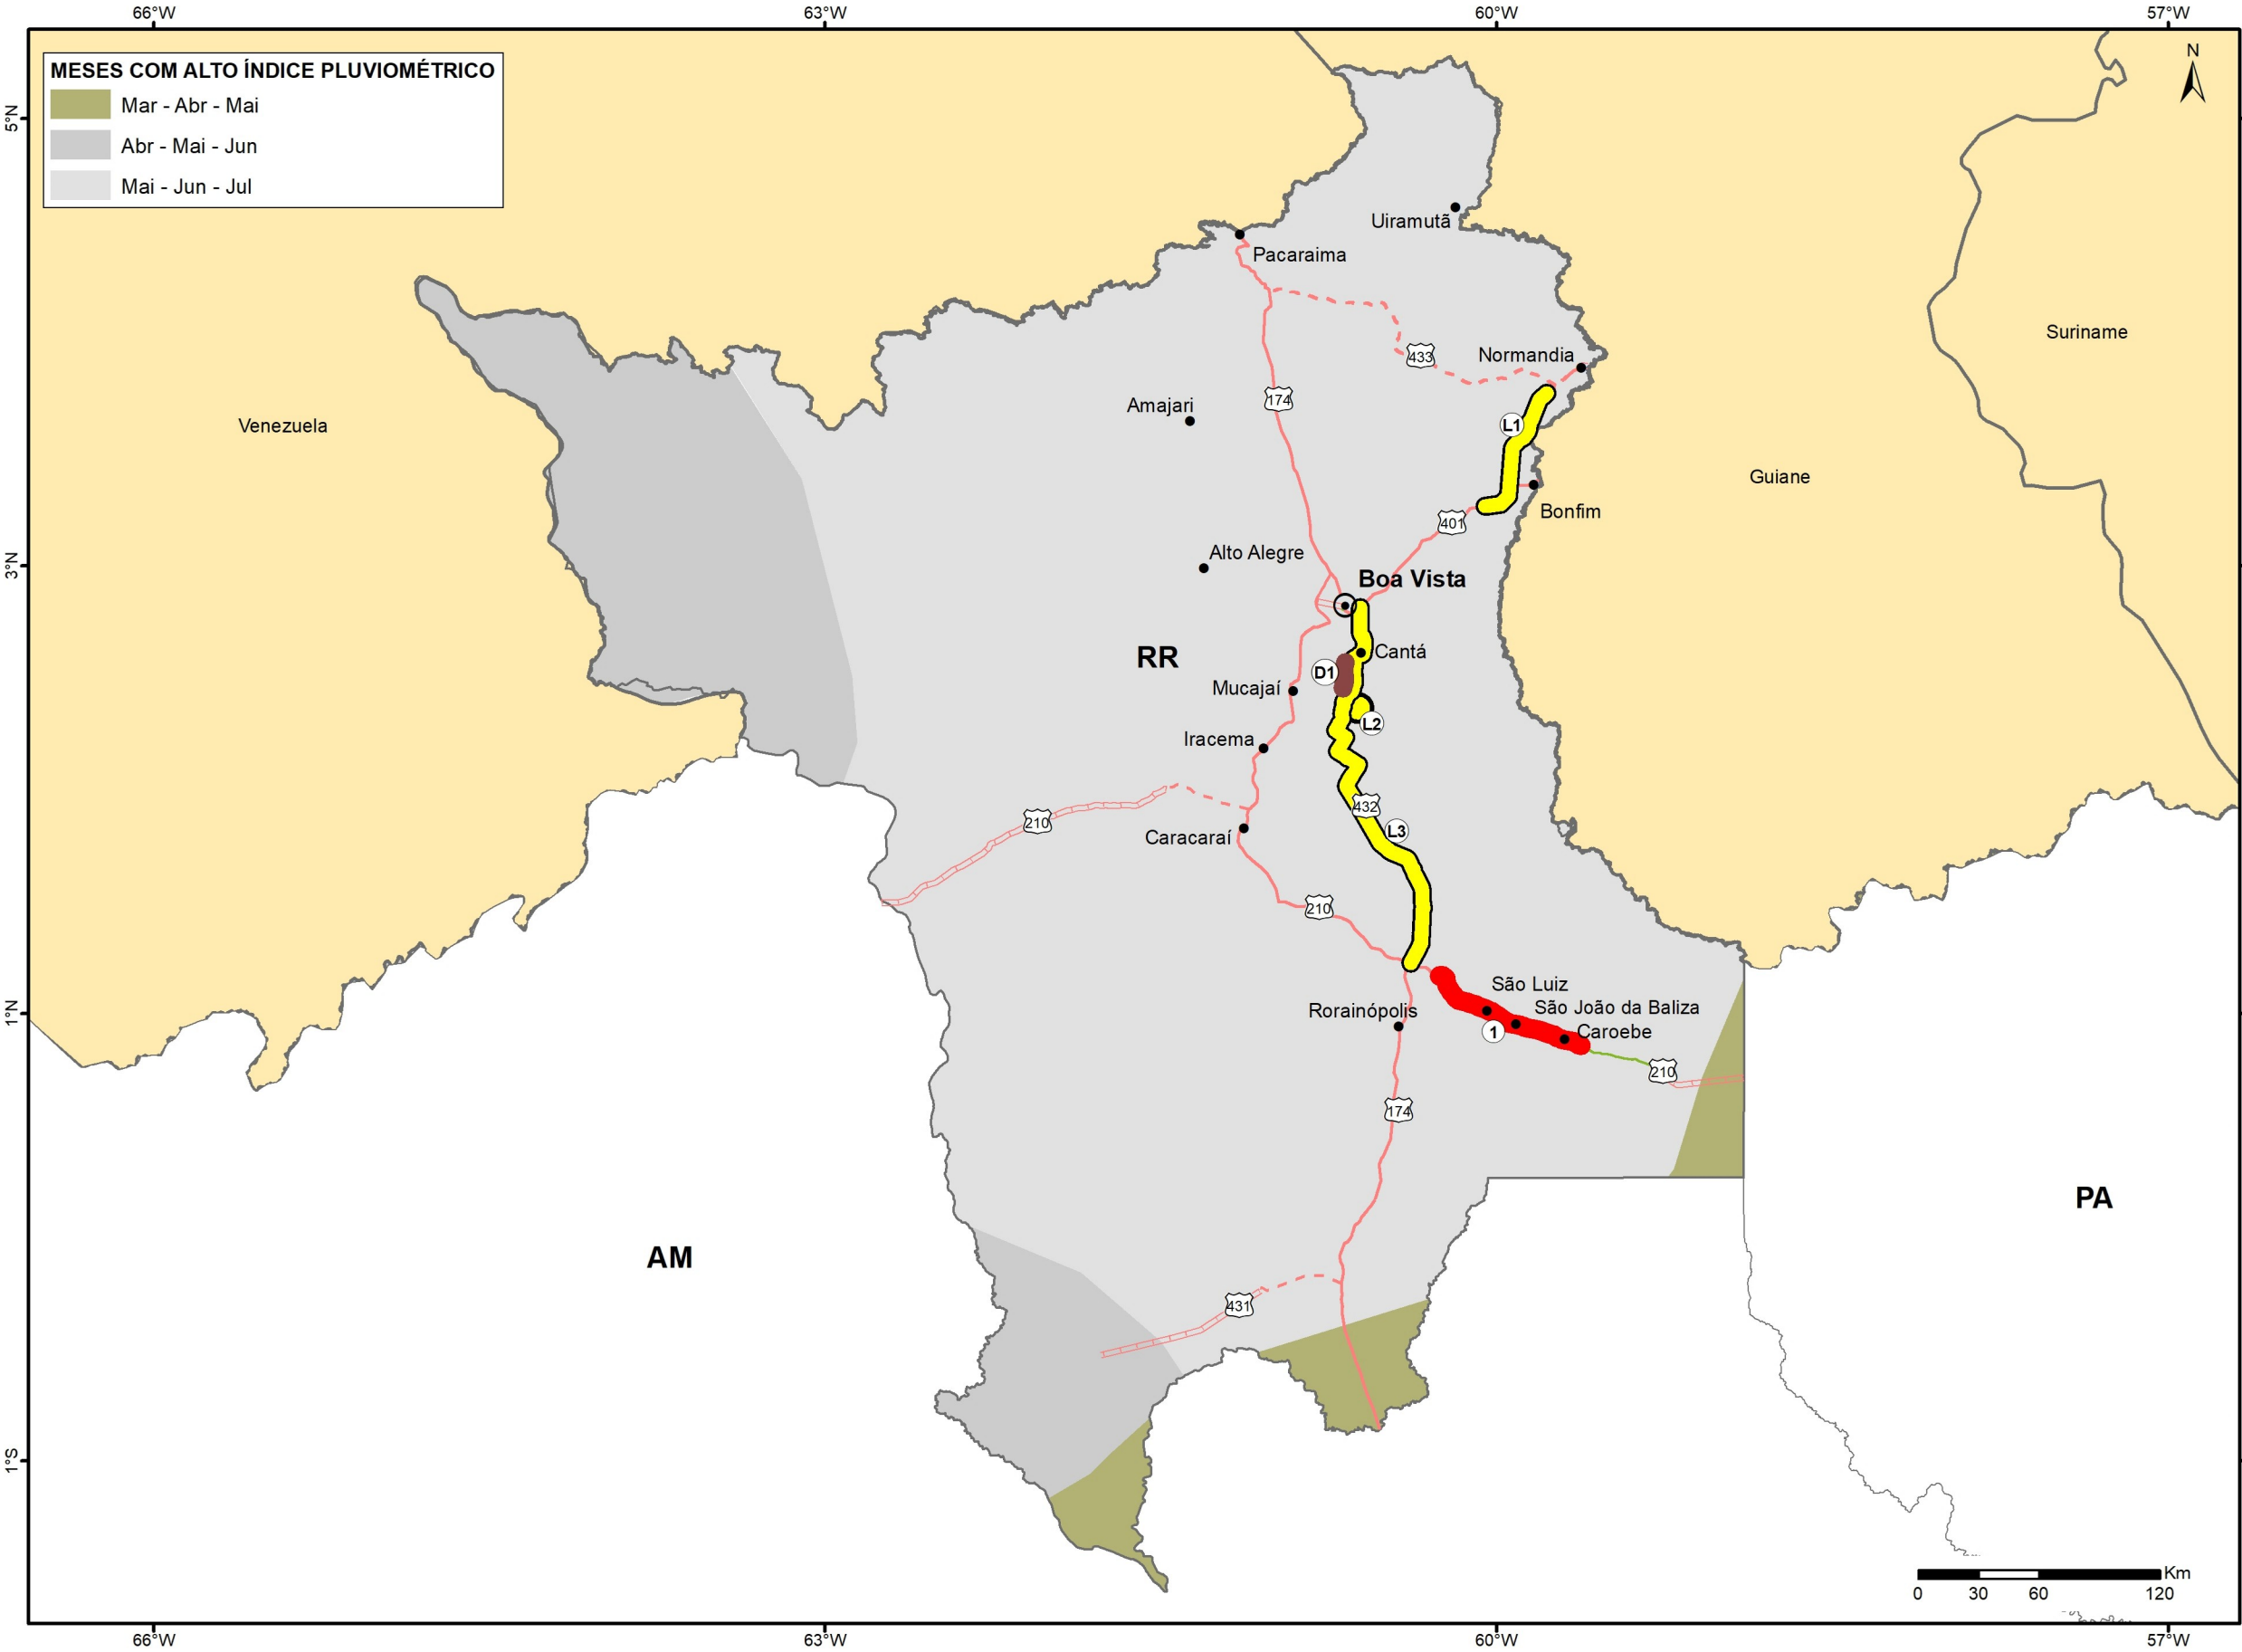

Obra Direta																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	4245	15ZV	2-3	Unico	26 00008/20	CONSTRUTORA SINARCO LTDA	BR-210	84,20 167,30	0,37	Construção de cinco pontes	13/01/2024	10/07/2025	R\$ 55.043.301,33	31,43%	Risco de atraso na execução dos serviços que envolvem materiais pétreos, em função da alta demanda na região.		TT-247/2025	CONSORCIO ALTA-NE

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1				TED-622/2017	EXÉRCITO BRASILEIRO - 6º BEC	BR-432	167,60 180,30	12,7	Implantação e pavimentação da BR-432/RR	26/10/2017	14/10/2024	R\$ 38.377.764,50		R\$ 0,00	R\$ 38.377.764,50	99%	Obra concluída. O Termo de Recebimento Provisório da obra já foi emitido e assinado. Aguardando prestação de contas do TED para emissão de Termo de Recebimento Definitivo.			

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)		EDITAL	SUPERVISÃO		EMPRESA SUPERVISORA
L1	2074	7V99	3	BR-401	107,00 177,00	Ação 7V99 - Construção Bonfim - Normandia - km 107 ao km 177			Projetos em análise pela DPP. Previsão de licitação no 2º semestre/2025.					
L2	4244	7242	2-3	BR-432	168,00 168,10	Ponte sobre o Rio Cachorro	50009.001111/2023-26	0542/23-26	Suspenso o processo licitatório por ordem da SJRR. Foi delegada competência para a SR/RR voltar à fase de licitação.		0321/24-00	Edital 0321/24-00		CONSÓRCIO ALTA-NOVA ENGEVIX
L3	4244	7242	2-3	BR-432		Construção de 16 OAEs		640/2023	Em elaboração de estudos e projetos pela DPP até 2026.					

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
