





- Legenda:**
- Sede municipal
  - Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Planejada

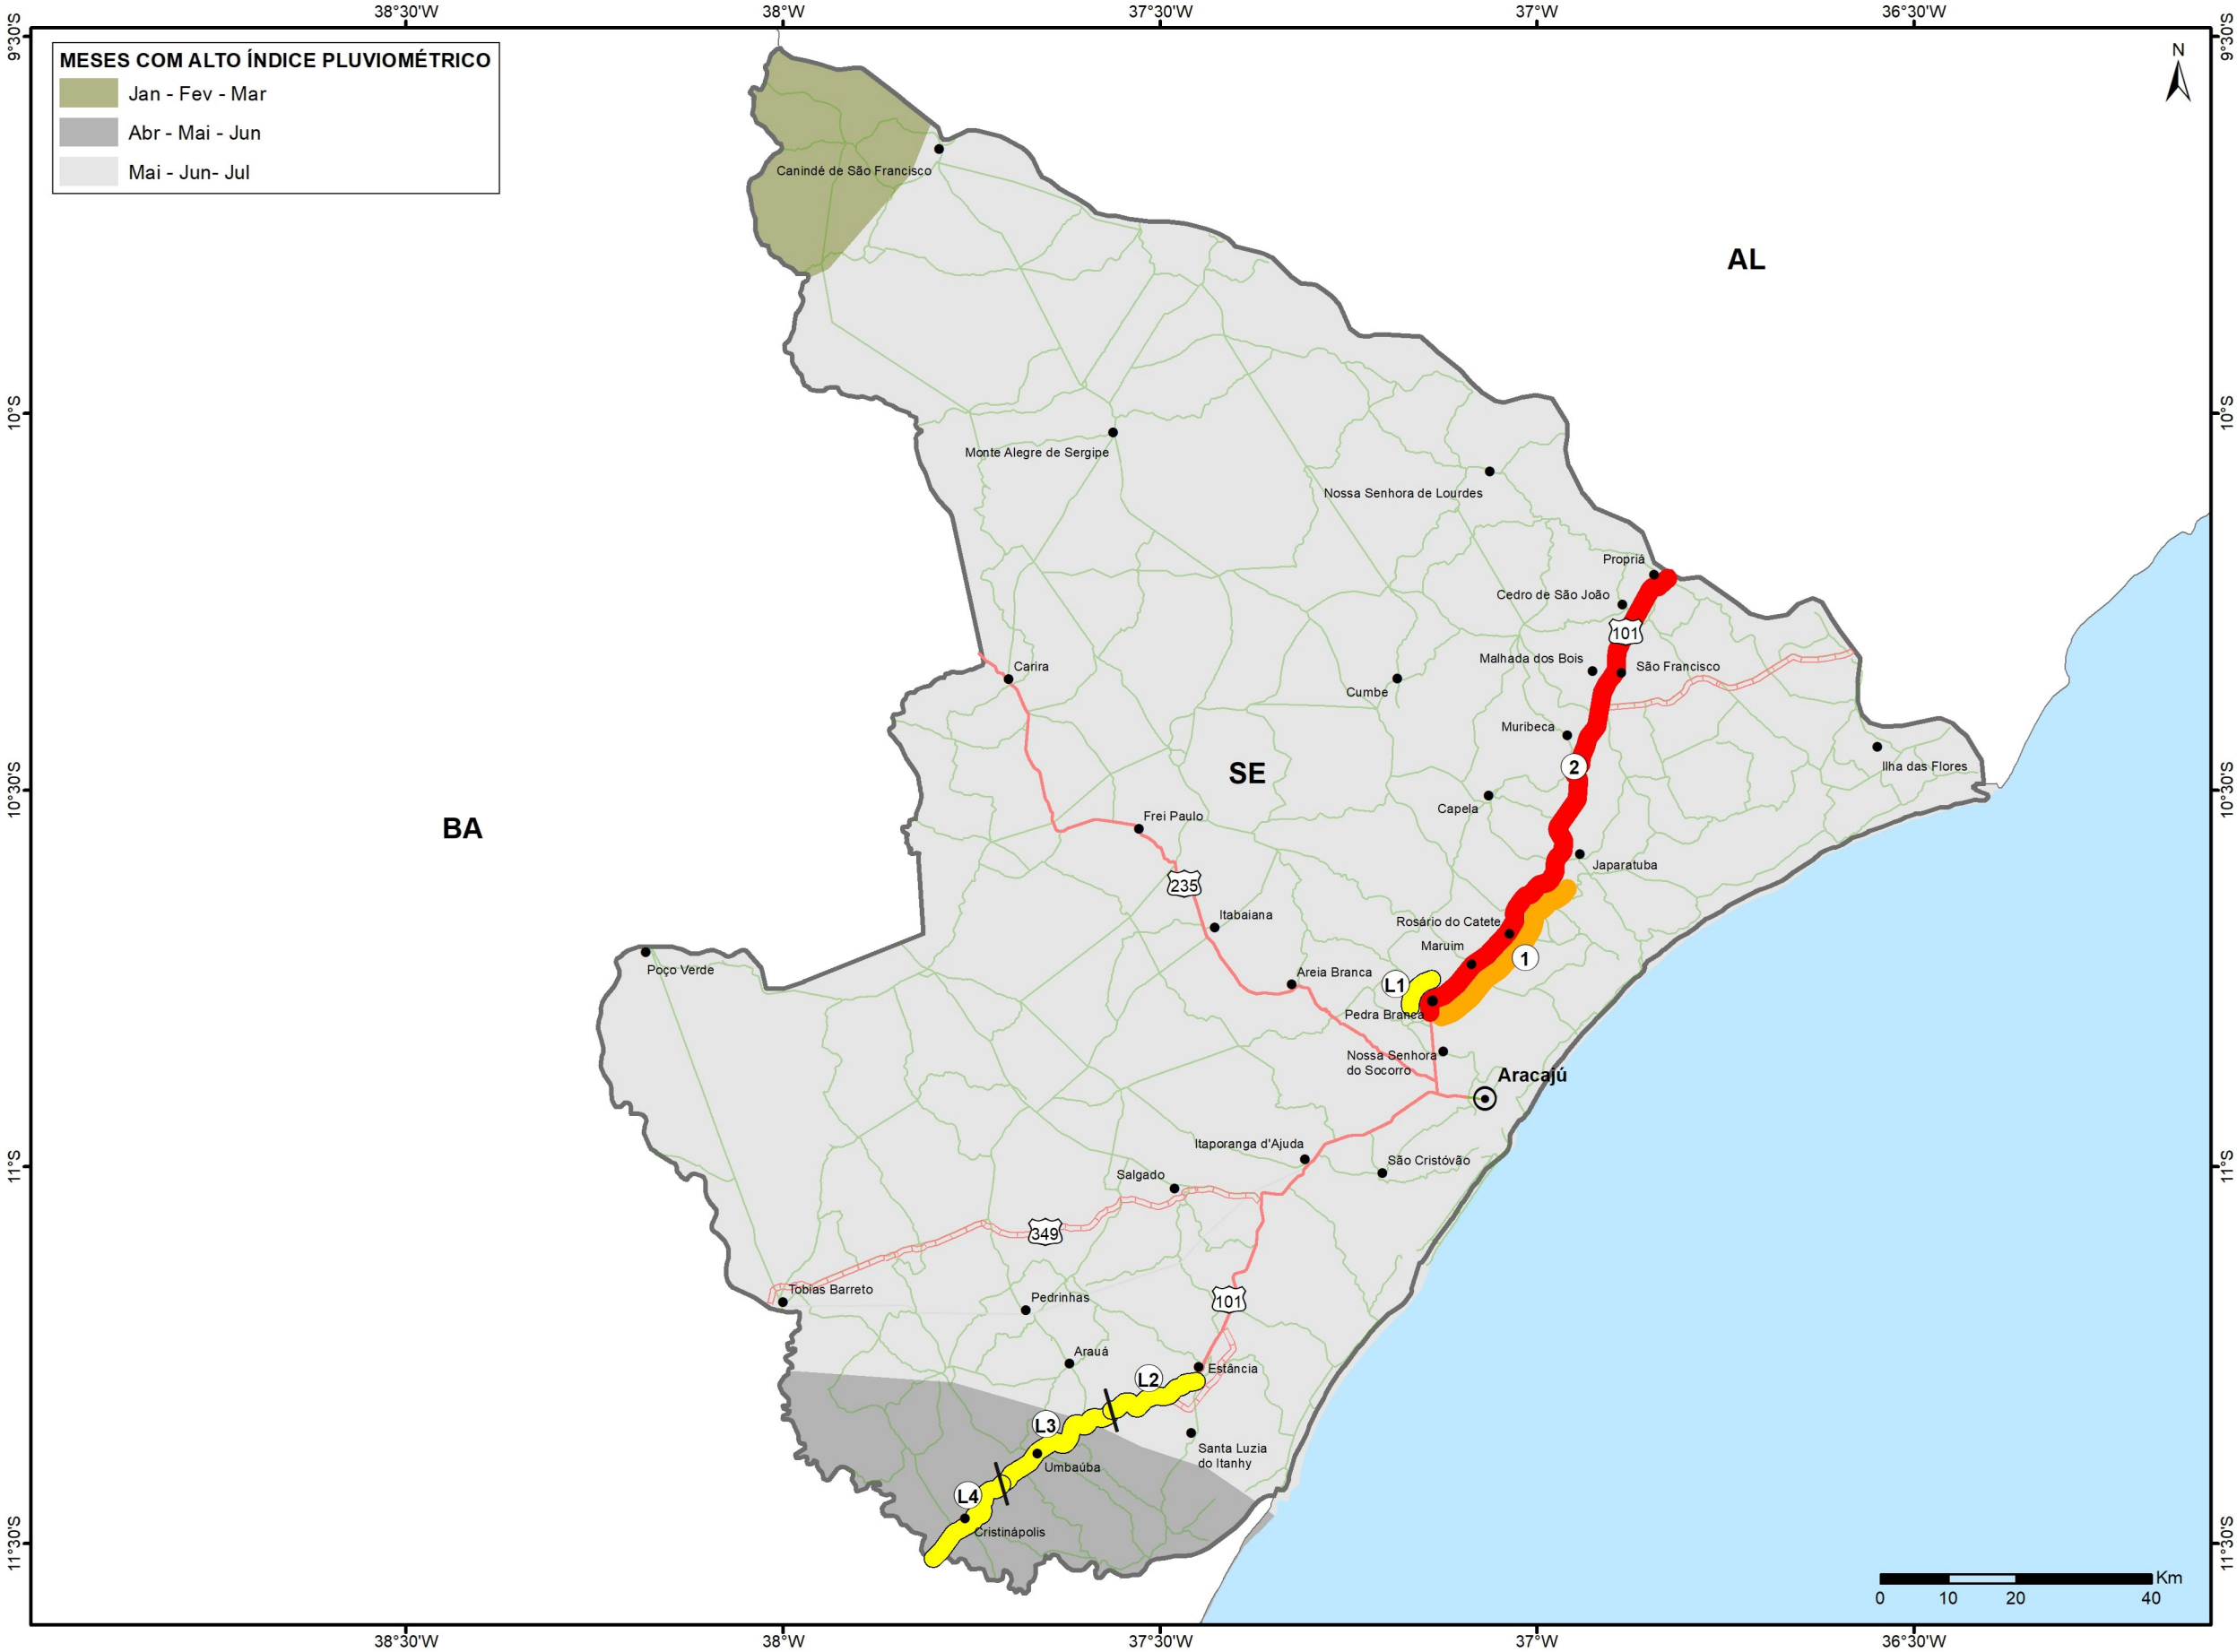

\* Contrato envolvendo obras de OAEs ao longo do trecho da rodovia. Devido à quantidade de OAEs, o contrato encontra-se representado por um segmento formado pela localização da primeira e última OAEs.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

| Obra Direta |        |      |    |       |               |                        |        |        |       |                 |                                        |            |                     |                    |                              |                                                                                                                                      |                     |                                       |
|-------------|--------|------|----|-------|---------------|------------------------|--------|--------|-------|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| OBRA        | ID PAC | AÇÃO | RP | LOTE  | CONTRATO      | EMPRESA                | BR     | TRECHO | EXT   | OBJETO RESUMIDO | INÍCIO                                 | TÉRMINO    | VALOR OBRA (PI+A+R) | EXEC. FINANC.      | SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025) | SUPERVISÃO                                                                                                                           | EMPRESA SUPERVISORA |                                       |
| 1           | 3085   | 110Q | 3  | 2.2   | 21 00409/2021 | CONSTRUTORA LUIZ COSTA | BR-101 | 51,80  | 77,30 | 25,5            | Remanescente do contrato 21 00127/2019 | 23/08/2021 | 31/03/2026          | R\$ 211.107.486,37 | 29,65%                       | Obra em andamento com atividades de terraplanagem, drenagem e sinalização. RFFO em andamento para definição de remanescente de obra. | 21 00923/2024       | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A |
| 2           | 3085   | 110Q | 3  | Unico | 21 00512/2024 | MATERA ENGENHARIA LTDA | BR-101 | 1,20   | 77,30 | 0               | Remanescente de OAEs e Passarelas      | 12/08/2024 | 03/05/2026          | R\$ 22.287.020,31  | 1,66%                        | Em fase de elaboração de projetos. Planejada a conclusão das obras até o final do ano de 2025.                                       | 21 00923/2024       | CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A |

| Obra a licitar |        |      |    |        |        |        |                                               |                      |                              |                                                                                                                                                 |  |  |            |                     |              |
|----------------|--------|------|----|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|---------------------|--------------|
| A LICITAR      | ID PAC | AÇÃO | RP | BR     | TRECHO | OBJETO | PROCESSO DA LICITAÇÃO                         | EDITAL               | SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025) |                                                                                                                                                 |  |  | SUPERVISÃO | EMPRESA SUPERVISORA |              |
| L1             |        | 110Q | 3  | BR-101 | 77,00  | 78,30  | Remanescente da Travessia de Pedra Branca     | 50621.001072/2023-30 | 0469/24-21                   | Homologada a adjudicação ao Consórcio HB20/CLPT, vencedor da Concorrência Eletrônica nº 469/2024                                                |  |  |            | Edital 0322/24-21   | Em licitação |
| L2             | 2106   | 110R | 3  | BR-101 | 152,60 | 168,60 | Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.1 | 50600.000205/2025-61 | 0116/25-00                   | Processo licitatório em andamento. Previsão de assinatura de contrato em agosto/2025.                                                           |  |  |            | Edital 0477/24-21   | Em licitação |
| L3             | 2106   | 110R | 3  | BR-101 | 168,60 | 189,00 | Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.2 |                      |                              | Previsão de lançamento do edital para contratação integrada em jun./2025, com assinatura do contrato no 2º semestre e início das obras em 2026. |  |  |            | Edital 0477/24-21   | Em licitação |
| L4             | 2106   | 110R | 3  | BR-101 | 189,00 | 206,10 | Duplicação Estância a Divisa SE/BA - Lote 5.3 |                      |                              | Previsão de lançamento do edital para contratação integrada em mai./2025, com assinatura do contrato no 2º semestre e início das obras em 2026. |  |  |            | Edital 0477/24-21   | Em licitação |

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
