



# **Ministério da Integração Nacional**

## **Secretaria de Infraestrutura Hídrica**

# **Alteração da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do PISF**

**Brasília, DF, 14/12/2011**

# Histórico do Pedido de Outorga do PISF

- Fev/2001 – MI solicita à ANA pedido de outorga preventiva para o PISF
- Jan/2005 – Outorga preventiva conferida pela Resolução ANA n.º 29/2005
- **Set/2005 – Resolução ANA n.º 411, de 26 de setembro de 2005 → Outorga de direito de uso de recursos hídricos do rio São Francisco para captação de água para o PISF, com validade de 20 anos.**

# Resolução ANA nº 411, de 22 de setembro de 2005

## Condicionantes

I. Início da implantação física do empreendimento em até dois anos, contados da data de publicação desta Resolução.



II. Início da implantação física do empreendimento em até dois anos, contados da data de publicação desta Resolução.



# **Resolução ANA nº 411, de 22 de setembro de 2005**

## **Condicionantes**

III. Início da operação da primeira fase do empreendimento em até seis anos, contados da data de publicação desta Resolução.

**Obra não concluída**

IV. Implantação, até o início da operação da primeira fase do empreendimento, da cobrança pelo serviço de adução de água bruta, no âmbito da União e dos Estados beneficiados, com valores que cubram os custos de operação e manutenção do empreendimento.

**Obra não concluída  
Ainda em estudos**

# Início de Operação da Fase de testes do Empreendimento

DEZEMBRO  
2012



## LEGENDA


### EIXO NORTE

- Meta 1 – Captação até Res. Jati
- Meta 2A – Res. Jati até Res. Porcos
- Meta 2B – Res. Porcos até Res. Calçara

### EIXO LESTE

- Meta 1 – Captação até Res. Areias
- Meta 2 – Res. Areias até Res. Barro Branco
- Meta 3 – Res. Barro Branco até Res. Poções


# SITUAÇÃO DAS OBRAS POR LOTE

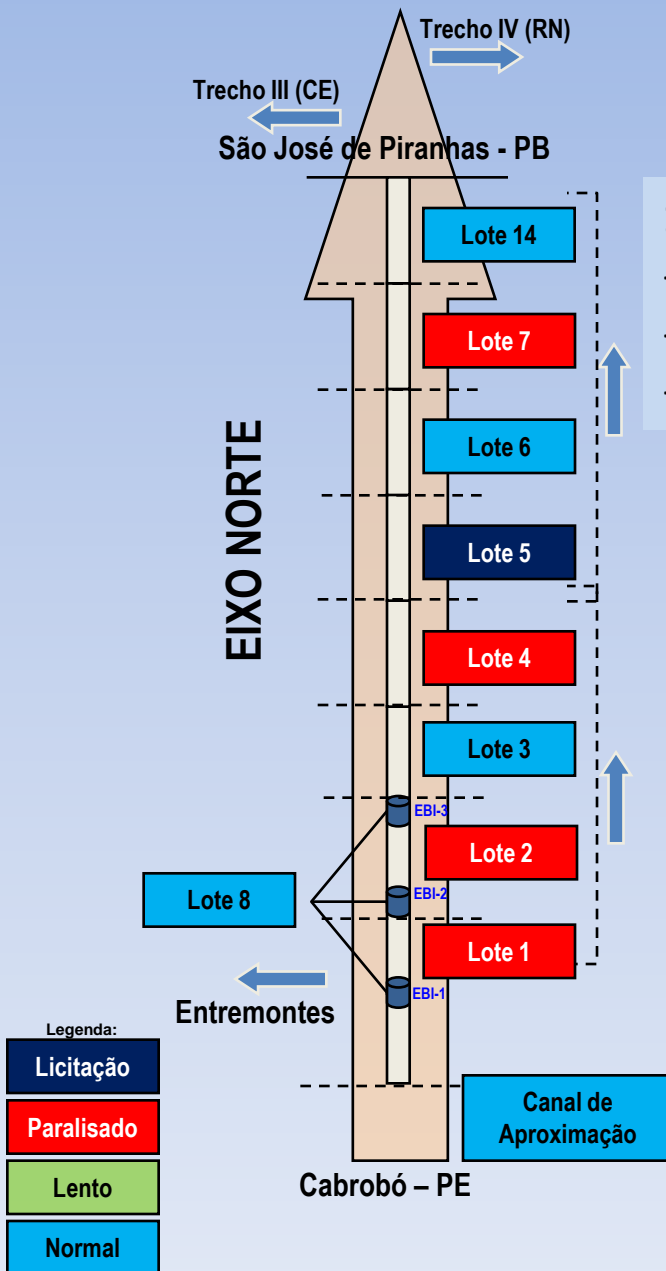

## 16 lotes de obras

- Dois lotes a cargo do Comando do Exército
- 13 lotes licitados, em execução
- 1 lote a licitar

- EIXO NORTE: 46%
- EIXO LESTE: 71%

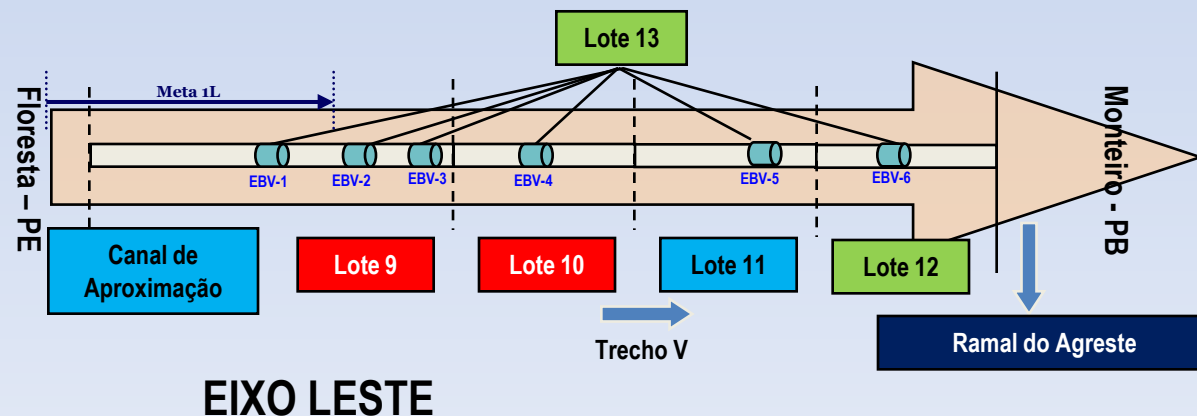

# Ritmo atual

Revisão e conclusão de  
projetos executivos

Adequações contratuais:  
aditivos e supressões

Rescisões parciais

Novas contratações

**Projetos: 86%**

**Bombas: 71%**

**Sistema Elétrico: 47%**

**Meio Ambiente: 56%**

**Projetos: 86%**

**Bombas: 71%**

**Sistema Elétrico: 47%**

**Meio Ambiente: 56%**





# Equipamentos

**Investimento: R\$ 431 milhões**

**Motobombas em fase final de construção**

**Ritmo normal na construção das linhas de transmissão e sistemas elétricos**

**Construção dos Sistemas informatizados de controle também em ritmo normal**

**Futuras instalação do centro de controle:**

- **Licitação autorizada**
- **Sede: Salgueiro**

- **Sistemas elétricos: 45%**

- **Equipamentos: 71%**






# Meio Ambiente

## 38 Programas Básicos Ambientais

- Estudos do semiárido e do bioma da caatinga
- Levantamentos de Flora e Fauna
- Projetos de Saneamento de Municípios da área dos canais
- Assentamentos rurais para as famílias atingidas pelas desapropriações
- Melhorias estruturais para comunidades indígenas e quilombolas
- Levantamentos arqueológicos



# PISF

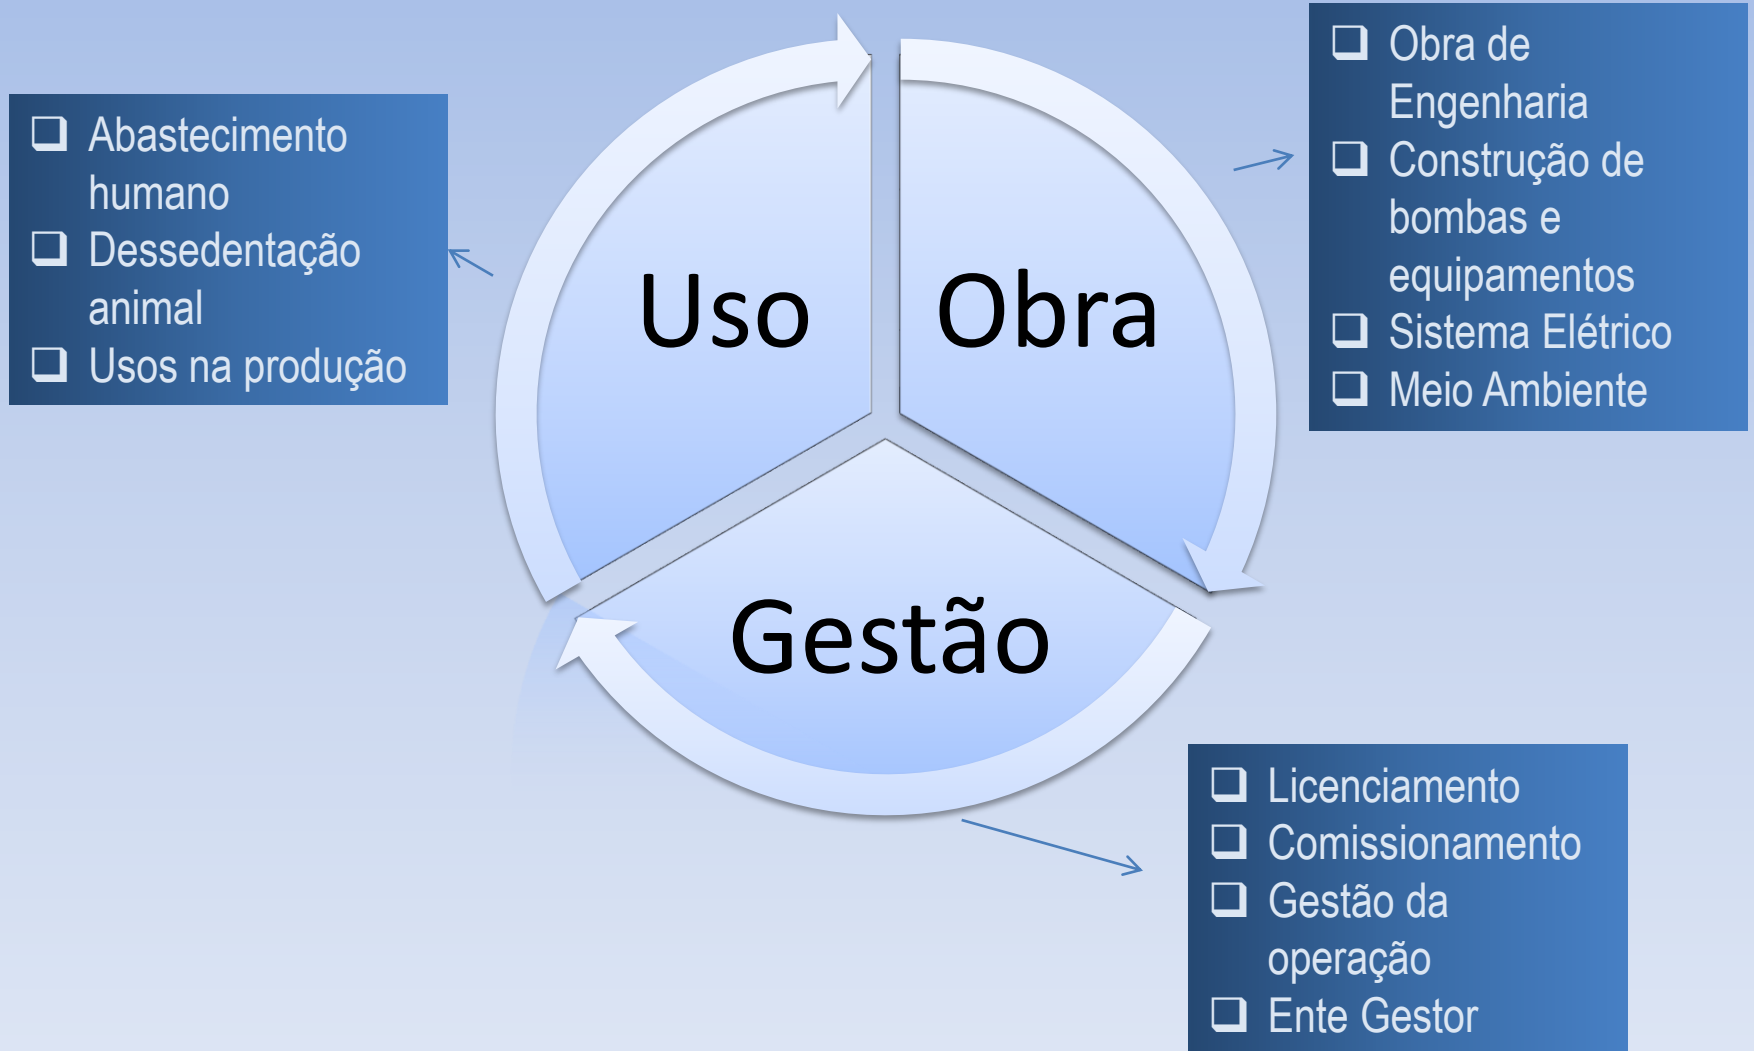



## Augusto Wagner Padilha Martins

Secretário da Infraestrutura Hídrica

Ministério da Integração Nacional

[augusto.wagner@integracao.gov.br](mailto:augusto.wagner@integracao.gov.br) – tel.: (61) 34145828
