












SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	A	Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP/PB	SOLUÇÃO ENTREGUE	
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO ENTREGUE	
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO ENTREGUE	
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO ENTREGUE	
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO ENTREGUE	
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	OBRA EM EXECUÇÃO	
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	OBRA EM EXECUÇÃO	
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
9	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	OBRA EM EXECUÇÃO	
10	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
11	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	OBRA EM EXECUÇÃO	
12	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	OBRA EM EXECUÇÃO	
13	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	OBRA EM EXECUÇÃO	
14	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	OBRA EM EXECUÇÃO	

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS PARALISADAS

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	OBRA PARALISADA 
2	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	OBRA PARALISADA 
3	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	OBRA PARALISADA 

PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Ana Nery/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
2	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
3	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre	EM PROCESSO LICITATÓRIO
4	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO
5	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
6	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
7	A	Hospital Santa Marcelina- São Paulo/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
2	A	Instituto do Câncer do Ceará /ICC - Fortaleza/CE	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
3	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
4	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
5	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
6	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
7	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
8	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
9	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
10	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA









SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
11	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
12	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
13	C	Hospital Marieta Konder/SC	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
14	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
15	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
16	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
17	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
18	C	Hospital Geral de Roraima/RR	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
19	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
20	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
21	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA









SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	REANÁLISE 
2	C	Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ	REANÁLISE 
3	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	REANÁLISE 
4	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	REANÁLISE 
5	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	REANÁLISE 
6	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	REANÁLISE 
7	C	Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE	REANÁLISE 
8	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	REANÁLISE 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
9	C	Hospital N. Sra da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC	REANÁLISE 
10	C	Hospital Universitário Severino Sombra/RJ	REANÁLISE 
11	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	EM ANÁLISE 
12	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE 
13	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	EM ANÁLISE 
14	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	EM ANÁLISE 
15	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE 
16	A	Hospital do Câncer III/HC III/INCA	EM ANÁLISE 

LEGENDA

A Ampliação

C Construção

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO











	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP	ANÁLISE DE TITULARIDADE NA CONJUR
2	C	Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
3	C	Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS	AGUARDANDO RESOLUÇÃO DA FILANTROPIA
4	A	Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO
5	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	AGUARDANDO AVALIAÇÃO REFERENTE À ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
6	C	Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO PELO COMITÊ GESTOR (SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL)
7	C	Hospital Geral de Palmas/TO	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO




SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EXCLUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital de Referência de Araguaína/TO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
2	A	Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
3	A	Fundação Hospital Centenário-São Leopoldo /RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
4	C	Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
5	A	Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB - São Luís/MA	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
6	A	Associação Beneficente Douradense - Dourados	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
7	C	Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho/RO	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
8	C	Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
9	C	Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
10	C	Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
11	A	Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
12	A	Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
13	C	Hospital Regional de Assis - Assis/SP	EXCLUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		25/02/2015
ORDEM DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016
INAUGURAÇÃO		28/11/2016

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação

Valor da Obra: R\$ 2.471.731,37

Valor Equipamento: R\$ 1.923.709,47

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 114.230,25











Valor da Solução: R\$ 4.527.132,70






VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		16/04/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017
INAUGURAÇÃO		13/05/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação



Valor da Obra: R\$ 2.711.598,95

Valor Equipamento: R\$ 1.923.709,47

Valor Projeto: R\$ 17.312,15











Valor Fiscalização: R\$ 93.461,11




Valor da Solução: R\$ 4.746.081,68

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		28/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017
INAUGURAÇÃO		12/06/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.947.158,42

Valor Projeto: R\$ 15.958,20











Valor Fiscalização: R\$ 76.499,65




Valor da Solução: R\$ 4.516.822,11

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		19/06/2015
ORDEM DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		24/07/2017
INAUGURAÇÃO		26/07/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R\$ 1.947.158,42

Valor Projeto: R\$ 16.418,01





Valor Fiscalização: R\$ 136.730,14




Valor da Solução: R\$ 4.600.306,73

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		26/08/2015
ORDEN DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017
INAUGURAÇÃO		27/11/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 1.975.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00










Valor Fiscalização: R\$ 99.691,85




Valor da Solução: R\$ 4.019.921,39

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		20/12/2017
INAUGURAÇÃO		29/12/2018











-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.912.446,24
Valor Projeto: R\$ 17.765,81
Valor Fiscalização: R\$ 76.845,80
Valor da Solução: R\$ 5.027.057,85

[VOLTAR](#)

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		14/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		15/01/2018
INAUGURAÇÃO		29/01/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.907.454,15

Valor Projeto: R\$ 18.100,78











Valor Fiscalização: R\$ 120.807,14




Valor da Solução: R\$ 4.176.359,10

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		11/04/2018
INAUGURAÇÃO		27/04/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.490.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.907.454,15

Valor Projeto: R\$ 15.836,87








Valor Fiscalização: R\$ 85.499,61




Valor da Solução: R\$ 4.498.790,63

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		80%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/01/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/04/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		13/06/2018
INAUGURAÇÃO		09/07/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Aguardando processo de licitação.
O pedido de importação foi cancelado.



Valor da Obra: R\$ 2.780.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 20.499,22



Valor Fiscalização: R\$ 59.538,19




Valor da Solução: R\$ 4.828.045,66

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		61%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		14/01/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/04/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		11/06/2018
INAUGURAÇÃO		07/07/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada.



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 19.908,40








Valor Fiscalização: R\$ 122.191,75




Valor da Solução: R\$ 4.610.108,40

VOLTAR 



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		03/03/2017
ORDEN DE SERVIÇO		13/07/2017
OBRA CIVIL		55%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		10/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/03/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		07/05/2018
INAUGURAÇÃO		02/06/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.170.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 17.123,12











Valor Fiscalização: R\$ 56.768,97

Valor da Solução: R\$ 4.211.900,34

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEN DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/05/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		13/07/2018
INAUGURAÇÃO		08/08/2018




Concluído



Em andamento



Não iniciado

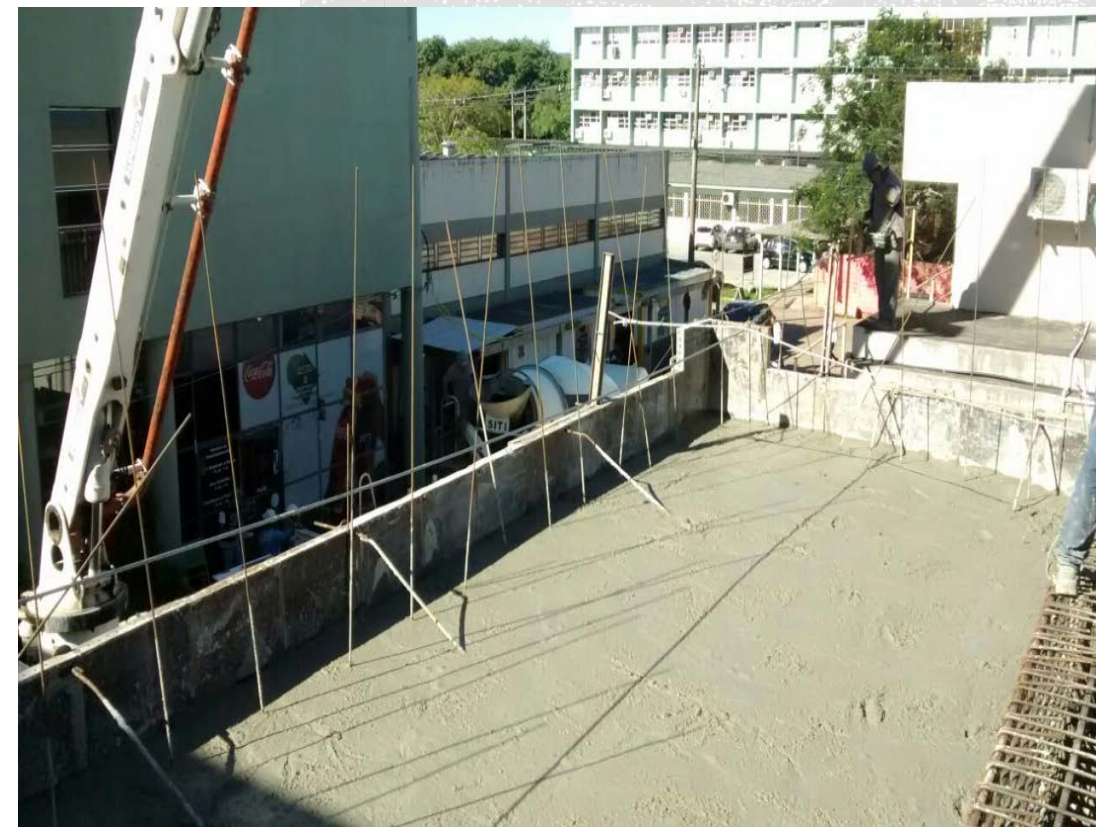Obs. Obra paralisada.

Valor da Obra: R\$ 2.512.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 17.566,24










Valor Fiscalização: R\$ 95.538,02




Valor da Solução: R\$ 4.593.112,51

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO		15/05/2015
LICITAÇÃO		15/05/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/07/2017
OBRA CIVIL		30%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		23/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/03/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		20/05/2018
INAUGURAÇÃO		15/06/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 19.532,11









Valor Fiscalização: R\$ 59.884,34




Valor da Solução: R\$ 4.447.424,70

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO		19/03/2015
LICITAÇÃO		20/03/2017
ORDEN DE SERVIÇO		06/07/2017
OBRA CIVIL		30%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/03/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		12/05/2018
INAUGURAÇÃO		07/06/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 17.549,53






Valor Fiscalização: R\$ 67.153,54




Valor da Solução: R\$ 4.809.711,32

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		30/05/2017
ORDEM DE SERVIÇO		19/09/2017
OBRA CIVIL		16%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/01/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		17/04/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		14/06/2018
INAUGURAÇÃO		10/07/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.248.498,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 18.100,78







Valor Fiscalização: R\$ 42.230,58




Valor da Solução: R\$ 4.276.837,61

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		07/07/2017
ORDEN DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		16%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/01/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		24/04/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		21/06/2018
INAUGURAÇÃO		17/07/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25

Valor Projeto: R\$ 17.657,67










Valor Fiscalização: R\$ 49.845,93




Valor da Solução: R\$ 4.490.511,85


VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		31/05/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		8%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		21/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/05/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		25/07/2018
INAUGURAÇÃO		20/08/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

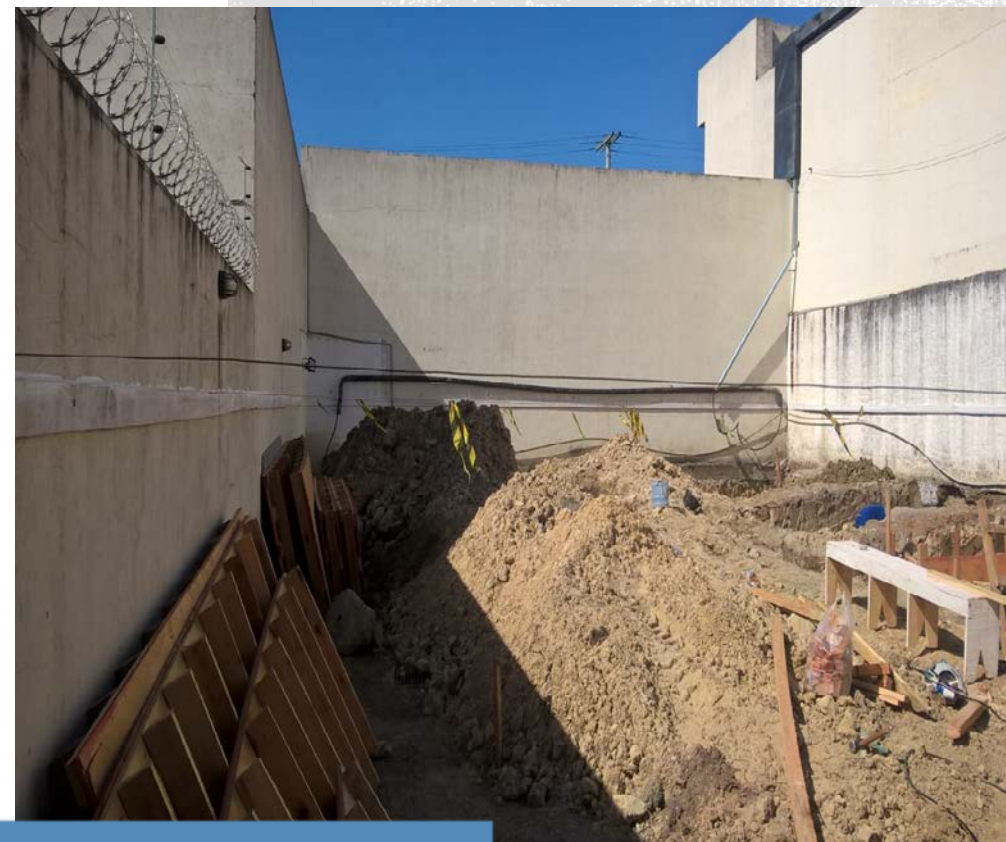

Valor da Obra: R\$ 2.184.980,00
Valor Equipamento: R\$ 1.968.008,25
Valor Projeto: R\$ 17.595,25
Valor Fiscalização: R\$ 49.845,93
Valor da Solução: R\$ 4.220.429,42

VOLTAR



Hospital Universitário Walter Cantídio/UFCE – Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer	Aprovado



Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado



Hospital Universitário Severino Sombra/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer	Aguardando Parecer



Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer

VOLTAR

Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Reprovado	Aguardando Parecer



Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Guarapuava/PR

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aguardando Parecer	Aguardando Parecer



Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Em Análise	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital São José – Teresópolis/RJ

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital Universitário Santa Terezinha/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue



Hospital do Câncer III/HC III/INCA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue

