

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/FAP/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
11	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
16	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
17	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	OBRA EM EXECUÇÃO	
18	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	OBRA EM EXECUÇÃO	
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	OBRA EM EXECUÇÃO	
20	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
21	A	Instituto do Câncer do Ceará/ICC - Fortaleza/CE	OBRA EM EXECUÇÃO	
22	C	Hospital Geral de Roraima/RR	OBRA EM EXECUÇÃO	
23	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
24	A	Hospital Ana Nery/RS	OBRA EM EXECUÇÃO	
25	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
26	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	OBRA EM EXECUÇÃO	
27	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
28	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	OBRA EM EXECUÇÃO	
29	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
30	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	OBRA EM EXECUÇÃO	

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
31	C	Hospital Marieta Konder/SC	OBRA EM EXECUÇÃO 
32	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	OBRA EM EXECUÇÃO 
33	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	OBRA EM EXECUÇÃO 
34	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 
35	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 
36	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	OBRA EM EXECUÇÃO 
37	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária – Sinop/MT	OBRA EM EXECUÇÃO 
38	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	OBRA EM EXECUÇÃO 
39	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 
40	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 
41	C	Hospital N. Sra da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC	OBRA EM EXECUÇÃO 
42	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	OBRA EM EXECUÇÃO 
43	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 
44	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	OBRA EM EXECUÇÃO 
45	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	OBRA EM EXECUÇÃO 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
46	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	OBRA EM EXECUÇÃO 
47	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	OBRA EM EXECUÇÃO 

SUSPENSO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	SUSPENSO 

PROJETO EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Cura D'ars/ Sociedade Beneficente São Camilo/CE	EM PROCESSO LICITATÓRIO

PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
2	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

EM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	EM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
2	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	EM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
3	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	EM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
4	C	Hospital Universitário Severino Sombra/RJ	EM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	REANÁLISE 
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE 
3	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	EM ANÁLISE 
4	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE 
5	A	Hospital do Câncer III/HC III/INCA	EM ANÁLISE 
6	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	EM ANÁLISE 
7	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	EM ANÁLISE 
8	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM ANÁLISE 

PROJETOS SUBSTITUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital de Referência de Araguaína/TO	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
2	A	Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
3	A	Fundação Hospital Centenário-São Leopoldo/RS	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
4	C	Hospital Nossa Senhora da Conceição – Porto Alegre/RS	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015
5	A	Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo – IMOAB/São Luís/MA	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
6	A	Associação Beneficente Douradense - Dourados	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017



SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS SUBSTITUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
7	C	Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - Porto Velho/RO	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
8	C	Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
9	C	Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
10	C	Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
11	A	Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
12	A	Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
13	C	Hospital Regional de Assis - Assis/SP	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 07/06/2017
14	A	Hospital do Câncer A.C Camargo – São Paulo/SP	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 12/01/2018
15	C	Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 12/01/2018
16	A	Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 26/03/2018
17	C	Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 26/03/2018
18	C	Hospital Geral de Palmas/TO	SUBSTITUÍDO DO PLANO EM 26/03/2018

LEGENDA

A	Ampliação
C	Construção

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		30/01/2015
ORDEN DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016
INAUGURAÇÃO		28/11/2016

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação

Valor da Obra: R\$ 2.471.731,37

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 4.710.492,57



VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017
INAUGURAÇÃO		13/05/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação



Valor da Obra: R\$ 2.711.598,95

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.312,15

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60

Valor da Solução: R\$ 4.953.259,88

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017
INAUGURAÇÃO		12/06/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 15.958,20

Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20

Valor da Solução: R\$ 4.504.829,77

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		27/05/2015
ORDEN DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		24/07/2017
INAUGURAÇÃO		26/07/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 16.418,01

Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20

Valor da Solução: R\$ 4.643.731,99

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017
INAUGURAÇÃO		27/11/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 1.975.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 3.971.094,29

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		21/07/2015
ORDEN DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		26/02/2018
INAUGURAÇÃO		11/06/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.207.031,66

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		29/05/2018
INAUGURAÇÃO		20/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.490.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.579.402,34

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEN DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		21/03/2018
INAUGURAÇÃO		23/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 119.062,64

Valor da Solução: R\$ 5.058.559,11

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		21/02/2019
INAUGURAÇÃO		25/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.170.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 90.840,80

Valor da Solução: R\$ 4.221.104,80

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		13/01/2017
ORDEN DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		30/05/2019
INAUGURAÇÃO		25/06/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.557.516,71

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO		19/03/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEN DE SERVIÇO		06/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		03/06/2019
INAUGURAÇÃO		29/06/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.982,60

Valor da Solução: R\$ 4.924.325,17

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		27/05/2019
INAUGURAÇÃO		22/06/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.359.800,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53

Valor Fiscalização: R\$ 71.816,98

Valor da Solução: R\$ 4.811.940,89

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		11/05/2019
INAUGURAÇÃO		06/06/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.681.680,43

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 218.136,67

Valor da Solução: R\$ 4.938.518,54

VOLTAR



EVOLUÇÃO		
ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO		15/05/2015
LICITAÇÃO		16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		22/05/2019
INAUGURAÇÃO		17/06/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88
Valor Projeto: R\$ 19.532,11
Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80
Valor da Solução: R\$ 4.439.241,79

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		27/05/2019
INAUGURAÇÃO		22/06/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.016.412,25

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 20.499,22

Valor Fiscalização: R\$ 109.792,40

Valor da Solução: R\$ 5.165.496,91

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		23/01/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		05/05/2019
INAUGURAÇÃO		31/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.649.000,00
 Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
 Valor Projeto: R\$ 19.601,56
 Valor Fiscalização: R\$ 97.985,41
 Valor da Solução: R\$ 5.129.754,35

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/02/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/05/2019
INAUGURAÇÃO		11/06/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.661.900,00

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15

Valor Fiscalização: R\$ 113.848,22

Valor da Solução: R\$ 5.246.093,63

VOLTAR



EVOLUÇÃO		
ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEN DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		12/06/2019
INAUGURAÇÃO		08/07/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.660.031,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.553,41

Valor Fiscalização: R\$ 96.740,27

Valor da Solução: R\$ 5.136.492,05

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		11/06/2018
OBRA CIVIL		93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		05/07/2019
INAUGURAÇÃO		31/07/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.580.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 109.563,08

Valor da Solução: R\$ 5.069.754,23

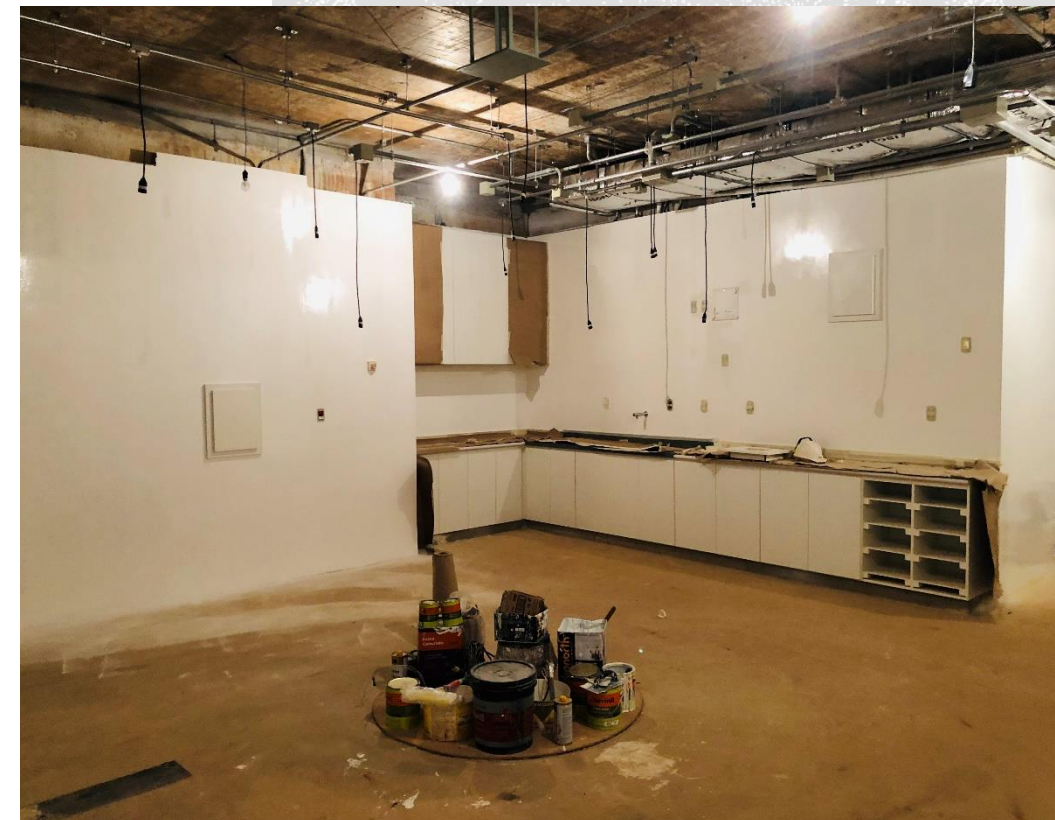
VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2018
OBRA CIVIL		93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/08/2019
INAUGURAÇÃO		11/09/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.443.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86

Valor Fiscalização: R\$ 127.098,69

Valor da Solução: R\$ 4.950.201,92

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		19/09/2017
OBRA CIVIL		93%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		18/08/2019
INAUGURAÇÃO		13/09/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.248.498,00

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 119.830,85

Valor da Solução: R\$ 4.549.654,91



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		06/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		05/07/2018
OBRA CIVIL		84%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/05/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		13/08/2019
INAUGURAÇÃO		08/09/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13

Valor Fiscalização: R\$ 84.896,60

Valor da Solução: R\$ 4.826.777,44

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		70%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/07/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		08/09/2019
INAUGURAÇÃO		04/10/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.384.564,60

Valor Equipamento: R\$ 2.324.671,90


Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 95.893,56

Valor da Solução: R\$ 4.822.725,31



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		15/10/2018
OBRA CIVIL		48%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		12/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/11/2019
INAUGURAÇÃO		11/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.950.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 70.701,01


Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 8.536.385,26

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/04/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		25/06/2020
INAUGURAÇÃO		21/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra Suspensa.



Valor da Obra: R\$ 3.069.626,68

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 158.880,55

Valor da Solução: R\$ 5.264.866,51

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEN DE SERVIÇO		18/07/2018
OBRA CIVIL		43%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/07/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		08/09/2019
INAUGURAÇÃO		04/10/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.193.300,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 68.094,04

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 7.776.248,72

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		26/01/2018
LICITAÇÃO		20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/10/2018
OBRA CIVIL		42%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		12/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/11/2019
INAUGURAÇÃO		11/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.374.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 75.517,95

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 9.365.784,93

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		17/01/2018
LICITAÇÃO		15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		13/08/2018
OBRA CIVIL		42%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		12/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/11/2019
INAUGURAÇÃO		11/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.680.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 63.712,69

Valor Fiscalização: R\$ 184.163,92

Valor da Solução: R\$ 7.260.226,51

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		16/07/2018
OBRA CIVIL		40%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		12/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/11/2019
INAUGURAÇÃO		11/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.399.500,50

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 74.396,98

Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 9.390.494,03

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		18/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/06/2018
OBRA CIVIL		39%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		12/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/11/2019
INAUGURAÇÃO		11/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.209.400,90

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 70.960,91

Valor Fiscalização: R\$ 175.868,25

Valor da Solução: R\$ 10.189.492,26

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		14/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		16/04/2018
OBRA CIVIL		34%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		12/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/11/2019
INAUGURAÇÃO		11/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.796.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.324.671,90

Valor Projeto: R\$ 19.033,61

Valor Fiscalização: R\$ 91.686,93

Valor da Solução: R\$ 5.231.392,43

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/12/2017
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/11/2018
OBRA CIVIL		33%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		13/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/12/2019
INAUGURAÇÃO		10/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.475.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 58.714,07

Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 8.049.398,32

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO		24/08/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		23/07/2018
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/07/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		08/09/2019
INAUGURAÇÃO		04/10/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.379.990,90

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 7.956.231,68

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/12/2017
LICITAÇÃO		27/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		22/10/2018
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		17/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/11/2019
INAUGURAÇÃO		16/12/2019

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.725.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 77.134,00

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 9.317.488,69

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO		08/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		23/08/2018
OBRA CIVIL		30%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		17/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/11/2019
INAUGURAÇÃO		16/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.494.900,90

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 73.808,00

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 9.484.475,88

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		28/02/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEN DE SERVIÇO		21/11/2018
OBRA CIVIL		29%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/11/2019
INAUGURAÇÃO		28/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.634.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 64.515,08

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 8.213.369,76

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		16/10/2017
LICITAÇÃO		27/07/2018
ORDEN DE SERVIÇO		07/01/2019
OBRA CIVIL		25%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/07/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		03/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		06/01/2020
INAUGURAÇÃO		01/02/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.174.990,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 63.254,19


Valor Fiscalização: R\$ 172.549,98

Valor da Solução: R\$ 8.743.144,07

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/12/2017
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		10/09/2018
OBRA CIVIL		23%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/11/2019
INAUGURAÇÃO		26/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.557.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 81.811,98

Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 9.154.996,23

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/02/2018
LICITAÇÃO		05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		03/10/2018
OBRA CIVIL		23%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/11/2019
INAUGURAÇÃO		26/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.800.802,72

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 72.580,78

Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 10.789.980,05

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/06/2018
LICITAÇÃO		04/10/2018
ORDEN DE SERVIÇO		14/12/2018
OBRA CIVIL		23%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/07/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		17/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/01/2020
INAUGURAÇÃO		15/02/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.373.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.324.671,90

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 66.918,42

Valor da Solução: R\$ 4.781.288,79

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		21/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/07/2018
OBRA CIVIL		23%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		13/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/12/2019
INAUGURAÇÃO		12/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.742.250,12

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 56.434,72


Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 8.314.369,09

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/09/2017
LICITAÇÃO		16/07/2018
ORDEN DE SERVIÇO		17/12/2018
OBRA CIVIL		22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		13/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/12/2019
INAUGURAÇÃO		11/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.240.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 63.143,44


Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 9.818.827,69

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		09/02/2018
LICITAÇÃO		12/04/2018
ORDEN DE SERVIÇO		06/11/2018
OBRA CIVIL		19%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/07/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		03/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		06/01/2020
INAUGURAÇÃO		02/02/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.556.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 60.020,65

Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 8.131.704,90

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		24/01/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEN DE SERVIÇO		26/11/2018
OBRA CIVIL		19%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/07/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		03/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		06/01/2020
INAUGURAÇÃO		31/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.700.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 74.075,93

Valor Fiscalização: R\$ 182.504,78

Valor da Solução: R\$ 9.689.842,91

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		02/08/2018
OBRA CIVIL		17%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/11/2019
INAUGURAÇÃO		27/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.458.400,00

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 70.358,85

Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 9.445.355,40

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/12/2018
OBRA CIVIL		15%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		10/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		08/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		11/12/2019
INAUGURAÇÃO		06/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.100.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 61.158,39


Valor Fiscalização: R\$ 183.334,35

Valor da Solução: R\$ 8.676.842,64

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		10/10/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/09/2018
OBRA CIVIL		13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/07/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		17/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/01/2020
INAUGURAÇÃO		15/02/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.769.900,90

Valor Equipamento: R\$ 2.332.349,90

Valor Projeto: R\$ 55.304,72

Valor Fiscalização: R\$ 105.355,03

Valor da Solução: R\$ 7.262.910,55

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/04/2019
OBRA CIVIL		2%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/10/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		02/04/2020
INAUGURAÇÃO		28/04/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.705.471,97

Valor Equipamento: R\$ 2.733.262,20

Valor Projeto: R\$ 73.307,57

Valor Fiscalização: R\$ 176.697,81

Valor da Solução: R\$ 9.688.739,55

VOLTAR



Hospital Universitário Walter Cantídio/UFCE – Fortaleza/CE

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aguardando Parecer



Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital Universitário Santa Terezinha/SC

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Hospital Regional do Vale da Ribeira/SP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Reprovado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Analisado	Projeto Não Encaminhado	Projeto Não Encaminhado



Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue



Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue



Hospital Regional João de Freitas/PR

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue



Hospital do Câncer III/HC III/INCA

ANÁLISE ARQUITETURA	ANÁLISE CIVIL	ANÁLISE ELÉTRICA	ANÁLISE MECÂNICA	ANÁLISE ORÇAMENTO	SITUAÇÃO VISA	SITUAÇÃO CNEN
Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue	Projeto Não Entregue

