

PANORAMA DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS


















SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/FAP/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC – São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
11	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo-Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO


	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
16	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia – Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
17	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
18	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
19	A	Instituto do Câncer do Ceará/ICC - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
20	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
21	A	Hospital Ana Nery/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
22	C	Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA	
23	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
24	C	Hospital Marieta Konder/SC	OBRA EM EXECUÇÃO	
25	C	Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
26	C	Hospital Estadual Mário Covas/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
27	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	OBRA EM EXECUÇÃO	
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE	OBRA EM EXECUÇÃO	
29	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	
30	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas /RS	OBRA EM EXECUÇÃO	

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

OBRAS EM EXECUÇÃO









	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
31	C	Hospital N. Sra da Conceição/Tubarão/SC	OBRA EM EXECUÇÃO 
32	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	OBRA EM EXECUÇÃO 
33	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	OBRA EM EXECUÇÃO 
34	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	OBRA EM EXECUÇÃO 
35	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	OBRA EM EXECUÇÃO 
36	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	OBRA EM EXECUÇÃO 
37	C	Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA	OBRA EM EXECUÇÃO 
38	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE	OBRA EM EXECUÇÃO 

AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
2	C	Hospital Universitário Severino Sombra/Vassouras/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
3	C	Hospital São José/Teresópolis/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
4	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO 
5	C	Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EM LICITAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS	
1	C	Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
2	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
3	C	Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
4	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
5	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
6	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
7	C	Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária – Sinop/MT	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
8	C	Hospital Geral de Roraima/RR	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
9	C	Hospital Cura D'ars/ Sociedade Beneficente São Camilo/CE	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
10	A	Hospital Universitário de Santa Maria – Santa Maria/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
11	C	Hospital Universitário Santa Terezinha/SC	EM PROCESSO LICITATÓRIO	
12	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO	

PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	EM ANÁLISE
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE/ELABORAÇÃO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Universitário Walter Cantídio – UFCE - Fortaleza / CE	EM ANÁLISE
2	A	Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP – São Paulo/SP	EM ELABORAÇÃO
3	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	EM ELABORAÇÃO
4	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP	EM ELABORAÇÃO
5	C	Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO
6	C	Hospital Geral de Palmas/TO	EM ELABORAÇÃO
7	A	Hospital do Câncer III/INCA/RJ	EM ELABORAÇÃO

PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
2	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí/PI	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
3	C	Hospital e Maternidade Marques Bastos/PI	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
4	C	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus/BA	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
5	C	Hospital Dom Thomás/PE	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR/PROJETO BÁSICO

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
6	C	Hospital Maternidade São José/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
7	C	Hospital Rio Doce/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
8	C	Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
9	C	Hospital Regional Darcy Vargas/RJ	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
10	C	Hospital Nossa Senhora das Dores/MG	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
11	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
12	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR
13	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	EM ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Fundação Pio XII/RO	CONCLUÍDO 
2	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo/SP	CONCLUÍDO 
3	Fundação Hospitalar de Blumenau - Hospital Santo Antônio/SC	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO O EQUIPAMENTO
4	Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born/RS	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO VISITA TÉCNICA
5	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA. AGUARDANDO VISITA TÉCNICA
6	Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia/MG	ADEQUAÇÃO EM ANDAMENTO

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA

	INSTITUIÇÃO	STATUS
7	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
8	Hospital de Juazeiro/BA	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
9	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
10	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
11	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Hospital Dr. Luís Antonio/RN	OBRA CONCLUÍDA. AGUARDANDO O EQUIPAMENTO
2	Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu/SP	OBRA EM ADEQUAÇÃO
3	Hospital do Câncer – Unidade I/INCA/RJ	OBRA EM ANDAMENTO. EQUIPAMENTO ENTREGUE NA OBRA
4	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	OBRA CONCLUÍDA. AGUARDANDO O EQUIPAMENTO
5	Casa de Saúde Santa Marcelina/SP	OBRA EM CONCLUSÃO



SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO






	INSTITUIÇÃO	STATUS
6	Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge/GO	AGUARDA INÍCIO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CASAMATA
7	Hospital do Câncer – Unidade III/INCA/RJ	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
8	Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/AL	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
9	Hospital Dr. Hélio Angotti/MG*	EM FASE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO




*Entrou no PER-SUS por determinação do Comitê Gestor em 22/01/2020, substituindo o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

LEGENDA

A	Ampliação
C	Construção

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		30/01/2015
ORDEN DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação

Valor da Obra: R\$ 2.471.731,37

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 4.710.492,57






VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação



Valor da Obra: R\$ 2.711.598,95

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.312,15

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60




Valor da Solução: R\$ 4.953.259,88

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 15.958,20










Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20




Valor da Solução: R\$ 4.504.829,77

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		24/07/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 16.418,01

Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20




Valor da Solução: R\$ 4.643.731,99

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 1.975.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00







Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60




Valor da Solução: R\$ 3.971.094,29

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		26/02/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20




Valor da Solução: R\$ 4.207.031,66

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		29/05/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.490.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87









Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.579.402,34

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		22/07/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 3.016.412,25

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 20.499,22

Valor Fiscalização: R\$ 127.173,81

Valor da Solução: R\$ 5.182.878,32

VOLTAR



EVOLUÇÃO		
ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	15/05/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	27/07/2017
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	20/05/2019








- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado




Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00
Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88
Valor Projeto: R\$ 19.532,11
Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80
Valor da Solução: R\$ 4.439.241,79

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/07/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.660.031,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.553,41


Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13




Valor da Solução: R\$ 5.134.753,91

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		21/02/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.170.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12










Valor Fiscalização: R\$ 90.840,80

Valor da Solução: R\$ 4.221.104,80

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEN DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		21/03/2018



Concluído



Em andamento



Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65










Valor Projeto: R\$ 17.765,81




Valor Fiscalização: R\$ 119.062,64

Valor da Solução: R\$ 5.058.559,11

VOLTAR

EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		17/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.359.800,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53










Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.821.935,19

VOLTAR




EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		13/01/2017
ORDEN DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		29/04/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.

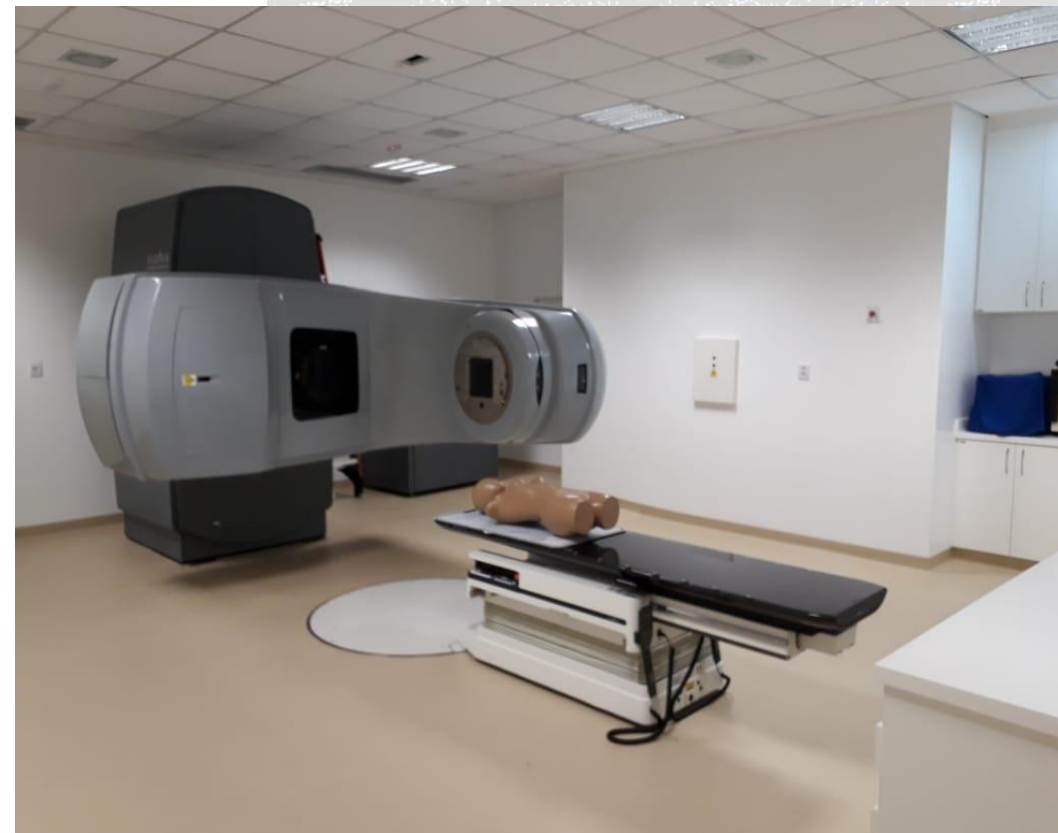

Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67










Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.557.516,71

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		11/06/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução entregue e em operação.



Valor da Obra: R\$ 2.580.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78










Valor Fiscalização: R\$ 123.902,74




Valor da Solução: R\$ 5.084.093,89

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/02/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		23/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.661.900,00

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15










Valor Fiscalização: R\$ 125.146,14

Valor da Solução: R\$ 5.257.391,55

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.443.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86










Valor Fiscalização: R\$ 126.664,16




Valor da Solução: R\$ 4.949.767,38

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEN DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		30/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.681.680,43

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40










Valor Fiscalização: R\$ 218.136,67




Valor da Solução: R\$ 4.938.518,54

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		06/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		05/07/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/04/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13










Valor Fiscalização: R\$ 110.968,71




Valor da Solução: R\$ 4.852.849,55

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/12/2017
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		17/04/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.475.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05

Valor Projeto: R\$ 75.308,66







Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 8.174.710,66

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		23/01/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/04/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.649.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 19.601,56










Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79




Valor da Solução: R\$ 5.140.617,72

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO		19/03/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		10/05/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53




Valor Fiscalização: R\$ 130.982,60




Valor da Solução: R\$ 4.924.325,17

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/12/2017
LICITAÇÃO		27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		22/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		15/05/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.725.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41










Valor Projeto: R\$ 98.934,69




Valor Fiscalização: R\$ 291.178,09

Valor da Solução: R\$ 9.572.949,19



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		14/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		16/04/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		28/05/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.796.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 19.033,61










Valor Fiscalização: R\$ 165.557,91




Valor da Solução: R\$ 5.495.714,88

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/06/2018
LICITAÇÃO		04/10/2018
ORDEN DE SERVIÇO		14/12/2018
OBRA CIVIL		99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		11/06/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.373.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47










Valor Fiscalização: R\$ 132.098,70




Valor da Solução: R\$ 4.973.235,27

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		19/09/2017
OBRA CIVIL		99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		25/06/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.783.832,82

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78










Valor Fiscalização: R\$ 149.379,24




Valor da Solução: R\$ 5.114.538,12

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		26/06/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.384.564,60

Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41










Valor Projeto: R\$ 17.595,25




Valor Fiscalização: R\$ 190.187,70

Valor da Solução: R\$ 4.831.461,96



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		17/01/2018
LICITAÇÃO		15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		13/08/2018
OBRA CIVIL		97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		11/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.680.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 81.720,06










Valor Fiscalização: R\$ 354.225,19

Valor da Solução: R\$ 7.370.881,32

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		16/10/2017
LICITAÇÃO		27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/01/2019
OBRA CIVIL		97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		24/06/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.174.990,00

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97










Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 8.947.396,33

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/12/2017
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		10/09/2018
OBRA CIVIL		97%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		11/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.557.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83










Valor Fiscalização: R\$ 306.110,30




Valor da Solução: R\$ 9.323.046,71

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		15/10/2018
OBRA CIVIL		92%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		26/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.950.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 90.683,51










Valor Fiscalização: R\$ 314.405,97

Valor da Solução: R\$ 8.709.591,06

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		28/02/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/11/2018
OBRA CIVIL		90%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		26/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.634.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23










Valor Fiscalização: R\$ 306.939,86

Valor da Solução: R\$ 8.483.403,19

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		26/01/2018
LICITAÇÃO		20/04/2018
ORDEN DE SERVIÇO		18/10/2018
OBRA CIVIL		86%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		10/08/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.374.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 96.871,71










Valor Fiscalização: R\$ 310.258,13

Valor da Solução: R\$ 9.671.168,14

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEN DE SERVIÇO		12/12/2018
OBRA CIVIL		84%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		14/08/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.100.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 78.443,83










Valor Fiscalização: R\$ 275.416,31

Valor da Solução: R\$ 9.076.432,38

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/09/2017
LICITAÇÃO		16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		17/12/2018
OBRA CIVIL		76%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		26/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.240.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41

Valor Projeto: R\$ 80.055,13










Valor Fiscalização: R\$ 277.075,44




Valor da Solução: R\$ 10.088.348,98

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		09/02/2018
LICITAÇÃO		12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		06/11/2018
OBRA CIVIL		73%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		31/08/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.556.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 76.984,53










Valor Fiscalização: R\$ 340.122,55

Valor da Solução: R\$ 8.430.443,49

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/04/2019
OBRA CIVIL		68%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/06/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		07/10/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.705.471,97

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 92.214,19










Valor Fiscalização: R\$ 272.927,61

Valor da Solução: R\$ 10.143.985,20

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		24/01/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		26/11/2018
OBRA CIVIL		61%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/06/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		26/11/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.700.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 95.021,93










Valor Fiscalização: R\$ 324.360,78




Valor da Solução: R\$ 10.008.921,01

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Está em novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 3.373.673,75

Valor Equipamento: R\$ 2.613.938,83

Valor Projeto: R\$ 17.566,24










Valor Fiscalização: R\$ 138.891,93

Valor da Solução: R\$ 6.144.070,75

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		18/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/06/2018
OBRA CIVIL		45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		18/01/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 8.730.809,92

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 91.026,10










Valor Fiscalização: R\$ 299.473,76




Valor da Solução: R\$ 12.194.681,21

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/07/2018
OBRA CIVIL		44%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/07/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/11/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		09/02/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 6.531.242,45

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 87.339,73










Valor Fiscalização: R\$ 312.746,83

Valor da Solução: R\$ 9.553.901,24

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		16/07/2018
OBRA CIVIL		43%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/07/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/11/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		09/02/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 7.647.833,80

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 95.433,76










Valor Fiscalização: R\$ 315.235,54




Valor da Solução: R\$ 11.131.874,53

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO		08/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		23/08/2018
OBRA CIVIL		35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		13/10/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/02/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		08/05/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 8.472.498,69

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 94.678,25










Valor Fiscalização: R\$ 342.611,25

Valor da Solução: R\$ 11.983.159,62

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO		24/08/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		23/07/2018
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		10/07/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/11/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		02/02/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 6.629.748,29

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 61.386,10










Valor Fiscalização: R\$ 310.258,13




Valor da Solução: R\$ 9.623.964,75

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		21/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		12/07/2018
OBRA CIVIL		26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		03/07/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		25/02/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 6.831.358,73

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 72.385,08










Valor Fiscalização: R\$ 350.906,93

Valor da Solução: R\$ 9.877.222,97

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/02/2018
LICITAÇÃO		05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		03/10/2018
OBRA CIVIL		24%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		14/10/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/02/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		09/05/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 8.873.467,49

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 93.104,01










Valor Fiscalização: R\$ 319.383,37




Valor da Solução: R\$ 12.359.326,30

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		02/08/2018
OBRA CIVIL		22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/02/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		07/05/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 8.319.861,69

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 90.253,80










Valor Fiscalização: R\$ 355.884,33

Valor da Solução: R\$ 11.839.371,25

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		10/10/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/09/2018
OBRA CIVIL		13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		11/11/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		06/06/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Obra paralisada. Em realização de novo processo licitatório.



Valor da Obra: R\$ 7.096.762,90

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 55.304,72






Valor Fiscalização: R\$ 275.416,31




Valor da Solução: R\$ 10.050.056,16

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		10/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do [Sexto Termo Aditivo – Modalidade Casamata Vazia](#) do Contrato 134/2013.











Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

VOLTAR



EVOLUÇÃO

ADESÃO AO PLANO		18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		21/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do [Sexto Termo Aditivo – Modalidade Casamata Vazia](#) do Contrato 134/2013.

Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

VOLTAR

