

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

Ministério da Saúde

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – SCTIE


JANEIRO 2021



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

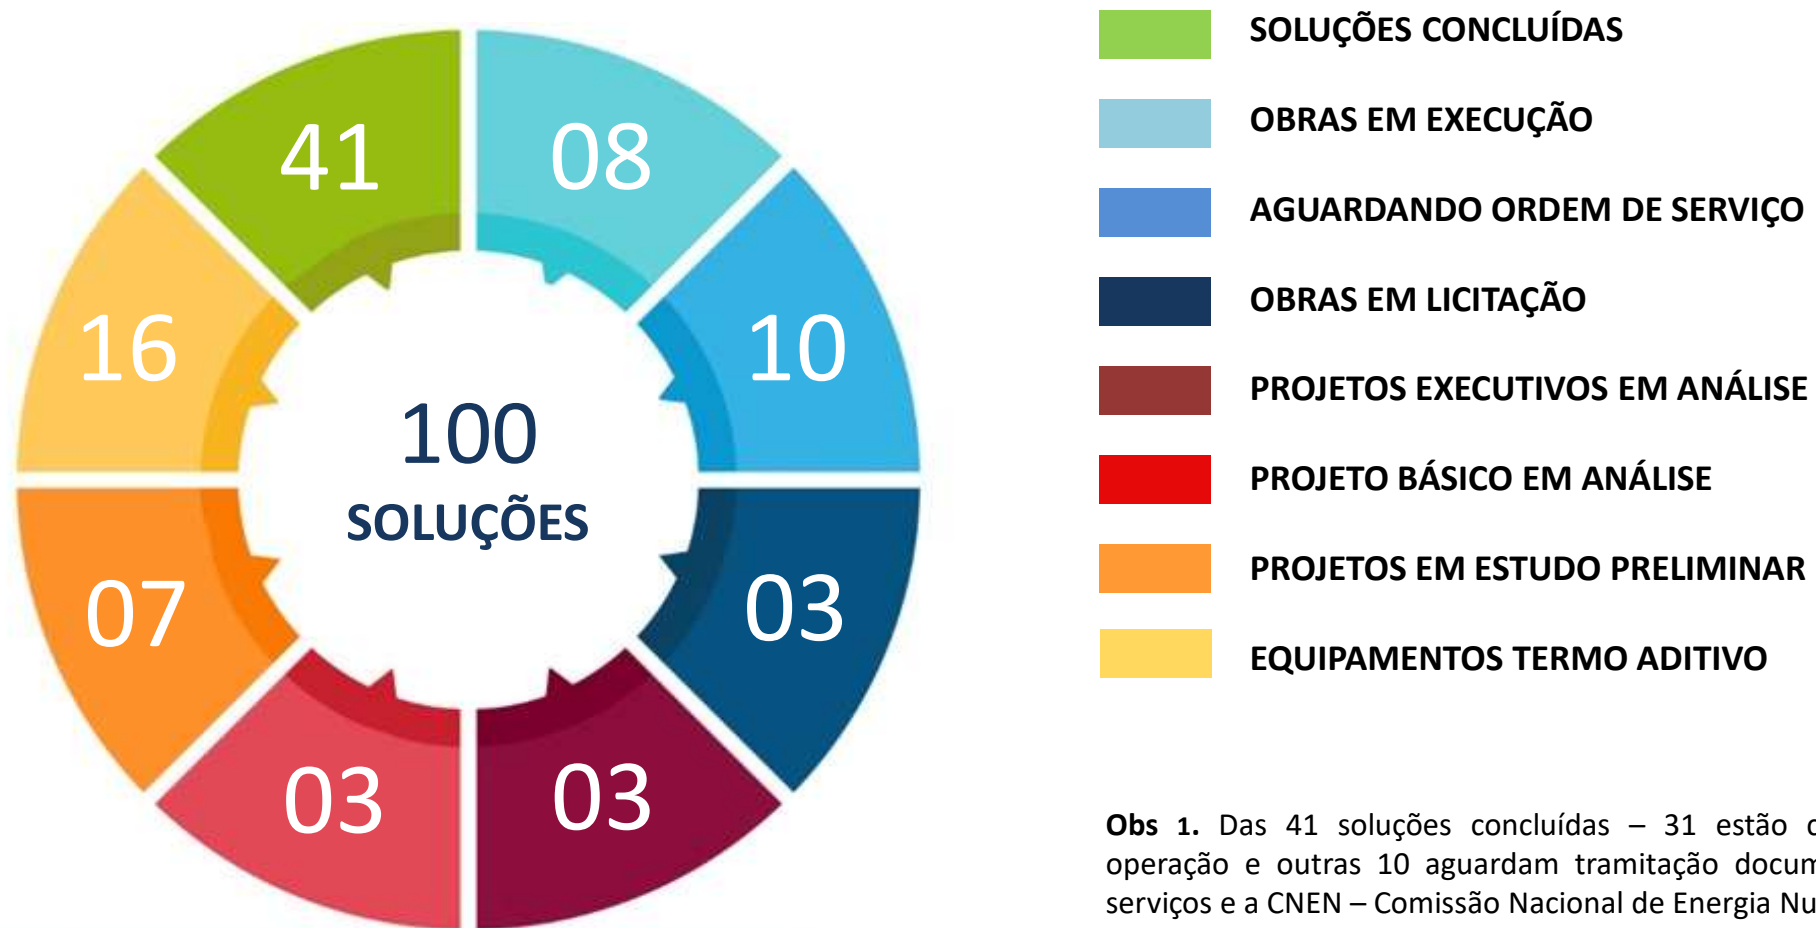

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	A	Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba – Campina Grande/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
11	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
18	A	Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
20	A	Hospital Ana Nery – Santa Cruz do Sul/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
21	C	Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
22	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
23	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
24	C	Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
25	A	Hospital do Câncer de Pernambuco – HCP Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
26	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
27	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre – Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
28	CV	Fundação Pio XII – Porto Velho/RO*	EQUIP. TERMO ADITIVO - CONCLUÍDO
29	CV	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo – Mogi das Cruzes/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
30	CV	Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
31	EO	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
32	CV	Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
33	EO	Hospital do Câncer INCA I	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
34	C	Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA	OBRA CONCLUÍDA – EQUIP. EM COMISSONAMENTO
35	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
36	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
37	EO	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN*	EQUIPAMENTO COMISSONADO - ADITIVO
38	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
39	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
40	C	Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
41	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO

Obs. *Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

Legenda:

A = Ampliação CV = Casamata Vazia
C = Construção EO = Equip. Obsoleto

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



OBRAS EM EXECUÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Estadual Mário Covas – Santo André/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
2	C	Hospital N. Sra da Conceição - Tubarão/SC	OBRA EM EXECUÇÃO
3	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR	OBRA EM EXECUÇÃO
4	C	Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC	OBRA EM EXECUÇÃO
5	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	OBRA EM EXECUÇÃO
6	C	Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ	OBRA EM EXECUÇÃO
7	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	OBRA EM EXECUÇÃO
8	C	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	OBRA EM EXECUÇÃO

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO - JUDICIALIZAÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital São José - Teresópolis/RJ	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
2	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
3	C	Hospital Geral de Roraima/RR*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
4	C	Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
5	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
6	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
7	C	Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
8	C	Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
9	C	Hospital Estadual de Bauru/SP*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
10	C	Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT*	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

Obs. *Obra licitada e contrato assinado, aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



OBRAS EM LICITAÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
2	A	Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS	EM PROCESSO LICITATÓRIO
3	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	EM PROCESSO LICITATÓRIO

PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	EM ANÁLISE SUVISA-RJ
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	EM ANÁLISE - PREFEITURA
3	A	Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP	EM ANÁLISE - MS

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



PROJETOS BÁSICOS EM ELABORAÇÃO / ANÁLISE

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Maternidade São José - Colatina/ES	EM ELABORAÇÃO
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	EM ELABORAÇÃO
3	C	Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR	EM ELABORAÇÃO

ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP	EM ELABORAÇÃO
2	C	Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE	EM ELABORAÇÃO
3	C	Hospital Maternidade São José – Colatina/ES	EM ELABORAÇÃO
4	C	Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ	EM ELABORAÇÃO
5	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	EM ELABORAÇÃO
6	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP	EM ELABORAÇÃO
7	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI	EM ELABORAÇÃO

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



PROJETOS AGUARDANDO DELIBERAÇÃO – COMITÊ GESTOR

	TIPO DE OBRA	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	C	FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
2	C	Hospital Geral de Palmas/TO	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
3	C	Hospital Rio Doce - Linhares/ES	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
4	C	Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
5	C	Hospital Nossa Senhora das Dores – Itabira/MG	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
6	C	SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
7	C	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus/BA	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
8	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR
9	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	DELIBERAÇÃO COMITÊ GESTOR

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

JANEIRO 2021



PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Sociedade Beneficência e Caridade de Lajeado – Hospital Bruno Born/RS	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – EM INSTALAÇÃO
2	Fundação Benjamin Guimarães – Hospital da Baleia/MG	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – AGUARDANDO CNEN
3	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – EM INSTALAÇÃO
4	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – AL EM IMPORTAÇÃO
5	Hospital de Juazeiro/BA	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – AL EM IMPORTAÇÃO
6	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – AL EM IMPORTAÇÃO
7	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – AL EM IMPORTAÇÃO
8	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	AGUARDANDO ASSINATURA - TERMO DE ADESÃO










PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA




JANEIRO 2021



PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Hospital do Câncer – INCA I – Rio de Janeiro/RJ	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – EM INSTALAÇÃO
2	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – EM INSTALAÇÃO
4	Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP	ADEQUAÇÃO CONCLUÍDA – EM INSTALAÇÃO
5	Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL	ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA – COMITÊ GESTOR
6	Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba/MG	EM ADEQUAÇÃO – COMITÊ GESTOR
7	Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ	ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA – COMITÊ GESTOR
8	Ass. de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge - Goiânia/GO	AGUARDANDO DELIBERAÇÃO – COMITÊ GESTOR

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado






Valor da Obra: R\$ 2.471.731,37




Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 4.710.492,57

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado





Valor da Obra: R\$ 2.711.598,95




Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.312,15

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60

Valor da Solução: R\$ 4.953.259,88

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.446.257,75

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63










Valor Projeto: R\$ 15.958,20




Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20

Valor da Solução: R\$ 4.504.829,77

MACEIÓ – AL

Santa Casa de Misericórdia de Maceió

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		24/07/2017

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado











Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15




Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 16.418,01

Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20

Valor da Solução: R\$ 4.643.731,99

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 1.975.000,00




Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 3.971.094,29

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		26/02/2018

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.129.997,03




Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.207.031,66

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		29/05/2018

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.490.000,00




Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.579.402,34

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		22/07/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.016.412,25

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04







Valor Projeto: R\$ 20.499,22




Valor Fiscalização: R\$ 127.173,81

Valor da Solução: R\$ 5.182.878,32

BARBALHA – CE

Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO		15/05/2015
LICITAÇÃO		16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		20/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado










Valor da Obra: R\$ 2.400.000,00




Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 19.532,11

Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80

Valor da Solução: R\$ 4.439.241,79

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/07/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.660.031,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37









Valor Projeto: R\$ 16.553,41




Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13

Valor da Solução: R\$ 5.134.753,91

LIMEIRA – SP

Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		21/02/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.170.000,00




Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 90.840,80

Valor da Solução: R\$ 4.221.104,80

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		21/03/2018

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00




Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 119.062,64

Valor da Solução: R\$ 5.058.559,11

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		17/05/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.359.800,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37







Valor Projeto: R\$ 17.156,53




Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.821.935,19

PELOTAS – RS

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		29/04/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado









Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.557.516,71

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		11/06/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.580.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 123.902,74

Valor da Solução: R\$ 5.084.093,89

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/02/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		23/12/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.661.900,00

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26










Valor Projeto: R\$ 20.092,15




Valor Fiscalização: R\$ 125.146,14

Valor da Solução: R\$ 5.257.391,55

CAMPO MOURÃO – PR

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/12/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.443.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37








Valor Projeto: R\$ 16.935,86




Valor Fiscalização: R\$ 126.664,16

Valor da Solução: R\$ 4.949.767,38

SOROCABA – SP

Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		30/12/2019

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.681.680,43




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 218.136,67

Valor da Solução: R\$ 4.938.518,54

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/12/2017
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/06/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.475.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 75.308,66

Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 8.174.710,66

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		23/01/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		18/05/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.649.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 19.601,56

Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79

Valor da Solução: R\$ 5.140.617,72

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		06/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		05/07/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		14/07/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.500.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13

Valor Fiscalização: R\$ 110.968,71

Valor da Solução: R\$ 4.852.849,55

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		16/10/2017
LICITAÇÃO		27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/01/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		18/08/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.174.990,00




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97

Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 8.947.396,33

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		17/01/2018
LICITAÇÃO		15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		13/08/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		30/10/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.680.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05









Valor Projeto: R\$ 81.720,06




Valor Fiscalização: R\$ 354.225,19

Valor da Solução: R\$ 7.370.881,32

TAUBATÉ– SP

Hospital Regional do Vale do Paraíba

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		14/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		16/04/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		03/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 2.796.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36


Valor Projeto: R\$ 19.033,61




Valor Fiscalização: R\$ 165.557,91

Valor da Solução: R\$ 5.495.714,88

SALVADOR – BA

Hospital Geral Roberto Santos/CICAN

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/04/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Fev. 2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.705.471,97




Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30


Valor Projeto: R\$ 92.214,19

Valor Fiscalização: R\$ 272.927,61







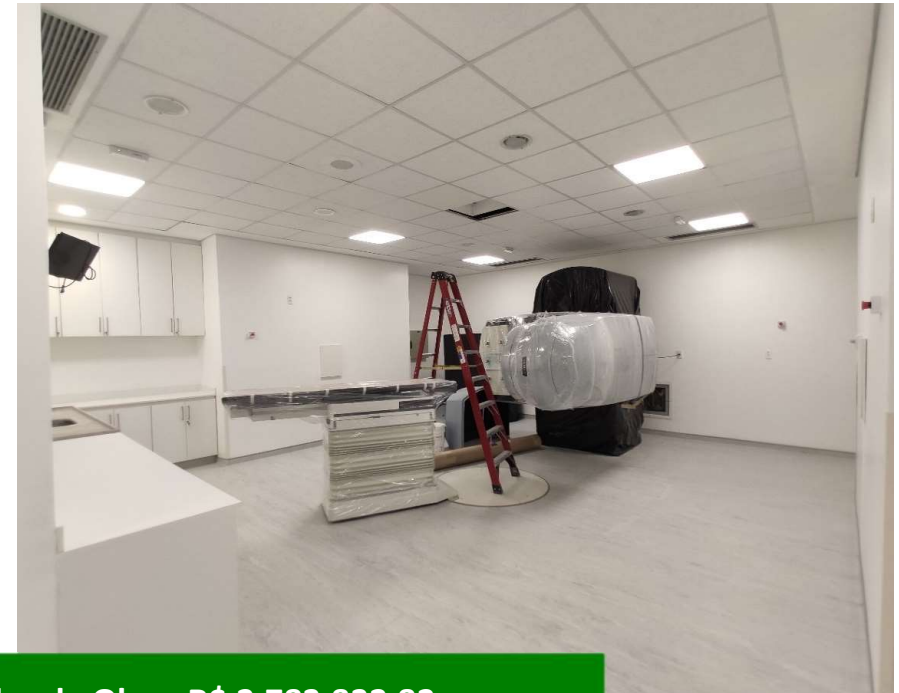


Valor da Solução: R\$ 10.143.985,20




ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		19/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		07/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.783.832,82
Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28
Valor Projeto: R\$ 18.100,78
Valor Fiscalização: R\$ 149.379,24
Valor da Solução: R\$ 5.114.538,12

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		09/12/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado







Valor da Obra: R\$ 2.384.564,60




Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41

Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 190.187,70

Valor da Solução: R\$ 4.831.461,96

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO		19/03/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		19/01/2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado









Valor da Obra: R\$ 2.757.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.982,60

Valor da Solução: R\$ 4.924.325,17

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/12/2017
LICITAÇÃO		27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		22/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		Fev. 2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.




Valor da Obra: R\$ 6.725.500,00




Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 98.934,69

Valor Fiscalização: R\$ 291.178,09

Valor da Solução: R\$ 9.572.949,19

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		26/01/2018
LICITAÇÃO		20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Fev. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.












Valor da Obra: R\$ 6.374.500,00




Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 96.871,71

Valor Fiscalização: R\$ 310.258,13

Valor da Solução: R\$ 9.671.168,14

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/12/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Fev. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.












Valor da Obra: R\$ 6.100.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 78.443,83

Valor Fiscalização: R\$ 275.416,31

Valor da Solução: R\$ 9.076.432,38

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/06/2018
LICITAÇÃO		04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO		14/12/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Fev./2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.












Valor da Obra: R\$ 2.373.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 132.098,70

Valor da Solução: R\$ 4.973.235,27

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/12/2017
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		10/09/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		Mar. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.












Valor da Obra: R\$ 6.557.500,00




Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83

Valor Fiscalização: R\$ 306.110,30

Valor da Solução: R\$ 9.323.046,71

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		09/02/2018
LICITAÇÃO		12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		06/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Mar. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 5.556.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43









Valor Projeto: R\$ 76.984,53




Valor Fiscalização: R\$ 340.122,55

Valor da Solução: R\$ 8.430.443,49

TUBARÃO – SC

Hospital Nossa Senhora da Conceição

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		28/02/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/11/2018
OBRA CIVIL		99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Mar. 2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Contrato suspenso por deliberação do Comitê Gestor – COVID-19



Valor da Obra: R\$ 5.634.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23




Valor Fiscalização: R\$ 306.939,86

Valor da Solução: R\$ 8.483.403,19

SANTO ANDRÉ – SP

Hospital Estadual Mário Covas

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		15/10/2018
OBRA CIVIL		98%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Abr. 2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado












Valor da Obra: R\$ 5.950.000,00




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 90.683,51

Valor Fiscalização: R\$ 314.405,97

Valor da Solução: R\$ 8.709.591,06

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/09/2017
LICITAÇÃO		16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		17/12/2018
OBRA CIVIL		78%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/11/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Mai. 2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.240.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41









Valor Projeto: R\$ 80.055,13




Valor Fiscalização: R\$ 277.075,44

Valor da Solução: R\$ 10.088.348,98

GUARAPUAVA – PR

Hospital de Caridade São Vicente de Paulo

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
PROJETO BÁSICO		15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO		26/11/2019
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		01/07/2020
OBRA CIVIL		67%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Mai. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Ago. 2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado









Valor da Obra: R\$ 5.714.883,22




Valor Equipamento: R\$ 2.347.173,90

Valor Projeto: R\$ 60.982,58

Valor Fiscalização: R\$ 85.377,60

Valor da Solução: R\$ 8.208.417,30

ADESÃO AO PLANO		29/10/2012
PROJETO BÁSICO		07/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		24/06/2019
LICITAÇÃO		11/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		28/09/2020
OBRA CIVIL		15%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Abr. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Jul. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Out. 2021

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.042.276,91





Valor Equipamento: R\$ 2.622,572,23




Valor Projeto: R\$ 0,00

Valor Fiscalização: R\$ 145.174,26

Valor da Solução: R\$

BAGÉ/RS

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		24/09/2020
OBRA CIVIL		12%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Abr. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Jul. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Out. 2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado

SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ



Valor da Obra: R\$ 7.648.490,00

Valor Equipamento: R\$ 3.140.986,97





Valor Projeto: R\$ 0,00




Valor Fiscalização: R\$ 211.539,64

Valor da Solução: R\$

VASSOURAS/RJ

HOSPITAL SEVERINO SOMBRA

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		21/10/2020
OBRA CIVIL		10%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Mai. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Ago. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Nov. 2021

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado







Valor da Obra: R\$ 7.648.490,00




Valor Equipamento: R\$ 3.140.986,97

Valor Projeto: R\$ 0,00

Valor Fiscalização: R\$ 211.539,64

Valor da Solução: R\$

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		24/01/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		26/11/2018
OBRA CIVIL		66%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando novo processo licitatório.






Valor Executado Obra: R\$ 3.353.175,97




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.021,93

Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando novo processo licitatório.












Valor Executado Obra: R\$ 1.307.440,54




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 138.891,93

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		18/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/06/2018
OBRA CIVIL		45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.












Valor Executado Obra: R\$ 3.459.283,16




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 91.026,10

Valor Fiscalização: R\$ 139.828,82

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/07/2018
OBRA CIVIL		44%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.










Valor Executado Obra: R\$ 1.831.284,83




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 87.339,73


Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		16/07/2018
OBRA CIVIL		43%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

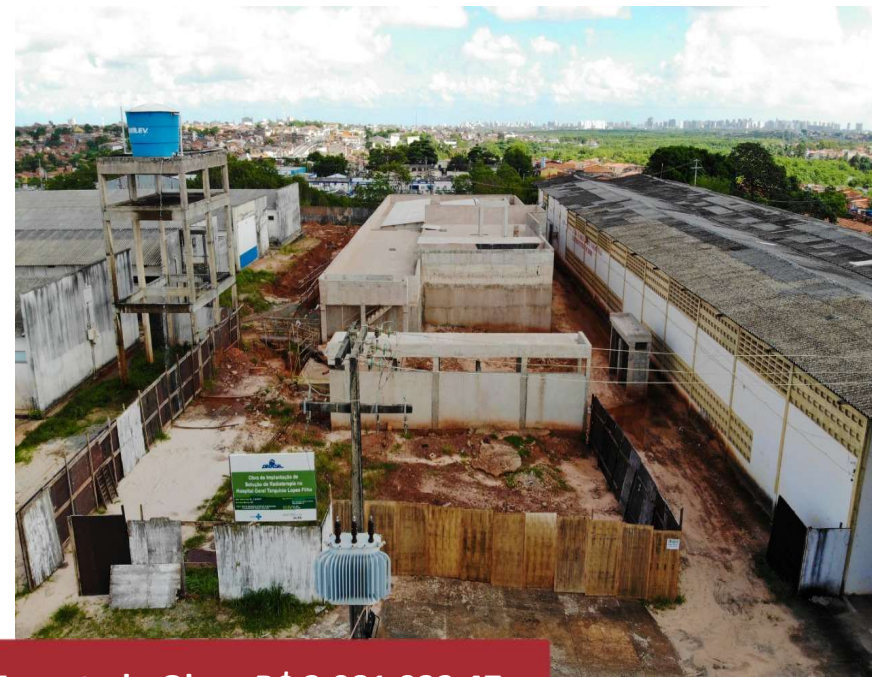

Valor Executado Obra: R\$ 2.081.932,47

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.433,76

Valor Fiscalização: R\$ 168.965,45

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	08/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	23/08/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.












Valor Executado Obra: R\$ 2.291.463,61




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 94.678,25

Valor Fiscalização: R\$ 147.939,49

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO		24/08/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		23/07/2018
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.760.465,01

Valor Equipamento: -










Valor Projeto: R\$ 61.386,10




Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: -

PRESIDENTE PRUDENTE – SP

Hospital Regional de Presidente Prudente

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		21/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/07/2018
OBRA CIVIL		26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.












Valor Executado Obra: R\$ 1.531.358,73




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 72.385,08

Valor Fiscalização: R\$ 159.158,39

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/02/2018
LICITAÇÃO		05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		03/10/2018
OBRA CIVIL		24%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.












Valor Executado Obra: R\$ 1.630.425,71




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 93.104,01

Valor Fiscalização: R\$ 137.431,63

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		02/08/2018
OBRA CIVIL		22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.












Valor Executado Obra: R\$ 1.716.352,06




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 90.253,80

Valor Fiscalização: R\$ 132.256,71

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		10/10/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/09/2018
OBRA CIVIL		13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado

Obs. Contrato rescindido. Aguardando realização de perícia judicial para Posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 386.569,10




Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 55.304,72

Valor Fiscalização: R\$ 75.451,11

Valor da Solução: -



ADESÃO AO PLANO		10/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2020




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO		18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		21/01/2020




-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		10/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Dez.2020






-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado




Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

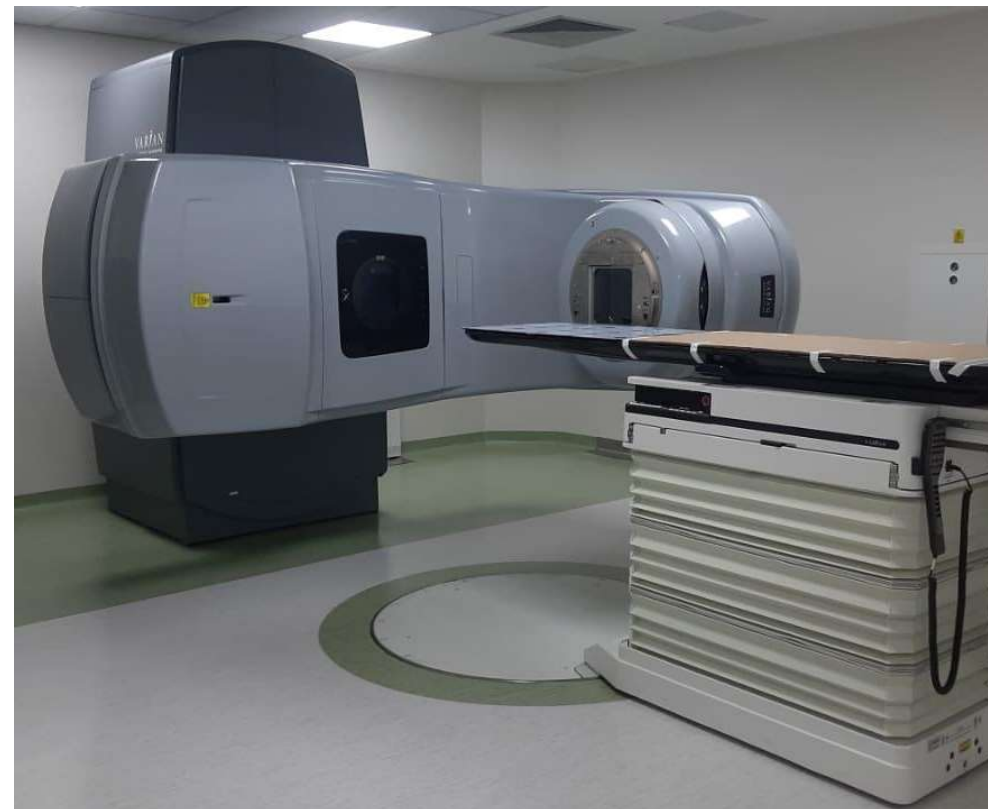


Foto exemplo modelo

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ADESÃO AO PLANO		16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/04/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Dez.2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.
