



# PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

**Ministério da Saúde**

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos  
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – SCTIE


**OUTUBRO 2021**



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



# PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

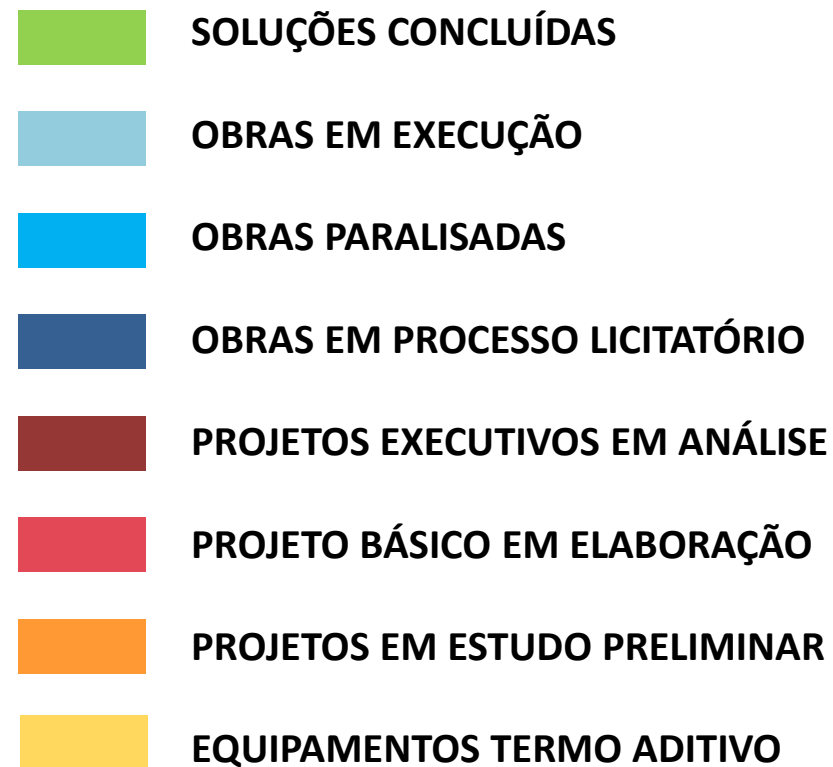

**Obs 1.** Das 49 soluções concluídas – 41 estão com licença de operação e outras 09 aguardam tramitação documental entre os serviços e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear para obtenção da licença.

### SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                      | SITUAÇÃO          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | A         | Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB  | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 2  | A         | Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA            | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 3  | A         | Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR                           | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 4  | A         | Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 5  | A         | Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 6  | A         | Hospital Governador João Alves Filho - Aracaju/SE                | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 7  | A         | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 8  | A         | Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 9  | A         | Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 10 | A         | Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS            | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 11 | A         | Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 12 | A         | Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE        | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 13 | A         | Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 14 | A         | Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 15 | A         | Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP   | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |

### SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                      | SITUAÇÃO          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16 | A         | Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 17 | A         | Instituto de Câncer de Londrina/PR                               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 18 | A         | Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE                      | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 19 | A         | Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR            | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 20 | A         | Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 21 | C         | Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP      | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 22 | C         | Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF                  | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 23 | A         | Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP                | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 24 | C         | Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC                              | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 25 | A         | Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 26 | A         | Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 27 | A         | Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 28 | C         | Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE        | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 29 | C         | Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP                               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 30 | C         | Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |



### SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                     | SITUAÇÃO                                   |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 31 | C         | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT     | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 32 | C         | Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA             | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 33 | CV        | Fundação Pio XII – Porto Velho/RO*                              | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 34 | CV        | Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 35 | CV        | Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC*                           | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 36 | EO        | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP*       | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 37 | EO        | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN*             | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 38 | EO        | Hospital do Câncer INCA I*                                      | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 39 | EO        | Hospital Bruno Born – Lajeado/RS*                               | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 40 | EO        | Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP*                   | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |
| 41 | CV        | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP*       | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO           |

#### Legenda:

A = Ampliação    CV = Casamata Vazia  
C = Construção    EO = Equip. Obsoleto

### SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                         | SITUAÇÃO                                   |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 42 | A         | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 43 | C         | Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 44 | C         | Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 45 | CV        | Hospital Geral de Caxias do Sul/RS*                                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 46 | CV        | Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR*          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 47 | CV        | Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG* | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 48 | C         | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR           | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 49 | C         | Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP                      | SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |

**Obs.** \*Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

#### Legenda:

A = Ampliação    CV = Casamata Vazia  
C = Construção    EO = Equip. Obsoleto

### OBRAS EM EXECUÇÃO

|   | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                               | SITUAÇÃO         |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | C         | Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC       | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 2 | C         | Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS             | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 3 | C         | Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ     | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 4 | C         | Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE | OBRA EM EXECUÇÃO |

### OBRAS PARALISADAS - JUDICIALIZAÇÃO

|   | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                      | SITUAÇÃO                        |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | C         | Hospital Regional de Presidente Prudente/SP*                     | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 2 | C         | Hospital Geral de Roraima/RR*                                    | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 3 | C         | Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS*          | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 4 | C         | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA*                       | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 5 | C         | Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR*              | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 6 | C         | Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP*                    | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 7 | C         | Hospital Estadual de Bauru/SP*                                   | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |
| 8 | C         | Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT* | OBRA PARALISADA – AÇÃO JUDICIAL |

**Obs.** Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400

Autuado em: 13/11/2019

Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF

\*Aguardando realização de perícia judicial para posterior emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.

### OBRAS EM PROCESSO LICITATÓRIO

|   | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                         | SITUAÇÃO                |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | A         | Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS              | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 2 | C         | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 3 | C         | Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO                           | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 4 | A         | Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP     | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 5 | C         | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE                 | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 6 | C         | Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA                  | EM PROCESSO LICITATÓRIO |
| 7 | C         | Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA  | EM PROCESSO LICITATÓRIO |

### PROJETOS EXECUTIVOS EM ELABORAÇÃO / ANÁLISE

|   | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                             | SITUAÇÃO             |
|---|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | C         | Hospital Geral do Andaraí/RJ                            | EM ANÁLISE SUVISA-RJ |
| 2 | C         | Hospital São José - Teresópolis/RJ                      | EM ELABORAÇÃO        |
| 3 | C         | Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP                | EM ELABORAÇÃO        |
| 4 | C         | Hospital Maternidade São José - Colatina/ES             | EM ELABORAÇÃO        |
| 5 | C         | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP                | EM ELABORAÇÃO        |
| 6 | C         | Hospital Rio Doce - Linhares/ES                         | EM ELABORAÇÃO        |
| 7 | C         | FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP                          | EM ELABORAÇÃO        |
| 8 | C         | Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP | EM ELABORAÇÃO        |
| 9 | C         | Hospital Geral de Palmas/TO                             | EM ELABORAÇÃO        |



### PROJETOS BÁSICOS EM ELABORAÇÃO / ANÁLISE

|   | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                           | STATUS                       |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | C         | Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ                        | EM ANÁLISE - VISA            |
| 2 | C         | Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR                              | EM ANÁLISE – VISA            |
| 3 | C         | SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI             | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO |
| 4 | C         | Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG                         | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO |
| 5 | C         | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO |

### ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

|   | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                        | STATUS                          |
|---|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | C         | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP     | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR |
| 2 | C         | Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE                 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR |
| 3 | C         | Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP | ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR |

**PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA**

|   | <b>INSTITUIÇÃO</b>                                                   | <b>STATUS</b>               |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Hospital de Juazeiro/BA                                              | CASAMATA EM ADEQUAÇÃO       |
| 2 | Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN           | EQUIPAMENTO – EM IMPORTAÇÃO |
| 3 | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ             | ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA      |
| 4 | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ – 2º Bunker | ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA      |

**PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE EQUIPAMENTO OBSOLETO**

|   | <b>INSTITUIÇÃO</b>                                               | <b>STATUS</b>               |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL | EQUIPAMENTO – EM IMPORTAÇÃO |
| 2 | Hospital Dr. Hélio Angotti - Uberaba/MG                          | EQUIPAMENTO – EM IMPORTAÇÃO |
| 3 | Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ                | EQUIPAMENTO – EM IMPORTAÇÃO |

### EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

|    | TIPOLOGIA | LOCALIDADE     | INSTITUIÇÃO                                            | STATUS           |
|----|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | RJ        | Rio de Janeiro | Hospital do Cancer III (Ampliação)                     | Excluído pelo CG |
| 2  | CE        | Fortaleza      | Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE          | Excluído pelo CG |
| 3  | PB        | Patos          | Hospital Regional Dep. Janduy Carneiro                 | Excluído pelo CG |
| 4  | RN        | Natal          | Hospital Universitário Onofre Lopes                    | Excluído pelo CG |
| 5  | PR        | Ponta Grossa   | Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa    | Excluído pelo CG |
| 6  | GO        | Goiânia        | Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge  | Excluído pelo CG |
| 7  | ES        | Vitória        | Santa Casa de Misericórdia de Vitória                  | Excluído pelo CG |
| 8  | BA        | Ilhéus         | Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilheus | Excluído pelo CG |
| 9  | GO        | Goiânia        | Ass. de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge        | Excluído pelo CG |
| 10 | SP        | Botucatu       | Hosp. Das Clínicas Faculdade de Medicina               | Excluído pelo CG |

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 21/11/2014 |
| LICITAÇÃO               |  | 30/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 12/05/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/11/2016 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 5.136.862,94

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 04/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 23/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 07/07/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 03/04/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.312,15

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60

Valor da Solução: R\$ 5.419.031,74

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 03/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 07/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 11/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 04/05/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 15.958,20

Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20

Valor da Solução: R\$ 4.452.806,85



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 08/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 27/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 29/09/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 09/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 25/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 24/07/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 16.418,01

Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20

Valor da Solução: R\$ 4.643.731,99

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 04/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 05/01/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/07/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/10/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.317.980,17



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 15/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 21/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 21/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 26/02/2018 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.533.298,69

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 16/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 03/11/2015 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 16/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 29/05/2018 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.782.159,04

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.871.561,38

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 16/06/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/11/2015 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 09/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/11/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 22/07/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 3.931.538,12**

**Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04**

**Valor Projeto: R\$ 20.499,22**

**Valor Fiscalização: R\$ 127.173,81**

**Valor da Solução: R\$ 6.098.004,19**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 09/02/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 15/05/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/01/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 27/07/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 21/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 20/05/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.601.183,56**

**Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88**

**Valor Projeto: R\$ 19.532,11**

**Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80**

**Valor da Solução: R\$ 4.640.425,35**



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 24/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 04/08/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 26/03/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 01/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 30/07/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.788.594,15

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.553,41

Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13

Valor da Solução: R\$ 5.263.317,06

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/10/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/02/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 13/07/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 07/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 21/02/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.490.091,13

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 90.840,80

Valor da Solução: R\$ 4.541.195,93

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 07/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 19/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 03/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 14/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 25/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 21/03/2018 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.020.000,00

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 119.062,64

Valor da Solução: R\$ 5.058.559,11



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 30/09/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 13/03/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 22/12/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 17/05/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.501.098,18

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.963.233,37

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 06/10/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO               |  | 13/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 26/09/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 29/04/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.455.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.557.516,71

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 02/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 11/06/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 25/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 19/11/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.015.163,20

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 123.902,74

Valor da Solução: R\$ 5.519.257,09

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 25/04/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 06/02/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 31/01/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 23/12/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.982.302,30

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15

Valor Fiscalização: R\$ 125.146,14

Valor da Solução: R\$ 5.577.793,85

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 20/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 27/03/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/03/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 20/12/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.743.904,59

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86

Valor Fiscalização: R\$ 126.664,16

Valor da Solução: R\$ 5.250.671,98



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 14/05/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 26/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 02/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 31/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 30/12/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.909.141,83

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 218.136,67

Valor da Solução: R\$ 6.165.979,94



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 08/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 20/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 07/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 16/06/2020 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 75.308,66

Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 8.174.710,66

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 26/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 23/01/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 16/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/05/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.829.751,41

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 19.601,56

Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79

Valor da Solução: R\$ 5.234.294,41

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 06/06/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 05/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/11/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 01/06/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 14/07/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.780.455,54

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13

Valor Fiscalização: R\$ 110.968,71

Valor da Solução: R\$ 5.780...

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 16/10/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 27/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 07/01/2019 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 04/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/08/2020 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.321.003,36

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97

Valor Fiscalização: R\$ 233.937,95

Valor da Solução: R\$ 9.093.409,69



|                         |                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |   | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |   | 18/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |   | 17/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |   | 15/03/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |   | 13/08/2018 |
| OBRA CIVIL              |   | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |   | 30/04/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |   | 10/01/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 30/10/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21

Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05

Valor Projeto: R\$ 81.720,06

Valor Fiscalização: R\$ 354.225,19

Valor da Solução: R\$ 7.570.524,51

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 24/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 14/06/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 16/04/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 03/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.261.449,96

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 19.033,61


Valor Fiscalização: R\$ 165.557,91

Valor da Solução: R\$ 5.961.164,84



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 17/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 19/09/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/04/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 07/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

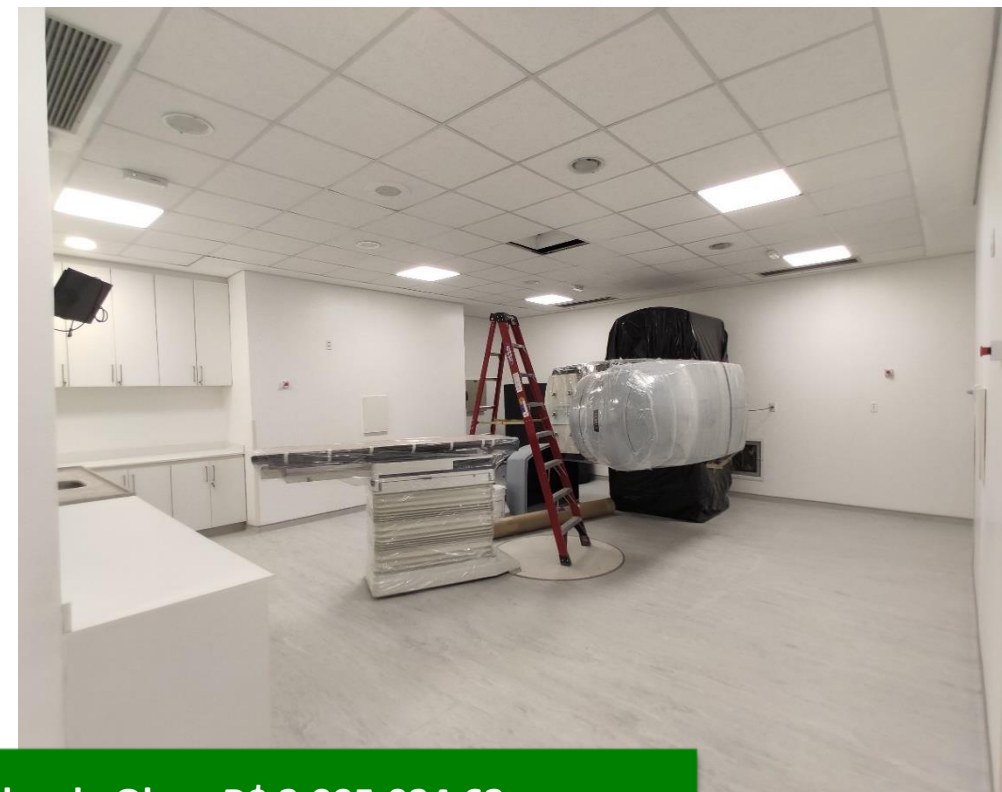

Valor da Obra: R\$ 2.995.034,63

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 149.379,24

Valor da Solução: R\$ 5.325.739,93

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 21/07/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/02/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 24/10/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 08/03/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/11/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 09/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.384.564,60

Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41

Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 190.187,70

Valor da Solução: R\$ 4.831.461,96

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 22/01/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/03/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 17/01/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 06/07/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 16/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 19/01/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.131.542,72

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.982,60

Valor da Solução: R\$ 5.298.867,89

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 20/04/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 18/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 30/05/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 09/04/2021 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 96.871,71

Valor Fiscalização: R\$ 310.258,13

Valor da Solução: R\$ 10.170.047,37

|                         |                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |   | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |   | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |   | 27/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |   | 27/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |   | 22/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |   | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |   | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |   | 14/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 07/05/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.941.348,05

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 98.934,69

Valor Fiscalização: R\$ 291.178,09

Valor da Solução: R\$ 9.685.962,41



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 06/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 12/12/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 04/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 25/08/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.532.748,88

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 78.443,83

Valor Fiscalização: R\$ 275.416,31

Valor da Solução: R\$ 9.509.181,25

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 14/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 22/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 28/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 10/09/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/10/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.557.500,00

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83

Valor Fiscalização: R\$ 306.110,30

Valor da Solução: R\$ 9.323.046,71

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 22/06/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 04/10/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 14/12/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Nov./2021  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 2.741.347,73

Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 132.098,70

Valor da Solução: R\$ 5.341.583,00



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 15/07/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/01/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 01/07/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Fev. 2021  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | Jun. 2021  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Nov. 2021  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 5.714.883,22

Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42

Valor da Solução: R\$ 8.966.301,37

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 08/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 09/02/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 12/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 06/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 15/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Nov. 2021  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 5.556.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 76.984,53

Valor Fiscalização: R\$ 340.122,55

Valor da Solução: R\$ 8.430.443,49



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 15/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 19/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Nov. 2021  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 6.068.802,63

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 90.683,51

Valor Fiscalização: R\$ 314.405,97

Valor da Solução: R\$ 8.931.228,52

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 28/02/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/05/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 21/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/10/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Dez. 2021  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 5.634.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23

Valor Fiscalização: R\$ 306.939,86

Valor da Solução: R\$ 8.483.403,19



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 27/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 04/04/2019 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 31/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 11/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Dez. 2021  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Solução com infraestrutura concluída, equipamento instalado, aguardando tramitação documental entre o serviço e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, para obtenção da Licença de Operação.



Valor da Obra: R\$ 7.109.893,40

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 92.214,19

Valor Fiscalização: R\$ 272.927,61

Valor da Solução: R\$ 10.364.573,50

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 21/10/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 80%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Out. 2021  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | Dez. 2021  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Fev. 2022  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42

Valor da Solução: R\$ 11.181,512,74

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 29/05/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 21/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 12/12/2019 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 29/10/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 76%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Out. 2021  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | Dez. 2021  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Fev. 2022  |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.757.149,99

Valor Equipamento: 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42

Valor da Solução: R\$ 9.210.886,41



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 24/09/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 70%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Out. 2021  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | Jan. 2022  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Mar. 2022  |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.648.490,00

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42

Valor da Solução: R\$ 11.284.227,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 29/10/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 07/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 24/06/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 11/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 28/09/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 46%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Nov. 2021  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | Fev. 2022  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Mai. 2022  |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.042.276,91

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.616,42

Valor da Solução: R\$ 12.678.013,90

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 13/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 27/09/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/07/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 17/12/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 84%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.240.000,00

Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 277.075,44

Valor da Solução: R\$ 10.088.348,98



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 25/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 24/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/05/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 26/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 66%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 3.353.175,97

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.021,93

Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: -

**Obs.** Contrato rescindido. Em processo licitatório.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 10/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 25/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 14/07/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 46%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 1.307.440,54

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 138.891,93

Valor da Solução: -

**Obs.** Contrato rescindido. Em processo licitatório.



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 18/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 21/06/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 45%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 3.459.283,16

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 91.026,10

Valor Fiscalização: R\$ 139.828,82

Valor da Solução: -

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 21/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/03/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 18/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 44%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.831.284,83

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 87.339,73

Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: -

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 28/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 16/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 43%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 2.081.932,47

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.433,76

Valor Fiscalização: R\$ 168.965,45

Valor da Solução: -



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/10/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 23/08/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 35%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
 Autuado em: 13/11/2019  
 Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
 Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
 emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



**Valor Executado Obra: R\$ 2.291.463,61**

**Valor Equipamento: -**

**Valor Projeto: R\$ 94.678,25**

**Valor Fiscalização: R\$ 147.939,49**

**Valor da Solução: -**



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/11/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 24/08/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 23/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 32%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.760.465,01

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: -

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 21/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 12/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 26%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.531.358,73

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 72.385,08

Valor Fiscalização: R\$ 159.158,39

Valor da Solução: -



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/02/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 05/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 03/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 24%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.630.425,71

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 93.104,01

Valor Fiscalização: R\$ 137.431,63

Valor da Solução: -

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 02/08/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 22%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



Valor Executado Obra: R\$ 1.716.352,06

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 90.253,80

Valor Fiscalização: R\$ 132.256,71

Valor da Solução: -



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 10/10/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 04/09/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 13%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado

Obs: Processo Judicial: 1037217-16.2019.4.01.3400  
Autuado em: 13/11/2019  
Órgão Julgador: 3ª Vara Federal Cível da SJDF  
Aguardando realização de perícia judicial para posterior  
emissão de ordem de serviço para a continuidade da obra.



**Valor Executado Obra: R\$ 386.569,10**

**Valor Equipamento: -**

**Valor Projeto: R\$ 55.304,72**

**Valor Fiscalização: R\$ 75.451,11**

**Valor da Solução: -**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 10/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 17/05/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 06/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 10/01/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 18/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/09/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 21/01/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/02/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 04/04/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 01/03/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41**



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 10/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/09/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 17/02/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 03/03/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2018 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 28/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 05/04/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82



|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 11/05/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 24/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 10/06/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77**



|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 30/08/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 09/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 05/05/2021 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12



|                         |                                                                                    |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/04/2019  |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/06/2020  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 06/07/2020  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Não emitida |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12



|                         |                                                                                    |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 02/04/2020  |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/11/2020  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 27/03/2021  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Não emitida |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

