




PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

Ministério da Saúde

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – SCTIE

AGOSTO 2022

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

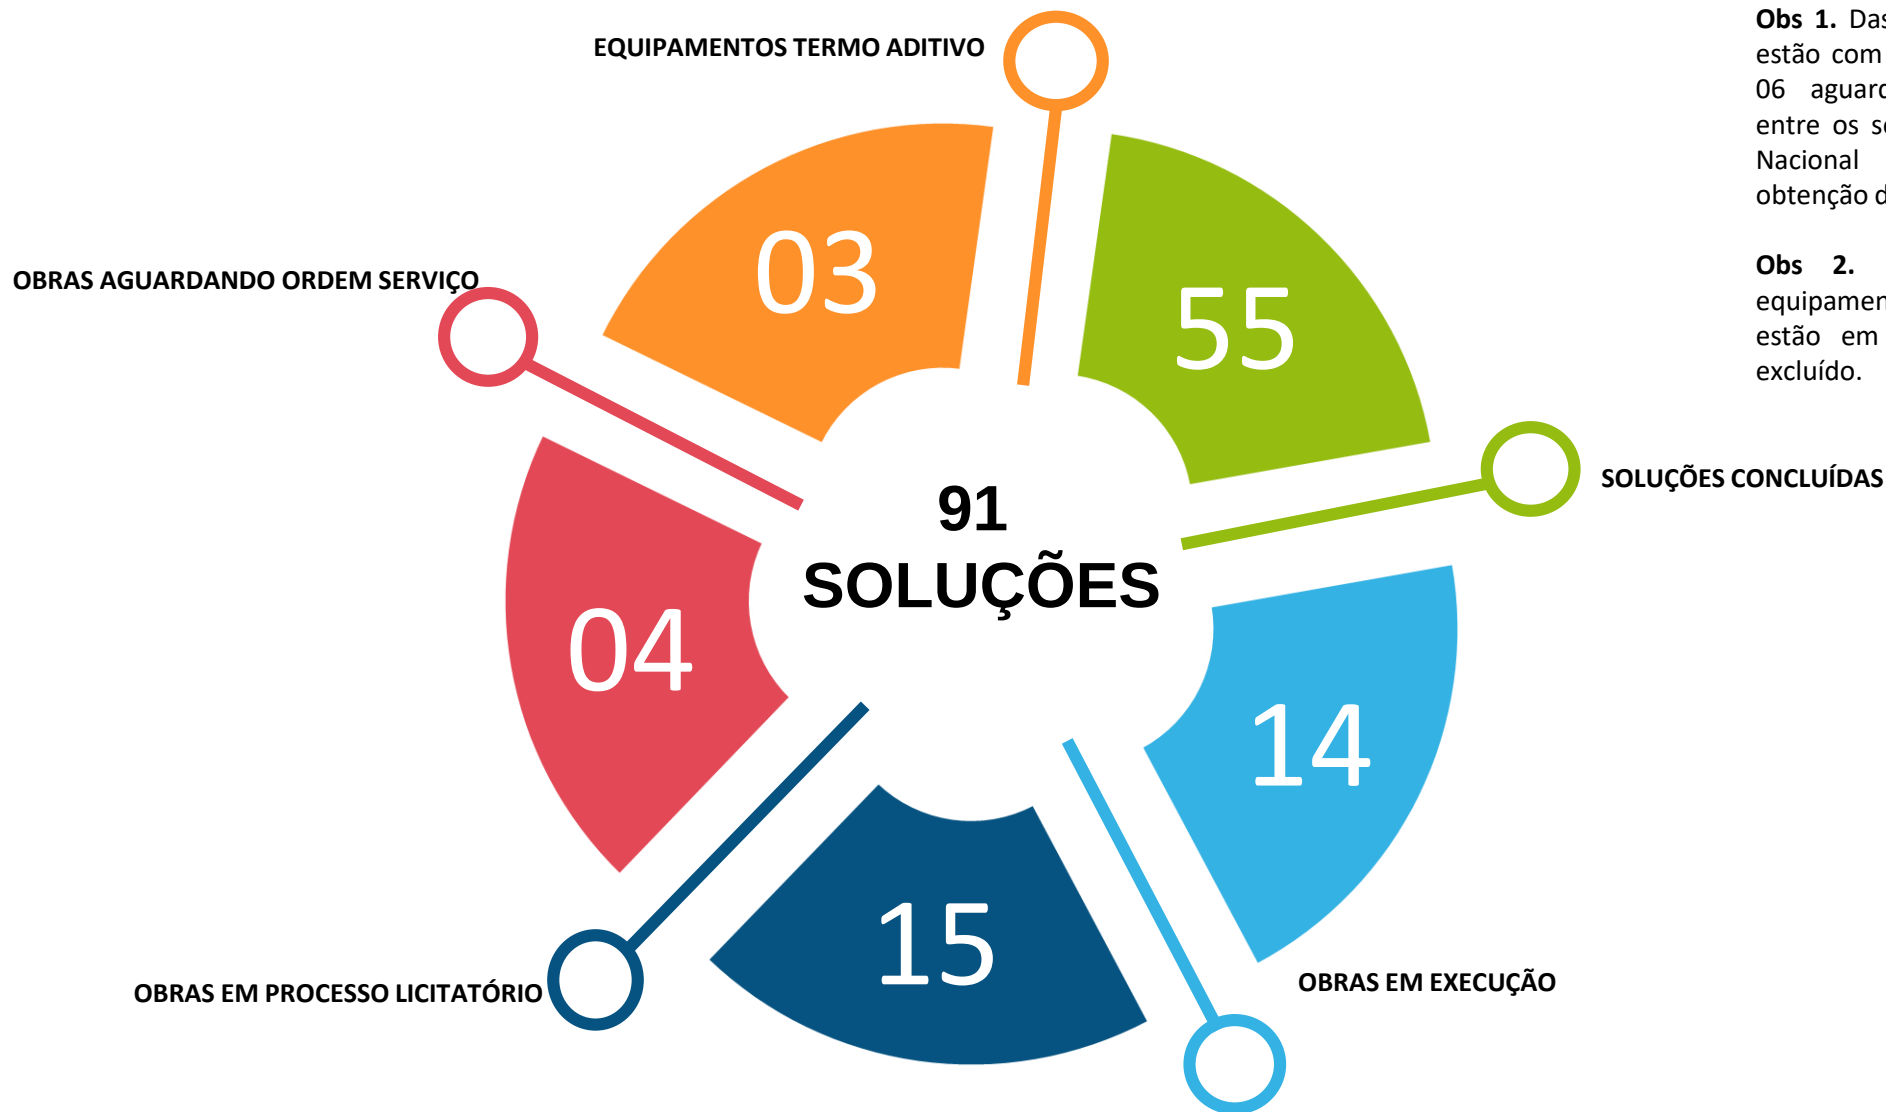

Obs 1. Das 55 soluções concluídas – 49 estão com licença de operação e outras 06 aguardam tramitação documental entre os serviços e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear para obtenção da licença.

Obs 2. Do termo aditivo de 20 equipamentos, 16 já foram instalados, 03 estão em execução e 01 serviço foi excluído.

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	A	Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Aracaju/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
11	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
18	A	Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
20	A	Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
21	C	Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
22	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
23	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
24	C	Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
25	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
26	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
27	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
29	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
30	C	Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
31	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
32	C	Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
33	C	Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
34	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
35	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
36	C	Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
37	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
38	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
39	C	Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ	SOLUÇÃO CONCLUÍDA – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
40	CV	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
41	CV	Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
42	EO	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
43	EO	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO

Legenda:

A = Ampliação
C = Construção

CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
44	EO	Hospital Bruno Born – Lajeado/RS*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
45	EO	Hospital do Câncer INCA I*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
46	EO	Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
47	CV	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
48	CV	Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
49	CV	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
50	CV	Fundação Pio XII – Porto Velho/RO*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
51	EO	Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
52	CV	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR*	EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
53	CV	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
54	CV	Hospital de Juazeiro/BA	EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO
55	EO	Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG	EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO

Obs. *Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

Legenda:

A = Ampliação CV = Casamata Vazia
C = Construção EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES EM EXECUÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC	ACELERADOR LINEAR EM INSTALAÇÃO
2	C	Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE	OBRA EM EXECUÇÃO
3	A	Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
4	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	OBRA EM EXECUÇÃO
5	A	FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
6	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	OBRA EM EXECUÇÃO
7	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	OBRA EM EXECUÇÃO

SOLUÇÕES EM EXECUÇÃO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
8	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
9	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	OBRA EM EXECUÇÃO
10	C	Hospital Rio Doce - Linhares/ES	OBRA EM EXECUÇÃO
11	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	OBRA EM EXECUÇÃO
12	C	Hospital São José - Teresópolis/RJ	OBRA EM EXECUÇÃO
13	C	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	OBRA EM EXECUÇÃO
14	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	OBRA EM EXECUÇÃO

AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Maternidade São José - Colatina/ES	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
2	C	SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
3	C	Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO
4	C	Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP	AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO

SOLUÇÕES EM PROCESSO LICITATÓRIO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ	AGUARDANDO SESSÃO
2	C	Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR	AGUARDANDO SESSÃO
3	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI	AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO
4	C	Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG	AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO
5	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO
6	C	Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE	EM PROCESSO LICITATÓRIO
7	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	EM PROCESSO LICITATÓRIO
8	C	Hospital Geral de Roraima/RR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
9	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS	EM PROCESSO LICITATÓRIO

SOLUÇÕES EM PROCESSO LICITATÓRIO

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
10	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
11	C	Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR	EM PROCESSO LICITATÓRIO
12	C	Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT	EM PROCESSO LICITATÓRIO
13	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
14	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	EM PROCESSO LICITATÓRIO
15	C	Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP	EM PROCESSO LICITATÓRIO

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA
2	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ – 2º Bunker	ADEQUAÇÃO NÃO INICIADA

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ	EQUIPAMENTO EM INSTALAÇÃO

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

	TIPOLOGIA	LOCALIDADE	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	RJ	Rio de Janeiro	Hospital do Cancer III (Ampliação)	Excluído pelo CG
2	CE	Fortaleza	Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE	Excluído pelo CG
3	RN	Natal	Hospital Universitário Onofre Lopes	Excluído pelo CG
4	PR	Ponta Grossa	Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa	Excluído pelo CG
5	GO	Goiânia	Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge	Excluído pelo CG
6	ES	Vitória	Santa Casa de Misericórdia de Vitória	Excluído pelo CG
7	BA	Ilhéus	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilheus	Excluído pelo CG
8	SP	Botucatu	Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina	Excluído pelo CG

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 5.136.862,94

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.312,15

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60

Valor da Solução: R\$ 5.419.031,33

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 15.958,20

Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20

Valor da Solução: R\$ 4.452.806,85

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		24/07/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15
Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
Valor Projeto: R\$ 16.418,01
Valor Fiscalização: R\$ 69.454,00
Valor da Solução: R\$ 4.554.288,79

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.317.980,17

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		26/02/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.533.298,69

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEN DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		29/05/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.652.230,79

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.741.633,13

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEN DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		22/07/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.105.059,44

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 20.499,22

Valor Fiscalização: R\$ 96.756,34

Valor da Solução: R\$ 5.241.108,04

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO		15/05/2015
LICITAÇÃO		16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		20/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.447.738,29

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 19.532,11

Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80

Valor da Solução: R\$ 4.486.980,08

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/07/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.609.105,06

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.553,41

Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13

Valor da Solução: R\$ 5.083.827,97

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/10/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		21/02/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.138.027,23

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 77.246,40

Valor da Solução: R\$ 4.175.537,63

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		21/03/2018

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.815.696,60

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: R\$ 4.828.024,26

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		17/05/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.272.832,40

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.734.967,59

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		29/04/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.347.323,07

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.449.839,78

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		11/06/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.864.379,37

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 135.635,19

Valor da Solução: R\$ 5.380.205,71

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/02/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		23/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.961.778,18

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15

Valor Fiscalização: R\$ 124.911,69

Valor da Solução: R\$ 5.577.035,28

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.486.413,43

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86

Valor Fiscalização: R\$ 132.313,11

Valor da Solução: R\$ 4.998.829,77

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		30/12/2019

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.669.150,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 178.921,93

Valor da Solução: R\$ 4.886.773,37

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/12/2017
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/06/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 75.308,66

Valor Fiscalização: R\$ 228.249,48

Valor da Solução: R\$ 8.427.628,27

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		23/01/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		18/05/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.622.381,29

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 19.601,56

Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79

Valor da Solução: R\$ 5.113.999,01

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		06/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEN DE SERVIÇO		05/07/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		14/07/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.638.164,74

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13

Valor Fiscalização: R\$ 115.748,59

Valor da Solução: R\$ 4.995.794,16

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		16/10/2017
LICITAÇÃO		27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/01/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		18/08/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.314.782,30

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97

Valor Fiscalização: R\$ 254.993,15

Valor da Solução: R\$ 9.108.243,83

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		17/01/2018
LICITAÇÃO		15/03/2018
ORDEN DE SERVIÇO		13/08/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		30/10/2020

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21

Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05

Valor Projeto: R\$ 81.720,06

Valor Fiscalização: R\$ 300.777,38

Valor da Solução: R\$ 7.517.076,70

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		14/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		16/04/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		03/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.083.828,34

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 19.033,61

Valor Fiscalização: R\$ 165.631,87

Valor da Solução: R\$ 5.780.617,18

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		19/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		07/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.682.677,74

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 137.212,25

Valor da Solução: R\$ 5.001.216,05

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEN DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		09/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.597.240,78

Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41

Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 237.552,05

Valor da Solução: R\$ 5.091.502,49

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO		19/03/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEN DE SERVIÇO		06/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		19/01/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.029.396,08

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.548,06

Valor da Solução: R\$ 5.196.286,71

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		26/01/2018
LICITAÇÃO		20/04/2018
ORDEN DE SERVIÇO		18/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		09/04/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 96.871,71

Valor Fiscalização: R\$ 273.559,66

Valor da Solução: R\$ 10.133.348,90

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/12/2017
LICITAÇÃO		27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		22/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		07/05/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.907.667,29

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 98.934,69

Valor Fiscalização: R\$ 266.765,12

Valor da Solução: R\$ 9.627.868,68

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/12/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		25/08/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.509.545,15

Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23

Valor Projeto: R\$ 78.443,83

Valor Fiscalização: R\$ 192.499,09

Valor da Solução: R\$ 9.403.060,30

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/12/2017
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		10/09/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.466.422,28

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83

Valor Fiscalização: R\$ 349.721,82

Valor da Solução: R\$ 9.275.580,51

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		15/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		09/11/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.456.749,86

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 90.683,51

Valor Fiscalização: R\$ 314.603,48

Valor da Solução: R\$ 9.319.173,26

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/04/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		22/11/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.109.857,41

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 92.214,19

Valor Fiscalização: R\$ 145.134,76

Valor da Solução: R\$ 10.236.744,66

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/06/2018
LICITAÇÃO		04/10/2018
ORDEN DE SERVIÇO		14/12/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		29/11/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.706.130,83

Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 283.040,43

Valor da Solução: R\$ 5.457.307,83

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		09/02/2018
LICITAÇÃO		12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		06/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		15/03/2022

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.555.999,84

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 76.984,53

Valor Fiscalização: R\$ 385.472,22

Valor da Solução: R\$ 9.091.828,02

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		28/02/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		17/03/2022

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.748.109,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23

Valor Fiscalização: R\$ 349.642,82

Valor da Solução: R\$ 8.640.215,15

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
PROJETO BÁSICO		15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO		26/11/2019
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		01/07/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Jun. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		26/04/2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.033.836,63

Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 100.377,63

Valor da Solução: R\$ 9.157.015,99

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		21/10/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		05/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/04/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74

Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 167.127,99

Valor da Solução: R\$ 11.181,512,74

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		24/09/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.309.959,37

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ 11.890.532,36

ADESÃO AO PLANO		29/10/2012
PROJETO BÁSICO		07/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		24/06/2019
LICITAÇÃO		11/12/2019
ORDEN DE SERVIÇO		28/09/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.583.382,54

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 175.818,69

Valor da Solução: R\$ 14.166.321,81

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		29/05/2018
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2019
LICITAÇÃO		12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		29/10/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.243.299,69

Valor Equipamento: 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 163.120,38

Valor da Solução: R\$ 9.813.540,65

ADESÃO AO PLANO		30/08/2019
PROJETO BÁSICO		20/11/2020
PROJETO EXECUTIVO		21/05/2021
LICITAÇÃO		30/06/2021
ORDEM DE SERVIÇO		18/05/2022
OBRA CIVIL		11%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		-
CHEGADA EQUIPAMENTO		-
LICENÇA OPERAÇÃO		-

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.241.903,14

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ 6.6676.826,13

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		11/10/2019
PROJETO EXECUTIVO		30/04/2020
LICITAÇÃO		24/11/2021
ORDEN DE SERVIÇO		31/05/2022
OBRA CIVIL		14%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		-
CHEGADA EQUIPAMENTO		-
LICENÇA OPERAÇÃO		-

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.173.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ 12.607.922,99

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		24/01/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEN DE SERVIÇO		26/11/2018
OBRA CIVIL		66%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.980.000,00

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 95.021,93

Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: R\$ 9.529.659,56

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
PROJETO BÁSICO		15/04/2021
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2021
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEN DE SERVIÇO		12/07/2022
OBRA CIVIL		2%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.100.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 7.600.00,00

ADESÃO AO PLANO		19/12/2018
PROJETO BÁSICO		25/06/2021
PROJETO EXECUTIVO		07/02/2022
LICITAÇÃO		03/03/2022
ORDEN DE SERVIÇO		15/08/2022
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.950.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 14.450.000,00

ADESÃO AO PLANO		09/09/2021
PROJETO BÁSICO		06/07/2021
PROJETO EXECUTIVO		28/10/2021
LICITAÇÃO		18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO		15/08/2022
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Concluído

Em andamento

Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.300.000,00

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.800.000,00

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		21/06/2021
PROJETO EXECUTIVO		12/11/2021
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		17/08/2022
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

	Concluído
	Em andamento
	Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.896.471,64

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 14.396.471,64

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO		24/08/2017
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEN DE SERVIÇO		19/08/2022
OBRA CIVIL		32%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.618.438,36

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: R\$ 8.047.555,05

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		06/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		04/06/2020
LICITAÇÃO		19/04/2022
ORDEN DE SERVIÇO		22/08/2022
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.689.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.189.000,00

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/04/2018
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2018
LICITAÇÃO		06/01/2022
ORDEN DE SERVIÇO		22/08/2022
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.595.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.095.000,00

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2018
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2018
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEN DE SERVIÇO		29/08/2022
OBRA CIVIL		1%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

 Concluído
 Em andamento
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.648.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.148.000,00

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/09/2017
LICITAÇÃO		16/07/2018
ORDEN DE SERVIÇO		17/12/2018
OBRA CIVIL		84%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor da Obra: R\$ 5.223.604,30

Valor Equipamento: R\$ 2.491.218,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 210.275,52

Valor da Solução: R\$ 7.986.568,81

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2016
OBRA CIVIL		46%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 1.307.440,54

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		16/07/2018
OBRA CIVIL		43%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 2.081.932,47

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 95.433,76

Valor Fiscalização: R\$ 168.965,45

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		18/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/06/2018
OBRA CIVIL		45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 3.592.426,62

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 91.026,10

Valor Fiscalização: R\$ 139.828,82

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/07/2018
OBRA CIVIL		44%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 1.831.284,83

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 87.339,73

Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO		08/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		23/08/2018
OBRA CIVIL		35%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 2.291.463,61

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 94.678,25

Valor Fiscalização: R\$ 147.939,49

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		21/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/07/2018
OBRA CIVIL		26%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 1.531.358,73

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 72.385,08

Valor Fiscalização: R\$ 159.158,39

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/02/2018
LICITAÇÃO		05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		03/10/2018
OBRA CIVIL		24%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: -

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 93.104,01

Valor Fiscalização: R\$ 137.431,63

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		02/08/2018
OBRA CIVIL		22%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 1.777.147,47

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 90.253,80

Valor Fiscalização: R\$ 132.256,71

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		10/10/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEN DE SERVIÇO		04/09/2018
OBRA CIVIL		13%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		--
CHEGADA EQUIPAMENTO		--
LICENÇA OPERAÇÃO		--

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Retomada de Obras – Em instrução de processo licitatório



Valor Executado Obra: R\$ 386.569,10

Valor Equipamento: -

Valor Projeto: R\$ 55.304,72

Valor Fiscalização: R\$ 75.451,11

Valor da Solução: -

ADESÃO AO PLANO		10/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

ADESÃO AO PLANO		18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		21/01/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		10/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		18/12/2020

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		17/02/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

ADESÃO AO PLANO		16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/04/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		01/03/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		03/03/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO		12/04/2018
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		28/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		05/04/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

ADESÃO AO PLANO		30/08/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		05/05/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12

ADESÃO AO PLANO		02/04/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		11/05/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		24/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		10/06/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77

ADESÃO AO PLANO		02/04/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/11/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/03/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2021

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

ADESÃO AO PLANO		16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		21/01/2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12

ADESÃO AO PLANO		02/07/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/08/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/12/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		21/07/2022

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00

ADESÃO AO PLANO		11/03/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/09/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/12/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO		06/02/2016
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/01/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		28/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Set.2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		02/12/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/06/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		28/04/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		Set. 2022

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39
