



# PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA

Ministério da Saúde  
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde  
Gerência de Projetos – SECTICS


FEVEREIRO 2023



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



# PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS

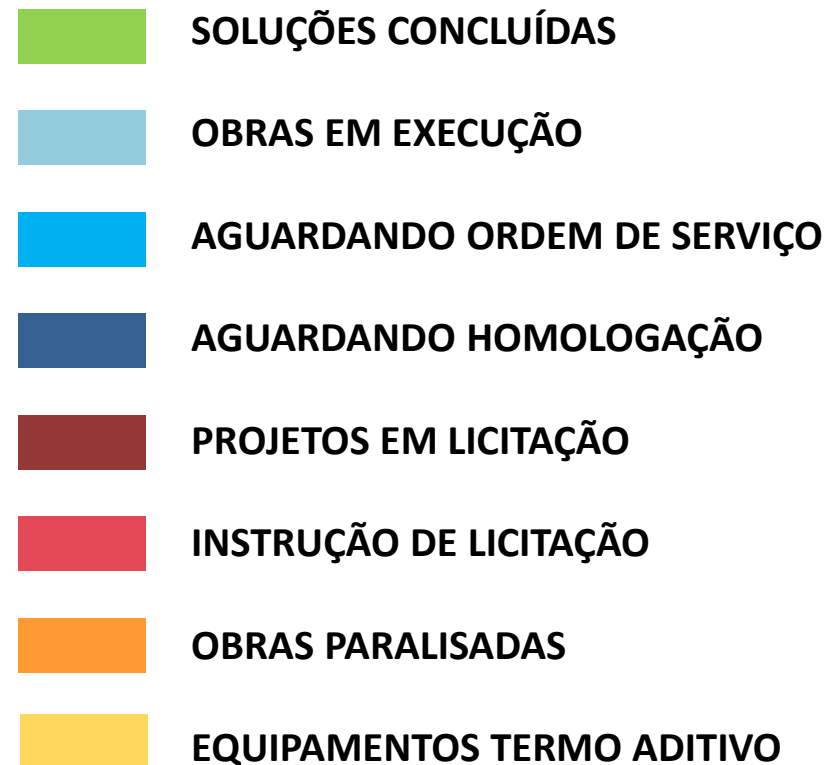

**Obs 1.** Das 58 soluções concluídas – 53 estão com licença de operação e outras 05 aguardam tramitação documental entre os serviços e a CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear para obtenção da licença.

**Obs 2.** Do termo aditivo de 20 equipamentos, 17 já foram instalados, 02 estão em execução e 01 serviço foi excluído.



### SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                      | SITUAÇÃO          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | A         | Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB  | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 2  | A         | Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA            | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 3  | A         | Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR                           | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 4  | A         | Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 5  | A         | Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 6  | A         | Hospital Governador João Alves Filho - Aracaju/SE                | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 7  | A         | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 8  | A         | Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 9  | A         | Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 10 | A         | Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS            | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 11 | A         | Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 12 | A         | Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE        | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 13 | A         | Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 14 | A         | Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 15 | A         | Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP   | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |

## SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                      | SITUAÇÃO          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16 | A         | Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 17 | A         | Instituto de Câncer de Londrina/PR                               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 18 | A         | Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE                      | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 19 | A         | Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR            | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 20 | A         | Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 21 | C         | Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP      | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 22 | C         | Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF                  | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 23 | A         | Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP                | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 24 | C         | Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC                              | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 25 | A         | Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 26 | A         | Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS                         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 27 | A         | Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 28 | C         | Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE        | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 29 | C         | Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP                               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |
| 30 | C         | Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA |



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                         | SITUAÇÃO                                   |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 31 | C         | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT         | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 32 | C         | Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 33 | C         | Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP                      | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 34 | A         | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 35 | C         | Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 36 | C         | Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC                          | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 37 | C         | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR           | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 38 | C         | Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS                       | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 39 | C         | Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ               | SOLUÇÃO CONCLUÍDA                          |
| 40 | C         | Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC                 | SOLUÇÃO CONCLUÍDA - EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 41 | C         | Hospital Cura D’ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE           | SOLUÇÃO CONCLUÍDA - EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |

Legenda:  
A = Ampliação  
C = Construção

CV = Casamata Vazia  
EO = Equip. Obsoleto

### SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                         | SITUAÇÃO                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 42 | CV        | Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP*     | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 43 | CV        | Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC*                               | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 44 | EO        | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP*           | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 45 | EO        | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN*                 | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 46 | EO        | Hospital Bruno Born – Lajeado/RS*                                   | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 47 | EO        | Hospital do Câncer INCA I*                                          | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 48 | EO        | Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP*                       | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 49 | CV        | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP*           | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 50 | CV        | Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG* | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 51 | CV        | Hospital Geral de Caxias do Sul/RS*                                 | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 52 | CV        | Fundação Pio XII – Porto Velho/RO*                                  | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |
| 53 | EO        | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL    | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO |

**Obs.** \*Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

#### Legenda:

A = Ampliação    CV = Casamata Vazia  
C = Construção    EO = Equip. Obsoleto



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                | SITUAÇÃO                                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 54 | CV        | Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO              |
| 55 | EO        | Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ          | EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO              |
| 56 | CV        | Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR* | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 57 | CV        | Hospital de Juazeiro/BA                                    | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |
| 58 | EO        | Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG                        | EQUIP. TERMO ADITIVO – EM LICENÇA DE OPERAÇÃO |

**Obs.** \*Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

**Legenda:**  
A = Ampliação    CV = Casamata Vazia  
C = Construção    EO = Equip. Obsoleto



### SOLUÇÕES EM EXECUÇÃO

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                         | SITUAÇÃO         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | A         | Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP     | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 2  | C         | Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO                           | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 3  | A         | FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP                                      | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 4  | C         | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 5  | C         | Hospital Estadual de Bauru/SP                                       | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 6  | C         | Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP                        | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 7  | C         | SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI           | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 8  | C         | Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG                       | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 9  | C         | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP                      | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 10 | C         | Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP             | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 11 | C         | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP                            | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 12 | C         | Hospital Rio Doce - Linhares/ES                                     | OBRA EM EXECUÇÃO |



### SOLUÇÕES EM EXECUÇÃO

|    | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO                                                           | SITUAÇÃO         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13 | C         | Hospital Geral do Andaraí/RJ                                          | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 14 | C         | Hospital São José - Teresópolis/RJ                                    | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 15 | C         | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE                   | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 16 | C         | Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP                              | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 17 | C         | Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS                | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 18 | C         | Hospital Maternidade São José - Colatina/ES                           | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 19 | C         | Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ                        | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 20 | C         | Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR                              | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 21 | C         | Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE                                    | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 22 | C         | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI | OBRA EM EXECUÇÃO |
| 23 | C         | Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA                    | OBRA EM EXECUÇÃO |

**SOLUÇÕES EM PROCESSO LICITATÓRIO**

|          | <b>TIPOLOGIA</b> | <b>INSTITUIÇÃO</b>                                                 | <b>SITUAÇÃO</b>                |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>C</b>         | Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR                 | <b>AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO</b>  |
| <b>2</b> | <b>C</b>         | Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP                | <b>AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO</b>  |
| <b>3</b> | <b>C</b>         | Hospital Regional de Presidente Prudente/SP                        | <b>EM PROCESSO LICITATÓRIO</b> |
| <b>4</b> | <b>C</b>         | Hospital Geral de Roraima/RR                                       | <b>EM PROCESSO LICITATÓRIO</b> |
| <b>5</b> | <b>C</b>         | Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS             | <b>ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO</b> |
| <b>6</b> | <b>C</b>         | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA                          | <b>EM PROCESSO LICITATÓRIO</b> |
| <b>7</b> | <b>C</b>         | Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT    | <b>ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO</b> |
| <b>8</b> | <b>C</b>         | Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA | <b>EM PROCESSO LICITATÓRIO</b> |



PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

|   | INSTITUIÇÃO                                                          | STATUS               |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ             | ADEQUAÇÃO AUTORIZADA |
| 2 | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ – 2º Bunker | ADEQUAÇÃO AUTORIZADA |



EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

|   | TIPOLOGIA | LOCALIDADE     | INSTITUIÇÃO                                            | STATUS           |
|---|-----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | RJ        | Rio de Janeiro | Hospital do Cancer III (Ampliação)                     | Excluído pelo CG |
| 2 | CE        | Fortaleza      | Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE          | Excluído pelo CG |
| 3 | RN        | Natal          | Hospital Universitário Onofre Lopes                    | Excluído pelo CG |
| 4 | PR        | Ponta Grossa   | Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa    | Excluído pelo CG |
| 5 | GO        | Goiânia        | Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge  | Excluído pelo CG |
| 6 | ES        | Vitória        | Santa Casa de Misericórdia de Vitória                  | Excluído pelo CG |
| 7 | BA        | Ilhéus         | Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilheus | Excluído pelo CG |
| 8 | SP        | Botucatu       | Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina         | Excluído pelo CG |

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 21/11/2014 |
| LICITAÇÃO               |  | 30/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 12/05/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/11/2016 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.461,61

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 5.136.862,94

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 04/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 23/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 07/07/2015 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 03/04/2017 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 17.312,15

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60

Valor da Solução: R\$ 5.419.031,33

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 03/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 07/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 11/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 04/05/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 15.958,20

Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20

Valor da Solução: R\$ 4.452.806,85


|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 08/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 27/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 29/09/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 09/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 25/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 24/07/2017 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15**  
**Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63**  
**Valor Projeto: R\$ 16.418,01**  
**Valor Fiscalização: R\$ 69.454,00**  
**Valor da Solução: R\$ 4.554.288,79**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 04/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 05/01/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/07/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/10/2017 |



Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88


Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 15.341,00

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.317.980,17

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 15/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 21/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 21/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 26/02/2018 |



Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.533.298,69

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 16/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 03/11/2015 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 16/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 29/05/2018 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.652.230,79

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 15.836,87

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.741.633,13

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 16/06/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/11/2015 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 09/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/11/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 22/07/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.105.059,44

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 20.499,22

Valor Fiscalização: R\$ 96.756,34

Valor da Solução: R\$ 5.241.108,04

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 09/02/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 15/05/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/01/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 27/07/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 21/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 20/05/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 2.447.738,29**

**Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88**

**Valor Projeto: R\$ 19.532,11**

**Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80**

**Valor da Solução: R\$ 4.486.980,08**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 24/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 04/08/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 26/03/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 01/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 30/07/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.609.105,06

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.553,41

Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13

Valor da Solução: R\$ 5.083.827,97

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/10/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/02/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 13/07/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 07/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 21/02/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.138.027,23

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 17.123,12

Valor Fiscalização: R\$ 77.246,40

Valor da Solução: R\$ 4.175.537,63

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 07/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 19/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 03/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 14/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 25/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 21/03/2018 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.815.696,60

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 17.765,81

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: R\$ 4.828.024,26

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 30/09/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 13/03/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 22/12/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 17/05/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.272.832,40

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.156,53

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.734.967,59

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 06/10/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO               |  | 13/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 26/09/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 29/04/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.347.323,07

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.657,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.449.839,78

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 02/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 11/06/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 25/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 19/11/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.864.379,37

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 17.023,78

Valor Fiscalização: R\$ 135.635,19

Valor da Solução: R\$ 5.380.205,71

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 25/04/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 06/02/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 31/01/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 23/12/2019 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.961.778,18

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 20.092,15

Valor Fiscalização: R\$ 124.911,69

Valor da Solução: R\$ 5.577.035,28

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 20/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 27/03/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/03/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 20/12/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.486.413,43

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 16.935,86

Valor Fiscalização: R\$ 132.313,11

Valor da Solução: R\$ 4.998.829,77

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 14/05/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 26/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 02/06/2016 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 31/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 30/12/2019 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.669.150,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 178.921,93

Valor da Solução: R\$ 4.886.773,37

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 08/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 20/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 07/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 16/06/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 75.308,66

Valor Fiscalização: R\$ 228.249,48

Valor da Solução: R\$ 8.427.628,27

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 26/09/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 23/01/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 16/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/05/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.622.381,29

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 19.601,56

Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79

Valor da Solução: R\$ 5.113.999,01

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 06/06/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 05/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/11/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 01/06/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 14/07/2020 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.638.164,74

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 16.155,13

Valor Fiscalização: R\$ 115.748,59

Valor da Solução: R\$ 4.995.794,16

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 16/10/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 27/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 07/01/2019 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 04/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/08/2020 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.314.782,30

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 81.131,97

Valor Fiscalização: R\$ 254.993,15

Valor da Solução: R\$ 9.108.243,83

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 18/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 17/01/2018 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 15/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 13/08/2018 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 30/04/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 10/01/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 30/10/2020 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21**  
**Valor Equipamento: R\$ 2.390.464,05**  
**Valor Projeto: R\$ 81.720,06**  
**Valor Fiscalização: R\$ 300.777,38**  
**Valor da Solução: R\$ 7.517.076,70**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 24/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 14/06/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 16/04/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 03/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.083.828,34

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 19.033,61

Valor Fiscalização: R\$ 165.631,87

Valor da Solução: R\$ 5.780.617,18

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 17/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 19/09/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/04/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 07/12/2020 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.682.677,74

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 18.100,78

Valor Fiscalização: R\$ 137.212,25

Valor da Solução: R\$ 5.001.216,05

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 21/07/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/02/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 24/10/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 08/03/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/11/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 09/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.597.240,78

Valor Equipamento: R\$ 2.239.114,41

Valor Projeto: R\$ 17.595,25

Valor Fiscalização: R\$ 237.552,05

Valor da Solução: R\$ 5.091.502,49

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 22/01/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/03/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 17/01/2017 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 06/07/2017 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 16/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 19/01/2021 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.029.396,08

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 17.549,53

Valor Fiscalização: R\$ 130.548,06

Valor da Solução: R\$ 5.196.286,71

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 20/04/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 18/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 30/05/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 09/04/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23**  
**Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30**  
**Valor Projeto: R\$ 96.871,71**  
**Valor Fiscalização: R\$ 273.559,66**  
**Valor da Solução: R\$ 10.133.348,90**

|                         |                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |   | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |   | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |   | 27/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |   | 27/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |   | 22/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |   | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |   | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |   | 14/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 07/05/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.907.667,29

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 98.934,69

Valor Fiscalização: R\$ 266.765,12

Valor da Solução: R\$ 9.627.868,68

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 06/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 01/03/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 12/12/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 04/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 25/08/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 6.509.545,15**

**Valor Equipamento: R\$ 2.622.572,23**

**Valor Projeto: R\$ 78.443,83**

**Valor Fiscalização: R\$ 192.499,09**

**Valor da Solução: R\$ 9.403.060,30**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 14/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 22/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 28/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 10/09/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/10/2021 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.466.422,28

Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R\$ 104.934,83

Valor Fiscalização: R\$ 349.721,82

Valor da Solução: R\$ 9.275.580,51

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 07/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 15/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 19/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 09/11/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.456.749,86

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 90.683,51

Valor Fiscalização: R\$ 314.603,48

Valor da Solução: R\$ 9.319.173,26

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 27/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 04/04/2019 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 31/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 11/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 22/11/2021 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.109.857,41

Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 92.214,19

Valor Fiscalização: R\$ 145.134,76

Valor da Solução: R\$ 10.236.744,66

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 22/06/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 04/10/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 14/12/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 29/11/2021 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.706.130,83

Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 16.698,47

Valor Fiscalização: R\$ 283.040,43

Valor da Solução: R\$ 5.457.307,83

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 08/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 09/02/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 12/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 06/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 15/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 15/03/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.555.999,84

Valor Equipamento: R\$ 3.073.371,43

Valor Projeto: R\$ 76.984,53

Valor Fiscalização: R\$ 385.472,22

Valor da Solução: R\$ 9.091.828,02

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 28/02/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/05/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 21/11/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/10/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 17/03/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.748.109,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 82.749,23

Valor Fiscalização: R\$ 349.642,82

Valor da Solução: R\$ 8.640.215,15

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 15/07/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 26/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/01/2020 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 01/07/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Fev. 2021  |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | Jun. 2021  |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 26/04/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



**Valor da Obra: R\$ 6.033.836,63**

**Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15**

**Valor Projeto: R\$ 61.470,58**

**Valor Fiscalização: R\$ 100.377,63**

**Valor da Solução: R\$ 9.157.015,99**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 24/09/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/10/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 06/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 08/09/2022 |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.309.959,37

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ 11.890.532,36

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/03/2020 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 21/10/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 05/10/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 02/04/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 22/11/2022 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74

Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 167.127,99

Valor da Solução: R\$ 11.181,512,74

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 29/10/2012 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 07/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 24/06/2019 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 11/12/2019 |
| ORDEN DE SERVIÇO        | <div></div> | 28/09/2020 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 25/11/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 09/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | Fev. 2023  |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.583.382,54

Valor Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 175.818,69

Valor da Solução: R\$ 14.166.321,81

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 29/05/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 21/11/2019 |
| LICITAÇÃO               |  | 12/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 29/10/2020 |
| OBRA CIVIL              |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 24/11/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 15/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Fev. 2023  |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.243.299,69  
Valor Equipamento: 3.345.650,00  
Valor Projeto: R\$ 61.470,58  
Valor Fiscalização: R\$ 163.120,38  
Valor da Solução: R\$ 9.813.540,65

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 25/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 24/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 18/01/2022 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 14/07/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 90%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/09/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.980.000,00

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 95.021,93

Valor Fiscalização: R\$ 254.637,63

Valor da Solução: R\$ 9.529.659,56

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 10/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO               |  | 25/03/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 06/09/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 89%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/10/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 2.762.837,53

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 17.566,24

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: R\$ 6.073.234,97

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 21/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/01/2020 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 30/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 63%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/10/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 3.621.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 87.339,73

Valor Fiscalização: R\$ 173.379,55

Valor da Solução: R\$ 7.081.719,28

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/10/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 30/04/2020 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/11/2021 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 31/05/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 65%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/01/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | -          |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | -          |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.173.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ 12.607.922,99

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 31/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 16/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 43%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 8.257.060,33

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 125.400,00

Valor da Solução: R\$ 11.662.460,33

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 11/11/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 24/08/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 24/01/2020 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 19/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 55%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/10/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.618.438,36

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 61.386,10

Valor Fiscalização: R\$ 167.730,59

Valor da Solução: R\$ 8.047.555,05

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 30/08/2019 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 20/11/2020 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 21/05/2021 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 30/06/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 18/05/2022 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 43%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 25/01/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | -          |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | -          |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.241.903,14

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 173.452,41

Valor da Solução: R\$ 6.6676.826,13

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 13/04/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 13/11/2018 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 29/08/2022 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 38%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | --         |

Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.648.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.148.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 06/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 04/06/2020 |
| LICITAÇÃO               |  | 19/04/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 22/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 30%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.689.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.189.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/07/2018 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 09/09/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 23/12/2021 |
| LICITAÇÃO               |  | 28/12/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 29/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 35%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.121.114,39

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.621.114,39

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/12/2018 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 25/06/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 07/02/2022 |
| LICITAÇÃO               |  | 03/03/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 15/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 24%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.950.000,00  
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 14.450.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 09/09/2021 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 06/07/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 28/10/2021 |
| LICITAÇÃO               |  | 18/04/2022 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 15/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 19%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.300.000,00  
 Valor Equipamento: 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 13.800.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 25/08/2018 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 17/09/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 17/02/2022 |
| LICITAÇÃO               |  | 18/04/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 05/09/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 17%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.543.772,87

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 14.043.772,87

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 27/04/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 05/12/2018 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/01/2022 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 22/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 21%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.595.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 13.095.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 01/11/2018 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 21/12/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 25/04/2022 |
| LICITAÇÃO               |  | 26/05/2022 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 31/10/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 15%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.050.000,00  
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 12.550.000,00

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 09/03/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 06/05/2022 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 26/07/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 19/12/2022 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 13%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | --         |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.945.000,00  
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 110.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 11.455.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 25/10/2018 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/11/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 31/03/2022 |
| LICITAÇÃO               |  | 21/06/2022 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 20/10/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 17%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.100.000,00  
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 110.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 13.490.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 19/12/2018 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 19/01/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 25/11/2021 |
| LICITAÇÃO               |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 17/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |  | 10%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.831.403,13

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 15.331.403,13

|                         |                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |   | 04/08/2020 |
| PROJETO BÁSICO          |   | 15/04/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |   | 07/12/2021 |
| LICITAÇÃO               |   | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |   | 12/07/2022 |
| OBRA CIVIL              |   | 11%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |   | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |   | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.100.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 7.600.00,00

|                         |                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |   | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO          |   | 21/06/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       |   | 12/11/2021 |
| LICITAÇÃO               |   | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |   | 17/08/2022 |
| OBRA CIVIL              |   | 9%         |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |   | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |   | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.896.471,64

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 220.000,00

Valor da Solução: R\$ 14.396.471,64

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 06/12/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 11/04/2022 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 14/10/2022 |
| ORDEN DE SERVIÇO        | <div></div> | 05/12/2022 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 5%         |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | --         |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.994.303,54  
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 110.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 11.387.303,54

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 06/02/2019 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 01/12/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 14/04/2022 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 30/05/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 03/01/2023 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 4%         |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | --         |

Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.045.321,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 110.000,00

Valor da Solução: R\$ 12.435.321,00

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 25/04/2019 |
| PROJETO BÁSICO          | <div></div> | 22/03/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO       | <div></div> | 28/03/2022 |
| LICITAÇÃO               | <div></div> | 25/07/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO        | <div></div> | 07/12/2022 |
| OBRA CIVIL              | <div></div> | 2%         |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | --         |

Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.807.000,00  
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00  
 Valor Projeto: R\$ 80.000,00  
 Valor Fiscalização: R\$ 110.000,00  
 Valor da Solução: R\$ 15.197.000,00

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 13/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 27/09/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 16/07/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 17/12/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 84%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.415.600,05

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 35.200,00

Valor da Solução: R\$ 7.730.800,05

**Obs.** Retomada de Obras – Aguardando Homologação da licitação.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 18/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 21/06/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 45%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 7.285.310,85



Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 121.000,00

Valor da Solução: R\$ 10.686.310,85

**Obs.** Retomada de Obras – Em processo licitatório.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

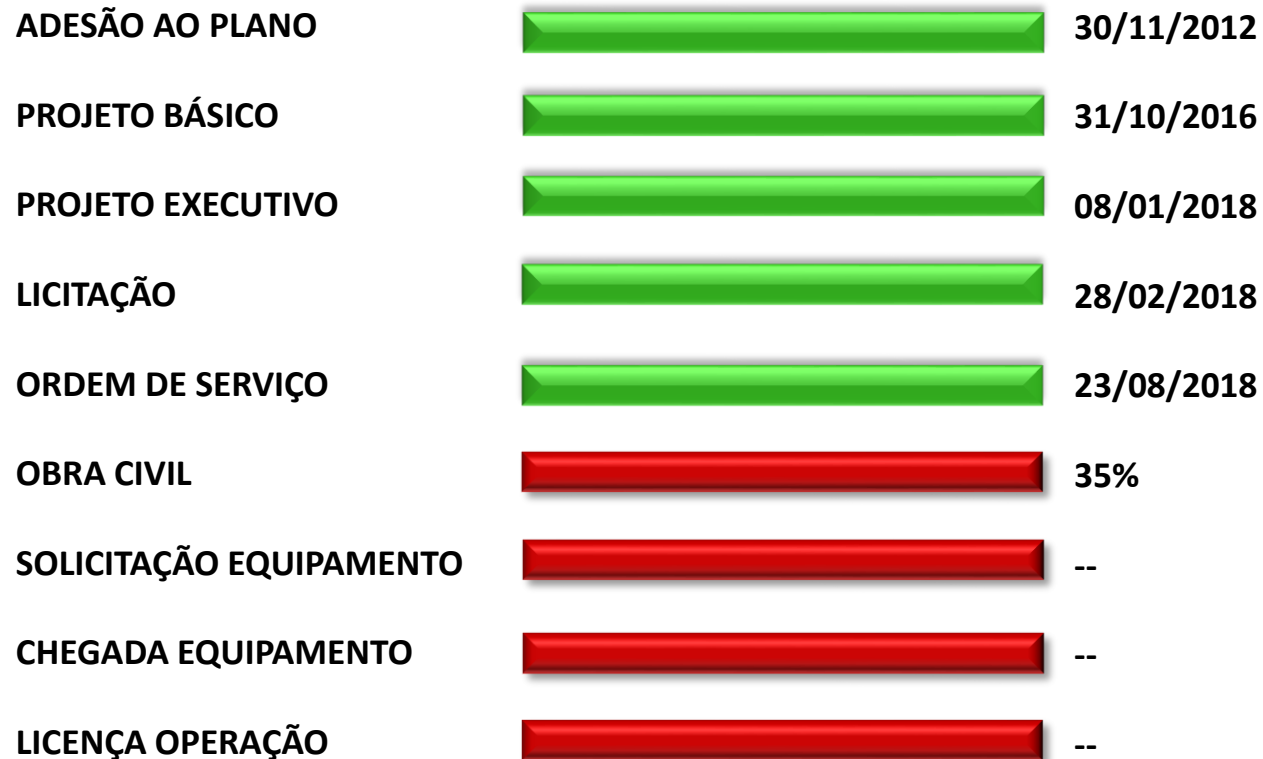

Valor Executado Obra: R\$ 9.070.911,89

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 143.000,00

Valor da Solução: R\$ 12.493.911,89

**Obs.** Retomada de Obras – Em processo licitatório.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 21/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 12/07/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 26%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 7.925.097,40

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 162.800,00

Valor da Solução: R\$ 11.367.897,40

**Obs.** Retomada de Obras – Em processo licitatório.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

|                         |                                                                                     |            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |   | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |   | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |   | 05/02/2018 |
| LICITAÇÃO               |   | 05/04/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |   | 03/10/2018 |
| OBRA CIVIL              |   | 24%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |   | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |   | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 10.655.875,35

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 167.200,00

Valor da Solução: R\$ 14.103.075,35

**Obs.** Retomada de Obras – Atualização do orçamento para licitação.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEN DE SERVIÇO        |  | 02/08/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 22%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 9.995.939,30

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 171.600,00

Valor da Solução: R\$ 13.447.539,30

**Obs.** Retomada de Obras – Atualização do orçamento para licitação.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO          |  | 05/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO       |  | 10/10/2017 |
| LICITAÇÃO               |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO        |  | 04/09/2018 |
| OBRA CIVIL              |  | 13%        |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | --         |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | --         |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | --         |

 Concluído  
 Em andamento  
 Não iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 9.512.036,24

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 80.000,00

Valor Fiscalização: R\$ 191.400,00

Valor da Solução: R\$ 12.983.436,24

**Obs.** Retomada de Obras – Aguardando Homologação da licitação.  
Os valores indicados são estimados e podem sofrer variação.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 10/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 17/05/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 06/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 10/01/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 18/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/09/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 21/01/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 10/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 18/12/2020 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10**

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 09/09/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 17/02/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82**

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 19/02/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 04/04/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 01/03/2021 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 03/03/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 12/04/2018 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 28/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 05/04/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 30/08/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 09/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 05/05/2021 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 11/05/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 24/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 10/06/2021 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



**Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77**

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 27/11/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 27/03/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 19/11/2021 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 06/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 21/01/2022 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 02/07/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 06/08/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 06/12/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 21/07/2022 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 06/02/2016 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 12/01/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 28/11/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | 09/08/2022 |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 25/05/2021 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/08/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 11/09/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | 05/01/2023 |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.186.575,26

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 11/03/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 30/09/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 20/12/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Fev. 2023  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         | <div></div> | 04/08/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       | <div></div> | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO | <div></div> | 02/12/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     | <div></div> | 19/06/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        | <div></div> | Fev. 2023  |

- Concluído
- Em andamento
- Não iniciado

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

|                         |                                                                                    |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ADESÃO AO PLANO         |  | 04/08/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO       |  | 100%       |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 28/04/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO     |  | 11/11/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO        |  | Fev. 2023  |

-  Concluído
-  Em andamento
-  Não iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39

**Obs.** Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.
