

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)


JUNHO/2024



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

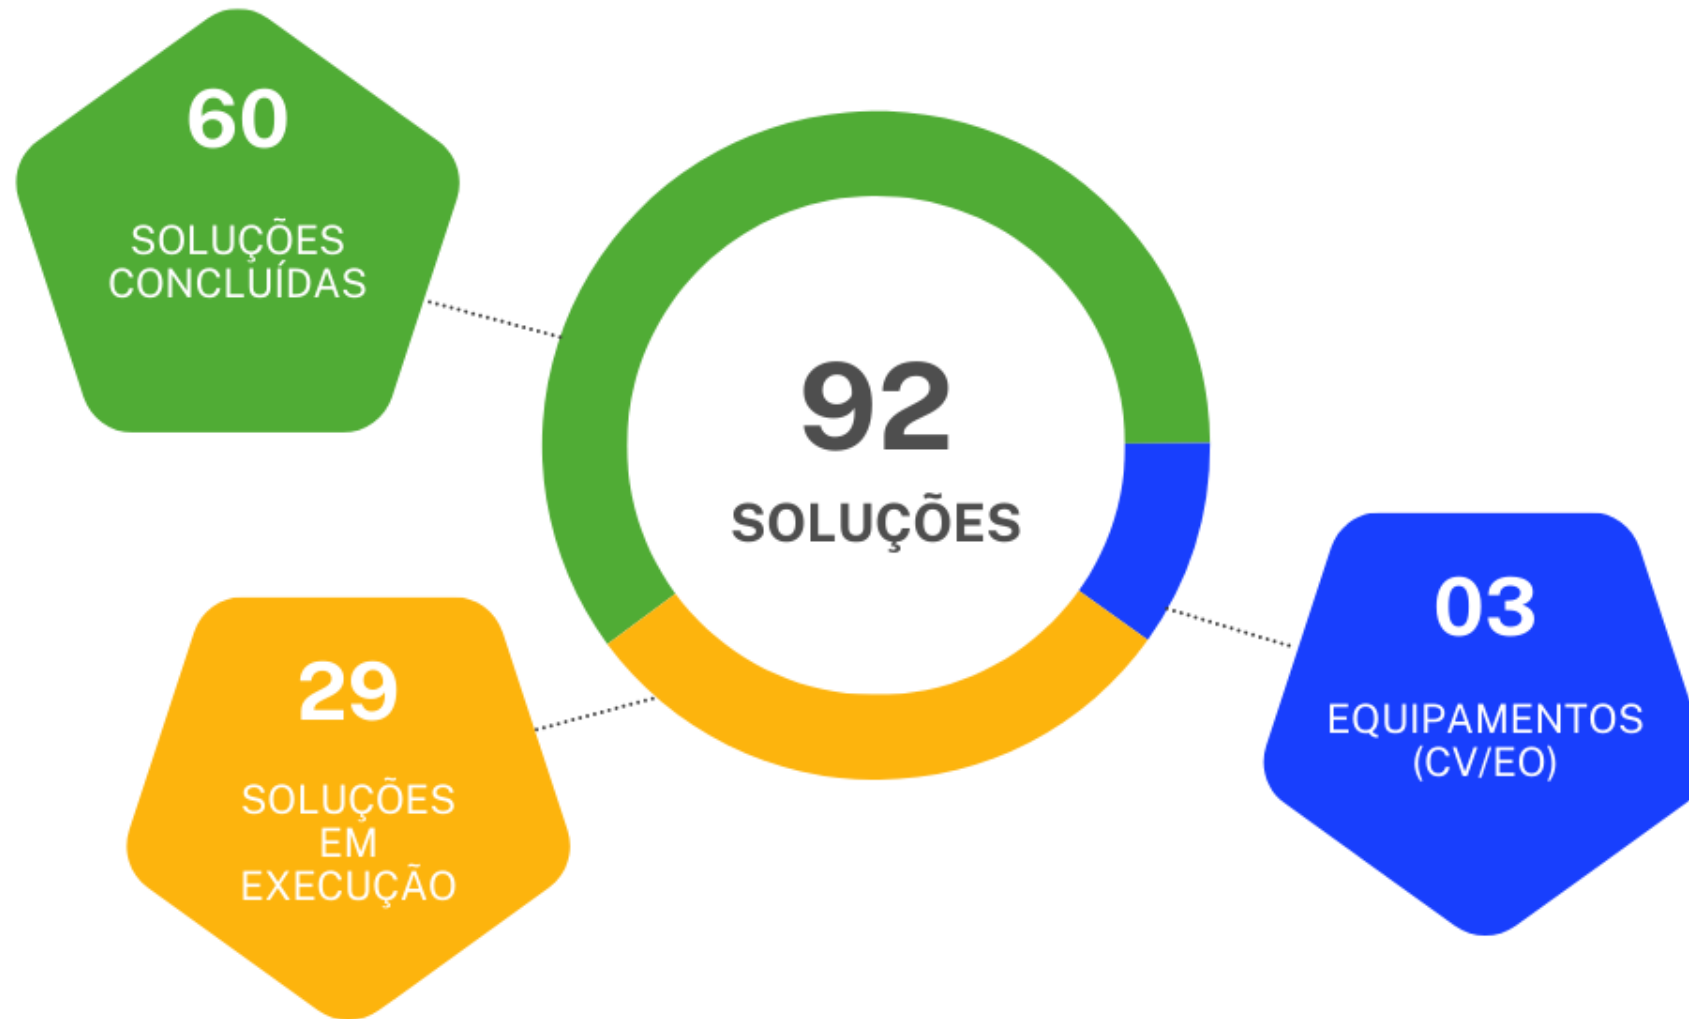

Obs. Das 60 soluções concluídas – 60 estão com licença de operação emitida pelo CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear para obtenção da licença.

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

PER/SUS | JUNHO/2024

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	A	Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Aracajú/SE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
11	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

Legenda:

A = Ampliação

C = Construção

CV = Casamata Vazia

EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

PER/SUS | JUNHO/2024

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
18	A	Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
20	A	Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
21	C	Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
22	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
23	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
24	C	Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
25	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
26	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
27	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
29	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
30	C	Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

Legenda:
A = Ampliação
C = Construção
CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
31	C	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
32	C	Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
33	C	Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
34	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
35	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
36	C	Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
37	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
38	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
39	C	Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
40	C	Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
41	C	Hospital Cura D’ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE	SOLUÇÃO CONCLUÍDA
42	A	Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

Legenda:
A = Ampliação
C = Construção
CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

PER/SUS | JUNHO/2024

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
43	CV	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
44	CV	Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
45	EO	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
46	EO	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
47	EO	Hospital Bruno Born – Lajeado/RS*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
48	EO	Hospital do Câncer INCA I*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
49	EO	Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
50	CV	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
51	CV	Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
52	CV	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
53	CV	Fundação Pio XII – Porto Velho/RO*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
54	EO	Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO

Legenda:

A = Ampliação
C = Construção

CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

Obs. *Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
55	CV	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
56	EO	Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
57	CV	Hospital de Juazeiro/BA	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
58	EO	Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
59	CV	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR*	EQUIP. TERMO ADITIVO – CONCLUÍDO
60	C	Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP	SOLUÇÃO CONCLUÍDA

Legenda:
A = Ampliação
C = Construção
CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

Obs. *Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA EM EXECUÇÃO

PER/SUS | JUNHO/2024



	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO	% de Execução
1	A	Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP**	OBRA CONCLUÍDA	100%
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP**	OBRA CONCLUÍDA	100%
3	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA**	OBRA CONCLUÍDA	100%
4	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ**	OBRA CONCLUÍDA	100%
5	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	OBRA EM EXECUÇÃO	99%
6	C	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	OBRA EM EXECUÇÃO	99%
7	C	Hospital Estadual de Bauru/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	99%
8	C	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	OBRA EM EXECUÇÃO	99%
9	C	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA	OBRA EM EXECUÇÃO	99%
10	C	SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI	OBRA EM EXECUÇÃO	96%
11	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	95%
12	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	94%

Legenda:

A = Ampliação
C = Construção

CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

****Obs.** Aguardando comissionamento do Acelerador Linear para entrega da solução.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO	% de Execução
13	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI	OBRA EM EXECUÇÃO	92%
14	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	92%
15	C	Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG	OBRA EM EXECUÇÃO	91%
16	C	Hospital São José - Teresópolis/RJ	OBRA EM EXECUÇÃO	88%
17	C	Hospital Maternidade São José - Colatina/ES	OBRA EM EXECUÇÃO	87%
18	C	Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR	OBRA EM EXECUÇÃO	87%
19	C	Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR	OBRA EM EXECUÇÃO	85%
20	C	Hospital Rio Doce - Linhares/ES	OBRA EM EXECUÇÃO	85%
21	C	Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ	OBRA EM EXECUÇÃO	84%
22	C	Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP	OBRA EM EXECUÇÃO	83%
23	C	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	OBRA EM EXECUÇÃO	80%
24	A	FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	77%

Legenda:
A = Ampliação
C = Construção
CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO	% de Execução
25	C	Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT	OBRA EM EXECUÇÃO	75%
26	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP	OBRA EM EXECUÇÃO	68%
27	C	Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE	OBRA EM EXECUÇÃO	67%
28	C	Hospital Geral de Roraima/RR	OBRA EM EXECUÇÃO	45%
29	C	Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS	OBRA EM EXECUÇÃO	44%

Legenda:
A = Ampliação
C = Construção
CV = Casamata Vazia
EO = Equip. Obsoleto

	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	EM ADEQUAÇÃO
2	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ – 2º Bunker	AGUARDANDO ADEQUAÇÃO
3	Grupo Hospitalar Conceição	COMISSIONAMENTO DO ACELERADOR LINEAR

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

PER/SUS | JUNHO/2024

	TIPOLOGIA	LOCALIDADE	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	RJ	Rio de Janeiro	Hospital do Cancer III (Ampliação)	Excluído pelo CG
2	CE	Fortaleza	Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE	Excluído pelo CG
3	RN	Natal	Hospital Universitário Onofre Lopes	Excluído pelo CG
4	PR	Ponta Grossa	Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa	Excluído pelo CG
5	GO	Goiânia	Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge	Excluído pelo CG
6	ES	Vitória	Santa Casa de Misericórdia de Vitória	Excluído pelo CG
7	BA	Ilhéus	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilheus	Excluído pelo CG
8	SP	Botucatu	Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina	Excluído pelo CG



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	21/11/2014
LICITAÇÃO	<div></div>	30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	12/05/2015
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	18/11/2016

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74
Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
Valor Projeto: R\$ 47.923,39
Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40
Valor da Solução: R\$ 5.167.324,72

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	07/07/2015
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	03/04/2017

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80
Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
Valor Projeto: R\$ 47.923,39
Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60
Valor da Solução: R\$ 5.449.642,98

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	09/12/2015
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	04/05/2017

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82
Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20
Valor da Solução: R\$ 4.485.509,32

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	29/09/2015
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	24/07/2017

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20

Valor da Solução: R\$ 4.675.974,65

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	05/01/2016
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	18/10/2017

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.351.299,84

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	15/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	09/12/2015
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	26/02/2018

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06
Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20
Valor da Solução: R\$ 4.563.858,58

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	08/10/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	16/06/2016
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	29/05/2018

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.652.230,79

Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.774.456,93

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		22/07/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.105.059,44

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 126.304,73

Valor da Solução: R\$ 5.298.817,88

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	15/05/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	27/07/2017
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	20/05/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.447.738,29

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80

Valor da Solução: R\$ 4.516.108,64

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/07/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.609.105,06
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13
Valor da Solução: R\$ 5.115.935,23

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	04/08/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	26/03/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	30/07/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.138.027,23

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 77.246,40

Valor da Solução: R\$ 4.207,075,18

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		21/03/2018

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.815.696,60

Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: R\$ 4.858.191,12

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	13/03/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	17/05/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.272.832,40

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.766,471,13

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	26/02/2016
LICITAÇÃO	<div></div>	13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	26/09/2017
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	29/04/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.347.323,07




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.480.842,78

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		11/06/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2019

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.864.379,37
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 47.923,39
Valor Fiscalização: R\$ 135.635,19
Valor da Solução: R\$ 5.411.105,32

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	06/02/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	23/12/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.961.778,18
Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 124.911,69
Valor da Solução: R\$ 5.585.603,80

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/12/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.486.413,43

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 132.313,11

Valor da Solução: R\$ 5.030.554,58

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	08/10/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	02/06/2016
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	30/12/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.669.150,00

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 178.921,93

Valor da Solução: R\$ 4.886.773,37

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	20/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	07/11/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	16/06/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.249,48

Valor da Solução: R\$ 8.413.790,19

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	05/07/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	23/01/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	18/05/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.622.381,29

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79

Valor da Solução: R\$ 5.143.058,12

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	06/06/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	05/07/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	14/07/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.638.164,74

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 115.748,59

Valor da Solução: R\$ 5.028.299,70

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	16/10/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	07/01/2019
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	18/08/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.314.782,30

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 254.993,15

Valor da Solução: R\$ 9.088.582,44

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	09/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	17/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	13/08/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	30/10/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 300.777,38

Valor da Solução: R\$ 7.360.299,23

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	14/06/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	16/04/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	03/12/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.083.828,34

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 165.631,87

Valor da Solução: R\$ 5.813.244,24

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/02/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	19/09/2017
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	07/12/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.682.677,74




Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 137.212,25

Valor da Solução: R\$ 5.001.216,05

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		09/12/2020

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.597.240,78
Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 237.552,05
Valor da Solução: R\$ 5.091.502,49

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	19/03/2015
LICITAÇÃO	<div></div>	17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	06/07/2017
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	19/01/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.029.396,08
Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 130.548,06
Valor da Solução: R\$ 5.227.397,85

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	26/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	18/10/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	09/04/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23
Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 273.559,66
Valor da Solução: R\$ 10.097.947,77

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	27/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	22/10/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	07/05/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.907.667,29

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 266.765,12

Valor da Solução: R\$ 9.693.239,40

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	15/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	12/12/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	04/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	25/08/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.509.545,15

Valor Equipamento: R\$ 3.039.119,73

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 192.499,09

Valor da Solução: R\$ 9.802.634,55

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	22/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	10/09/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	18/10/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.466.422,28
Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 349.721,82
Valor da Solução: R\$ 9.232.116,26




ADESÃO AO PLANO	<div></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	07/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	15/10/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	09/11/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.456.749,86
Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 314.603,48
Valor da Solução: R\$ 9.290.160,33

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/04/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		22/11/2021

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.109.857,41
Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 145.134,76
Valor da Solução: R\$ 10.236.744,66

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	22/06/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	14/12/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	29/11/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.706.130,83
Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 172.312,93
Valor da Solução: R\$ 5.391.352,44

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	09/02/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	06/11/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	15/03/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.555.999,84
Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 385.472,22
Valor da Solução: R\$ 8.460.279,05

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	28/02/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	21/11/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	02/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	17/03/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.748.109,00

Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 349.642,82

Valor da Solução: R\$ 8.618.936,50

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/04/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	26/11/2019
LICITAÇÃO	<div></div>	24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	01/07/2020
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	Jun. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	26/04/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.033.836,63
Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 100.377,63
Valor da Solução: R\$ 9.157.015,99

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	13/11/2019
LICITAÇÃO	<div></div>	19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	24/09/2020
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	26/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	06/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	08/09/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.309.959,37

Valor Equipamento: R\$ 3.353.723,28

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 188.676,06

Valor da Solução: R\$ 11.913.829,29

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	13/11/2019
LICITAÇÃO	<div></div>	19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	21/10/2020
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	05/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	02/04/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	22/11/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74 Equipamento:
R\$ 3.345.650,00
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 171.193,61
Valor da Solução: R\$ 11.124.089,93

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	29/10/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	07/04/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	24/06/2019
LICITAÇÃO	<div></div>	11/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	28/09/2020
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	25/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	09/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	23/05/2023

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.583.382,54
Valor Equipamento: R\$ 3.353.723,28
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 214.083,35
Valor da Solução: R\$ 14.212.659,75

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		29/05/2018
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2019
LICITAÇÃO		12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		29/10/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		19/10/2023

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.243.299,69

Valor Equipamento: 3.313.302,65

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 200.277,15

Valor da Solução: R\$ 9.818.350,07

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO		06/09/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/10/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/06/2023
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2024

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.070.278,07

Valor Equipamento: R\$ 2.996.203,97

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 163.514,33

Valor da Solução: R\$ 7.288.006,52

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	19/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	30/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	20/10/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	29/06/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	09/042024

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 6.486.071,34

Valor Equipamento: R\$ 3.006.658,97

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 43.569,48

Valor da Solução: R\$ 9.604.484,55

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	30/08/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	20/11/2020
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	21/05/2021
LICITAÇÃO	<div></div>	30/06/2021
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	18/05/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	25/01/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	31/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	-

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.292.995,53

Valor Equipamento: R\$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 66.416,89

Valor da Solução: R\$ 6.642.583,90

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	06/03/2015
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	04/06/2020
LICITAÇÃO	<div></div>	19/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	22/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	11/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	01/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.015.925,92

Valor Equipamento: R\$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 47.820,16

Valor da Solução: R\$ 13.223.339,46

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	27/09/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	22/05/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	19/06/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	26/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.625.056,27

Valor Equipamento: R\$ 3.006.567,50

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 235.149,78

Valor da Solução: R\$ 12.934.958,31

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	24/08/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	19/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	20/12/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	22/08/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.415.466,73

Valor Equipamento: R\$ 3.006.685,97

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 230.703,83

Valor da Solução: R\$ 10.710.839,68

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	11/10/2019
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	30/04/2020
LICITAÇÃO	<div></div>	24/11/2021
ORDEN DE SERVIÇO	<div></div>	31/05/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	25/01/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	30/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	-

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.839.183,77

Valor Equipamento: R\$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 66.948,22

Valor da Solução: R\$ 13.189.303,47

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	13/07/2018
PROJETO BÁSICO	<div></div>	09/09/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	23/12/2021
LICITAÇÃO	<div></div>	28/12/2021
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	29/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	15/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	21/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.800.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.006.567,50
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 45.163,48
Valor da Solução: R\$ 11.925.535,16

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	24/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	14/07/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	16/09/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	07/08/2023
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.169.697,59

Valor Equipamento: 3.384.647,30

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 342.680,01

Valor da Solução: R\$ 13.958.495,48

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	20/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	13/04/2018
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	13/11/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	29/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	18/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	29/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.648.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.006.658,97

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 44.100,81

Valor da Solução: R\$ 12.766.853,07

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	15/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	16/07/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	20/06/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	20/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 8.753.873,53
Valor Equipamento: R\$ 3.634.032,69
Valor Projeto: R\$ 68.184,76
Valor Fiscalização: R\$ 184.765,17
Valor da Solução: R\$ 14.722.788,62

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	25/08/2018
PROJETO BÁSICO	<div></div>	17/09/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	17/02/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	05/09/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	96%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	16/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	17/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.819.467,78

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00


Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 40.912,80

Valor da Solução: R\$ 14.134.184,76

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	01/11/2018
PROJETO BÁSICO	<div></div>	21/12/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	25/04/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	26/05/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	31/10/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	95%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	06/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

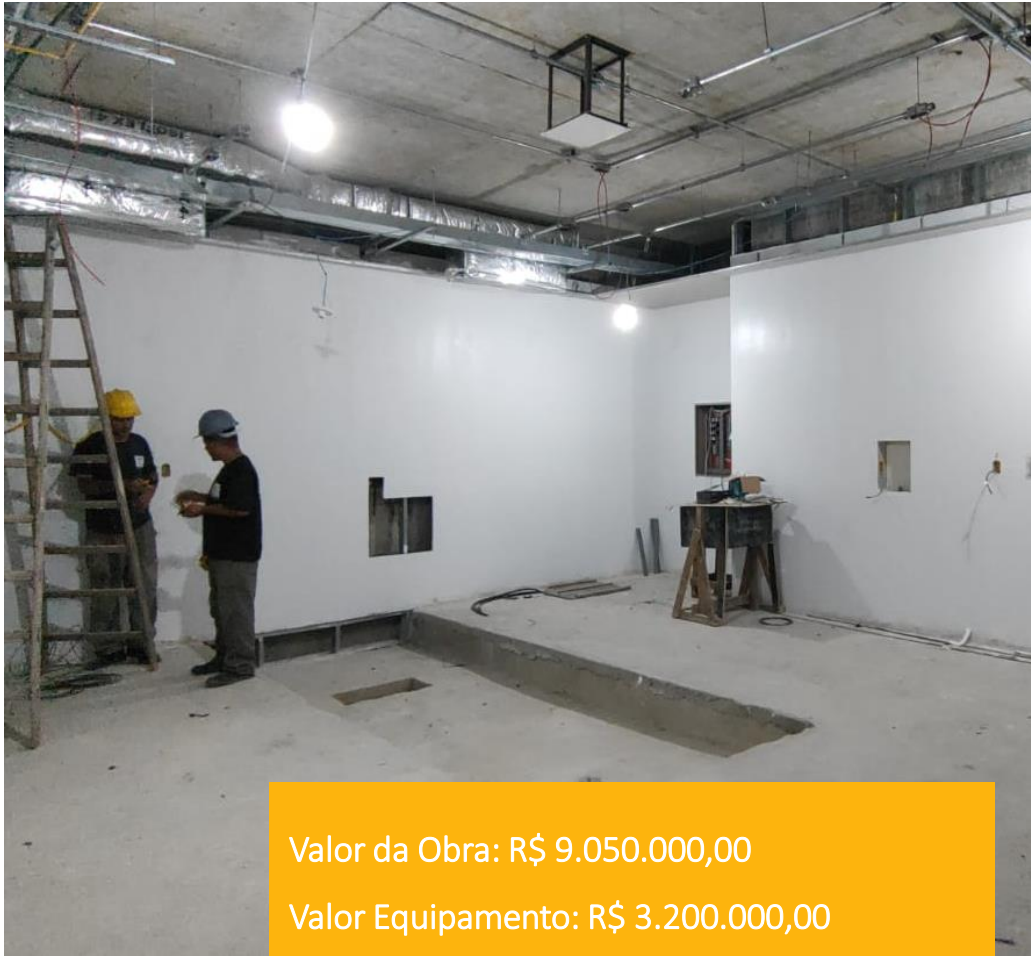

Valor da Obra: R\$ 9.050.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 23.378,75

Valor da Solução: R\$ 12.347.182,93

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/12/2018
PROJETO BÁSICO	<div></div>	25/06/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	07/02/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	03/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	15/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	94%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	05/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	16/06/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.950.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 49.945,49
Valor da Solução: R\$ 14.273.749,67

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	06/02/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	01/12/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	14/04/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	30/05/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	03/01/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	92%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	28/11/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	29/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.045.321,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ -

Valor da Solução: R\$ 12.319.125,18

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	13/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	21/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	14/08/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	92%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	01/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 9.630.921,82

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,80

Valor Fiscalização: R\$ 173.356,88

Valor da Solução: R\$ 13.072.463,50

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	25/10/2018
PROJETO BÁSICO	<div></div>	05/11/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	31/03/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	21/06/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	20/10/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	91%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	14/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.271.066,61

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 26.566,75

Valor da Solução: R\$ 13.571.437,54

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	27/04/2018
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	05/12/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	06/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	22/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	88%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	16/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	18/05/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.595.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 47.820,15

Valor da Solução: R\$ 12.911.004,91

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	10/10/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	08/05/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	87%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	07/02/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 9.898.569,10

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 81.147,72

Valor da Solução: R\$ 13.237.726,97

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	19/12/2018
PROJETO BÁSICO	<div></div>	19/01/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	25/11/2021
LICITAÇÃO	<div></div>	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	17/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	87%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	28/11/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 12.506.871,03
Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 44.632,15
Valor da Solução: R\$ 15.825.307,36

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	09/03/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	06/05/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	26/07/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	19/12/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	85%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	05/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	22/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.945.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ -

Valor da Solução: R\$ 14.218.804,18

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	21/06/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	12/11/2021
LICITAÇÃO	<div></div>	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	17/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	85%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	30/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.843.163,08
Valor Equipamento: 3.200.000,00
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 43.038,15
Valor da Solução: R\$ 15.160.005,41

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	25/04/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	22/03/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	28/03/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	25/07/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	07/12/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	84%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	23/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	Ago 2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.807.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ -
Valor da Solução: R\$ 15.080.804,18

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	11/12/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	25/01/2022
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	25/08/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	20/12/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	27/03/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	83%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	15/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 12.898.989,27

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ -

Valor da Solução: R\$ 16.172.793,45

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	30/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	08/01/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	18/09/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	80%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	09/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 10.821.463,61

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 159.976,18

Valor da Solução: R\$ 14.249.624,55

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	04/08/2020
PROJETO BÁSICO	<div></div>	15/04/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	07/12/2021
LICITAÇÃO	<div></div>	18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	12/07/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	77%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	06/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.250.048,48

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 12.220,71

Valor da Solução: R\$ 7.536.073,37

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	05/02/2018
LICITAÇÃO	<div></div>	05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	28/08/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	75%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 12.818.998,56

Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 149.459,24

Valor da Solução: R\$ 16.236.642,56

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	09/09/2021
PROJETO BÁSICO	<div></div>	06/07/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	28/10/2021
LICITAÇÃO	<div></div>	18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	15/08/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	68%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	15/02/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.300.000,00
Valor Equipamento: 3.200.000,00
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 47.820,16
Valor da Solução: R\$ 13.621.624,34

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	11/07/2019
PROJETO BÁSICO	<div></div>	06/12/2021
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	11/04/2022
LICITAÇÃO	<div></div>	14/10/2022
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	05/12/2022
OBRA CIVIL	<div></div>	67%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.819.467,78

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 13.283,38

Valor da Solução: R\$ 14.106.555,34

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	14/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	19/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	21/08/2023
OBRA CIVIL	<div></div>	45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 11.737.147,47
Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
Valor Projeto: R\$ 68.184,76
Valor Fiscalização: R\$ 119.082,63
Valor da Solução: R\$ 15.124.414,86

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	16/11/2012
PROJETO BÁSICO	<div></div>	26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO	<div></div>	18/12/2017
LICITAÇÃO	<div></div>	06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO	<div></div>	21/06/2018
OBRA CIVIL	<div></div>	45%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	--
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	--
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 11.525.415,38

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 153.199,12

Valor da Solução: R\$ R\$ 14.946,799,26

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	10/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	17/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	06/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	10/01/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	21/01/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	10/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	18/12/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	06/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	09/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	17/02/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	19/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	04/04/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	01/03/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	01/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	03/03/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	12/04/2018
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	16/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	28/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	05/04/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.063.091,18

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	30/08/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	09/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	05/05/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	02/04/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	11/05/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	24/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	10/06/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	02/04/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	27/11/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	27/03/2021
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	19/11/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	06/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	21/01/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	02/07/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	06/08/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	06/12/2021
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	21/07/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	06/02/2016
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	12/01/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	28/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	09/08/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	25/05/2021
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	04/08/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	11/09/2022
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	05/01/2023



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Valor Equipamento: R\$ 3.186.575,26

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	02/12/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	19/06/2021
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	20/03/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.092.532,98

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	28/04/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	11/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	06/04/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	11/03/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	30/09/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	20/12/2020
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	20/03/2024



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.


- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Valor Equipamento: R\$ 3.304.342,48

ADESÃO AO PLANO	<div></div>	01/08/2023
OBRA DE ADEQUAÇÃO	<div></div>	100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO	<div></div>	05/01/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO	<div></div>	30/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO	<div></div>	--

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

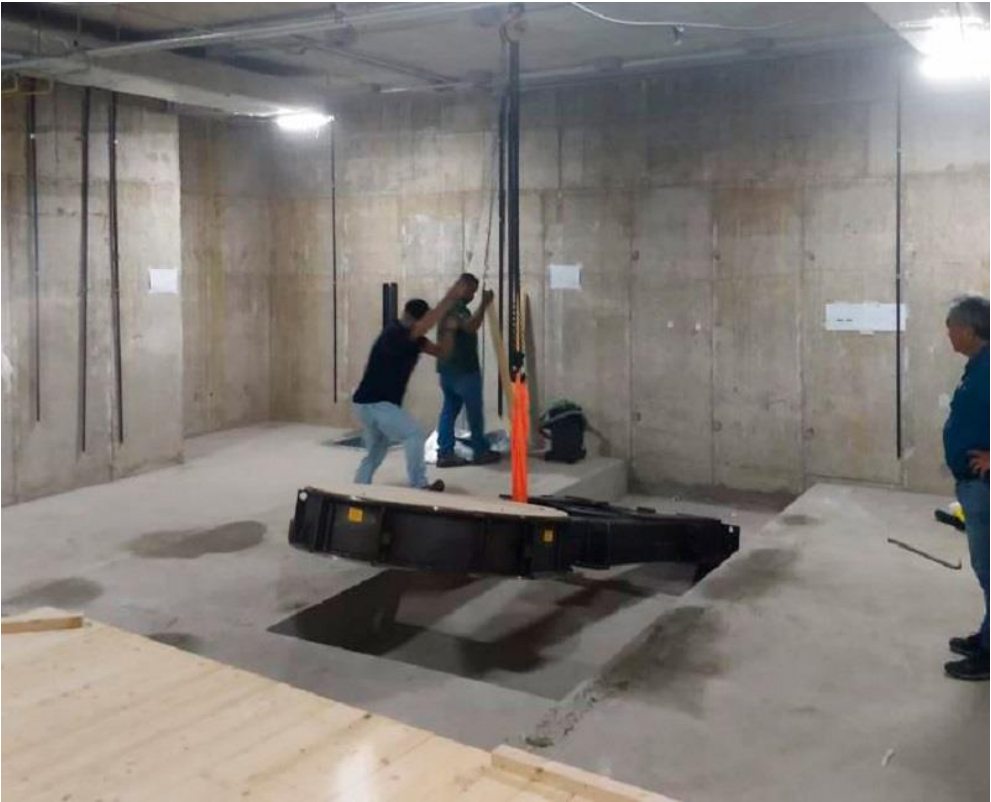

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50
