


PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

JULHO/2025

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

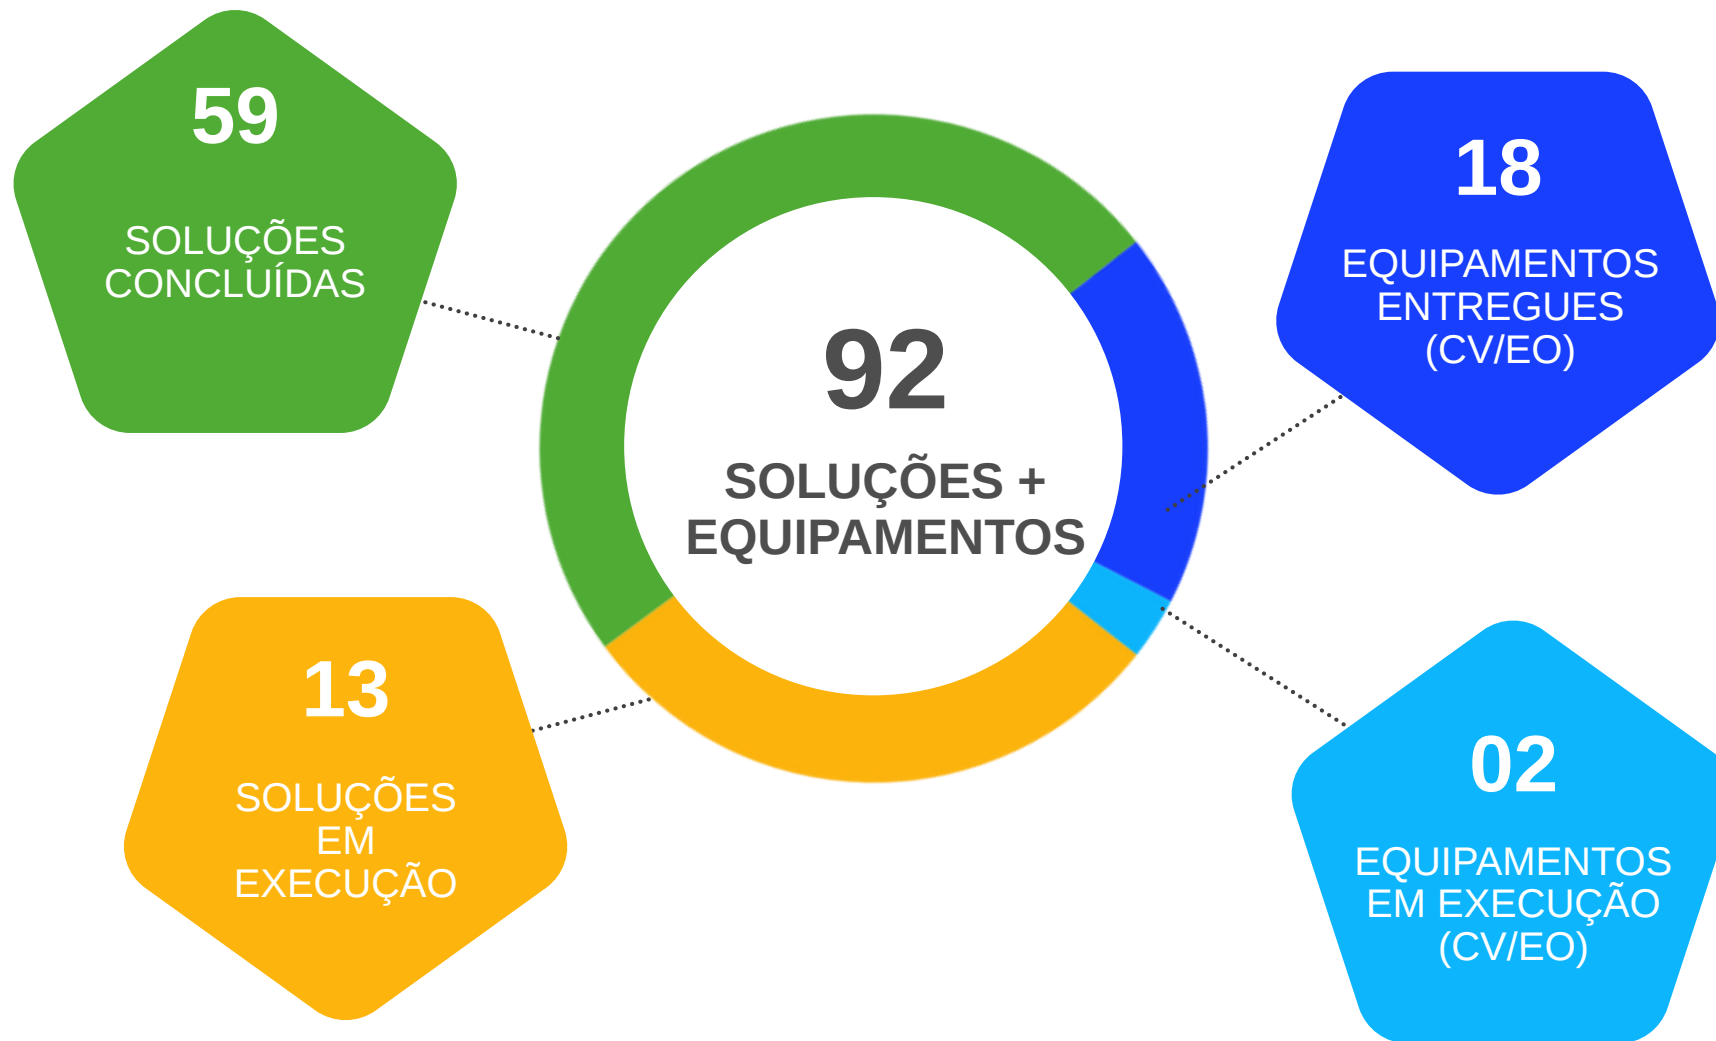

Obs: Das 75 soluções de Radioterapia comissionadas, 06 aguardam licença de operação da CNEN;

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	A	Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB	Solução Concluída
2	A	Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA	Solução Concluída
3	A	Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR	Solução Concluída
4	A	Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL	Solução Concluída
5	A	Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF	Solução Concluída
6	A	Hospital Governador João Alves Filho - Aracaju/SE	Solução Concluída
7	A	Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE	Solução Concluída
8	A	Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP	Solução Concluída
9	A	Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP	Solução Concluída
10	A	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS	Solução Concluída
11	A	Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM	Solução Concluída
12	A	Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE	Solução Concluída
13	A	Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS	Solução Concluída
14	A	Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC	Solução Concluída
15	A	Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP	Solução Concluída
16	A	Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP	Solução Concluída
17	A	Instituto de Câncer de Londrina/PR	Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
18	A	Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE	Solução Concluída
19	A	Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR	Solução Concluída
20	A	Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS	Solução Concluída
21	C	Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP	Solução Concluída
22	C	Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF	Solução Concluída
23	A	Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP	Solução Concluída
24	C	Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC	Solução Concluída
25	A	Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE	Solução Concluída
26	A	Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS	Solução Concluída
27	A	Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC	Solução Concluída
28	C	Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE	Solução Concluída
29	C	Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP	Solução Concluída
30	C	Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP	Solução Concluída
31	CB	Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT	Solução Concluída
32	CB	Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA	Solução Concluída
33	C	Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP	Solução Concluída
34	A	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS	Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
35	C	Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP	Solução Concluída
36	C	Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC	Solução Concluída
37	C	Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR	Solução Concluída
38	C	Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS	Solução Concluída
39	C	Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ	Solução Concluída
40	C	Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC	Solução Concluída
41	C	Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE	Solução Concluída
42	A	Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS	Solução Concluída
43	C	Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP	Solução Concluída
44	C	Hospital Geral do Andaraí/RJ	Solução Concluída
45	C	Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP	Solução Concluída
46	A	Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP	Solução Concluída
47	C	Hospital Estadual de Bauru – Bauru/SP	Solução Concluída
48	C	Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI	Solução Concluída
49	C	Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP	Solução Concluída
50	C	Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE	Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
51	C	SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI	Solução Concluída
52	C	Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG	Solução Concluída
53	A	FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP	Solução Concluída
54	C	Hospital São José - Teresópolis/RJ	Aguardando Licença de operação
55	CB	Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO	Aguardando Licença de operação
56	C	Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP	Aguardando Licença de operação
57	CB	Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA	Aguardando Licença de operação
58	C	Hospital Regional de Presidente Prudente/SP	Aguardando Licença de operação
59	CB	Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA	Aguardando Licença de operação

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA EM EXECUÇÃO

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	C	Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA	Solução em Execução
2	C	Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO	Solução em Execução
3	C	Hospital Maternidade São José - Colatina/ES	Solução em Execução
4	C	Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR	Solução em Execução
5	C	Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR	Solução em Execução
6	C	Hospital Rio Doce - Linhares/ES	Solução em Execução
7	C	Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ	Solução em Execução
8	CB	Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP	Solução em Execução
9	CB	Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT	Solução em Execução
10	C	Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP	Solução em Execução
11	C	Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE	Solução em Execução
12	C	Hospital Geral de Roraima/RR	Solução em Execução
13	CB	Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS	Solução em Execução

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
1	CV	Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
2	CV	Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
3	EO	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
4	EO	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
5	EO	Hospital Bruno Born – Lajeado/RS	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
6	EO	Hospital do Câncer INCA I	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
7	EO	Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
8	CV	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
9	CV	Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
10	CV	Hospital Geral de Caxias do Sul/RS	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
11	CV	Fundação Pio XII – Porto Velho/RO	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
12	EO	Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
13	CV	Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
14	EO	Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
15	CV	Hospital de Juazeiro/BA	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
16	EO	Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

Nº	TIPOLOGIA	INSTITUIÇÃO	SITUAÇÃO
17	CV	Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR	Equipamento do Termo Aditivo – Concluído
18	CV	Grupo Hospitalar Conceição – Porto Alegre/RS	Equipamento do Termo Aditivo - Concluído
19	CV	Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ	Bunker em adequação
20	EO	Hospital Geral do Oeste – Barreiras/BA	Bunker em adequação

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

Nº	TIPOLOGIA	LOCALIDADE	INSTITUIÇÃO	STATUS
1	A	Rio de Janeiro	Hospital do Cancer III (Ampliação)	Excluído pelo CG
2	C	Fortaleza	Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE	Excluído pelo CG
3	C	Natal	Hospital Universitário Onofre Lopes	Excluído pelo CG
4	C	Ponta Grossa	Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa	Excluído pelo CG
5	A	Goiânia	Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge	Excluído pelo CG
6	A	Vitória	Santa Casa de Misericórdia de Vitória	Excluído pelo CG
7	C	Ilhéus	Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus	Excluído pelo CG
8	A	Botucatu	Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina	Excluído pelo CG

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia
CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2014
LICITAÇÃO		30/01/2015
ORDEM DE SERVIÇO		12/05/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		18/11/2016

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74

Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40

Valor da Solução: R\$ 5.167.324,72

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		04/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		23/03/2015
ORDEM DE SERVIÇO		07/07/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2015
CHEGADA EQUIPAMENTO		23/09/2016
LICENÇA OPERAÇÃO		03/04/2017

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80
Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
Valor Projeto: R\$ 47.923,39
Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60
Valor da Solução: R\$ 5.449.642,98

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		03/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		07/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		04/05/2017

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82
Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20
Valor da Solução: R\$ 4.485.509,32

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		27/05/2015
ORDEM DE SERVIÇO		29/09/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/05/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/03/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		24/07/2017

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20

Valor da Solução: R\$ 4.675.974,65

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		04/08/2015
ORDEM DE SERVIÇO		05/01/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/07/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2017

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88

Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.351.299,84

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		16/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		29/05/2018

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.652.230,79
Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80
Valor da Solução: R\$ 4.774.456,93

ADESÃO AO PLANO		15/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		21/07/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/12/2015
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		26/02/2018

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06
Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20
Valor da Solução: R\$ 4.563.858,58

ADESÃO AO PLANO		07/11/2012
PROJETO BÁSICO		19/12/2014
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		03/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		14/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/10/2016
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/09/2017
LICENÇA OPERAÇÃO		21/03/2018

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.815.696,60
Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20
Valor da Solução: R\$ 4.858.191,12

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		30/09/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		13/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/12/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		17/05/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.272.832,40
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29
Valor da Solução: R\$ 4.766,471,13

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/07/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.138.027,23

Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 77.246,40

Valor da Solução: R\$ 4.207,075,18

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/03/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		20/12/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.486.413,43
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 132.313,11
Valor da Solução: R\$ 5.030.554,58

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/10/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		13/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		29/04/2019

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.347.323,07

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.480.842,78

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		22/01/2015
PROJETO EXECUTIVO		19/03/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/08/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		19/01/2021

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.029.396,08

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 130.548,06

Valor da Solução: R\$ 5.227.397,85

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/02/2015
PROJETO EXECUTIVO		15/05/2015
LICITAÇÃO		16/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		27/07/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/12/2017
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/06/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		20/05/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.447.738,29
Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80
Valor da Solução: R\$ 4.516.108,64

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/05/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		26/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		02/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		30/12/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.669.150,00
Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04
Valor Projeto: R\$ 19.908,40
Valor Fiscalização: R\$ 178.921,93
Valor da Solução: R\$ 4.886.773,37

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		26/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		23/01/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		18/05/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.622.381,29

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79

Valor da Solução: R\$ 5.143.058,12

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		16/06/2015
PROJETO EXECUTIVO		07/10/2015
LICITAÇÃO		24/11/2015
ORDEM DE SERVIÇO		09/06/2016
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/02/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/11/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		22/07/2019

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.105.059,44

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 126.304,73

Valor da Solução: R\$ 5.298.817,88

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/04/2016
PROJETO EXECUTIVO		05/07/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		06/02/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/01/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		23/12/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.961.778,18

Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 124.911,69

Valor da Solução: R\$ 5.585.603,80

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		02/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		11/06/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.864.379,37

Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R\$ 135.635,19

Valor da Solução: R\$ 5.411.105,32

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/03/2017
PROJETO EXECUTIVO		04/08/2017
LICITAÇÃO		22/09/2017
ORDEM DE SERVIÇO		26/03/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/06/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/02/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		30/07/2019

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.609.105,06
Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
Valor Projeto: R\$ 48.660,67
Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13
Valor da Solução: R\$ 5.115.935,23

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		20/12/2017
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		16/06/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07
Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 228.249,48
Valor da Solução: R\$ 8.413.790,19

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/07/2015
PROJETO EXECUTIVO		26/02/2016
LICITAÇÃO		01/02/2017
ORDEM DE SERVIÇO		24/10/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		08/03/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/11/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		09/12/2020

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.597.240,78

Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 237.552,05

Valor da Solução: R\$ 5.091.502,49

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		14/06/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/12/2017
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		10/09/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		18/10/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.466.422,28
Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 349.721,82
Valor da Solução: R\$ 9.232.116,26

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		11/02/2015
LICITAÇÃO		17/01/2017
ORDEM DE SERVIÇO		19/09/2017
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/04/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/10/2018
LICENÇA OPERAÇÃO		07/12/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.682.677,74

Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 137.212,25

Valor da Solução: R\$ 5.001.216,05

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		23/05/2016
PROJETO EXECUTIVO		06/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		05/07/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/11/2018
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/06/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		14/07/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.638.164,74

Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 115.748,59

Valor da Solução: R\$ 5.028.299,70

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		22/06/2018
LICITAÇÃO		04/10/2018
ORDEM DE SERVIÇO		14/12/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		29/11/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.706.130,83

Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 172.312,93

Valor da Solução: R\$ 5.391.352,44

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		16/10/2017
LICITAÇÃO		27/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		07/01/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		18/08/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.314.782,30

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 254.993,15

Valor da Solução: R\$ 9.088.582,44

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		24/11/2014
PROJETO EXECUTIVO		14/06/2017
LICITAÇÃO		19/12/2017
ORDEM DE SERVIÇO		16/04/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		03/12/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.083.828,34

Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 165.631,87

Valor da Solução: R\$ 5.813.244,24

ADESÃO AO PLANO		09/11/2012
PROJETO BÁSICO		18/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		17/01/2018
LICITAÇÃO		15/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		13/08/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/04/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		10/01/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		30/10/2020

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21

Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 300.777,38

Valor da Solução: R\$ 7.360.299,23

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		26/01/2018
LICITAÇÃO		20/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/05/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		09/04/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23
Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 273.559,66
Valor da Solução: R\$ 10.097.947,77

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/12/2017
LICITAÇÃO		27/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		22/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/12/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		07/05/2021

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.907.667,29

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 266.765,12

Valor da Solução: R\$ 9.693.239,40

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		06/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		01/03/2018
ORDEM DE SERVIÇO		12/12/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		25/08/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.509.545,15

Valor Equipamento: R\$ 3.039.119,73

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 192.499,09

Valor da Solução: R\$ 9.802.634,55

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		08/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		09/02/2018
LICITAÇÃO		12/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		06/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		15/03/2022

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.555.999,84

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 385.472,22

Valor da Solução: R\$ 8.460.279,05

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
PROJETO BÁSICO		15/07/2019
PROJETO EXECUTIVO		26/11/2019
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		01/07/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		Fev. 2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		Jun. 2021
LICENÇA OPERAÇÃO		26/04/2022

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.033.836,63

Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 100.377,63

Valor da Solução: R\$ 9.157.015,99

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/11/2017
PROJETO EXECUTIVO		28/02/2018
LICITAÇÃO		16/05/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/11/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/10/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		17/03/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.748.109,00
Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 349.642,82
Valor da Solução: R\$ 8.618.936,50

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2017
LICITAÇÃO		07/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		15/10/2018
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/06/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/02/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		09/11/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.456.749,86

Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 314.603,48

Valor da Solução: R\$ 9.290.160,33

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		27/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		04/04/2019
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		31/01/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		22/11/2021

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.109.857,41

Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 145.134,76

Valor da Solução: R\$ 10.236.744,66

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		21/10/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		05/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/04/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		22/11/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74

Equipamento: R\$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 171.193,61

Valor da Solução: R\$ 11.124.089,93

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2019
LICITAÇÃO		19/03/2020
ORDEM DE SERVIÇO		24/09/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		26/10/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		08/09/2022

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.309.959,37
Valor Equipamento: R\$ 3.353.723,28
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 188.676,06
Valor da Solução: R\$ 11.913.829,29

ADESÃO AO PLANO		29/10/2012
PROJETO BÁSICO		07/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		24/06/2019
LICITAÇÃO		11/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		28/09/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		23/05/2023

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.583.382,54
Valor Equipamento: R\$ 3.353.723,28
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 214.083,35
Valor da Solução: R\$ 14.212.659,75

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		29/05/2018
PROJETO EXECUTIVO		21/11/2019
LICITAÇÃO		12/12/2019
ORDEM DE SERVIÇO		29/10/2020
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/11/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		15/05/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		19/10/2023

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.243.299,69
Valor Equipamento: 3.313.302,65
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 200.277,15
Valor da Solução: R\$ 9.818.350,07

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		10/04/2015
PROJETO EXECUTIVO		08/10/2015
LICITAÇÃO		25/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO		06/09/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/10/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/06/2023
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2024

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.070.278,07

Valor Equipamento: R\$ 3.030.000,00

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 220.898,53

Valor da Solução: R\$ 7.379.186,75

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		21/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		30/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/10/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/06/2023
LICENÇA OPERAÇÃO		09/04/2024

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 6.486.071,34

Valor Equipamento: R\$ 3.041.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 263.485,92

Valor da Solução: R\$ 9.858.742,02

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		11/11/2016
PROJETO EXECUTIVO		24/08/2017
LICITAÇÃO		24/01/2020
ORDEM DE SERVIÇO		19/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/12/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/08/2023
LICENÇA OPERAÇÃO		22/02/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.556.769,29

Valor Equipamento: R\$ 3.041.000,00

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 297.652,07

Valor da Solução: R\$ 10.953.431,51

ADESÃO AO PLANO		30/08/2019
PROJETO BÁSICO		20/11/2020
PROJETO EXECUTIVO		21/05/2021
LICITAÇÃO		30/06/2021
ORDEM DE SERVIÇO		18/05/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/01/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		31/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		22/01/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.292.482,35
Valor Equipamento: R\$ 3.209.367,30
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 284.795,66
Valor da Solução: R\$ 6.860.449,49

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		06/03/2015
PROJETO EXECUTIVO		04/06/2020
LICITAÇÃO		19/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO		22/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		11/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		01/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		07/11/2024

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.097.307,58

Valor Equipamento: R\$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 196.062,68

Valor da Solução: R\$ 13.452.963,64

ADESÃO AO PLANO		13/07/2018
PROJETO BÁSICO		09/09/2021
PROJETO EXECUTIVO		23/12/2021
LICITAÇÃO		28/12/2021
ORDEM DE SERVIÇO		29/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		21/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		03/01/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.800.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.085.789,20
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 227.411,65
Valor da Solução: R\$ 12.187.005,03

ADESÃO AO PLANO		06/02/2019
PROJETO BÁSICO		01/12/2021
PROJETO EXECUTIVO		14/04/2022
LICITAÇÃO		30/05/2022
ORDEM DE SERVIÇO		03/01/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		28/11/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		25/04/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.404.922,04

Valor Equipamento: R\$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 235.912,83

Valor da Solução: R\$ 12.805.628,25

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2018
PROJETO EXECUTIVO		13/11/2018
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		29/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		18/05/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		29/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		24/06/2025



-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Valor da Obra: R\$ 10.211.915,12
Valor Equipamento: R\$ 3.075.389,20
Valor Projeto: R\$ 68.184,76
Valor Fiscalização: R\$ 238.569,49
Valor da Solução: R\$ 13.594.258,57

ADESÃO AO PLANO		19/12/2018
PROJETO BÁSICO		25/06/2021
PROJETO EXECUTIVO		07/02/2022
LICITAÇÃO		03/03/2022
ORDEM DE SERVIÇO		15/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		05/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/06/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		24/06/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.238.257,82

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 279.482,30

Valor da Solução: R\$ 14.855.359,80

ADESÃO AO PLANO		25/08/2018
PROJETO BÁSICO		17/09/2021
PROJETO EXECUTIVO		17/02/2022
LICITAÇÃO		18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO		05/09/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		17/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		24/06/2025



- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Valor da Obra: R\$ 10.819.467,78

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 270.449,61

Valor da Solução: R\$ 14.427.537,07

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
PROJETO BÁSICO		15/04/2021
PROJETO EXECUTIVO		07/12/2021
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		12/07/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		16/07/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.250.048,48

Valor Equipamento: R\$ 3.252.815,50

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 231.130,81

Valor da Solução: R\$ 7.807.798,97

ADESÃO AO PLANO		25/10/2018
PROJETO BÁSICO		05/11/2021
PROJETO EXECUTIVO		31/03/2022
LICITAÇÃO		21/06/2022
ORDEM DE SERVIÇO		20/10/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		14/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		05/08/2025

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.271.066,61

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 302.860,97

Valor da Solução: R\$ 13.911.547,26

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		25/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		24/01/2018
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		14/07/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/09/2022
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/08/2023
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.327.710,56
Valor Equipamento: 3.773.453,93
Valor Projeto: R\$ 61.470,58
Valor Fiscalização: R\$ 410.159,58
Valor da Solução: R\$ 14.572.794,65

Obs: Obra civil e equipamento 100%, aguardando Licença de Operação

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		27/04/2018
PROJETO EXECUTIVO		05/12/2018
LICITAÇÃO		06/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		22/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/05/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.803.649,55

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 335.803,83

Valor da Solução: R\$ 14.471.453,64

Obs: Obra civil e equipamento 100%, aguardando Licença de Operação

ADESÃO AO PLANO		01/11/2018
PROJETO BÁSICO		21/12/2021
PROJETO EXECUTIVO		25/04/2022
LICITAÇÃO		26/05/2022
ORDEM DE SERVIÇO		31/10/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--



- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Valor da Obra: R\$ 9.595.731,73

Valor Equipamento: R\$ 3.252.815,50

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 242.288,85

Valor da Solução: R\$ 13.164.640,26

Obs: Obra civil e equipamento 100%, aguardando Licença de Operação

ADESÃO AO PLANO		30/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/10/2016
PROJETO EXECUTIVO		08/01/2018
LICITAÇÃO		28/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		18/09/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		09/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil e equipamento 100%, aguardando Licença de Operação



Valor Executado Obra: R\$ 10.970.625,36

Valor Equipamento: R\$ 3.983.456,40

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 364.695,74

Valor da Solução: R\$ 15.386.962,26

ADESÃO AO PLANO		19/11/2012
PROJETO BÁSICO		31/08/2017
PROJETO EXECUTIVO		15/01/2018
LICITAÇÃO		02/09/2022
ORDEM DE SERVIÇO		06/02/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		20/06/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil e equipamento 100%, aguardando Licença de Operação



Valor Executado Obra: R\$ 11.282.352,39
Valor Equipamento: R\$ 3.634.032,69
Valor Projeto: R\$ 68.184,76
Valor Fiscalização: R\$ 365.419,14
Valor da Solução: R\$ 15.349.988,98

ADESÃO AO PLANO		13/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		21/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		14/08/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/01/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 9.957.517,85

Valor Equipamento: R\$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R\$ 68.184,80

Valor Fiscalização: R\$ 325.318,75

Valor da Solução: R\$ 13.442.010,60

Obs: Obra civil e equipamento 100%, aguardando Licença de Operação

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		11/10/2019
PROJETO EXECUTIVO		30/04/2020
LICITAÇÃO		24/11/2021
ORDEM DE SERVIÇO		31/05/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/01/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/03/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		-

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.



Valor da Obra: R\$ 9.839.183,77

Valor Equipamento: R\$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 344.305,19

Valor da Solução: R\$ 13.466.660,44

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		21/06/2021
PROJETO EXECUTIVO		12/11/2021
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		17/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/10/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.



Valor da Obra: R\$ 11.843.163,08
Valor Equipamento: 3.080.589,20
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 296.485,04
Valor da Solução: R\$ 15.294.041,50

ADESÃO AO PLANO		11/12/2012
PROJETO BÁSICO		25/01/2022
PROJETO EXECUTIVO		25/08/2022
LICITAÇÃO		20/12/2022
ORDEM DE SERVIÇO		27/03/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/03/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/09/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 13.110.861,45
Valor Equipamento: R\$ 3.634.030,40
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 253.446,80
Valor da Solução: R\$ 17.072.142,83

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.

ADESÃO AO PLANO		20/11/2012
PROJETO BÁSICO		13/04/2017
PROJETO EXECUTIVO		27/09/2017
LICITAÇÃO		16/07/2018
ORDEM DE SERVIÇO		22/05/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/06/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		26/01/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.625.056,27

Valor Equipamento: R\$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 317.506,73

Valor da Solução: R\$ 13.096.536,96

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.

ADESÃO AO PLANO		19/12/2018
PROJETO BÁSICO		19/01/2021
PROJETO EXECUTIVO		25/11/2021
LICITAÇÃO		18/01/2022
ORDEM DE SERVIÇO		17/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		28/11/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/08/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.



Valor da Obra: R\$ 12.506.871,03
Valor Equipamento: R\$ 3.090.989,20
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 299.673,05
Valor da Solução: R\$ 15.971.337,46

ADESÃO AO PLANO		11/07/2019
PROJETO BÁSICO		06/12/2021
PROJETO EXECUTIVO		11/04/2022
LICITAÇÃO		14/10/2022
ORDEM DE SERVIÇO		05/12/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		31/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 8.790.153,69
Valor Equipamento: R\$ 3.447.641,80
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 280.544,99
Valor da Solução: R\$ 12.592.144,66

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		09/03/2021
PROJETO EXECUTIVO		06/05/2022
LICITAÇÃO		26/07/2022
ORDEM DE SERVIÇO		19/12/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		05/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.136.476,68

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 277.356,97

Valor da Solução: R\$ 14.751.453,33

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.

ADESÃO AO PLANO		09/09/2021
PROJETO BÁSICO		06/07/2021
PROJETO EXECUTIVO		28/10/2021
LICITAÇÃO		18/04/2022
ORDEM DE SERVIÇO		15/08/2022
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/02/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		02/05/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.771.939,43
Valor Equipamento: 3.090.989,20
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$348.555,88
Valor da Solução: R\$14.285.288,69

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.

ADESÃO AO PLANO		12/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/07/2017
PROJETO EXECUTIVO		10/10/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		08/05/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		07/02/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		16/05/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.



Valor Executado Obra: R\$ 9.898.569,10
Valor Equipamento: R\$ 3.080.589,20
Valor Projeto: R\$ 58.010,15
Valor Fiscalização: R\$ 357.973,36
Valor da Solução: R\$ 13.395.141,81

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		05/02/2018
LICITAÇÃO		05/04/2018
ORDEM DE SERVIÇO		28/08/2023
OBRA CIVIL		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/07/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		25/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 12.818.998,56

Valor Equipamento: 3.983.456,40

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 371.557,27

Valor da Solução: R\$ 17.242.196,99

Obs: Obra civil concluída, equipamento em instalação.

ADESÃO AO PLANO		25/04/2019
PROJETO BÁSICO		22/03/2021
PROJETO EXECUTIVO		28/03/2022
LICITAÇÃO		25/07/2022
ORDEM DE SERVIÇO		07/12/2022
OBRA CIVIL		99%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		23/10/2023
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/11/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.807.000,00
Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50
Valor Projeto: R\$ 73.804,18
Valor Fiscalização: R\$ 299.673,05
Valor da Solução: R\$ 15.444.292,73

ADESÃO AO PLANO		16/11/2012
PROJETO BÁSICO		26/09/2017
PROJETO EXECUTIVO		18/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/06/2018
OBRA CIVIL		90%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/07/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--


- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 12.406.118,46
Valor Equipamento: R\$ 4.053.341,60
Valor Projeto: R\$ 68.184,76
Valor Fiscalização: R\$ 270.092,86
Valor da Solução: R\$ R\$ 16.797.737,68

ADESÃO AO PLANO		14/11/2012
PROJETO BÁSICO		05/10/2017
PROJETO EXECUTIVO		19/12/2017
LICITAÇÃO		06/02/2018
ORDEM DE SERVIÇO		21/08/2023
OBRA CIVIL		80%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		15/10/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		13/06/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

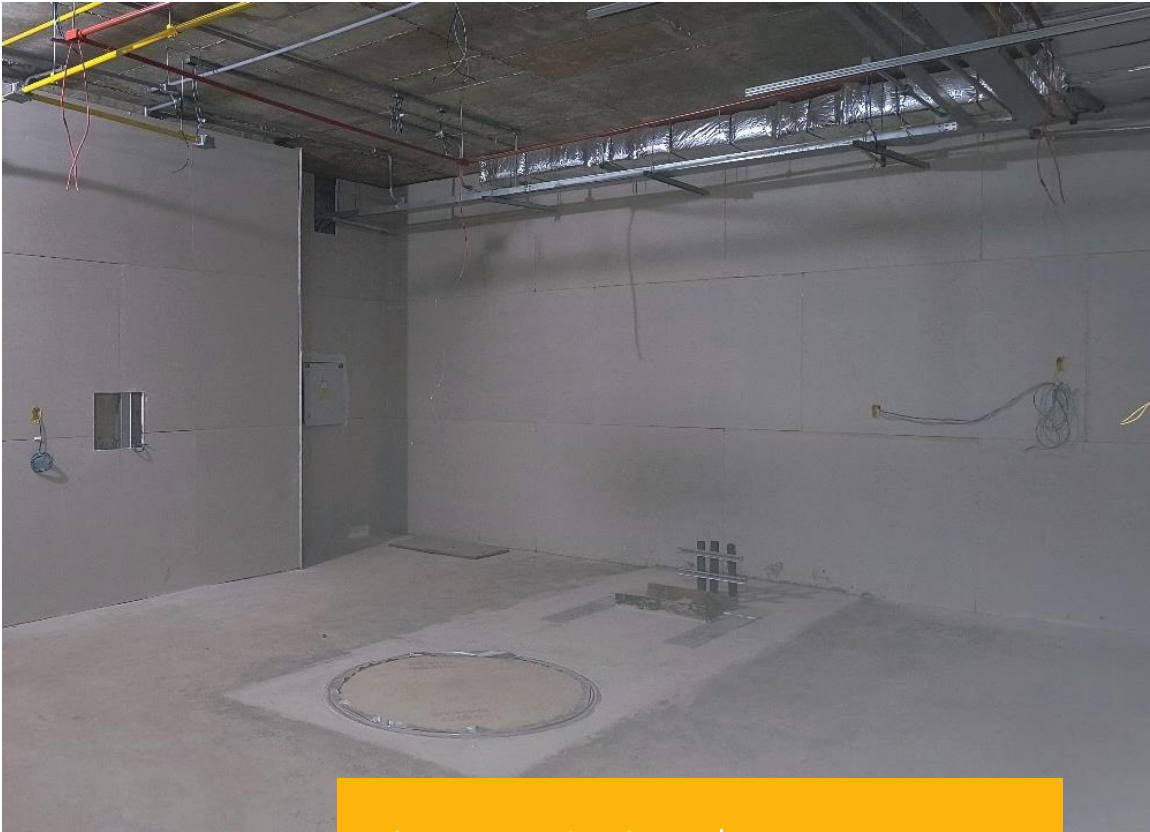

Valor Executado Obra: R\$ 11.870.147,99

Valor Equipamento: R\$ 4.053.341,60

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 376.248,87

Valor da Solução: R\$ 16.367.923,22

ADESÃO AO PLANO		10/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		17/05/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		10/01/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

ADESÃO AO PLANO		18/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		25/09/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		18/10/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		21/01/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		03/03/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO		16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		19/02/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		04/04/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		01/03/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO		16/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		21/01/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

ADESÃO AO PLANO		30/08/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		01/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/07/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		05/05/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/08/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		09/09/2019
LICENÇA OPERAÇÃO		17/02/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82

ADESÃO AO PLANO		02/04/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		11/05/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		24/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		10/06/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77

ADESÃO AO PLANO		12/04/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		10/12/2019
CHEGADA EQUIPAMENTO		07/03/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		18/12/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO		12/04/2018
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		16/06/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		28/09/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		05/04/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.063.091,18

ADESÃO AO PLANO		11/03/2019
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		30/09/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		20/12/2020
LICENÇA OPERAÇÃO		20/03/2024



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado

Valor Equipamento: R\$ 3.304.342,48

ADESÃO AO PLANO		02/04/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		27/11/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		27/03/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		19/11/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		02/12/2020
CHEGADA EQUIPAMENTO		19/06/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		20/03/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.092.532,98

ADESÃO AO PLANO		06/02/2016
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		12/01/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		28/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		09/08/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32

ADESÃO AO PLANO		02/07/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		06/08/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		06/12/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		21/07/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00

ADESÃO AO PLANO		04/08/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		28/04/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/11/2021
LICENÇA OPERAÇÃO		06/04/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39

ADESÃO AO PLANO		25/05/2021
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		04/08/2021
CHEGADA EQUIPAMENTO		11/09/2022
LICENÇA OPERAÇÃO		05/01/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.186.575,26

ADESÃO AO PLANO		01/08/2023
OBRA DE ADEQUAÇÃO		100%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		05/01/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		30/04/2024
LICENÇA OPERAÇÃO		30/01/2025

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50

ADESÃO AO PLANO		25/10/2024
OBRA DE ADEQUAÇÃO		90%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		03/12/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		05/07/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.258.607,64

ADESÃO AO PLANO		02/07/2020
OBRA DE ADEQUAÇÃO		75%
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO		24/09/2024
CHEGADA EQUIPAMENTO		22/04/2025
LICENÇA OPERAÇÃO		--

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

- Concluído
- Em Andamento
- Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.258.607,64
