


PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

DEZEMBRO/2024

PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

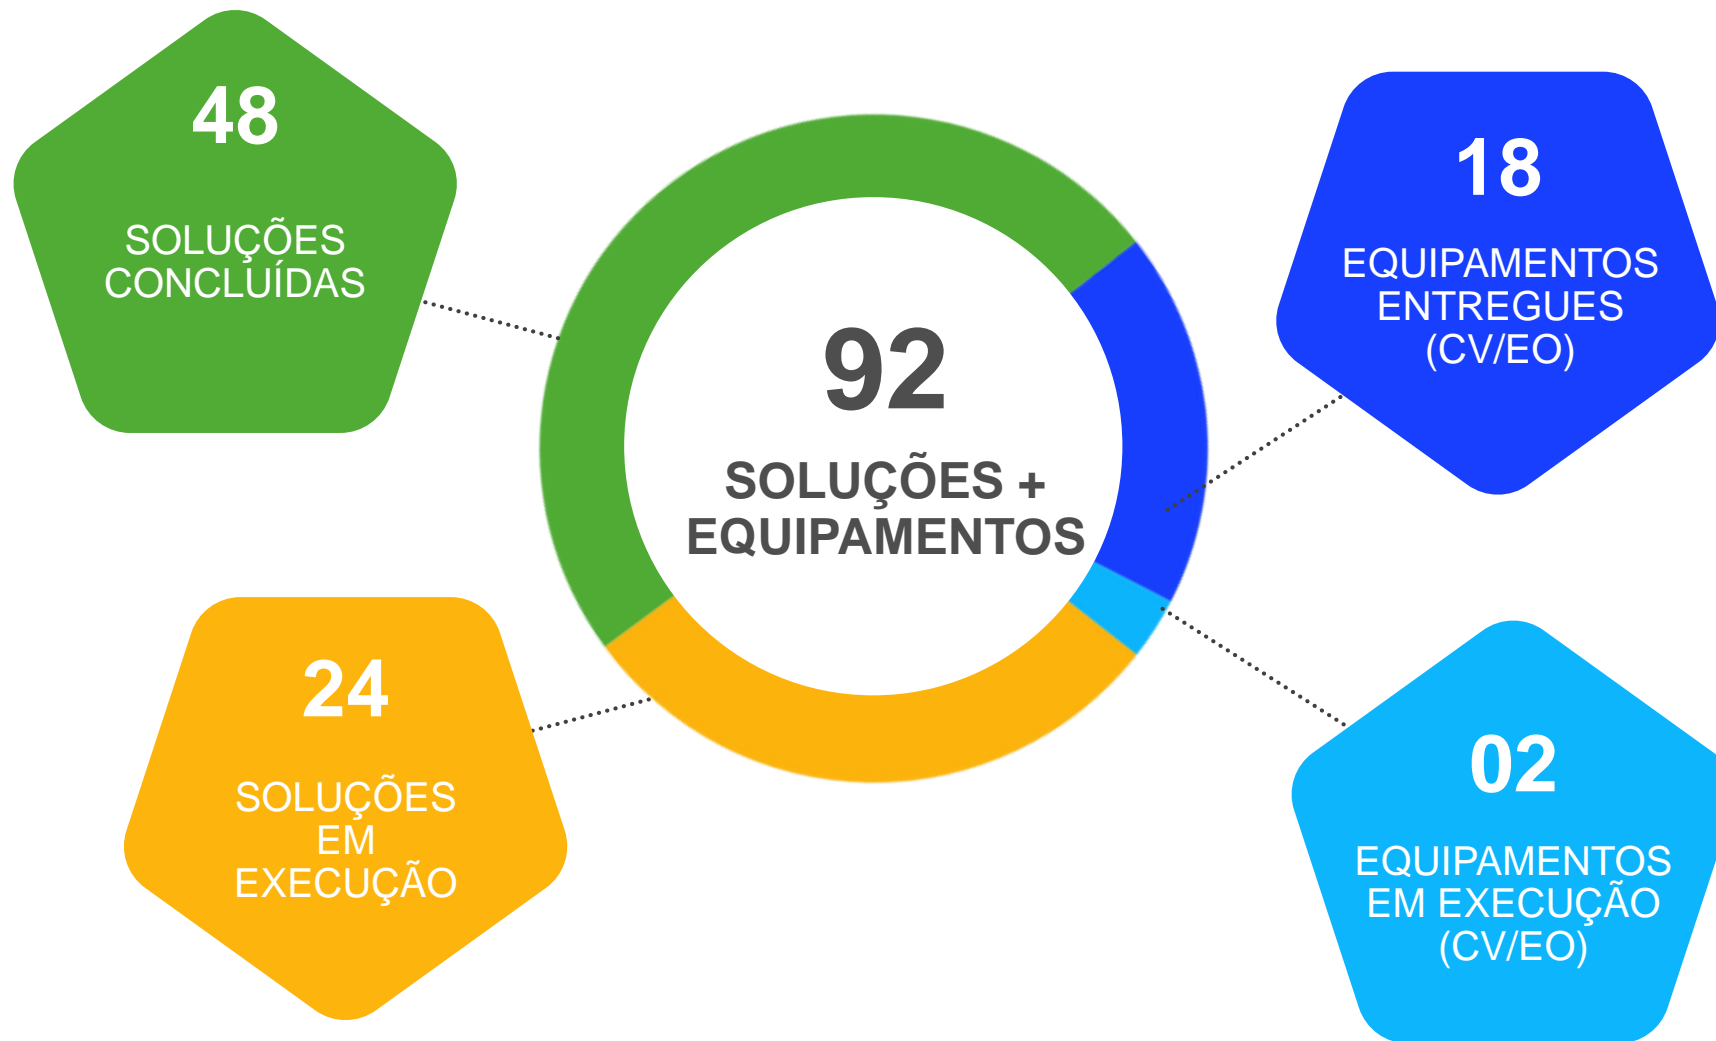

Obs: Das 66 soluções de Radioterapia, 05 aguardam licença de operação da CNEN;

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|--|-------------------|
| 1 | A | Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB | Solução Concluída |
| 2 | A | Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA | Solução Concluída |
| 3 | A | Hospital Erasto Gaertner - Curitiba/PR | Solução Concluída |
| 4 | A | Santa Casa de Misericórdia de Maceió/AL | Solução Concluída |
| 5 | A | Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF | Solução Concluída |
| 6 | A | Hospital Governador João Alves Filho - Aracajú/SE | Solução Concluída |
| 7 | A | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE | Solução Concluída |
| 8 | A | Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP | Solução Concluída |
| 9 | A | Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP | Solução Concluída |
| 10 | A | Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS | Solução Concluída |
| 11 | A | Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM | Solução Concluída |
| 12 | A | Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo - Barbalha/CE | Solução Concluída |
| 13 | A | Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS | Solução Concluída |
| 14 | A | Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC | Solução Concluída |
| 15 | A | Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP | Solução Concluída |
| 16 | A | Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP | Solução Concluída |
| 17 | A | Instituto de Câncer de Londrina/PR | Solução Concluída |

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|-------------------|
| 18 | A | Instituto do Câncer do Ceará - Fortaleza/CE | Solução Concluída |
| 19 | A | Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR | Solução Concluída |
| 20 | A | Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS | Solução Concluída |
| 21 | C | Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP | Solução Concluída |
| 22 | C | Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF | Solução Concluída |
| 23 | A | Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP | Solução Concluída |
| 24 | C | Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC | Solução Concluída |
| 25 | A | Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE | Solução Concluída |
| 26 | A | Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS | Solução Concluída |
| 27 | A | Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC | Solução Concluída |
| 28 | C | Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE | Solução Concluída |
| 29 | C | Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP | Solução Concluída |
| 30 | C | Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP | Solução Concluída |
| 31 | CB | Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT | Solução Concluída |
| 32 | CB | Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA | Solução Concluída |
| 33 | C | Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP | Solução Concluída |
| 34 | A | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS | Solução Concluída |

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|--------------------------------|
| 35 | C | Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP | Solução Concluída |
| 36 | C | Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC | Solução Concluída |
| 37 | C | Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR | Solução Concluída |
| 38 | C | Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS | Solução Concluída |
| 39 | C | Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ | Solução Concluída |
| 40 | C | Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC | Solução Concluída |
| 41 | C | Hospital Cura D'ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE | Solução Concluída |
| 42 | A | Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS | Solução Concluída |
| 43 | C | Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP | Solução Concluída |
| 44 | C | Hospital Geral do Andaraí/RJ | Solução Concluída |
| 45 | A | Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP | Aguardando Licença de operação |
| 46 | C | Hospital Estadual de Bauru – Bauru/SP | Aguardando Licença de operação |
| 47 | C | Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP | Aguardando Licença de operação |
| 48 | C | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE | Aguardando Licença de operação |

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA EM EXECUÇÃO

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|---------------------|
| 1 | C | Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA | Solução em Execução |
| 2 | C | Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO | Solução em Execução |
| 3 | CB | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO | Solução em Execução |
| 4 | CB | Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA | Solução em Execução |
| 5 | C | SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI | Solução em Execução |
| 6 | C | Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP | Solução em Execução |
| 7 | C | Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP | Solução em Execução |
| 8 | C | Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI | Solução em Execução |
| 9 | C | Hospital Regional de Presidente Prudente/SP | Solução em Execução |
| 10 | C | Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG | Solução em Execução |
| 11 | C | Hospital São José - Teresópolis/RJ | Solução em Execução |
| 12 | C | Hospital Maternidade São José - Colatina/ES | Solução em Execução |
| 13 | C | Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR | Solução em Execução |
| 14 | C | Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR | Solução em Execução |
| 15 | C | Hospital Rio Doce - Linhares/ES | Solução em Execução |
| 16 | C | Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ | Solução em Execução |

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA EM EXECUÇÃO

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|---|---------------------|
| 17 | CB | Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP | Solução em Execução |
| 18 | CB | Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA | Solução em Execução |
| 19 | A | FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP | Solução em Execução |
| 20 | CB | Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT | Solução em Execução |
| 21 | C | Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP | Solução em Execução |
| 22 | C | Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE | Solução em Execução |
| 23 | C | Hospital Geral de Roraima/RR | Solução em Execução |
| 24 | CB | Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS | Solução em Execução |

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|--|--|
| 1 | CV | Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 2 | CV | Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 3 | EO | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 4 | EO | Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 5 | EO | Hospital Bruno Born – Lajeado/RS | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 6 | EO | Hospital do Câncer INCA I | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 7 | EO | Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 8 | CV | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 9 | CV | Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 10 | CV | Hospital Geral de Caxias do Sul/RS | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 11 | CV | Fundação Pio XII – Porto Velho/RO | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 12 | EO | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL | Equipamento do Termo Aditivo - Concluído |
| 13 | CV | Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN | Equipamento do Termo Aditivo – Concluído |
| 14 | EO | Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ | Equipamento do Termo Aditivo – Concluído |
| 15 | CV | Hospital de Juazeiro/BA | Equipamento do Termo Aditivo – Concluído |
| 16 | EO | Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG | Equipamento do Termo Aditivo – Concluído |

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

| Nº | TIPOLOGIA | INSTITUIÇÃO | SITUAÇÃO |
|----|-----------|--|--|
| 17 | CV | Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR* | Equipamento do Termo Aditivo – Concluído |
| 18 | CV | Grupo Hospitalar Conceição – Porto Alegre/RS | Aguardando Licença de operação |
| 19 | CV | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ | Bunker em adequação |
| 20 | EO | Hospital Geral do Oeste – Barreiras/BA | Bunker em adequação |

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR










| Nº | TIPOLOGIA | LOCALIDADE | INSTITUIÇÃO | STATUS |
|----|-----------|----------------|--|------------------|
| 1 | A | Rio de Janeiro | Hospital do Cancer III (Ampliação) | Excluído pelo CG |
| 2 | C | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE | Excluído pelo CG |
| 3 | C | Natal | Hospital Universitário Onofre Lopes | Excluído pelo CG |
| 4 | C | Ponta Grossa | Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa | Excluído pelo CG |
| 5 | A | Goiânia | Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge | Excluído pelo CG |
| 6 | A | Vitória | Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Excluído pelo CG |
| 7 | C | Ilhéus | Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus | Excluído pelo CG |
| 8 | A | Botucatu | Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina | Excluído pelo CG |




Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



MINISTÉRIO DA
SAÚDE






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/11/2014 |
| LICITAÇÃO |  | 30/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/05/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/11/2016 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.898.101,74
 Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19
 Valor Projeto: R\$ 47.923,39
 Valor Fiscalização: R\$ 116.208,40
 Valor da Solução: R\$ 5.167.324,72

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 04/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 23/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/07/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2015 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 23/09/2016 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 03/04/2017 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.177.370,80




Valor Equipamento: R\$ 2.105.091,19

Valor Projeto: R\$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R\$ 119.257,60

Valor da Solução: R\$ 5.449.642,98




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 03/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 07/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 04/05/2017 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado






Valor da Obra: R\$ 2.394.234,82
 Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
 Valor Projeto: R\$ 48.660,67
 Valor Fiscalização: R\$ 74.197,20
 Valor da Solução: R\$ 4.485.509,32




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 08/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 27/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 29/09/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 09/05/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 25/03/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 24/07/2017 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.500.000,15
 Valor Equipamento: R\$ 1.968.416,63
 Valor Projeto: R\$ 48.660,67
 Valor Fiscalização: R\$ 158.897,20
 Valor da Solução: R\$ 4.675.974,65

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 04/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 05/01/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/07/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/10/2017 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.321.885,88




Valor Equipamento: R\$ 1.873.353,69

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 107.399,60

Valor da Solução: R\$ 4.351.299,84

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 15/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 30/09/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 21/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 09/12/2015 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 21/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 26/02/2018 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado





Valor da Obra: R\$ 2.456.264,06




Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 157.203,20

Valor da Solução: R\$ 4.563.858,58

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 16/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 03/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 16/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 29/05/2018 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.652.230,79




Valor Equipamento: R\$ 1.959.728,67

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 113.836,80

Valor da Solução: R\$ 4.774.456,93

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 16/06/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 24/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 09/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/11/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 22/07/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.105.059,44




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 126.304,73



Valor da Solução: R\$ 5.298.817,88




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 09/02/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 15/05/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 16/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 27/07/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/12/2017 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 21/06/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 20/05/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.447.738,29
 Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88
 Valor Projeto: R\$ 48.660,67
 Valor Fiscalização: R\$ 76.568,80
 Valor da Solução: R\$ 4.516.108,64

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 24/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 04/08/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 26/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 01/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/07/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.609.105,06



Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 95.002,13

Valor da Solução: R\$ 5.115.935,23

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 24/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 04/08/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 26/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 01/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/07/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.138.027,23




Valor Equipamento: R\$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 77.246,40

Valor da Solução: R\$ 4.207.075,18

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 07/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 19/12/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 03/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/10/2016 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 25/09/2017 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/03/2018 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado






Valor da Obra: R\$ 2.815.696,60




Valor Equipamento: R\$ 1.901.730,65

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 92.831,20

Valor da Solução: R\$ 4.858.191,12

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 30/09/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 13/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 22/12/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 17/05/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.272.832,40




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 81.811,29

Valor da Solução: R\$ 4.766.471,13

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/10/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO |  | 13/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 26/09/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 29/04/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.347.323,07




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 66.066,00

Valor da Solução: R\$ 4.480.842,78

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 02/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 11/06/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 25/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/11/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado










Valor da Obra: R\$ 2.864.379,37




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R\$ 135.635,19

Valor da Solução: R\$ 5.411.105,32

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 25/04/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/02/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 31/01/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 23/12/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.961.778,18




Valor Equipamento: R\$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 124.911,69

Valor da Solução: R\$ 5.585.603,80

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 27/03/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 20/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 22/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 27/03/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/03/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 20/12/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.486.413,43




Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 132.313,11

Valor da Solução: R\$ 5.030.554,58

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 14/05/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 26/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 02/06/2016 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 31/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/12/2019 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado




Valor da Obra: R\$ 2.669.150,00




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R\$ 178.921,93

Valor da Solução: R\$ 4.886.773,37

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 08/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 20/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 16/06/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.869.134,07




Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 228.249,48




Valor da Solução: R\$ 8.413.790,19




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/07/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 26/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 23/01/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/06/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/02/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/05/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.622.381,29
 Valor Equipamento: R\$ 2.363.167,37
 Valor Projeto: R\$ 48.660,67
 Valor Fiscalização: R\$ 108.848,79
 Valor da Solução: R\$ 5.143.058,12

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 23/05/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 06/06/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 05/07/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/11/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 01/06/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 14/07/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado








Valor da Obra: R\$ 2.638.164,74




Valor Equipamento: R\$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 115.748,59

Valor da Solução: R\$ 5.028.299,70

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 16/10/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 27/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/01/2019 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 04/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/08/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.314.782,30




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 254.993,15







Valor da Solução: R\$ 9.088.582,44




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 09/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 18/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 17/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 15/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 13/08/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 30/04/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 10/01/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 30/10/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 4.744.115,21
 Valor Equipamento: R\$ 2.254.936,06
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 300.777,38
 Valor da Solução: R\$ 7.360.299,23

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 24/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 14/06/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 19/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 16/04/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 03/12/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 3.083.828,34




Valor Equipamento: R\$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 165.631,87

Valor da Solução: R\$ 5.813.244,24

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/11/2014 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/02/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 17/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 19/09/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/04/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/10/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 07/12/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 2.682.677,74




Valor Equipamento: R\$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 137.212,25

Valor da Solução: R\$ 5.001.216,05

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 21/07/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/02/2016 |
| LICITAÇÃO |  | 01/02/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 24/10/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 08/03/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/11/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/12/2020 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.597.240,78




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 237.552,05

Valor da Solução: R\$ 5.091.502,49

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 22/01/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/03/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 17/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/07/2017 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/02/2018 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/08/2018 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/01/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 3.029.396,08




Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R\$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R\$ 130.548,06

Valor da Solução: R\$ 5.227.397,85

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 20/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 18/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 30/05/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/04/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado







Valor da Obra: R\$ 6.873.379,23




Valor Equipamento: R\$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 273.559,66

Valor da Solução: R\$ 10.097.947,77

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 27/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 27/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 22/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 14/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 07/05/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.907.667,29




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41 Valor

Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 266.765,12

Valor da Solução: R\$ 9.693.239,40

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 01/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/12/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 04/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 25/08/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.509.545,15




Valor Equipamento: R\$ 3.039.119,73

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 192.499,09



Valor da Solução: R\$ 9.802.634,55




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 14/06/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 22/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 10/09/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/12/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/10/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 6.466.422,28
 Valor Equipamento: R\$ 2.354.501,58
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 349.721,82
 Valor da Solução: R\$ 9.232.116,26




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 15/10/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/06/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 19/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/11/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 6.456.749,86
 Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41 Valor
 Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 314.603,48
 Valor da Solução: R\$ 9.290.160,33

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 27/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 04/04/2019 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 31/01/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 22/11/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 7.109.857,41




Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 145.134,76

Valor da Solução: R\$ 10.236.744,66

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 22/06/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 04/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/12/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/02/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 29/11/2021 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 2.706.130,83




Valor Equipamento: R\$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 172.312,93

Valor da Solução: R\$ 5.391.352,44

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 08/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 09/02/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 12/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 15/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 15/03/2022 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado










Valor da Obra: R\$ 5.555.999,84




Valor Equipamento: R\$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 385.472,22








Valor da Solução: R\$ 8.460.279,05




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 27/11/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 28/02/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 16/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/11/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/10/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 17/03/2022 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 5.748.109,00
 Valor Equipamento: R\$ 2.459.714,10
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 349.642,82
 Valor da Solução: R\$ 8.618.936,50

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 15/07/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 26/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 24/01/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 01/07/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | Fev. 2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Jun. 2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 26/04/2022 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado










Valor da Obra: R\$ 6.033.836,63




Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 100.377,63








Valor da Solução: R\$ 9.157.015,99




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 24/09/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 26/10/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 08/09/2022 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado




Valor da Obra: R\$ 8.309.959,37
 Valor Equipamento: R\$ 3.353.723,28
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 188.676,06
 Valor da Solução: R\$ 11.913.829,29




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 13/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 19/03/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/10/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 05/10/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 02/04/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 22/11/2022 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 7.545.775,74 Equipamento:
 R\$ 3.345.650,00
 Valor Projeto: R\$ 61.470,58
 Valor Fiscalização: R\$ 171.193,61
 Valor da Solução: R\$ 11.124.089,93

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 29/05/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/11/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 12/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 29/10/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 24/11/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 15/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/10/2023 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado




Valor da Obra: R\$ 6.243.299,69




Valor Equipamento: 3.313.302,65

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 200.277,15

Valor da Solução: R\$ 9.818.350,07

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 29/10/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 07/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 24/06/2019 |
| LICITAÇÃO |  | 11/12/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 28/09/2020 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/11/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/05/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 23/05/2023 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.583.382,54




Valor Equipamento: R\$ 3.353.723,28

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 214.083,35

Valor da Solução: R\$ 14.212.659,75

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 10/04/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/10/2015 |
| LICITAÇÃO |  | 25/03/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/09/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/10/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 27/06/2023 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 10/01/2024 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado











Valor da Obra: R\$ 4.070.278,07




Valor Equipamento: R\$ 2.996.203,97

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 163.514,33

Valor da Solução: R\$ 7.288.006,52




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 21/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 24/01/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 30/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/10/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 29/06/2023 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/04/2024 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Executado Obra: R\$ 6.486.071,34
 Valor Equipamento: R\$ 3.006.658,97
 Valor Projeto: R\$ 68.184,76
 Valor Fiscalização: R\$ 43.569,48
 Valor da Solução: R\$ 9.604.484,55

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/11/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 24/08/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 24/01/2020 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 19/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/12/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 22/08/2023 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Fevereiro 2025 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 7.415.466,73




Valor Equipamento: R\$ 3.006.685,97

Valor Projeto: R\$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R\$ 230.703,83

Valor da Solução: R\$ 10.710.839,68

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/03/2015 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 04/06/2020 |
| LICITAÇÃO |  | 19/04/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 22/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 11/05/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 01/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 07/11/2024 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.015.925,92




Valor Equipamento: R\$ 3.085.789,20


Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 47.820,16

Valor da Solução: R\$ 13.223.339,46

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/08/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 20/11/2020 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/05/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 30/06/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 18/05/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/01/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 31/03/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | janeiro 2025 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

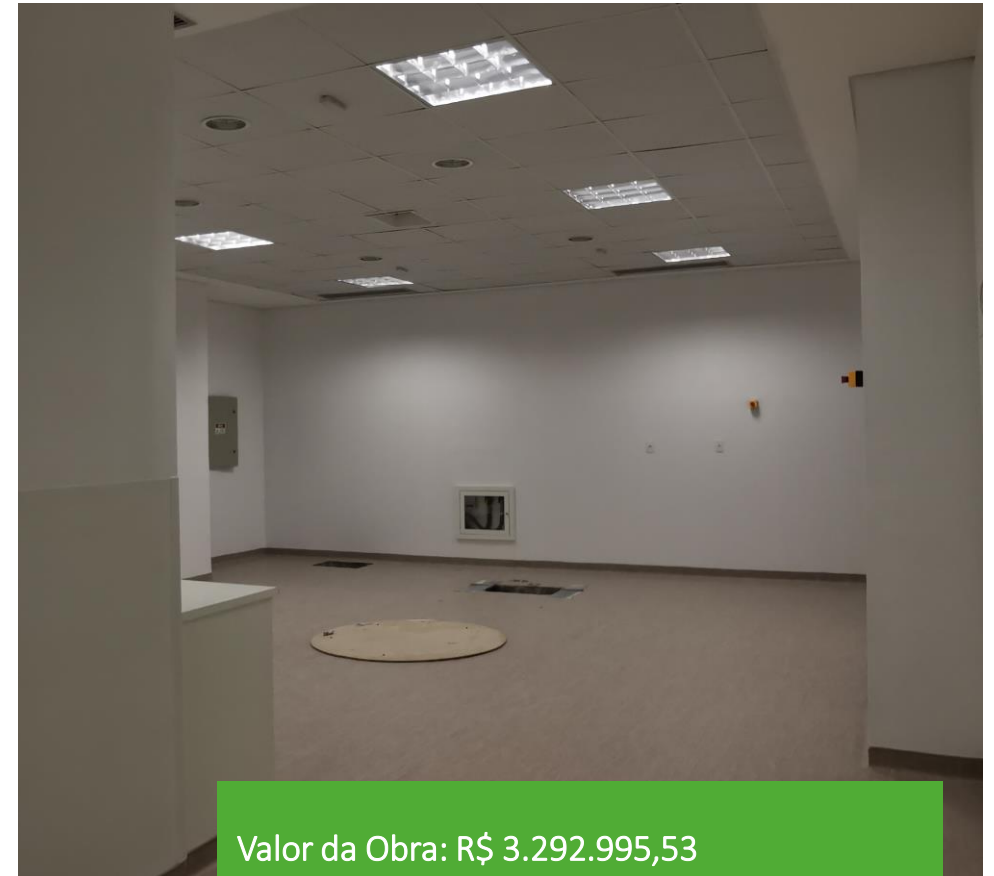










Valor da Obra: R\$ 3.292.995,53




Valor Equipamento: R\$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 66.416,89

Valor da Solução: R\$ 6.642.583,90

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/07/2018 |
| PROJETO BÁSICO |  | 09/09/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 23/12/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 28/12/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 29/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/05/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 21/01/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Fevereiro 2025 |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado










Valor da Obra: R\$ 8.800.000,00

Valor Equipamento: R\$ 3.006.567,50




Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 45.163,48

Valor da Solução: R\$ 11.925.535,16

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/04/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 13/11/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 29/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 18/05/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 29/01/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Fevereiro 2025 |



-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, aguardando etapas de instalação, Comissionamento e treinamentos - Acelerador Linear.








Valor da Obra: R\$ 9.648.000,00




Valor Equipamento: R\$ 3.006.658,97

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 44.100,81

Valor da Solução: R\$ 12.766.853,07

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 20/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 13/04/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 27/09/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 16/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 22/05/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/06/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 26/01/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, aguardando etapas de instalação, Comissionamento e treinamentos - Acelerador Linear.



Valor da Obra: R\$ 9.625.056,27
 Valor Equipamento: R\$ 3.006.567,50
 Valor Projeto: R\$ 68.184,76
 Valor Fiscalização: R\$ 235.149,78
 Valor da Solução: R\$ 12.934.958,31

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 25/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 24/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/07/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/09/2022 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/08/2023 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, aguardando etapas de instalação, Comissionamento e treinamentos - Acelerador Linear.




Valor da Obra: R\$ 10.169.697,59




Valor Equipamento: 3.384.647,30

Valor Projeto: R\$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R\$ 342.680,01

Valor da Solução: R\$ 13.958.495,48

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 11/10/2019 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 30/04/2020 |
| LICITAÇÃO |  | 24/11/2021 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 31/05/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/01/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 30/03/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | - |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Obs: Obra civil concluída, aguardando etapas de instalação, Comissionamento e treinamentos - Acelerador Linear.






Valor da Obra: R\$ 9.839.183,77

Valor Equipamento: R\$ 3.209.367,30




Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 66.948,22

Valor da Solução: R\$ 13.189.303,47

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 25/08/2018 |
| PROJETO BÁSICO |  | 17/09/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 17/02/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 18/04/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 05/09/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 17/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |



-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado









Valor da Obra: R\$ 10.819.467,78




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 40.912,80










Valor da Solução: R\$ 14.134.184,76




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 04/08/2020 |
| PROJETO BÁSICO |  | 15/04/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/12/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 12/07/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 4.250.048,48
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ 12.220,71
 Valor da Solução: R\$ 7.536.073,37




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 06/02/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 01/12/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 14/04/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 30/05/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 03/01/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 28/11/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 29/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado









Valor da Obra: R\$ 9.045.321,00
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ -
 Valor da Solução: R\$ 12.319.125,18




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/12/2018 |
| PROJETO BÁSICO |  | 25/06/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 07/02/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 03/03/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 15/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 05/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/06/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.950.000,00
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ 49.945,49
 Valor da Solução: R\$ 14.273.749,67

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 21/06/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 12/11/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 17/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 30/03/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/10/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado







Valor da Obra: R\$ 11.843.163,08




Valor Equipamento: 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 43.038,15

Valor da Solução: R\$ 15.160.005,41

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/08/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 15/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 02/09/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 06/02/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 20/06/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/03/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

| | |
|--|--------------|
|  | Concluído |
|  | Em Andamento |
|  | Não Iniciado |



Valor Executado Obra: R\$ 8.753.873,53




Valor Equipamento: R\$ 3.634.032,69

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 184.765,17

Valor da Solução: R\$ 14.722.788,62




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 13/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 21/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 14/08/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/03/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/01/2025 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado





Valor Executado Obra: R\$ 9.630.921,82
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 68.184,80
 Valor Fiscalização: R\$ 173.356,88
 Valor da Solução: R\$ 13.072.463,50




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 01/11/2018 |
| PROJETO BÁSICO |  | 21/12/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 25/04/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 26/05/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 31/10/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 9.050.000,00
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ 23.378,75
 Valor da Solução: R\$ 12.347.182,93

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 19/12/2018 |
| PROJETO BÁSICO |  | 19/01/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 25/11/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 18/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 17/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 28/11/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/08/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor da Obra: R\$ 12.506.871,03




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ 44.632,15


Valor da Solução: R\$ 15.825.307,36




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/02/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 05/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 28/08/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/07/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Fev. 2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor Executado Obra: R\$ 12.818.998,56
 Valor Equipamento: 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 68.184,76
 Valor Fiscalização: R\$ 149.459,24
 Valor da Solução: R\$ 16.236.642,56




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 25/10/2018 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/11/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 31/03/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 21/06/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 20/10/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 99% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 14/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.271.066,61
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ 26.566,75
 Valor da Solução: R\$ 13.571.437,54

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 27/04/2018 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 05/12/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 06/01/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 22/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 98% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/05/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado










Valor da Obra: R\$ 9.595.000,00




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 47.820,15



Valor da Solução: R\$ 12.911.004,91




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/12/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 25/01/2022 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 25/08/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 20/12/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 27/03/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 98% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/03/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/09/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 12.898.989,27
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ -
 Valor da Solução: R\$ 16.172.793,45

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 09/03/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 06/05/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 26/07/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 19/12/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 97% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 05/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 22/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado







Valor da Obra: R\$ 10.945.000,00




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ -

Valor da Solução: R\$ 14.218.804,18

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 25/04/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 22/03/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 28/03/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 25/07/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 07/12/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 97% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 23/10/2023 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 14/11/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 11.807.000,00




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R\$ -

Valor da Solução: R\$ 15.080.804,18




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/07/2019 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/12/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 11/04/2022 |
| LICITAÇÃO |  | 14/10/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 05/12/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 97% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 31/07/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Mar. 2025 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.819.467,78
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ 13.283,38
 Valor da Solução: R\$ 14.106.555,34

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 31/10/2016 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 08/01/2018 |
| LICITAÇÃO |  | 28/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 18/09/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 94% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 09/07/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 16/12/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado




Valor Executado Obra: R\$ 10.821.463,61




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 159.976,18





Valor da Solução: R\$ 14.249.624,55




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/07/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 10/10/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 08/05/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 93% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 07/02/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Fev. 2025 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor Executado Obra: R\$ 9.898.569,10
 Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 58.010,15
 Valor Fiscalização: R\$ 81.147,72
 Valor da Solução: R\$ 13.237.726,97




| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 09/09/2021 |
| PROJETO BÁSICO |  | 06/07/2021 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 28/10/2021 |
| LICITAÇÃO |  | 18/04/2022 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 15/08/2022 |
| OBRA CIVIL |  | 92% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/02/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Mar. 2025 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor da Obra: R\$ 10.300.000,00
 Valor Equipamento: 3.200.000,00
 Valor Projeto: R\$ 73.804,18
 Valor Fiscalização: R\$ 47.820,16
 Valor da Solução: R\$ 13.621.624,34

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 26/09/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 18/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/06/2018 |
| OBRA CIVIL |  | 63% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Mar. 2025 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado












Valor Executado Obra: R\$ 11.525.415,38




Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00

Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 153.199,12

Valor da Solução: R\$ R\$ 14.946.799,26

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 14/11/2012 |
| PROJETO BÁSICO |  | 05/10/2017 |
| PROJETO EXECUTIVO |  | 19/12/2017 |
| LICITAÇÃO |  | 06/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO |  | 21/08/2023 |
| OBRA CIVIL |  | 56% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 15/10/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | Mar. 2025 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | -- |

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado








Valor Executado Obra: R\$ 11.737.147,47

Valor Equipamento: R\$ 3.200.000,00




Valor Projeto: R\$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R\$ 119.082,63

Valor da Solução: R\$ 15.124.414,86






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 10/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 17/05/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 10/01/2020 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.018.793,04






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 18/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 25/09/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 18/10/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/01/2020 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.335.182,90






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 10/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 18/12/2020 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/08/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/09/2019 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 17/02/2021 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.386.724,82






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 19/02/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 04/04/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 01/03/2021 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/12/2019 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 07/03/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 03/03/2021 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.932.746,87






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 12/04/2018 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 16/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 28/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 05/04/2021 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado




Valor Equipamento: R\$ 3.063.091,18






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 30/08/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 09/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 05/05/2021 |

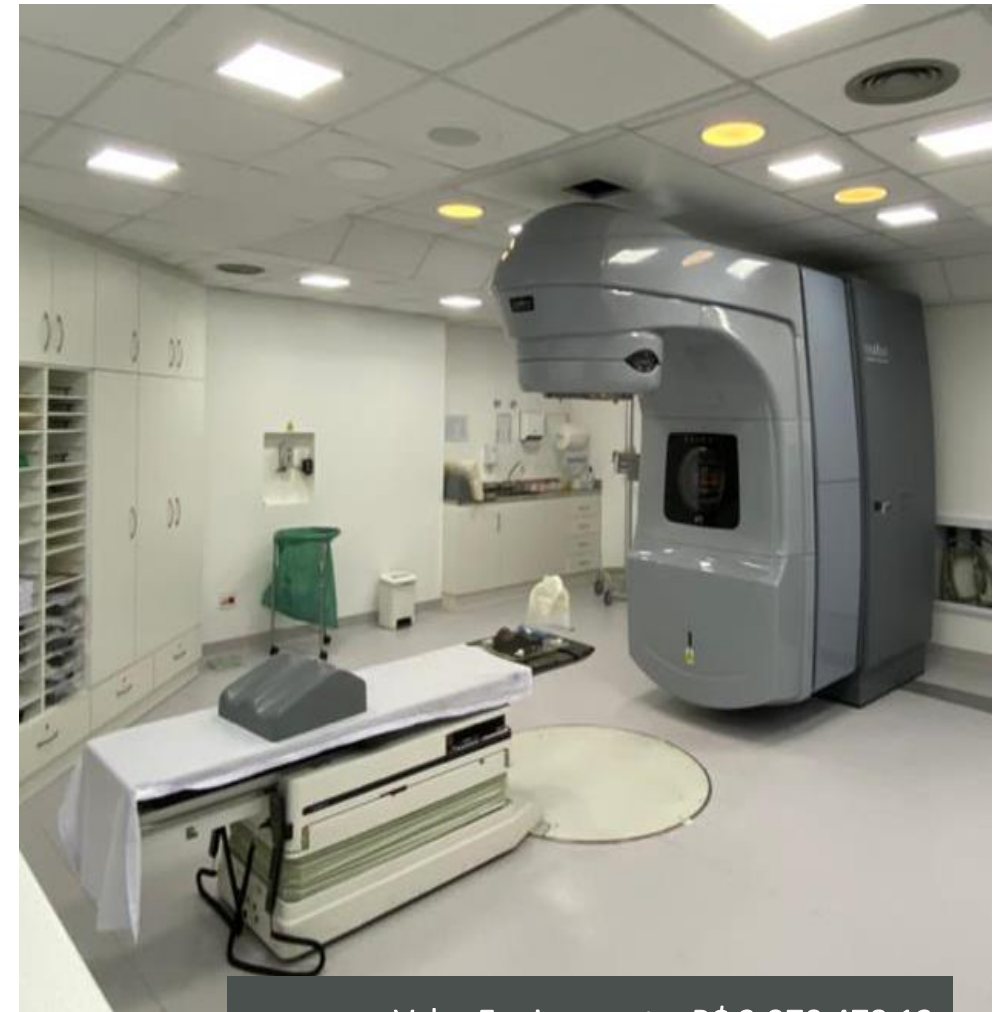Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.970.478,12






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 11/05/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 24/09/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 10/06/2021 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.628.332,77






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 02/04/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 27/11/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 27/03/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 19/11/2021 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 16/04/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 01/06/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/07/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/01/2022 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.961.331,15






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 02/07/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 06/08/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 06/12/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 21/07/2022 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 2.997.223,00






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 06/02/2016 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 12/01/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 28/11/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 09/08/2022 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado






Valor Equipamento: R\$ 2.805.032,32






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 25/05/2021 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 04/08/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/09/2022 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 05/01/2023 |



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Valor Equipamento: R\$ 3.186.575,26






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 04/08/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 02/12/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 19/06/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 20/03/2023 |






Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Valor Equipamento: R\$ 3.092.532,98






| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 04/08/2020 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 28/04/2021 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 11/11/2021 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 06/04/2023 |

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.




-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado



Valor Equipamento: R\$ 3.011.067,39



| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 11/03/2019 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 30/09/2020 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 20/12/2020 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | 20/03/2024 |


Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado






Valor Equipamento: R\$ 3.304.342,48
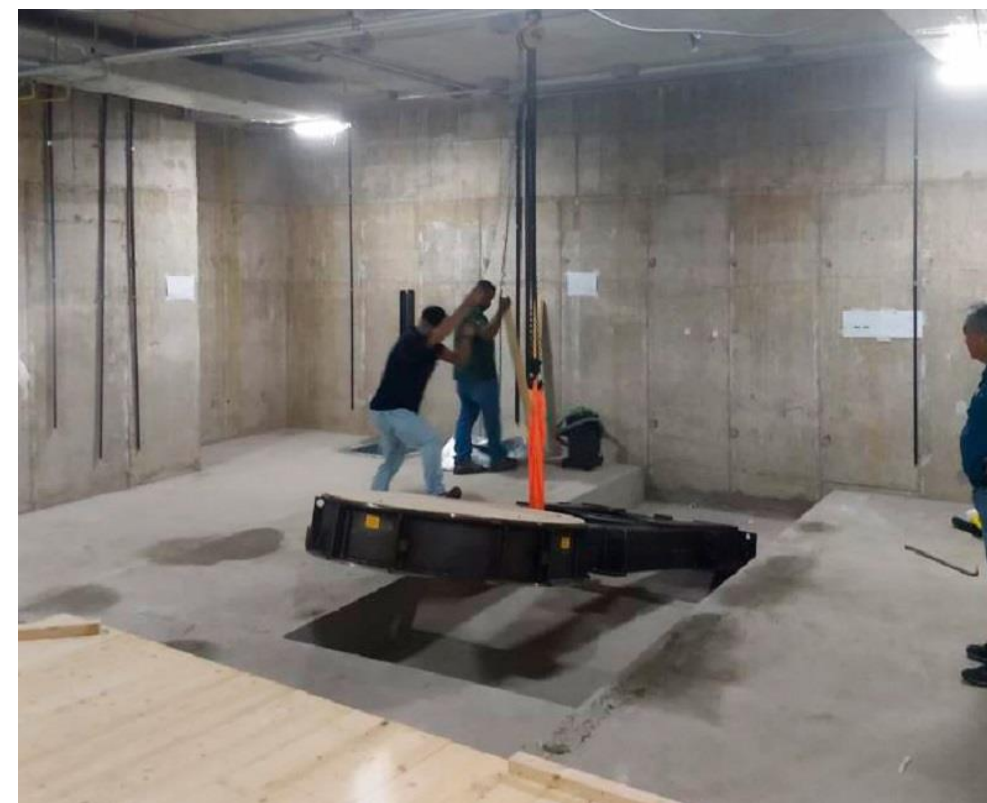
| | | |
|-------------------------|--|------------|
| ADESÃO AO PLANO |  | 01/08/2023 |
| OBRA DE ADEQUAÇÃO |  | 100% |
| SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 05/01/2024 |
| CHEGADA EQUIPAMENTO |  | 30/04/2024 |
| LICENÇA OPERAÇÃO |  | Fev. 2025 |



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

-  Concluído
-  Em Andamento
-  Não Iniciado

Valor Equipamento: R\$ 3.263.815,50
