


# DNIT


**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA  
**MAPA GERENCIAL**  
**RIO GRANDE DO SUL**

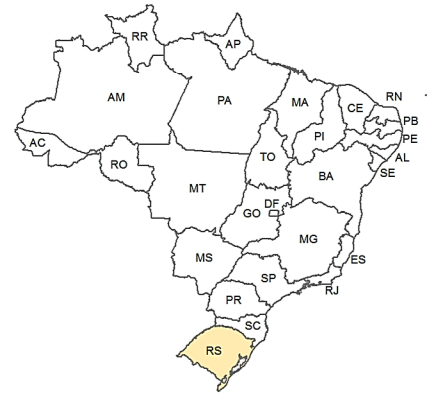

- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Não pavimentada
  - Planejada
  - Concedida

**Tipos de Intervenção**

<span style="color: orange;">■</span> DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	359,3 Km
<span style="color: blue;">■</span> ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	35,7 Km
<span style="color: brown;">■</span> IMPLANTAÇÃO	24,1 Km
<span style="color: red;">▲</span> OAE	
<b>Total</b>	<b>419,1 Km</b>

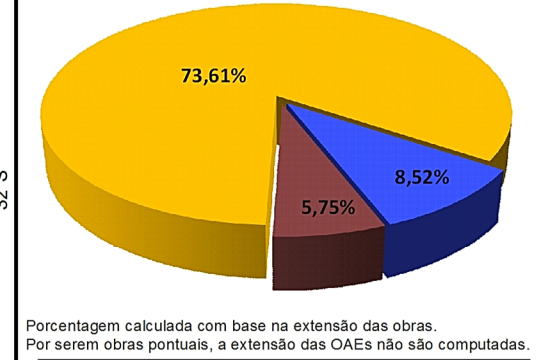

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Agosto de 2021

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (JULHO 2021)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	1	10 00821/2019	CONSORCIO EPC-MAC-SOGL-IGUA TEMI	BR-116	234,70 270,40	35,7	Melhoramento físicos e segurança de tráfego	02/12/2019	15/11/2022	R\$ 556.093.573,46	4,72%	Realização de estudos de compatibilização dos projetos. Segmento prioritário entre o km 240,20 e o km 245,70.	10 00650/2016	MAGNA ENGENHARIA LTDA
2	Único	00 00316/2014	CONSORCIO PONTE DO GUAIBA	BR-116	0,00 15,30	15,3	2ª Ponte sobre o Rio Guaíba	16/04/2014	08/08/2021	R\$ 820.173.527,50	93,61%	Necessário recursos para efetuar a compra assistida e consequentemente a conclusão dos serviços.	10 00444/2015	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	3	00 00459/2012	IVAI ENGENHARIA DE OBRAS S/A	BR-116	351,34 373,22	21,88	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	31/03/2022	R\$ 113.931.848,88	95,8%	Obra em fase final	10 00857/2016	INCORPTEP - RODOVIAS
4	6	00 00462/2012	CONSORCIO PELOTENSE - CC	BR-116	422,30 428,16	5,86	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	19/03/2022	R\$ 148.890.627,27	75,37%	Executados pavimentação da pista duplicada e obras complementares, além de adequação da iluminação pública. Pavimentados 17,285 km.	10 00636/2012	SITE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
4	6	00 00462/2012	CONSORCIO PELOTENSE - CC	BR-116	428,84 447,97	19,13	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	19/03/2022	R\$ 148.890.627,27	75,37%	Executados pavimentação da pista duplicada e obras complementares, além de adequação da iluminação pública. Pavimentados 17,285 km.	10 00637/2012	ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONS
5	7	00 00463/2012	SULTEPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	BR-116	448,50 470,10	21,6	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	25/03/2022	R\$ 150.437.083,93	79,2%	Concluído Revestimento em 18,8 km; Drenagem OAC - 15,9 km	10 00637/2012	ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONS
6	8	00 00464/2012	SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A	BR-116	470,10 489,00	18,9	Duplicação BR-116/RS	16/07/2012	16/12/2021	R\$ 143.121.816,07	88,66%	Obras paralisadas	10 00637/2012	ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONS
7	1B	00 00431/2012	CONSORCIO CONTORNO (SBS - MAC - PELOTENSE)	BR-392	60,63 68,40	7,77	Contorno de Pelotas	03/07/2012	23/06/2022	R\$ 351.541.440,03	91,67%	Executado serviços de terraplenagem, pavimentação, obras complementares e de contenção.	10 01149/2012	ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONS
7	1B	00 00431/2012	CONSORCIO CONTORNO (SBS - MAC - PELOTENSE)	BR-116	522,70 527,68	4,98	Contorno de Pelotas	03/07/2012	23/06/2022	R\$ 351.541.440,03	91,67%	Executado serviços de terraplenagem, pavimentação, obras complementares e de contenção.	10 01149/2012	ENECON S/A ENGENHEIROS E ECONO CONS
8	1	00 00139/2014	CONSORCIO B C M	BR-290	112,30 142,00	29,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	01/08/2022	R\$ 168.971.402,71	16,57%	Não há atividades de execução da obra. O consórcio encontra-se desmobilizado.	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
9	2	00 01070/2013	CONSORCIO TB ECB - ETEL	BR-290	142,00 172,08	30,08	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	05/11/2021	R\$ 212.694.280,34	9,87%	Obras paralisadas	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
10	3	00 00217/2014	CONSORCIO TRIER CTESA - PRODEC	BR-290	172,00 199,03	27,03	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	17/08/2021	R\$ 161.613.165,50	9,28%	Obras paralisadas	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
11	4	00 01126/2013	CONSORCIO EQUIPAV CSL - ESTEIO	BR-290	199,30 228,00	28,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	21/10/2023	R\$ 177.458.070,20	20,54%	Executando serviços no viaduto de Pântano Grande. Infraestrutura, mesoestrutura e placas pré-moldadas do maciço de terra armada concluídas.	00 00216/2011	SITE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
12	Único	00 00674/2010	ICCLA - IND.COM. E CONST.LBAGE LTDA	BR-386	351,50 385,30	33,8	Duplicação BR-386/RS	29/07/2010	05/08/2020	R\$ 217.318.215,57	97,26%	Obra finalizada, concluído contrato.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
13	1	00 00493/2013	CONSORCIO CONTORNO (SBS - MAC - PELOTENSE)	BR-158	324,00 329,10	5,1	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	27/12/2022	R\$ 188.492.543,57	93,08%	Executados serviços de obras de artes especiais no Viaduto 1 do Ramo 66, além de ensaios de compressão.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
14	2	00 00494/2013	CONSORCIO TRAVESSIA (SUTELPA-MAGNA-ETEL)	BR-158	329,10 331,90	2,8	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	27/12/2022	R\$ 223.363.826,57	88,97%	Liberados Pl Imã Dulce/Acesso, Viaduto Walter Jobim (LE), Tancredo Neves, Arroio Taquara (LE), Cadena (LE), Ferreira (LE).	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
14	2	00 00494/2013	CONSORCIO TRAVESSIA (SUTELPA-MAGNA-ETEL)	BR-287	247,70 254,30	6,6	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	27/12/2022	R\$ 223.363.826,57	88,97%	Liberados Pl Imã Dulce/Acesso, Viaduto Walter Jobim (LE), Tancredo Neves, Arroio Taquara (LE), Cadena (LE), Ferreira (LE).	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
15	Único	10 00633/2020	TRIER ENGENHARIA S/A	BR-116	363,26 397,20	33,94	Obras remanescentes na BR-116	14/09/2020	08/03/2022	R\$ 16.687.817,53	90,64%	Obra em fase final de conclusão. O tráfego está liberado em 23,97 Km	10 00857/2016	INCORPTEP - RODOVIAS
15	Único	10 00633/2020	TRIER ENGENHARIA S/A	BR-116	351,30 361,96	10,63	Obras remanescentes na BR-116	14/09/2020	08/03/2022	R\$ 16.687.817,53	90,64%	Obra em fase final de conclusão. O tráfego está liberado em 23,97 Km	10 00857/2016	INCORPTEP - RODOVIAS
16	Único	10 00094/2021	CONSORCIO PLANA TERRA/TRAÇADO/IGUA TEMI	BR-285	30,00 54,10	24,1	Remanescentes de obras na BR-285	15/03/2021	09/12/2023	R\$ 72.072.000,00	0%	RDC Integrado em fase de elaboração e aprovação dos projetos		

**OBRA DELEGADA**

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (JULHO 2021)
D1	TED-919/2018	1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	BR-116	300,54 351,34	50,8	Duplicação BR-116/RS (antigos contratos 00 00457/2012 e 00 00458/2012)	19/12/2018	31/05/2022	R\$ 207.475.946,90	R\$ 0,00	R\$ 207.475.946,90	34,82%	Previsto liberar até o final de 2021 trecho compreendido entre o km 342 e o km 351. Atualmente 23% concluído.

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

\*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
