

Legenda:


- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

- IMPLANTAÇÃO 277,01 Km
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 45,00 Km
- OBRAS COMPLEMENTARES 45,00 Km
- OAE*
- OAE
- A LICITAR

Total 367,01 Km

* Contrato para construção de OAEs ao longo do trecho da rodovia.

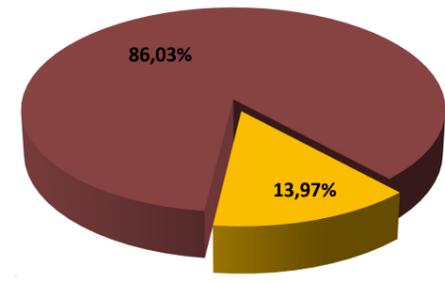

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	02 00263/2023	CONSÓRCIO AGR/LCM BR-163	BR-163	814,00 844,00	1,68	Acessos às pontes sobre os Igarapés Bueiro e Preto	09/05/2023	31/07/2024	R\$ 15.289.146,84	78,71%			Assinado 2º Termo Aditivo com reflexo financeiro oriundo da aprovação da 1ª RFPD
2	Único	00 00035/2013	CONSÓRCIO SANCHES TRIPOLONI - BENITO ROGGIO - CONSOL	BR-163	676,31 788,98	112,67	Implantação da BR-163/PA	01/07/2013	31/12/2023	R\$ 329.102.703,65	78,29%	02 00627/2009	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Obra Paralisada. Em tratativas para rescisão
3	4	00 00851/2016	CONSÓRCIO VEREDA - ENECON	BR-230	727,80 894,22	0,00	Execução de OAEs na BR-230 (12 Pontes)	22/01/2017	09/04/2024	R\$ 50.110.128,69	94,06%	00 00351/2013	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	10 pontes concluídas. Concluindo serviços da superestrutura com a execução da pós tesão das vigas longarinas da ponte, acabamentos e componentes ambientais.
3	4	00 00851/2016	CONSÓRCIO VEREDA - ENECON	BR-230	894,22 976,99	0,00	Execução de OAEs na BR-230 (12 Pontes)	22/01/2017	09/04/2024	R\$ 50.110.128,69	94,06%	00 00352/2013	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	10 pontes concluídas. Concluindo serviços da superestrutura com a execução da pós tesão das vigas longarinas da ponte, acabamentos e componentes ambientais.
3	4	00 00851/2016	CONSÓRCIO VEREDA - ENECON	BR-230	976,99 983,80	0,00	Execução de OAEs na BR-230 (12 Pontes)	22/01/2017	09/04/2024	R\$ 50.110.128,69	94,06%	00 00352/2013	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	10 pontes concluídas. Concluindo serviços da superestrutura com a execução da pós tesão das vigas longarinas da ponte, acabamentos e componentes ambientais.
4	Único	00 00011/2021	CONSÓRCIO CONSTRUBASE / CIDADE	BR-230	571,00 571,70	0,70	Construção de ponte sobre o rio Xingú	25/05/2021	07/04/2026	R\$ 379.129.324,44	1,88%			Assinado 1º Termo Aditivo de prorrogação de vigência e prazo, sem reflexo financeiro
5	2	02 00582/2010	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	BR-230	283,60 388,60	105,00	Implantação da BR-230	05/07/2010	14/07/2024	R\$ 266.700.745,21	92,70%	02 00247/2023	TRAFECOM ENGENHARIA	Obra em andamento. Em desenvolvimento os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, sinalização, área industrial e canteiro de obras
6	3	00 00247/2019	CONSÓRCIO ARTELESTE / DELTACON S	BR-230	185,00 280,00	95,00	Execução de OAEs na BR-230 (15 pontes)	04/12/2019	31/12/2023	R\$ 61.447.643,21	99,71%	02 00247/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA	Obra em andamento. Possui 15 pontes finalizadas. Estão sendo realizados serviços de acabamentos e realização de prova de carga. Foi iniciada a desmobilização
7	Único	02 00731/2021	CONSÓRCIO BR-422 (LCM - ÁPIA)	BR-422	0,00 59,34	59,34	Construção e pavimentação da BR-422/PA	10/12/2021	22/09/2024	R\$ 220.238.086,56	24,53%	02 00490/2022	CONSÓRCIO STE / PROGAIA	Obra em andamento. Em desenvolvimento os serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, Passagem de Fauna.
8	Único	02 00471/2021	TAMASA ENGENHARIA S/A	BR-316	67,60 112,60	45,00	Duplicação da BR-316	06/09/2021	04/09/2025	R\$ 189.552.088,03	13,84%	02 00010/2018	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULT.	Em ritmo lento. Executando pavimentação, infra e mesoestrutura da OAE Jeju, terraplenagem, compactação de sub-leito, sub-base e base, imprimação, CBUQ

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1	ACT-433/2023	Estado do Pará	BR-316	67,60 112,60	45,00	Delegar Supervisão e Execução de remoção de rede elétrica	27/07/2023	12/01/2026	R\$ 0,00	R\$ 23.168.341,45	R\$ 23.168.341,45	0,00%	Acordo de Cooperação Técnica assinado em 27/07/2023. Sem ônus para o DNIT

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-308	203,27 239,27	Ação 7562 - Remanescente do Lote 1				Projeto executivo de remanescente aprovado (SEI 15212850). Tratativas para licitação sendo conduzidas no processo 50602.000959/2023-39	
L2	BR-308	239,27 318,90	Ação 7562 - Remanescente do Lote 2				Projeto executivo de remanescente aprovado (SEI 15281555). Tratativas para licitação sendo conduzidas no processo 50602.000959/2023-39	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
