


Legenda:

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- - - Não pavimentada
- ▭ Planejada

Tipos de Intervenção

- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 39,60 Km
- A LICITAR

Total 39,60 Km

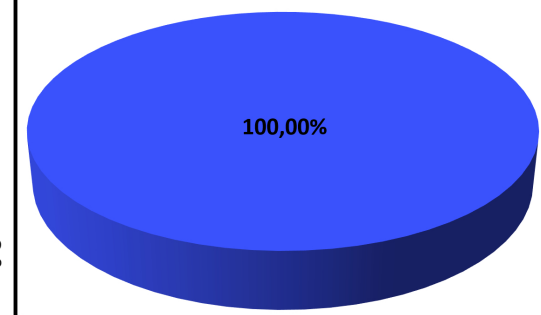

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	13 00938/2017	CONSÓRCIO LCM/CCL/PRODEC BR 230/PB	BR-230	152,30 183,90	31,6	Adequação de capacidade	01/02/2018	29/11/2024	R\$ 522.527.524,40	6,41%	13 00425/2018	JBR ENGENHARIA LTDA	Executando serviços nas OAEs nos segmentos 1 e 2, e terraplenagem, drenagem e pavimentação no Segmento 05.
2	Único	13 00434/2023	CONSÓRCIO CLC / CONSERVA	BR-230	2,00 13,38	11,38	Remanescente do contrato 13 00919/2016	29/08/2023	10/11/2026	R\$ 151.387.682,28	0,75%	13 00655/2023	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Obra em fase de implantação, com mobilização do canteiro de obras.

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1	TED-231/2020	EXÉRCITO BRASILEIRO - 1º BEC	BR-230	2,00 10,00	8,00	Remanescente das obras de adequação de capacidade e segurança	05/05/2020	29/12/2023	R\$ 71.913.225,71	R\$ 0,00	R\$ 71.913.225,71	67,78%	Obra paralisada. Em finalização do Termo de Compromisso. O trecho já licitado em remanescente.Ⓜ
D2	ACT-109/2022	Estado da Paraíba (PB)	BR-230	24,32 24,32	0,00	Construção do Viaduto de Água Fria (estaca 1216, Km 24,32)	31/03/2022	26/09/2024	R\$ 0,00	R\$ 28.711.428,32	R\$ 28.711.428,32	0,00%	Obra em execução, com execução de fundação e estrutura da OAE.

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-230	13,00 28,00	Adequação de Cabelo a Oitizeiro		31/12/2023		Anteprojeto em elaboração. Prevista a publicação do edital em RDCI em dezembro/2023	0209/23-13

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
