


Legenda:

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

 DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	76,00 Km
 IMPLANTAÇÃO	125,90 Km
Total 201,90 Km	

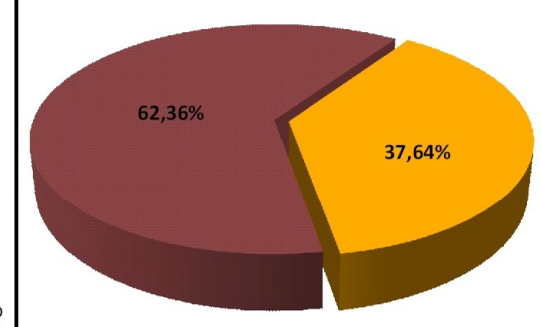

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Fevereiro de 2022

Obras Diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (JANEIRO 2022)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	Único	15 00441/2014	EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	BR-010	246,40 260,80	14,4	Travessia Urbana de Imperatriz	16/09/2014	02/04/2022	R\$ 275.997.302,40	28,34%	Obra em andamento. Liberado para o tráfego cerca de 1km das marginais, na altura das pontes do Cacau.	15 00799/2014	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLA
2	2	15 00387/2017	EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	BR-135	51,30 95,00	44,3	Duplicação da BR135/MA	09/06/2017	27/11/2021	R\$ 126.969.822,02	18,87%	Obra em andamento com 6,88 km de pavimentação concluída.	15 00394/2017	MODELAGEM ENGENHARIA LTDA
3	3	15 00005/2017	HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO	BR-135	95,00 127,30	32,15	Duplicação da BR135/MA	06/01/2017	15/07/2020	R\$ 72.207.796,02	8,12%	Contrato concluído por decurso de prazo. Em levantamento de remanescentes para nova contratação.	15 00495/2017	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PL
4	Único	15 00102/2016	HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO	BR-316	609,40 620,90	11,5	Contorno de Timon	05/01/2017	17/04/2022	R\$ 124.384.362,50	35,19%	Obras paralisadas. Executados 23km de revestimento na BR-226 e 9km no Contorno.	15 00367/2017	JDS ENGENHARIA E CONSULTORI
4	Único	15 00102/2016	HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO	BR-226	0,00 100,00	100	Implantação da BR-226/MA	05/01/2017	17/04/2022	R\$ 124.384.362,50	35,19%	Obras paralisadas. Executados 23km de revestimento na BR-226 e 9km no Contorno.	15 00367/2017	JDS ENGENHARIA E CONSULTORI

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
