


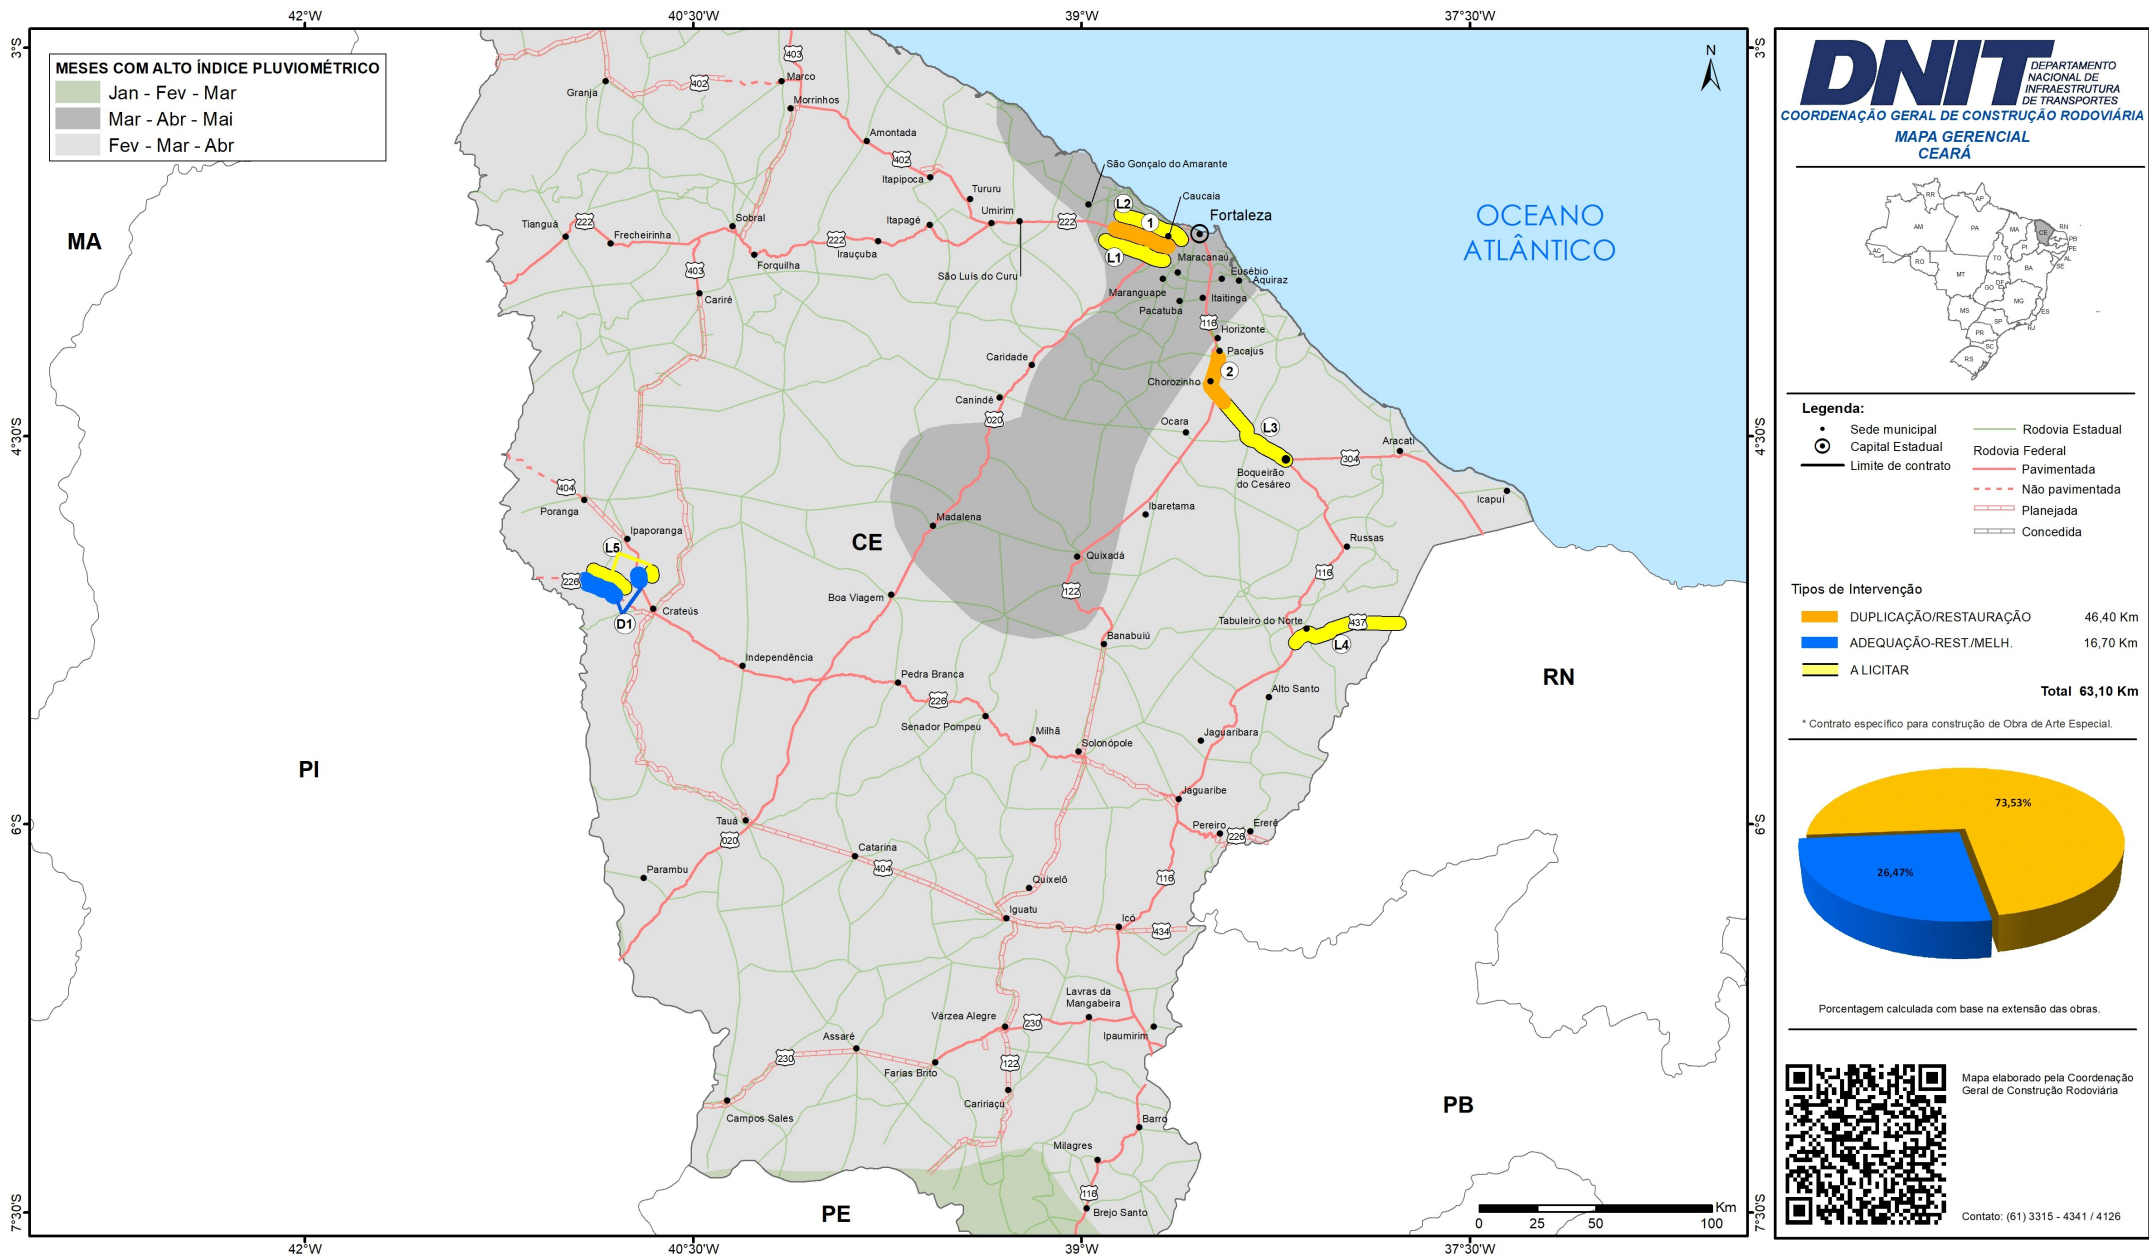

Obra Direta																SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*							
1	2008	10L3	2-3	Único	03 00537/2015	CONSORCIO TORC - MAIA MELO	BR-222	11,40	35,70	24,3	Duplicação do Acesso ao Porto de Pecém	27/08/2015	30/06/2026	R\$ 282.317.180,17	95,77%	Pavimentação concluída. Prevista a entrega total da obra no 2º Sem26.				03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
2	2009	13X6	3	1	03 00077/2024	CONSORCIO GLC-CONSERVA-ESTRATEGICA	BR-116	53,40	75,50	22,1	Duplicação Pacajus - Boqueirão do Cesário	25/03/2024	03/01/2028	R\$ 289.066.893,85	17,39%	Em andamento serviços de terraplenagem, camadas de fundação do CCP, e pavimentação em h/itotopping da faixa de rolamento e acostamentos.				03 00935/2024	CONSORCIO PROSL-GEOSISTEMAS-HIDROCONSULT

Obra Delegada																SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**							
D1				ACT-266/2023	DNOCs	BR-404	73,00	74,90	1,9	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	28/07/2028	R\$ 0,00	R\$ 84.006.006,04	R\$ 84.006.006,04	0%	Em andamento o ACT com a execução dos projetos básicos e às ações de desapropriação e licenciamento ambiental.					
D2				ACT-266/2023	DNOCs	BR-226	356,00	370,80	14,8	Adequação nas BRs 404 e 226/CE	24/08/2023	28/07/2028	R\$ 0,00	R\$ 84.006.006,04	R\$ 84.006.006,04	0%	Em andamento o ACT com a execução dos projetos básicos e às ações de desapropriação e licenciamento ambiental.					

Obra a licitar																SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL												
L1		10L3	2-3	Único	BR-222	11,40	35,70	Construção de melhorias previsto no PBAI						Em andamento a contratação da construção das melhorias, que estão sendo tratadas como três processos distintos (L1, L2, L3), dos quais um já se encontra com contrato em tratativas para assinatura.				03 00912/2020	JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
L2					BR-222	11,40	35,70	ACT Projeto Executivo/Execução do Cruzamento Rododiferenciado e remanescentes das obras do contrato 537/2025						Em tratativas para celebração de ACT, referente à elaboração de Projeto Executivo/Execução das Obras do Cruzamento Rododiferenciado TLSA MVP 11 x BR-222/CE				A LICITAR	A LICITAR		
L3	123662	13X6	3	2/3	BR-116			Adequação de Pacajus - Boqueirão do Cesário - Lotes 2 e 3						Anteprojeto doado pelo estado por meio da SOP. Os lotes 2 e 3, conforme inicialmente segmentado o empreendimento, serão unificados. Obra com previsão de licitação na modalidade integrada em 2026.				Edital 0145/25-00	BM LICITAÇÃO		
L4	2484	165N	2		BR-437	0,00	48,50	Adequação Div. RVO/CE - Entr. BR-116						Em andamento processo para obtenção de licença ambiental, a fim de viabilizar a licitação da obra na modalidade integrada. Projetos já aprovados.				A LICITAR	A LICITAR		
L5	167R	3	Único		BR-226	356,00	370,80	Adequação nas BRs 404 e 226/CE						Projetos básicos em elaboração por meio do ACT-266/2023. Estão em tratativas os procedimentos para licitação do empreendimento na modalidade semi-integrada.				A LICITAR	A LICITAR		
L6	167R	3	Único		BR-404	73,00	74,90	Adequação nas BRs 404 e 226/CE						Projetos básicos em elaboração por meio do ACT-266/2023. Estão em tratativas os procedimentos para licitação do empreendimento na modalidade semi-integrada.				A LICITAR	A LICITAR		

*Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

**Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
