


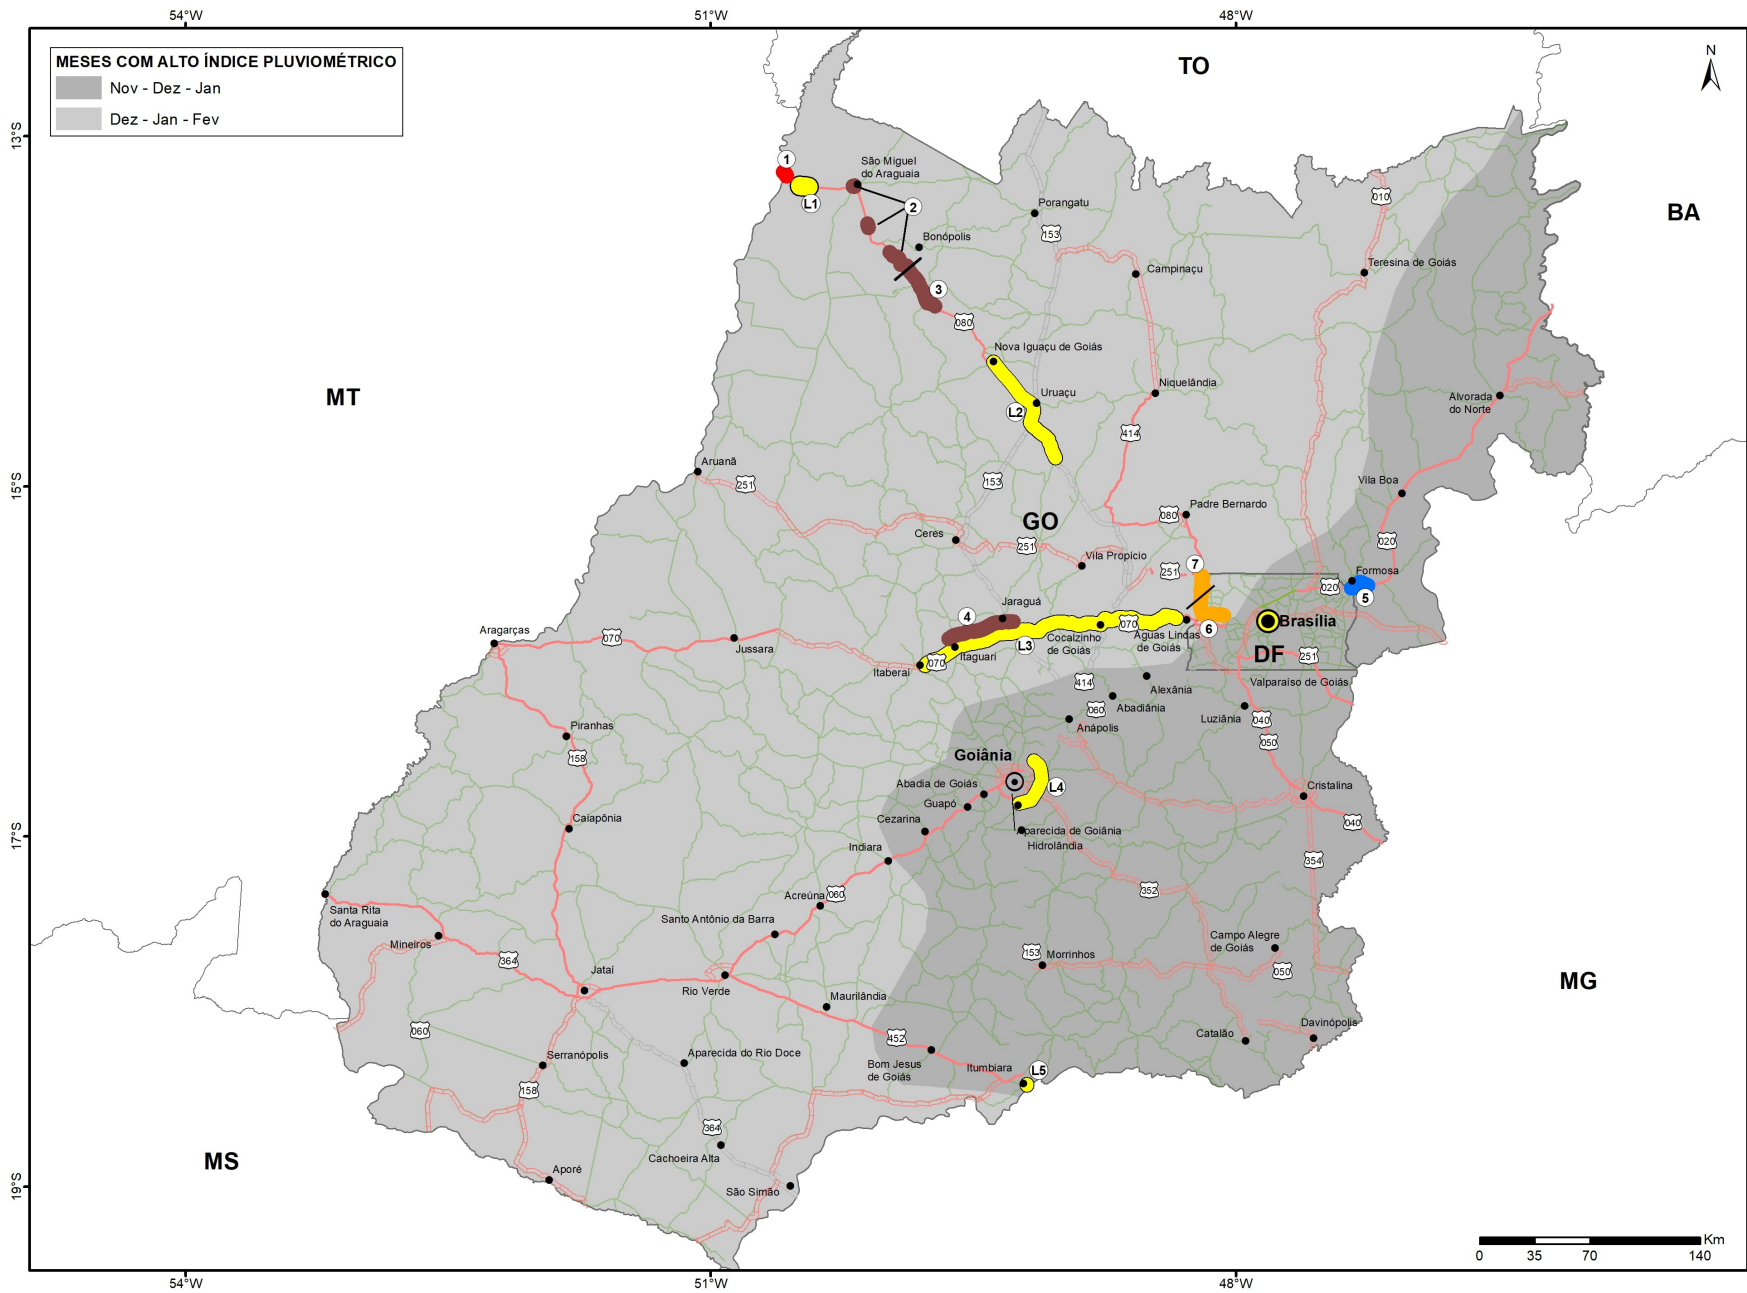


Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Capital Federal
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	12,00 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	6,30 Km
IMPLANTAÇÃO	106,46 Km
DUPICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	40,86 Km
ALCATRAZ	
OAE*	
Total	165,62 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.



Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2018	7E79	2-3	Único	12 00961/2015	CONSORCIO COMISA - BK - ENESCL	BR-080	406,20	410,30	4,1	Ponte sobre rio Araguaia e acessos	30/12/2015	22/02/2026	R\$ 220.470.043,73	88,74%	Contrato encerrado por decurso de prazo. PAAR de inexecução parcial em trâmite. Haverá saldo remanescente.	12 00439/2024	CONSORCIO DIRECO-ESTRATEGICA
2	2017	7E79	2-3	Único	12 00686/2020	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	293,00	363,00	70	Remanescentes de Implantação, incluindo OAEs	19/10/2020	26/07/2026	R\$ 99.806.237,65	98,62%	Contrato paralisado, serviços concluídos porém aguardando pendências administrativas.	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
3	2017	7E79	2-3	Único	12 00368/2023	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	273,30	301,20	27,9	Implantação e Pavimentação na BR-080/GO	05/07/2023	29/10/2026	R\$ 63.381.364,04	99,29%	Serviços concluídos, com a REF em trâmite. Conclusão prevista para julho de 2026.	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
4	2014	20UC-TXM	2	2	12 00350/2024	CONSORCIO CAIAPONIA	BR-070	129,00	167,70	8,66	Remanescente de implantação do Lote 2	14/06/2024	25/11/2027	R\$ 57.446.286,10	0,48%	Contrato em fase inicial. Foi dado ordem de serviço em abril.	Edital 017326/2024	ENALITACAO
5	3030	7R82	2-3-7	Único	00 00544/2024	TRIER ENGENHARIA S/A	BR-020	0,00	12,00	12	Remanescente da adequação de Formosa	30/08/2024	10/02/2028	R\$ 257.720.012,15	27,49%	Obra em andamento, com o viaduto do Forte de Santa Bárbara já concluído. 3º RFPO em trâmite.	12 00588/2024	CONSORCIO DYNA TEST / NORDEN
6	2531	7XT1	2-3-7	1	00 00680/2023	CONSORCIO CLC / CONSERVA / FP	BR-080	0,00	24,60	24,6	Duplicação da BR-080 - Brasília	23/12/2023	27/08/2027	R\$ 368.827.265,45	17,83%	Obra em andamento. A 1º RFPO encontra-se em análise na SR. Pendências relacionadas às redes de esgoto e energia (1º RFPO) em tratativas.	12 00384/2024	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ LTDA
7	140978	7XT1	2-3-7	2	12 00318/2025	CONSORCIO CLC - CONSERVA	BR-080	24,60	40,86	16,26	Duplicação da BR-080 - Brasília	06/04/2025	24/05/2027	R\$ 147.486.362,82	0%	Contrato assinado, aguardando ordem de início de serviço.	12 00737/2025	CONSORCIO PROSUL / HIDROCONSULT

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2018	7E79			BR-080	410,0	415,0	Remanescente da Ponte de Luiz Alves sobre o rio Araguaia		Edital nº 288/25, referente a contratação de supervisora homologado. Edital nº 150/26, referente as obras, publicado e em análise de propostas.	Edital 90288/25-12	ENALITACAO
L2	2017	7E79		3	BR-080		BR-080/GO - Lote 3			Previsão de aprovação de anteprojetos em set/26. Licitação será na modalidade integrada, previsão para Out/26.	A LICITAR	A LICITAR
L3	2014	7XMB			BR-070	65,0	188,0	Adequação de Cocalzinho de Goiás - km 65 - km 188		Edital nº 218/26, referente a contratação de empresa para elaboração dos projetos, foi licitado com previsão de abertura de propostas para Ago/26.	A LICITAR	A LICITAR
L4	2534	1651			BR-153	50,9	80,9	Contorno Rodoviário de Goiânia		Obra será licitada na modalidade de contratação integrada, SR planeja solicitar DC e licitar obras em Jul/26.	A LICITAR	A LICITAR
L5	2532	163X	7	Único	BR-153	703,32	703,60	Ponte sobre o rio Paranaíba em Itumbiara	50612.002182/2024-17	Edital 90480/2024-12 homologado, aguardando assinatura de contrato.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
