


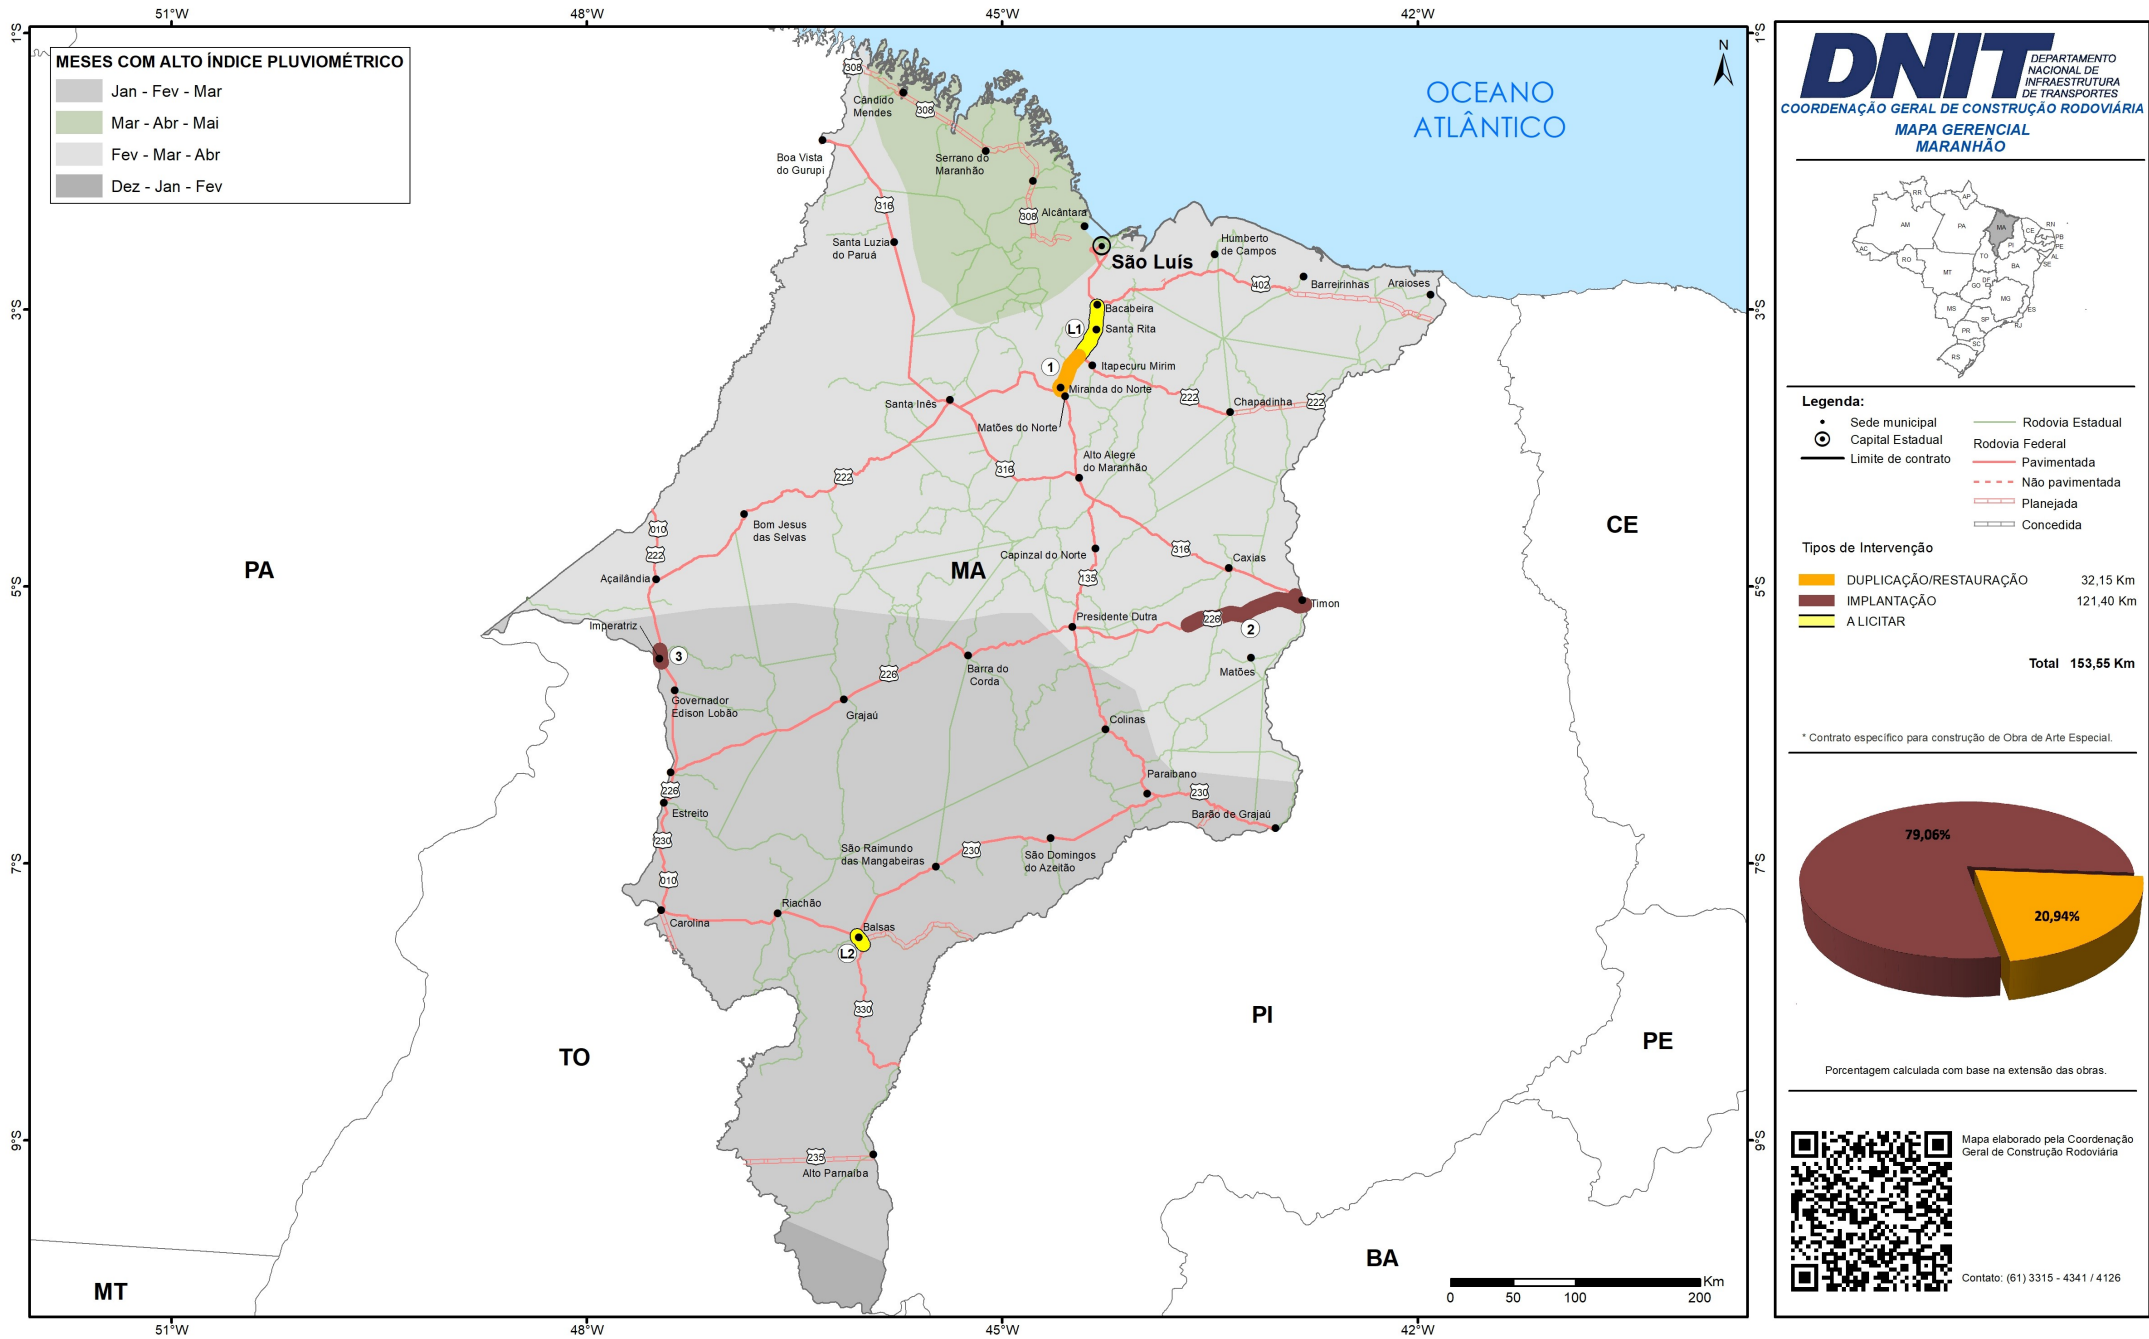

Obra Direta																	
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2022	7W84	2-3-7	3	15 00627/20	CONSORCIO BR-135/MA (LCM / OTIMA)	BR-135	95,00 - 127,30	32,15	Duplicação da BR-135/MA	12/12/2023	12/10/2026	R\$ 136.691.178,60	26,22%	Obra paralisada em função de questões vinculadas ao Plano de Consulta às comunidades quilombolas.	15 00626/2023	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA
2	2020	7V00	3-7	Unico	15 00039/20	CONSORCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-316	609,40 - 620,90	11,5	Contorno de Timon	03/02/2023	16/06/2026	R\$ 186.467.734,47	95,67%	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.	15 00459/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA - ZAGO
2	2020	7V00	3-7	Unico	15 00039/20	CONSORCIO - BR 226 E BR 316/MA	BR-226	0,00 - 100,00	100	Implantação da BR-226/MA	03/02/2023	18/03/2026	R\$ 186.467.734,47	95,67%	Obra concluída. Em tratativas para recebimento dos serviços.	15 00459/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA - ZAGO
3	2019	13X5	2-3-7	Unico	15 00699/20	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-010	250,90 - 260,80	9,9	Remanescente da travessia urbana de Imperatriz	26/11/2025	21/05/2029	R\$ 284.578.721,53	1,89%	Implantação do canteiro de obras em andamento.	Edital 0254/25-15	Em Licitação

Obra a licitar												SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)		SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO				EDITAL			
L1	2021	7W84	2-3-7	2	BR-135	51,30 - 95,60	Adequação Estiva - Miranda do Norte - Lote 2							A LICITAR	A LICITAR
L2					BR-230/330	0,00 - 8,60	Contorno de Balsas - Lado Direito								

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
