


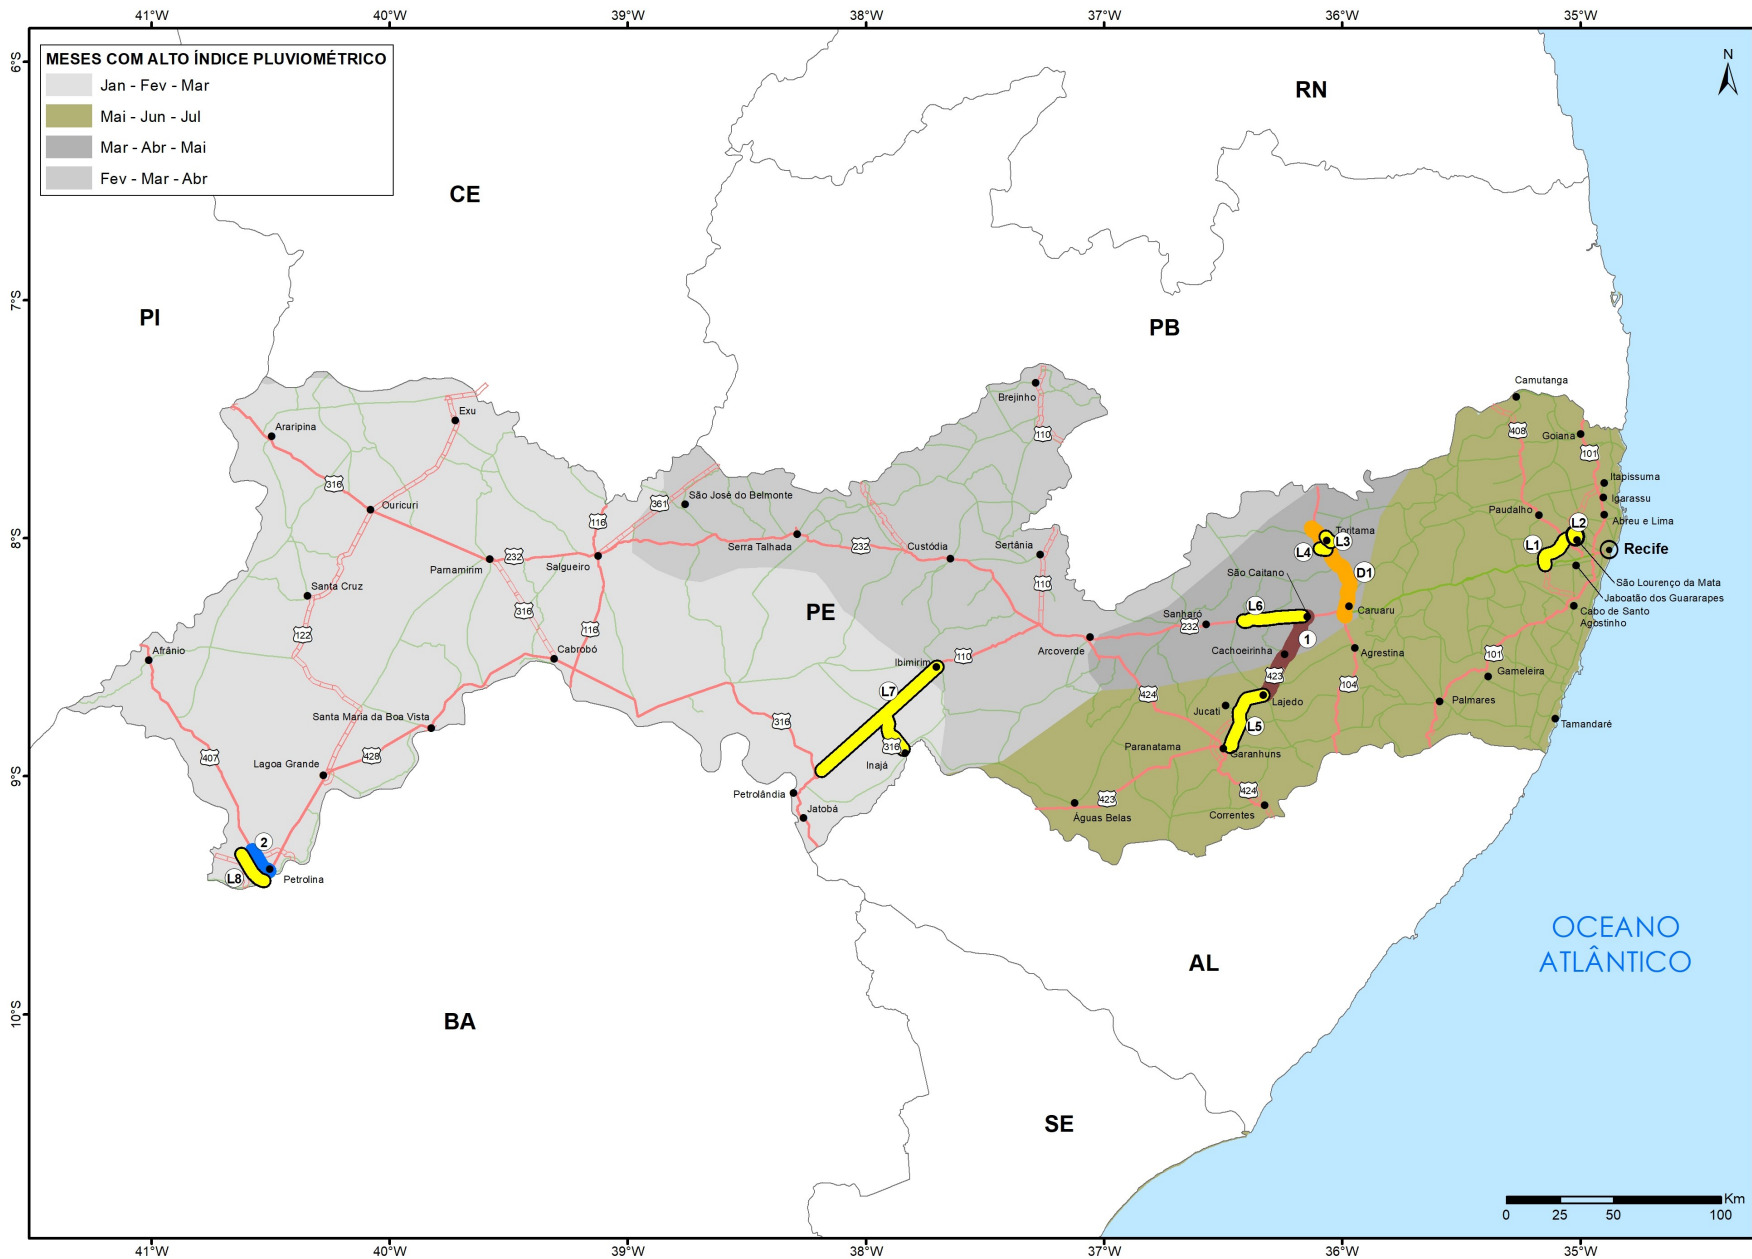

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL PERNAMBUCO

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	51,40 Km
IMPLANTAÇÃO	41,80 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	11,30 Km
A LICITAR	
Total	104,50 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta																			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
1	2053	14X0	2-6	1	04.00260/2021	CONSORCIO LCM/BIOTEC/CONTEC/CA	BR-423	18,20	60,00	41,8	Projetos e Execução do Lote 1	26/10/2021	29/09/2026	R\$ 330.394.587,82	5,3%	Previsão de entrega de 12 km de pista nova até Dez/26. Pendências junto às concessionárias de energia, água e esgoto, além de desapropriações.	04.00421/2024	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA	
2	2050	7X42	3	Único	04.00520/2022	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A	BR-407	115,50	124,60	11,3	Adequação da travessia urbana de Petrolina	13/10/2022	18/06/2027	R\$ 129.110.430,26	87,29%	Obra em andamento, com serviços no Seg 2 e 2º RFPO aprovada. Conclusão prevista para 2026 e haverá serviços remanescentes.	04.00276/2023	CONSORCIO JBR/ASTEP	
Obra Delegada																			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2054	7M88	3	TC-266/2007	ESTADO DE PERNAMBUCO	BR-104	19,80	71,20	51,4	Rest. e adeq. de capacidade e duplicação	07/08/2008	30/04/2026	R\$ 344.013.414,21	R\$ 27.892.979,53	R\$ 371.906.393,74	71,3%	Obra concluída. Aguardando DER/PE encaminhar prestações de contas.		
Obra a licitar																			
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA							
L1		14X3		2A	BR-101	30,00	50,00	Arco Metropolitano de Recife		Projetos em elaboração, previsão de licitação do Seg 2A para 2º Sem/26.	A LICITAR	A LICITAR							
L2		14X3			BR-101		Viaduto do Arco Metropolitano de Recife			Obra será executada pela OGMRP.	A LICITAR	A LICITAR							
L3	2054	7M88	2	UNICO	BR-104	19,80	33,00	Variação de Torilama		Projetos em desenvolvimento pelo DER/PE. TC em elaboração para ser enviado a CGOINT.	A LICITAR	A LICITAR							
L4	2054	7M88			BR-104	27,70	30,60	Travessia urbana de Torilama		Projetos aprovados, previsão de licitação em 2026.	A LICITAR	A LICITAR							
L5		20UC	2		BR-423	60,00	94,00	Duplicação Lote 2		Edital 514/2025-00, referente a elaboração de projetos, em fase de análise de propostas.	A LICITAR	A LICITAR							
L6					BR-232	149,10	177,90	Duplicação da BR-232 - São Caetano a Belo Jardim	50604.002815/2025-69	Projetos serão doados pelo DER/PE, previsão para assinatura de ACT em 2026.									
L7					BR-110/316		Construção Petrolândia - Inajá			Projetos Executivos doados pelo exército, aprovados pela DPP. Obra será inserida na PLOA 27 para licitar.	A LICITAR	A LICITAR							
L8		7X42	3	UNICO	BR-407	115,50	128,50	Remanescente da adequação da travessia urbana de Petrolina		Aguardando projetos do remanescente para licitar.	A LICITAR	A LICITAR							

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
