




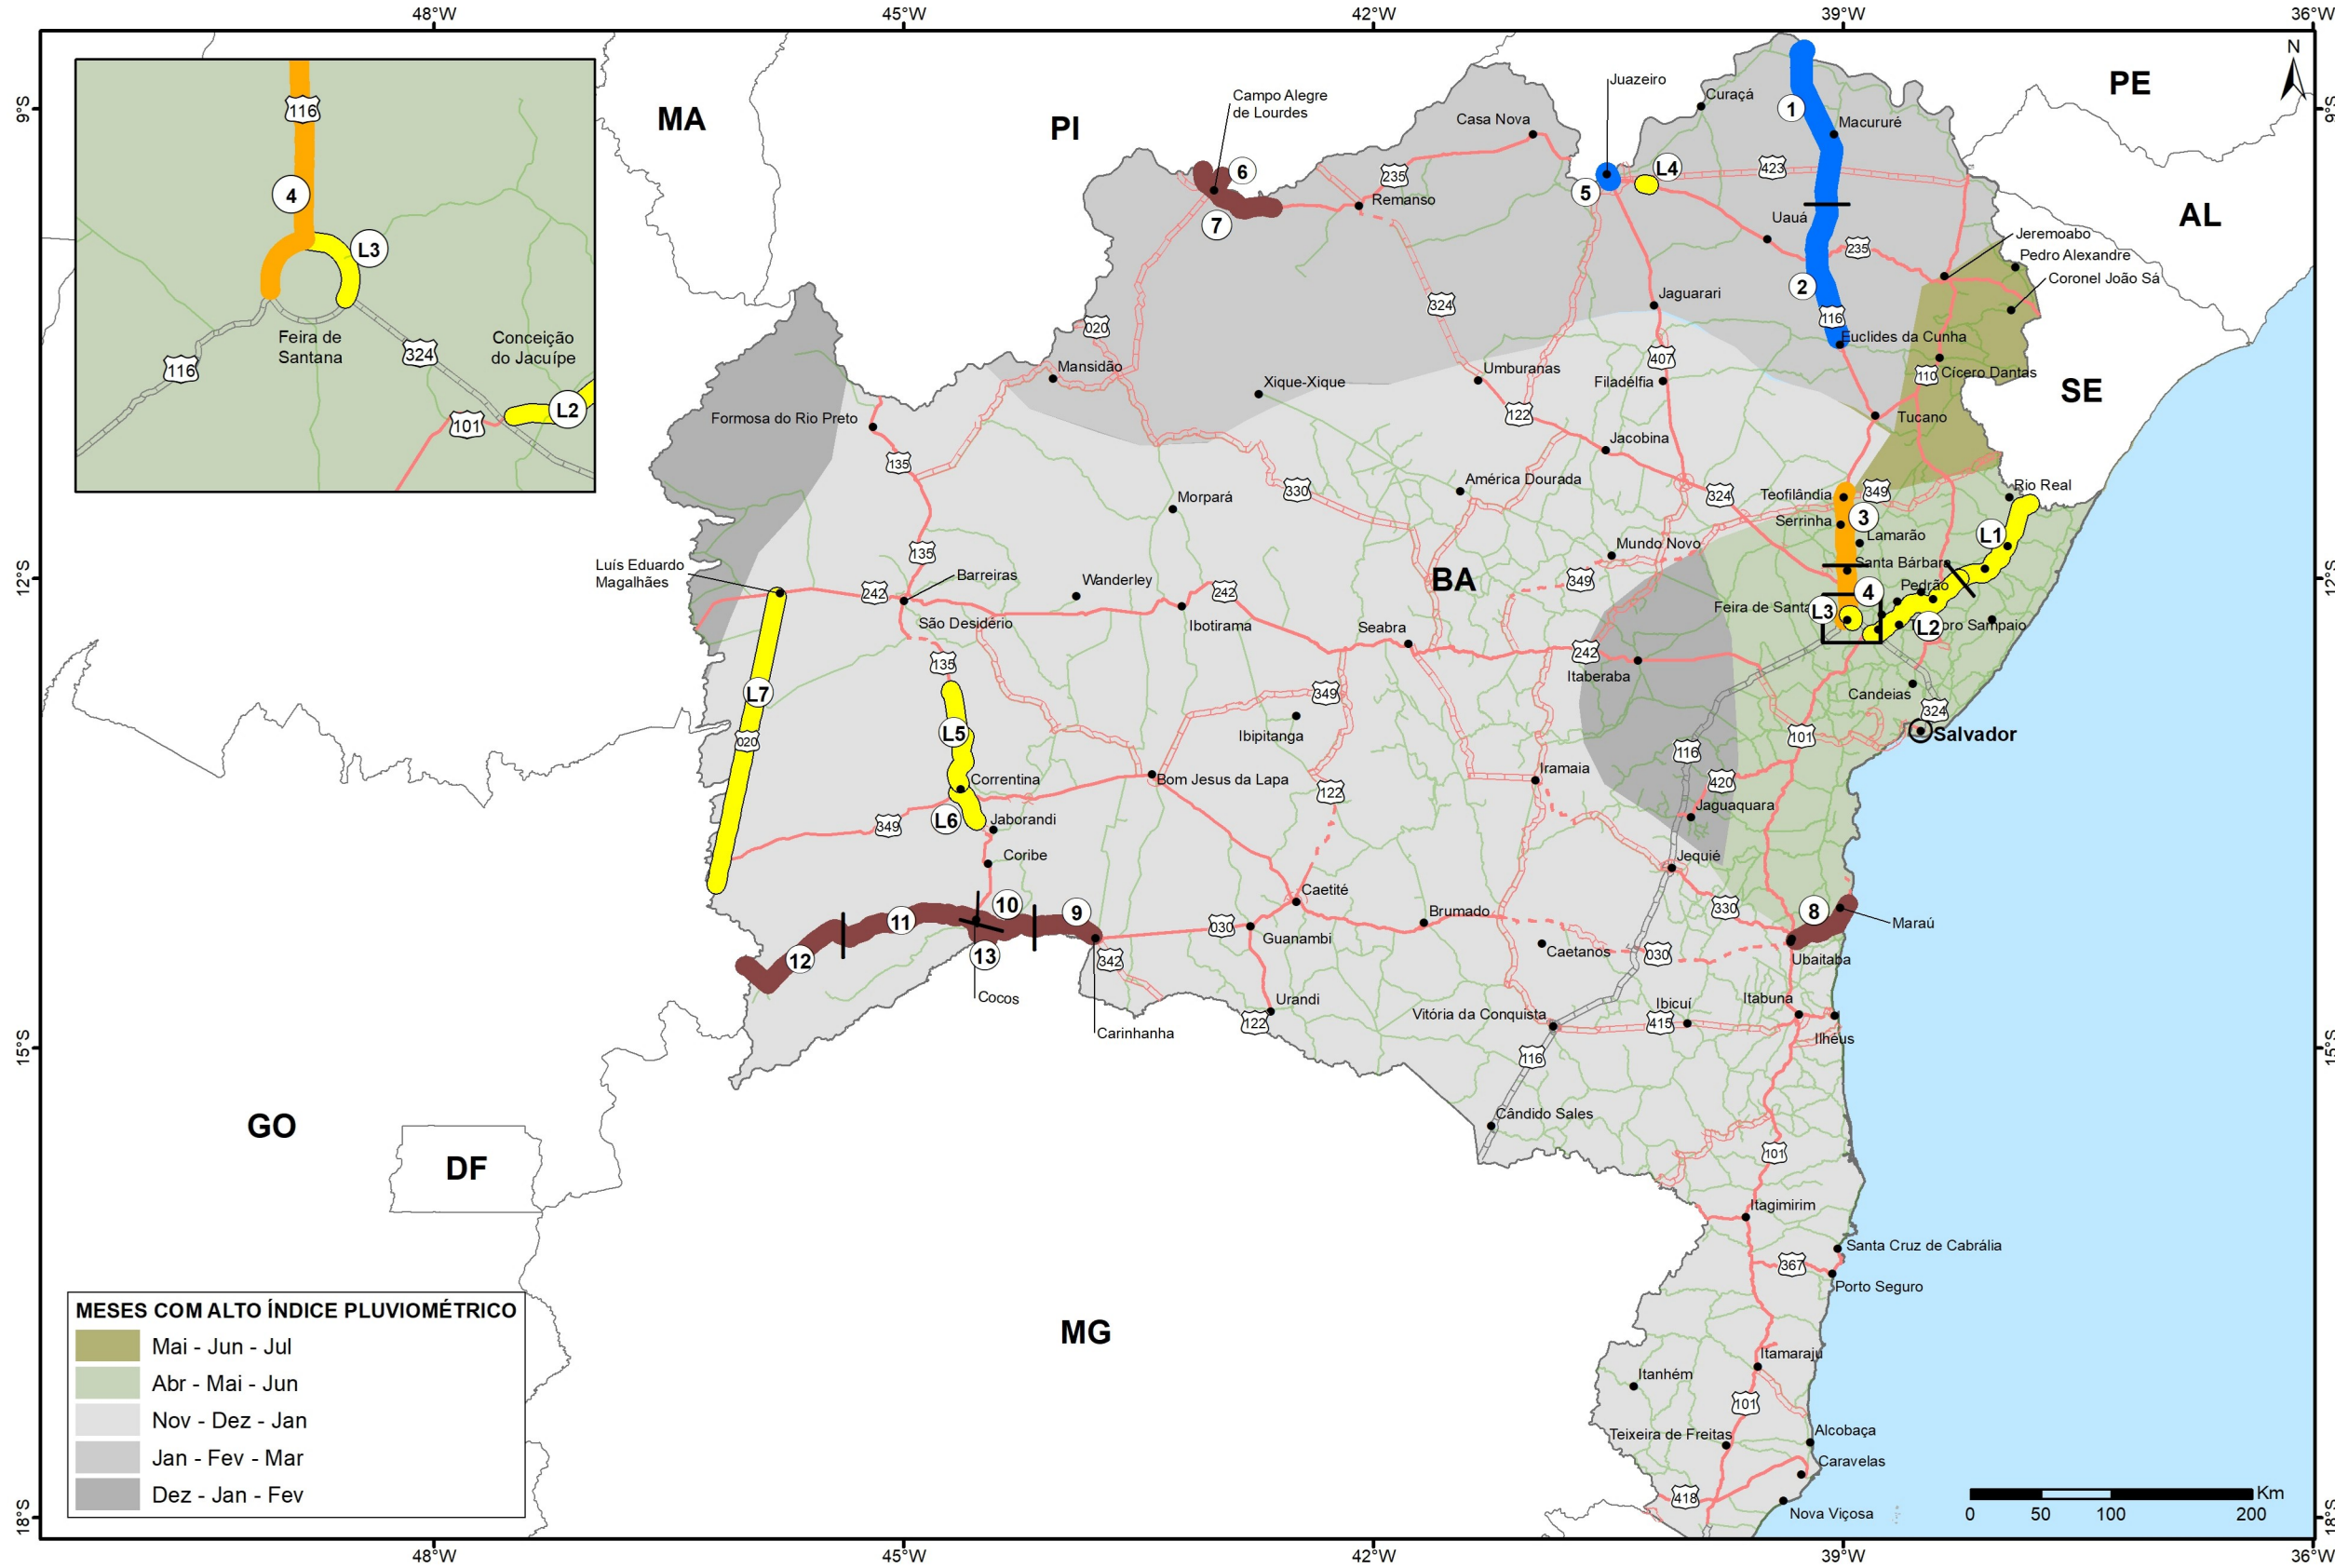

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODoviÁRIA

MAPA GERENCIAL

BAHIA




Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	93,52 Km
IMPLANTAÇÃO	429,30 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	217,13 Km
A LICITAR	
Total	739,95 Km

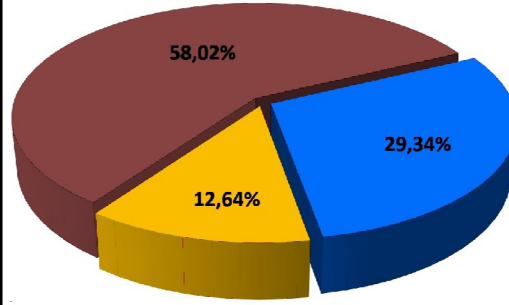

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obras Diretas

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1		13X7	3	1	05 00875/2014	CONSORCIO CCL / LCM / PRODEC	BR-116	0,00	113,36	113,36	Adequação BR-116/BA	21/11/2014	31/01/2026	R\$ 310.420.073,76	65,05%	Obra em andamento, ritmo adequado. Pendências de desapropriação mas que não são entraves para o andamento.	05 00028/2015	CONSORCIO HOLLUSIA STEP
2		13X7	3	2	05 00858/2014	CONSORCIO LCM-CCL-JDS	BR-116	113,36	211,83	98,47	Adequação BR-116/BA	23/10/2014	28/01/2026	R\$ 288.537.295,63	25,55%	Pendência em projetos de OAEs. RFPO em andamento, que será analisada pela SR. Desapropriação a ser feita não impacta andamento da obra no momento.	05 00028/2015	CONSORCIO HOLLUSIA STEP
3	1992	13X7	3	5	00 00379/2024	CONSORCIO SVC / TOP / PAVISERVICE / SD	BR-116	334,23	387,41	53,18	Duplicação BR-116/BA - Rem. do contrato 05 00878/2014	11/08/2024	29/09/2028	R\$ 568.458.191,11	0,89%	Contratação integrada. Projetos em fase de elaboração. Processo de contratação de supervisão em andamento.	05 00911/2016	ENECON S.A.
4	1993	13X7	3	6	05 00879/2014	CONSORCIO A MORIM BARRETO/EMPA/BA SITEC	BR-116	387,41	427,75	40,34	Duplicação BR-116/BA	14/10/2014	24/02/2025	R\$ 467.166.005,95	97,09%	Obra concluída, contrato em tramites de finalização.	05 00911/2016	ENECON S.A.
5	1991	14LV	3	Unico	05 00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-407	0,00	5,30	5,3	Adequação de capacidade na Travessia de Juazeiro	15/05/2023	08/07/2025	R\$ 218.260.324,91	37,87%	Obra em andamento. 2º RFPO em elaboração. Haverá necessidade de contratação de remanescente. Interferência com postes que serão remanejados ao longo da obra.	05 00523/2023	CONSORCIO JBR / A STEP
6	3893	7V18	3	Unico	05 00105/2024	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES	BR-020	775,50	787,30	11,8	Implantação entre Campo Alegre de Lurdes e Div/PI	20/02/2024	14/04/2025	R\$ 32.483.007,56	30,56%	RFPO tramitando na SR para mudar o traçado e diminuir a quantidade de desapropriações.	05 00540/2024	CONSORCIO GEOSISTEMAS-SETEC
7	2003	7F51	2-3	10	05 00114/2017	CONSORCIO BR-235 (S.A. PAULISTA / ASTEC)	BR-235	601,30	663,60	62,3	Implantação e pavimentação	20/04/2017	28/06/2025	R\$ 178.255.592,56	65,41%	Obra paralisada devido a pendência com desapropriações. Consorcio solicitou rescisão contratual. RFPO em andamento para suprir parte do escopo que não será executado.	05 00179/2023	GEOSISTEMAS S.B.V. E PLANEJAMENTO
8	2006	7XJ4	2-3	3	00 00390/2024	CONSERVA DE ESTRADA S LTDA	BR-030	845,50	898,40	52,9	Implantação do lote 3 - Maraú	30/07/2024	15/05/2027	R\$ 236.904.356,64	0%	Obra iniciada. LI parcial emitida. Há imbróglcio com pedreira sendo tratado.	05 00179/2023	TRAFECON ENGENHARIA LTDA
9	2004	7V19	2-3	2	05 00312/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	237,50	280,10	42,6	Implantação entre Cocos e Carinhanha (Lote 2)	20/06/2023	28/12/2025	R\$ 115.617.271,27	93,3%	RFPO sendo elaborada para tratar de pavimentação, sinalização e drenagem. Desapropriações a serem feitas não impactam o andamento da obra no momento.	05 00604/2022	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
10	2004	7V19	2-3	1	05 00059/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	191,50	237,50	46	Implantação entre Cocos e Carinhanha (Lote 1)	12/12/2022	30/04/2025	R\$ 133.949.319,09	91,34%	RFPO em andamento para inclusão de acesso a Juvenília e acrescentar quantitativo de pavimentação. Interferência com rede elétrica não impacta andamento atual da obra	05 00604/2022	RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
11	4120	163J	3	2	00 00392/2024	CONSORCIO GA E/SV C/PAVISERVICE/BA SITEC	BR-030	90,60	190,80	100,2	Implantação Div/GO até Cocos - Lote 2	10/07/2024	31/12/2027	R\$ 514.629.882,36	0,02%	Contratação integrada em fase de desenvolvimento dos projetos. Contratação de supervisão em andamento.	Edital 0145/25-00	Em licitação
12	4120	163J	3	1	00 00391/2024	CONSORCIO CAIAPO / MULTI MODAL	BR-030	0,00	90,60	90,6	Implantação Div/GO até Cocos - Lote 1	11/07/2024	01/01/2028	R\$ 365.326.608,28	0%	Contratação integrada em fase de desenvolvimento dos projetos. Contratação de supervisão em andamento.	Edital 0145/25-00	Em licitação
13	2007	1C09	2-3	5	05 00629/2014	CONSORCIO TOP/GEOSISTEMAS	BR-135	443,90	466,80	22,9	Implantação BR-135/BA	21/08/2014	01/03/2025	R\$ 122.309.811,52	98,7%	Obra concluída, porém ainda não foi emitido o Termo de Recebimento Definitivo. Em tramitação, processo de reconhecimento de dívida.	05 00030/2015	DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA

Obras a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	1994-1995	105S	2-3-7	BR-101	41,60 83,58	ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA - Lotes 1 e 2	50600.021701/2024-77	0201/24-05	Resultado de licitação homologado, aguardando assinatura de contrato.	50600.025588/2024-07	A licitar
L2	1996-1997	105S	2-3-7	BR-101	83,58 165,40	ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA - Lotes 3 e 4			Irà iniciar o levantamento do remanescente. Previsão de licitar em Jul/25	50600.025588/2024-07	A licitar
L3	2002	7XMO	3	BR-324	512,50 520,00	Contorno Norte de Feira de Santana	50605.001982/2024-00	0277/24-05	Resultado da licitação publicada. Aguardando assinatura do contrato.	Edital 0468/24-05	Em licitação
L4	1991	14LV	3	BR-235/407	318,40 322,40	Contratação de remanescente para execução das agulhas, OAEs e drenagens			TR sendo elaborada para contratação de remanescente.	05 00523/2023	CONSORCIO JBR / A STEP (SUPERVISAO JUAZERO/BA)
L5		1C09	2-3	BR-135	267,00 344,70	Ação 1C09 - Lote 2			Anteprojeto será revisado, com previsão de licitação em Set/25.	Edital 0145/25-00	Em licitação
L6	2928	1C09	2-3	BR-135	340,00 378,00	Lote 3			Projeto executivo aprovado. Edital em elaboração, com previsão de licitar em Jun/25		
L7	2512	20UC		BR-020	0,00 209,50	Adequação da BR-020/BA - Lotes 4 e 5			Projetos em elaboração pela DPP.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.
