


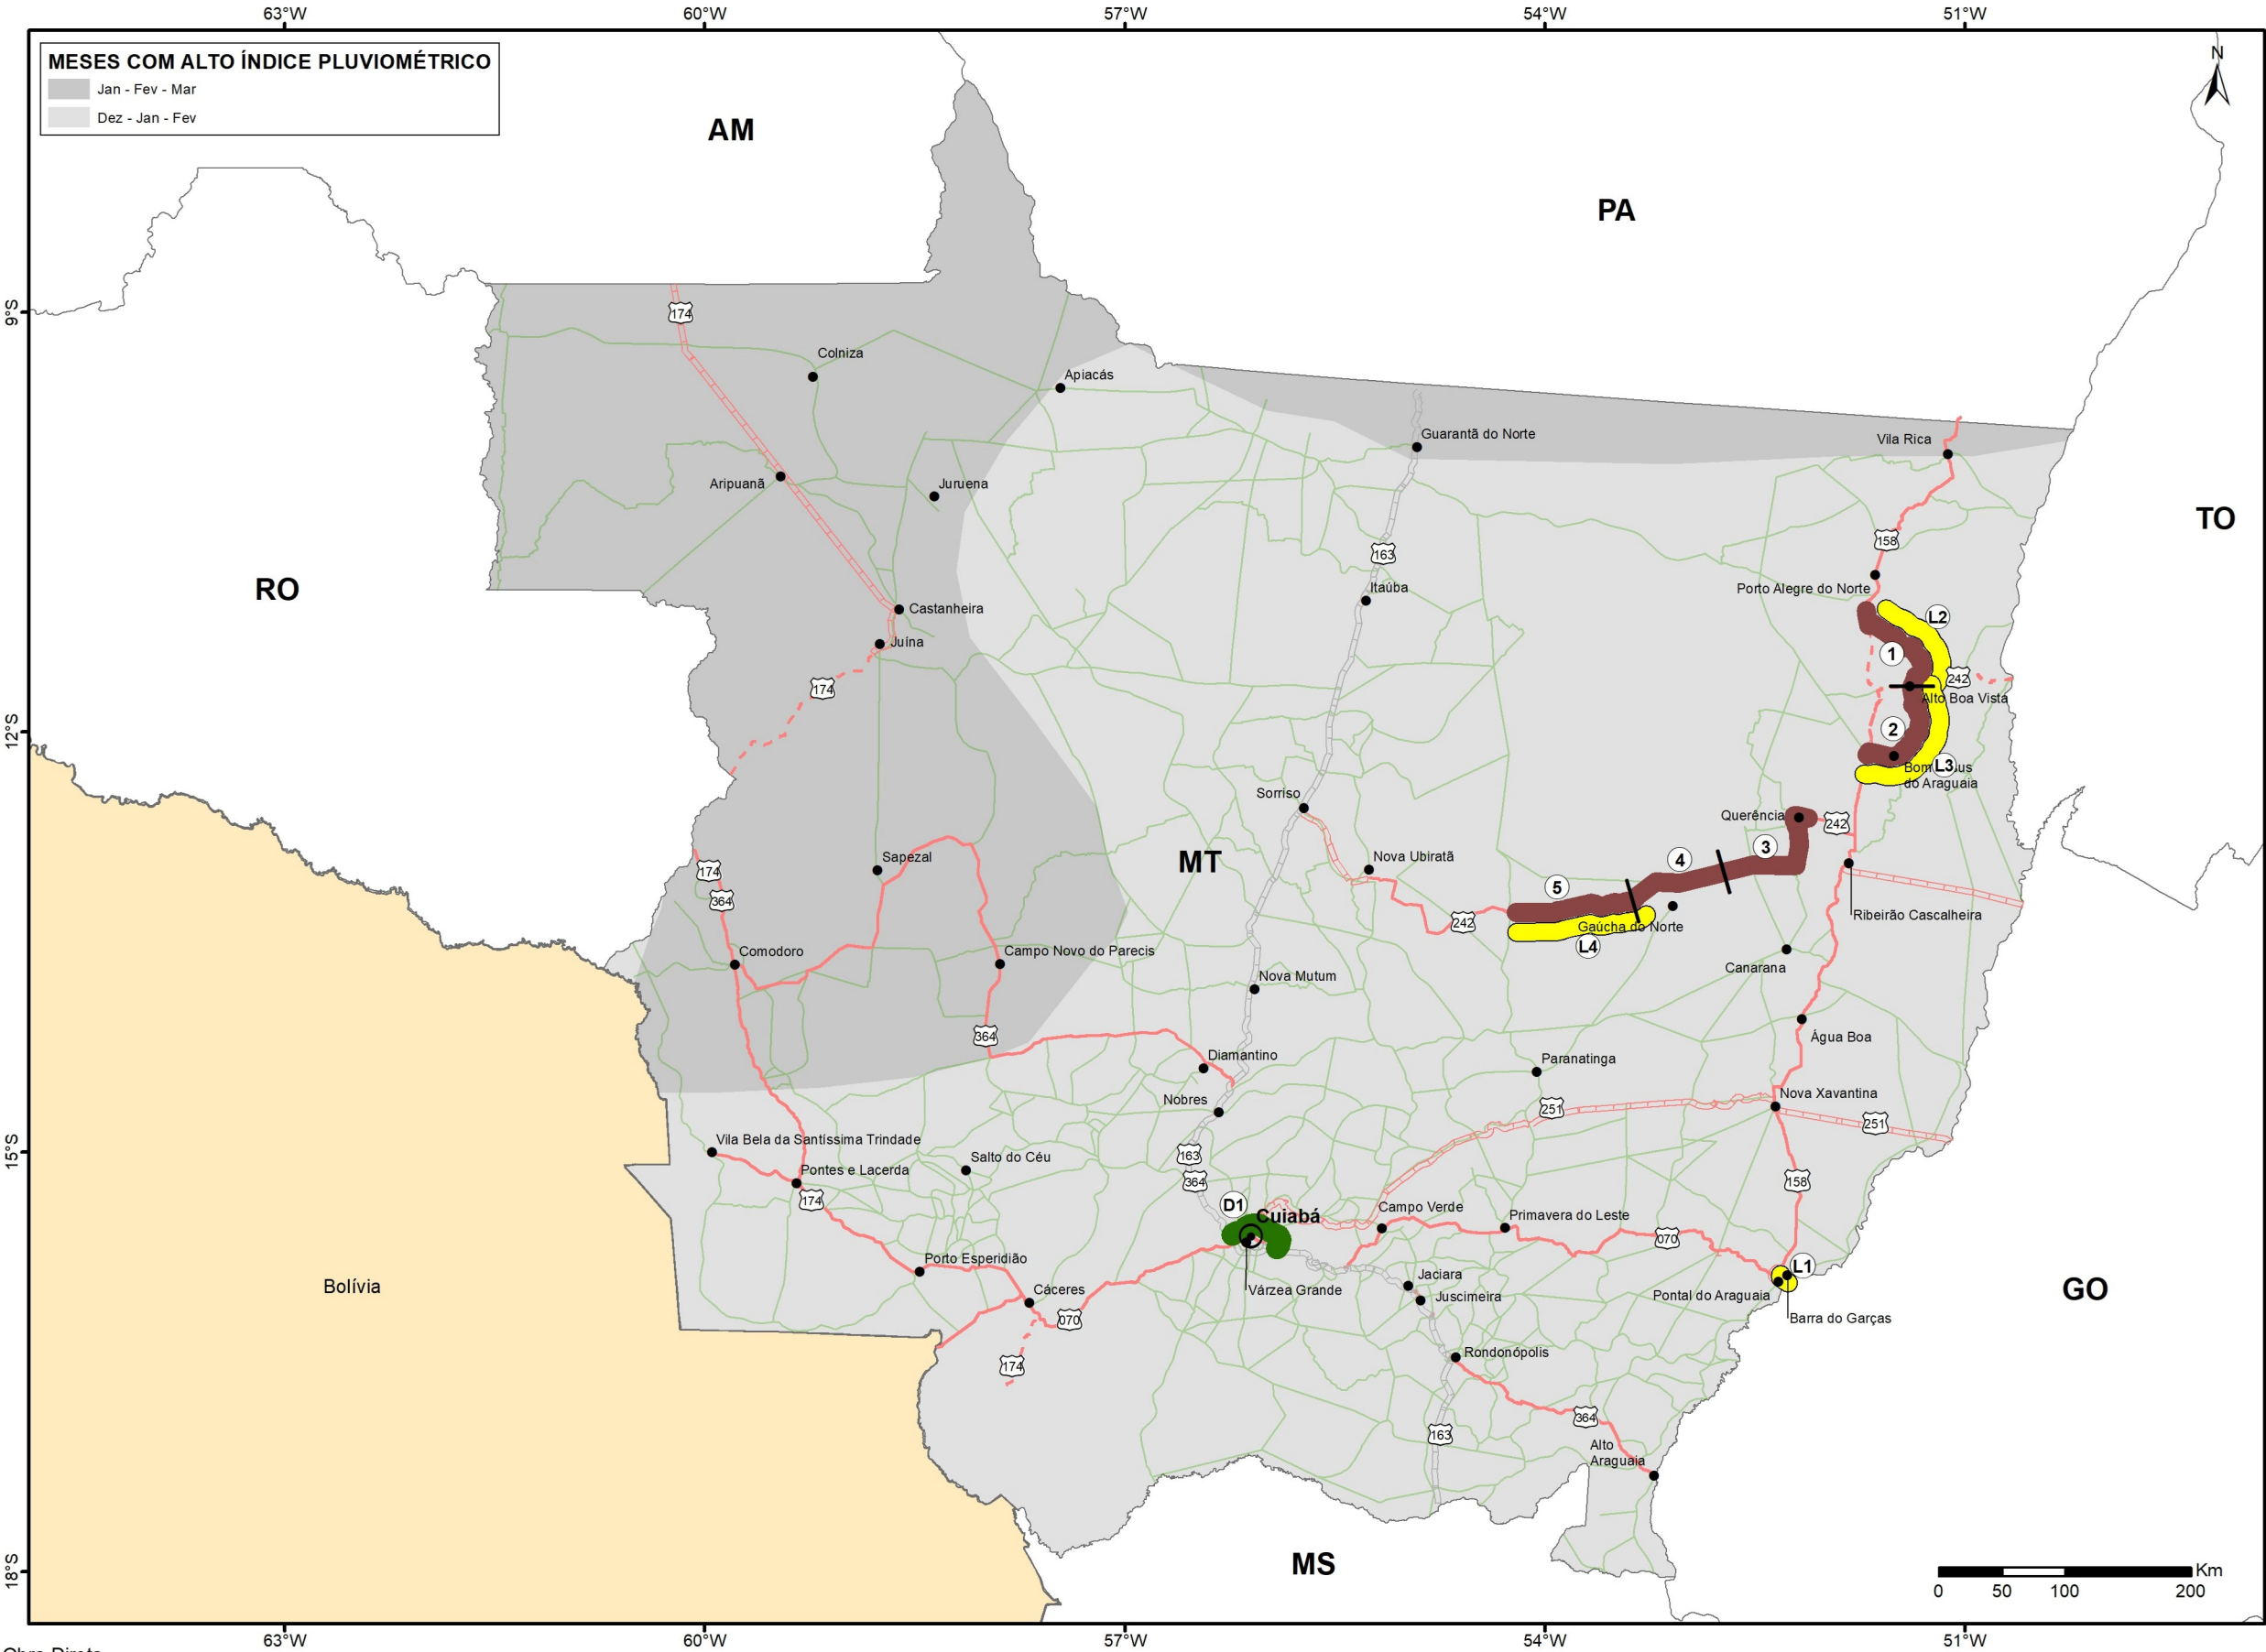

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2037	11VA	2-3-6	A	11 00209/2025	CONSORCIO BANDERANTES - DESTESA - RTA	BR-158	0,00	93,99	93,99	Implantação do Lote A	20/05/2025	<Null>	R\$ 169.076.075,80	0%	Obra parada devido ao período chuvoso e à troca de contrato de obras.	11 00551/2023	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	2038	11VA	2-3-6	B	11 00159/2022	CONSORCIO BANDERANTES - DESTESA - RTA	BR-158	93,99	195,42	101,43	Implantação do Lote B	23/05/2022	28/07/2025	R\$ 375.525.233,73	0,36%	Em fase de projetos. Projeto geométrico já encaminhado ao IBAMA para licenciamento.	11 00567/2023	CONSORCIO SUPERVISÃO O VALE DO ARAGUAIA
3	2039	10KK	2-3-6	Unico	11 00259/2016	CONSORCIO BANDERANTES/DESTESA/ASTEC	BR-242	291,98	395,36	103,38	Implantação e pavimentação	03/06/2016	22/12/2027	R\$ 294.169.064,86	0,33%	Obra paralisada, não há expectativas de execução em 2025. O trecho não foi contemplado na alternativa de traçado aceita pelo IBAMA.	11 00658/2017	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
4	2039	10KK	2-3-6	2	11 00927/2015	CONSORCIO JM/ALTA/ETEC	BR-242	395,36	486,32	90,96	Implantação BR-242/MT	26/01/2016	23/03/2024	R\$ 247.507.401,93	0,31%	Contrato concluído por decurso de prazo. Aguardando alteração do traçado para realização de nova licitação.	11 00031/2024	STRATA ENGENHARIA LTDA
5	2039	10KK	2-3-6	1	11 00960/2015	CONSORCIO ENPA/CAVALCA/SAB/CONTÉCNICA	BR-242	486,32	575,23	88,91	Implantação BR-242/MT	11/01/2016	24/06/2027	R\$ 399.162.544,08	0,1%	Obra paralisada, aguardando licenciamento. Haverá alteração de parte do traçado devido à alternativa aprovada pelo IBAMA.	11 00488/2020	STRATA ENGENHARIA LTDA

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
D1	2036	12KY	6	TC-764/2011	Governo de MT	BR-163	0,00	52,70	52,7	Contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande	15/11/2012	02/06/2027	R\$ 323.582.183,87		R\$ 215.721.455,93	R\$ 539.303.639,80	22,55%	Segmento do km 0 ao km 21,5 com execução de serviços de OAEs e terraplenagem. Segmento do km 21,5 ao km 51,71 em fase de projetos.		

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2035	7S80	2-3	BR-070	0,00	9,90	Contenção de taludes	50611.000281/2024-66	03/12/24-11	Processo licitatório suspenso por decisão liminar após mandado de segurança.	
L2	1984	11VA	2-3-6	BR-158	0,00	93,99	OAEs do Lote A da BR-158/MT	50611.000978/2024-37	0010/25-11	Licitação adjudicada, aguardando assinatura de contrato.	
L3	2038	11VA	2-3-6	BR-158	93,99	195,42	OAEs do Lote B da BR-158			Aguardando aprovação dos projetos no contrato 11 00159/2022 para instruir a licitação.	11 00567/2023
L4	2039	10KK	2-3-6	BR-242	486,32	575,23	OAEs do Lote A da BR-242			Aguardando licenciamento e projetos para preparar o edital. Futura contratação contemplará 7 OAEs, destas, 4 estão com o projeto em elaboração e 3 aguardando ajustes no traçado.	11 00488/2020

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
