




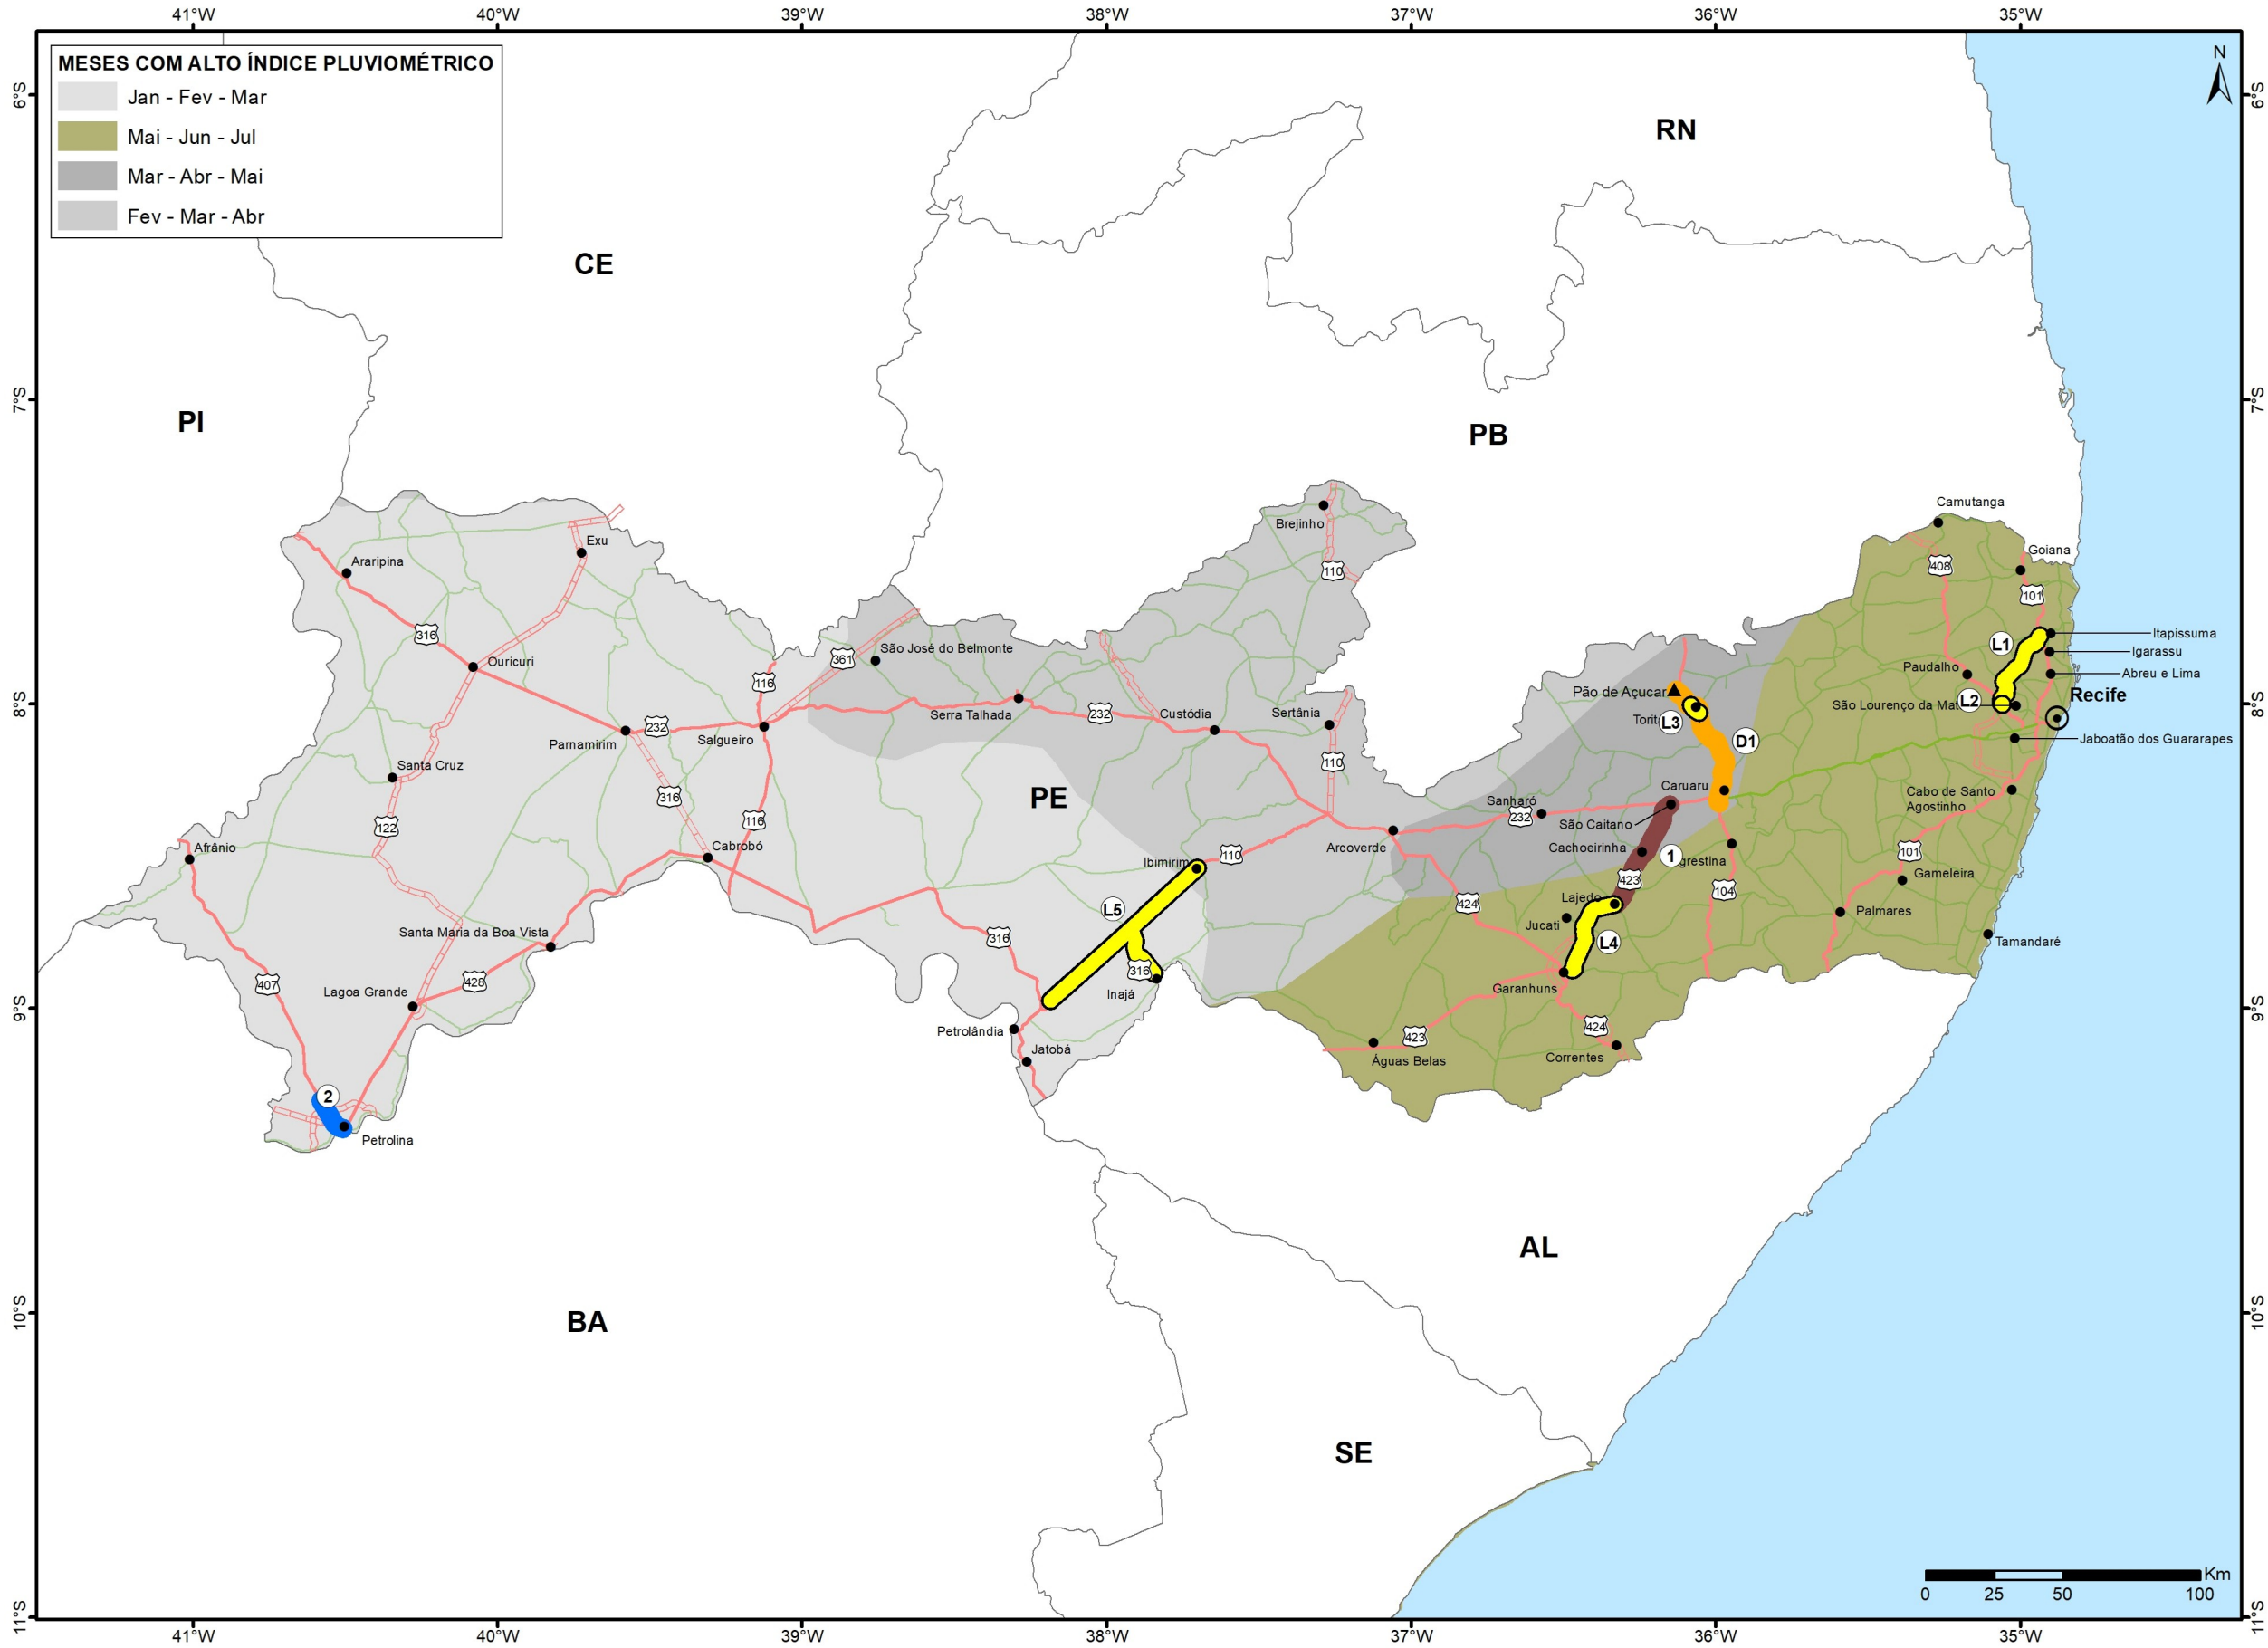

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL

PERNAMBUCO




Legenda:

- Sede municipal
- Distrito
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	51,40 Km
IMPLANTAÇÃO	67,92 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	11,30 Km
A LICITAR	
Total	130,62 Km

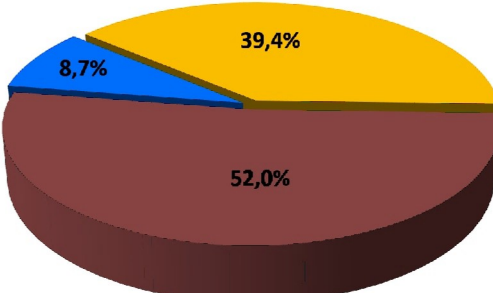

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obras Diretas															SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*						
1	2053	14X0	2-6	1	04 00260/2021	CONSORCIO LCM/BTEC/CONTECNICA	BR-423	18,20	60	41,8	Projetos e Execução do Lote 1.	26/10/2021	29/09/2026	R\$ 330.394.587,82	2,36%	Obra em ritmo lento com atraso relevante, principalmente pela não aprovação dos projetos de pavimentação e OAEs. Execução de 20 km de pista nova prevista até Dez/25.	04 00421/2024	GEOSISTEMA S ENG. E PLANEJAMENTO LTDA		
2	2050	7X42	3	Único	04 00520/2022	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S A	BR-407	115,50	124,60	11,3	Adequação da travessia urbana de Petrolina.	13/10/2022	28/06/2025	R\$ 140.149.481,70	59,6%	Obra com ritmo lento. Interferências com redes da COMPESA e postes da Neoenergia impactam o avanço. Há previsão de remanescente de obra a ser licitado em Set/25.	04 00276/2023	CONSORCIO JBR/A STEP		

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**				
D1	2054	7M88	3	TC-266/2007	Estado de Pernambuco	BR-104	19,80	71,20	51,4	Rest. e adeq. de capacidade e dupl.	08/07/2008	31/10/2025	R\$ 344.013.414,21	R\$ 27.892.979,53	R\$ 371.906.393,74	77%	Obra em andamento com previsão de conclusão das OAEs e contenções para o 1º semestre/2025 e finalização da obra em Dez/25.		

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)				SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	3872	14X3		BR-101	0,00	30,00	Arco Metropolitano de Recife		ACT firmado entre o DER/PE e o DNIT para a doação dos projetos. A previsão de aprovação é para Jun/25. A execução da obra será licitada pelo DNIT.					
L2		14X3		BR-101		Viaduto do Arco Metropolitano de Recife			ACT com grupo de empresários para doação de projeto o qual está em análise com expectativa de aprovação em Mar/25. Expectativa de orçamento R\$35mi. Obra será licitada pelo DNIT.					
L3	2054	7X56	2	BR-104		Variante de Toritama			Os projetos estão sendo elaborados pelo DER/PI, sem previsão de conclusão.					
L4	2053			BR-423	60,00	94,00	Duplicação Lote 2		Projeto executivo em licitação pela DPP, obra será licitada pelo DNIT com perspectiva de contratação para 2026.					
L5	3954			BR-110/316		Construção Petrolândia - Inajá			Projetos Executivos doados pelo exército, ainda em trâmite de aprovação com a DPP. Previsão de lançamento de edital para contratação de obra para Dez/25.					

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
