





DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
RIO GRANDE DO SUL

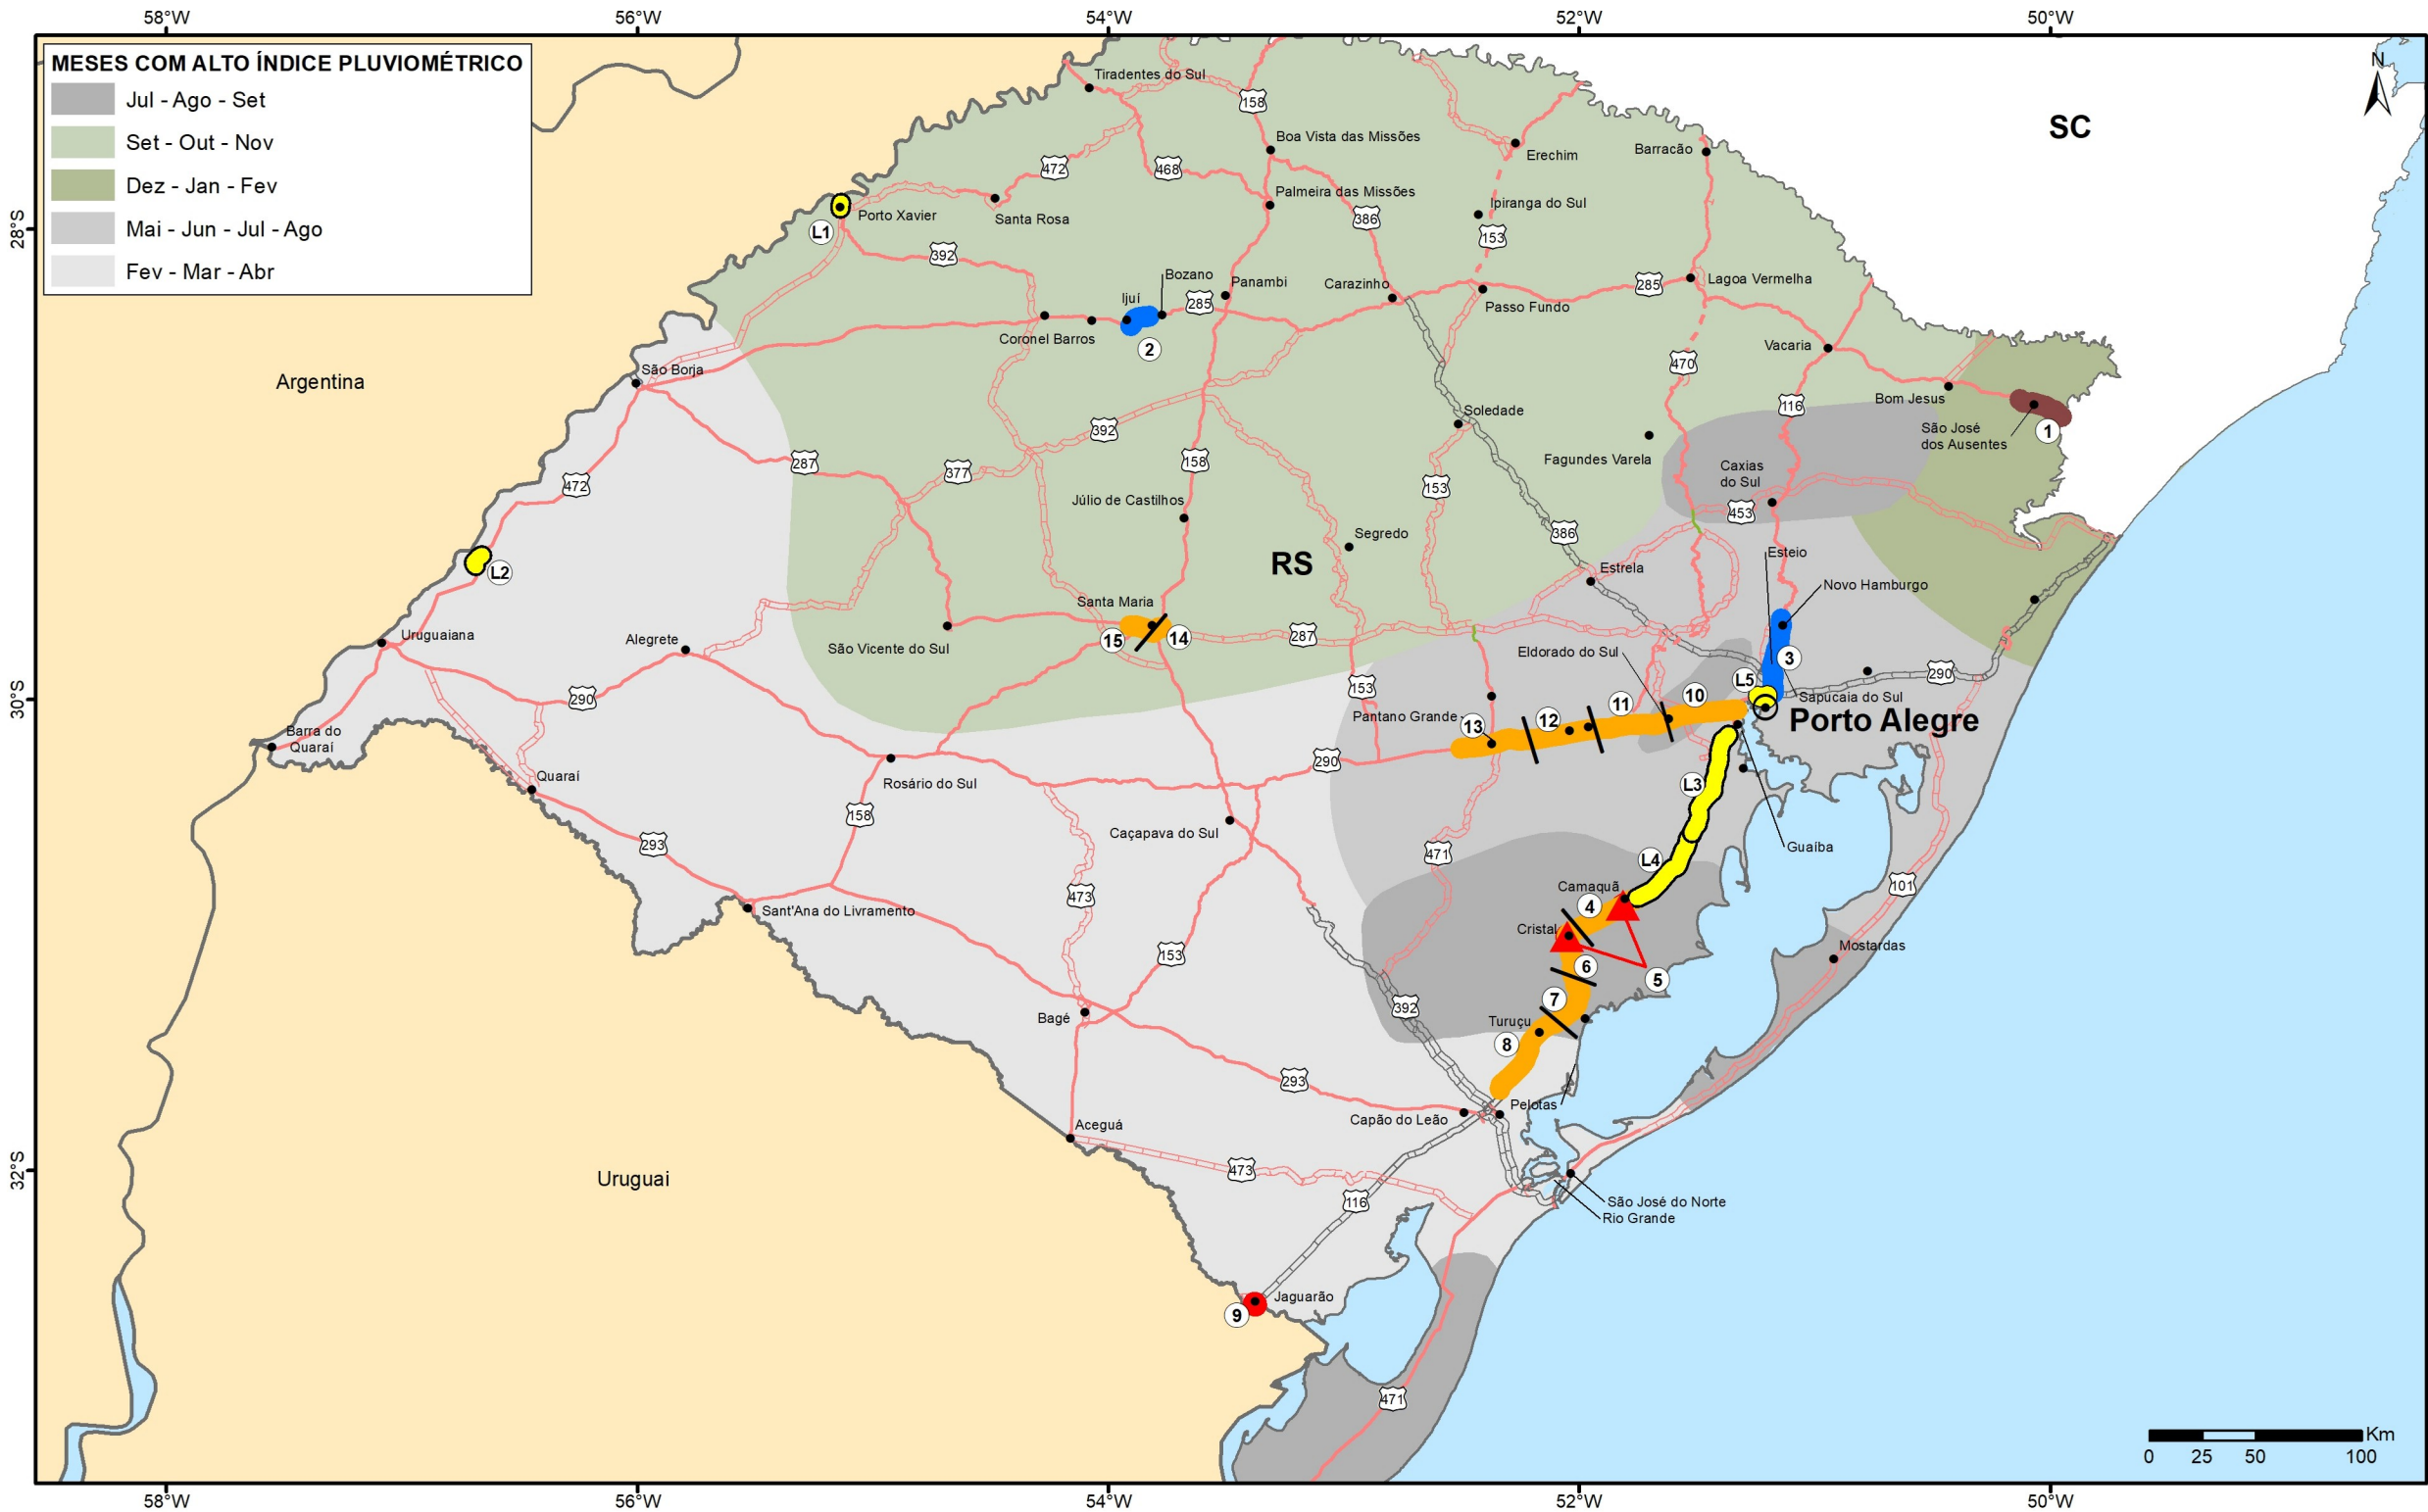

- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida
- Tipos de Intervenção**
- | | |
|------------------------|------------------|
| DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO | 265,67 Km |
| ADEQUAÇÃO-REST/MELH. | 68,50 Km |
| IMPLANTAÇÃO | 24,10 Km |
| A LICITAR | |
| Total | 358,27 Km |

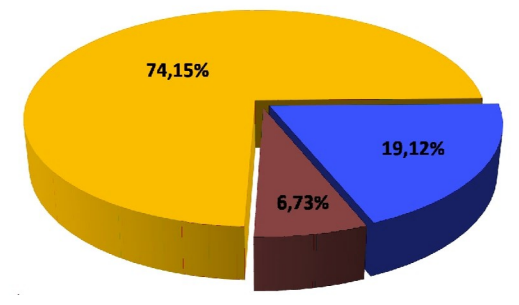

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Atualizado em: Junho de 2025

Obra direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2090	7X78	2-3-7	Único	10 00094/2021	CONSORCIO PLANATERRA/TRAÇADO/IGUATEMI	BR-285	30,00	54,10	24,1	Remanescentes de obras na BR-285	15/03/2021	17/08/2026	R\$ 119.453.916,11	30,2%	Obra em andamento, precisando de performar bem para finalizar em 2026. Provável licitação de nova supervisora.	10 00391/2022	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	2077	7X06	2-7	Único	10 00717/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-285	431,50	464,30	32,8	Travessia urbana de Ijuí	27/12/2023	07/06/2027	R\$ 262.992.420,27	5%	Obra em ritmo lento devido à questão orçamentária. Há interferência com redes de infraestrutura que estão sendo sanadas.	10 00062/2024	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	2083	7X06	2-3	1	10 00821/2019	CONSORCIO (MAC / ETERC / SOGEL / IGUATEMI)	BR-116	234,70	270,40	35,7	Melhoramento físicos e segurança de tráfego	02/12/2019	21/12/2026	R\$ 791.980.140,19	56,95%	Em andamento. Prevista 2ª RPFO para análise da SR. Também em estudo a 3ª RPFO, que só poderá avançar caso MP da calamidade seja prorrogada.	10 00650/2016	MAGNA ENGENHARIA LTDA
4	2086	7L04	2-3	5	10 00058/2022	PLANATERRA TERRAPL. PAVIMENTAÇÃO LTDA	BR-116	397,18	422,30	25,12	Remanescentes do contrato 461/2012	21/03/2022	05/09/2025	R\$ 222.847.495,17	57,48%	Obra em andamento. RPFO em fase de aprovação para tratar de aumento de quantitativos em terraplanagem, OAE e drenagem.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
5	100003	7L04	2-3	Único	10 00802/2020	CONSORCIO A.GASPAR/V. GARAMBONE	BR-116	400,34	401,20	0,13	Implantação do viaduto Pompeia	01/12/2020	29/06/2026	R\$ 85.940.903,92	75,51%	Obra com ritmo adequado. Previsão de término das obras em dez/2025.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
5	100003	7L04	2-3	Único	10 00802/2020	CONSORCIO A.GASPAR/V. GARAMBONE	BR-116	400,34	401,20	0,68	Duplicação da Ponte sobre o rio Camaquã	01/12/2020	29/06/2026	R\$ 85.940.903,92	75,51%	Obra com ritmo adequado. Previsão de término das obras em dez/2025.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
6	2087	7L04	2-3	Rem. lote 6	10 00805/2023	CONSORCIO PELOTENSE / PLANATERRA	BR-116	422,30	447,98	25,68	Remanescente da duplicação do lote 6	21/11/2023	03/05/2027	R\$ 140.119.632,50	8,99%	Obra em andamento em ritmo baixo. RPFO prevista para tratar de jazidas.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
7	2088	7L04	2-3	Rem. lote 7	10 00041/2023	CONSORCIO SULTEPA / BOURSCHIED ENG.	BR-116	448,50	470,10	21,6	Remanescentes do lote 7	22/03/2023	16/09/2025	R\$ 68.987.087,91	40,62%	Obra em andamento.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
8	100002	7L04	2-3	8/9	10 00427/2023	CONSORCIO SBS-BOURSCHIED	BR-116	470,10	511,76	41,66	Remanescente da duplicação dos lotes 8 e 9	28/08/2023	07/02/2027	R\$ 101.780.002,36	36,08%	Obra em andamento, enfrentando problemas com capacidade de pedreira.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
9	2526	112N	3	Único	00 00375/2024	CONSORCIO CIDADE / PLANATERRA / ÚNICA	BR-116	0,00	9,20	9,2	Ponte Internacional sobre Rio Jaguarão e acesso	28/07/2024	28/07/2028	R\$ 210.008.065,29	0%	Contratação integrada em fase de projeto. Ajuste de traçado em estudo junto com o governo do Uruguai. Contratação de supervisão em andamento	Edital 0328/24-10	Em licitação
10	2079	123U	2-3	1	00 00139/2014	CONSORCIO B C M	BR-290	112,30	142,00	29,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	01/08/2022	R\$ 168.971.402,71	16,57%	Obra paralisada. Prazo de vigência do contrato expirou e por isso ele vai ser finalizado. Será levantado remanescente para nova licitação em 2026	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
11	2080	123U	2-3	2	00 01070/2013	CONSORCIO TB ECB - ETEL	BR-290	142,00	172,08	30,08	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	05/11/2021	R\$ 212.694.280,34	9,87%	Obra paralisada. Em tratativas de restituição de prazo para reinício, a depender de tratativas com o consórcio. Provável retorno da obra apenas em 2026.	00 00726/2013	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
12	2081	123U	2-3	3	00 00217/2014	CONSORCIO TRIER CTESA - PRODEC	BR-290	172,00	199,03	27,03	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	14/02/2027	R\$ 292.015.136,98	26,02%	Obra em andamento com ritmo adequado	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
13	2082	123U	2-3	4	00 01126/2013	CONSORCIO TRIER CTESA - ESTEIO	BR-290	199,30	228,00	28,7	Duplicação BR-290/RS	13/03/2014	20/10/2025	R\$ 274.921.406,76	75,79%	Obra em andamento. Há previsão de duas RPFOs para o primeiro semestre de 2025	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
14	12KG	2-7	1		00 00493/2013	CONSORCIO CONTINENTAL SOGEL ECOPLAN	BR-158	324,00	329,10	5,1	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	27/12/2025	R\$ 207.690.439,33	98,01%	Obra em ritmo lento devido à questão orçamentária. Há interferência com redes de infraestrutura que estão sendo sanadas.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
15	12KG	2-7	2		00 00494/2013	CONSORCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-287	247,70	254,30	6,6	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	27/12/2025	R\$ 248.437.568,45	98,86%	Obra em ritmo lento devido à questão orçamentária. Há interferência com redes de infraestrutura que estão sendo sanadas.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA
15		12KG	2-7	2	00 00494/2013	CONSORCIO TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-158	247,70	254,30	2,8	Travessia de Santa Maria	05/09/2013	27/12/2025	R\$ 248.437.568,45	98,86%	Obra em ritmo lento devido à questão orçamentária. Há interferência com redes de infraestrutura que estão sendo sanadas.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA

Obra a licitar

A LICITAR	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2025)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2092	7X96		3	BR-392	700,00 700,00	Construção da Ponte Internacional em Porto Xavier	50600.021577/2024-40	Resultado da licitação homologado e adjudicado.		
L2	2076	7X08	2-3	BR-472	510,53 517,10	Ponte sobre o Rio Ibicuí			Aprovada e revisão do orçamento. Definir se será uma contratação integrada. Previsão de em agosto de 2025.	10 00588/2023	NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
L3	2084	7L04	2-3	BR-116	300,54 351,34	Travessia Urbana de Guaíba e trecho remanescente do Exército dos lotes 1 e 2			Supervisora levantando remanescente para nova licitação em 2025.	10 00635/2012	MAGNA ENGENHARIA LTDA
L4	2085	7L04	2-3	BR-116	351,34 397,20	Remanescente dos lotes 3 e 4			Remanescente sendo levantado pela supervisora para desenvolvimento de novo projeto executivo. Previsão de aprovar projeto até dez/2025		
L5		14PC		BR-116	00,00 15,30	2ª Ponte sobre o Rio Guaíba e acessos			Anteprojeto em trâmites de aprovação para licitar contratação integrada.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.
