

ACOMPANHAMENTO

Maio/2026



Aprender
CONECTADO

ESCOLAS
CONECTADAS

Juntos,
ampliamos
futuros

EACE em números

5.290 km

Fibra óptica implantada

74 mil

Access points instalados

6.537 kWh/
dia

Energia Solar
(capacidade instalada)

54% Escolas
concluídas

(Piloto, Fases 2&3, 4.1, 4.2 e 5)

49

Escolas/dia
(dia útil mês)

132 Mbps

Velocidade média

2.295 mil


Estudantes conectados

2.510

Municípios contemplados

2,1 Mbps

Velocidade média/matrícula

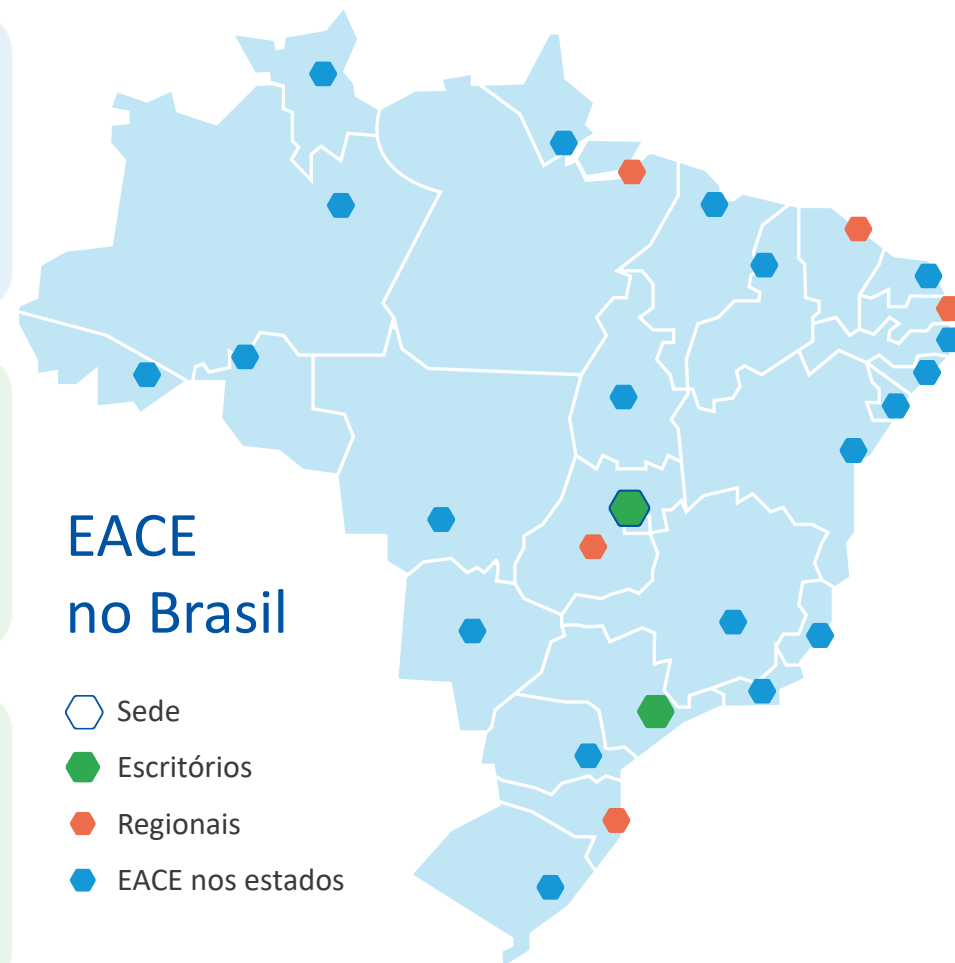



17.130

escolas rurais

1.141

em terra indígena

1.169

em área quilombola






	NORTE	NORDESTE	CENTRO-OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
 REDE EXTERNA	6.122	10.052	447	1.469	2.822	20.912
 REDE INTERNA	7.044	10.330	453	1.470	2.828	22.125
 GERADOR SOLAR	1.478	46	5	3	-	1.532
 ESCOLAS CONCLUÍDAS	6.128	9.930	445	1.446	2.784	20.733




20.733 escolas concluídas


EVOLUÇÃO - Acumulado

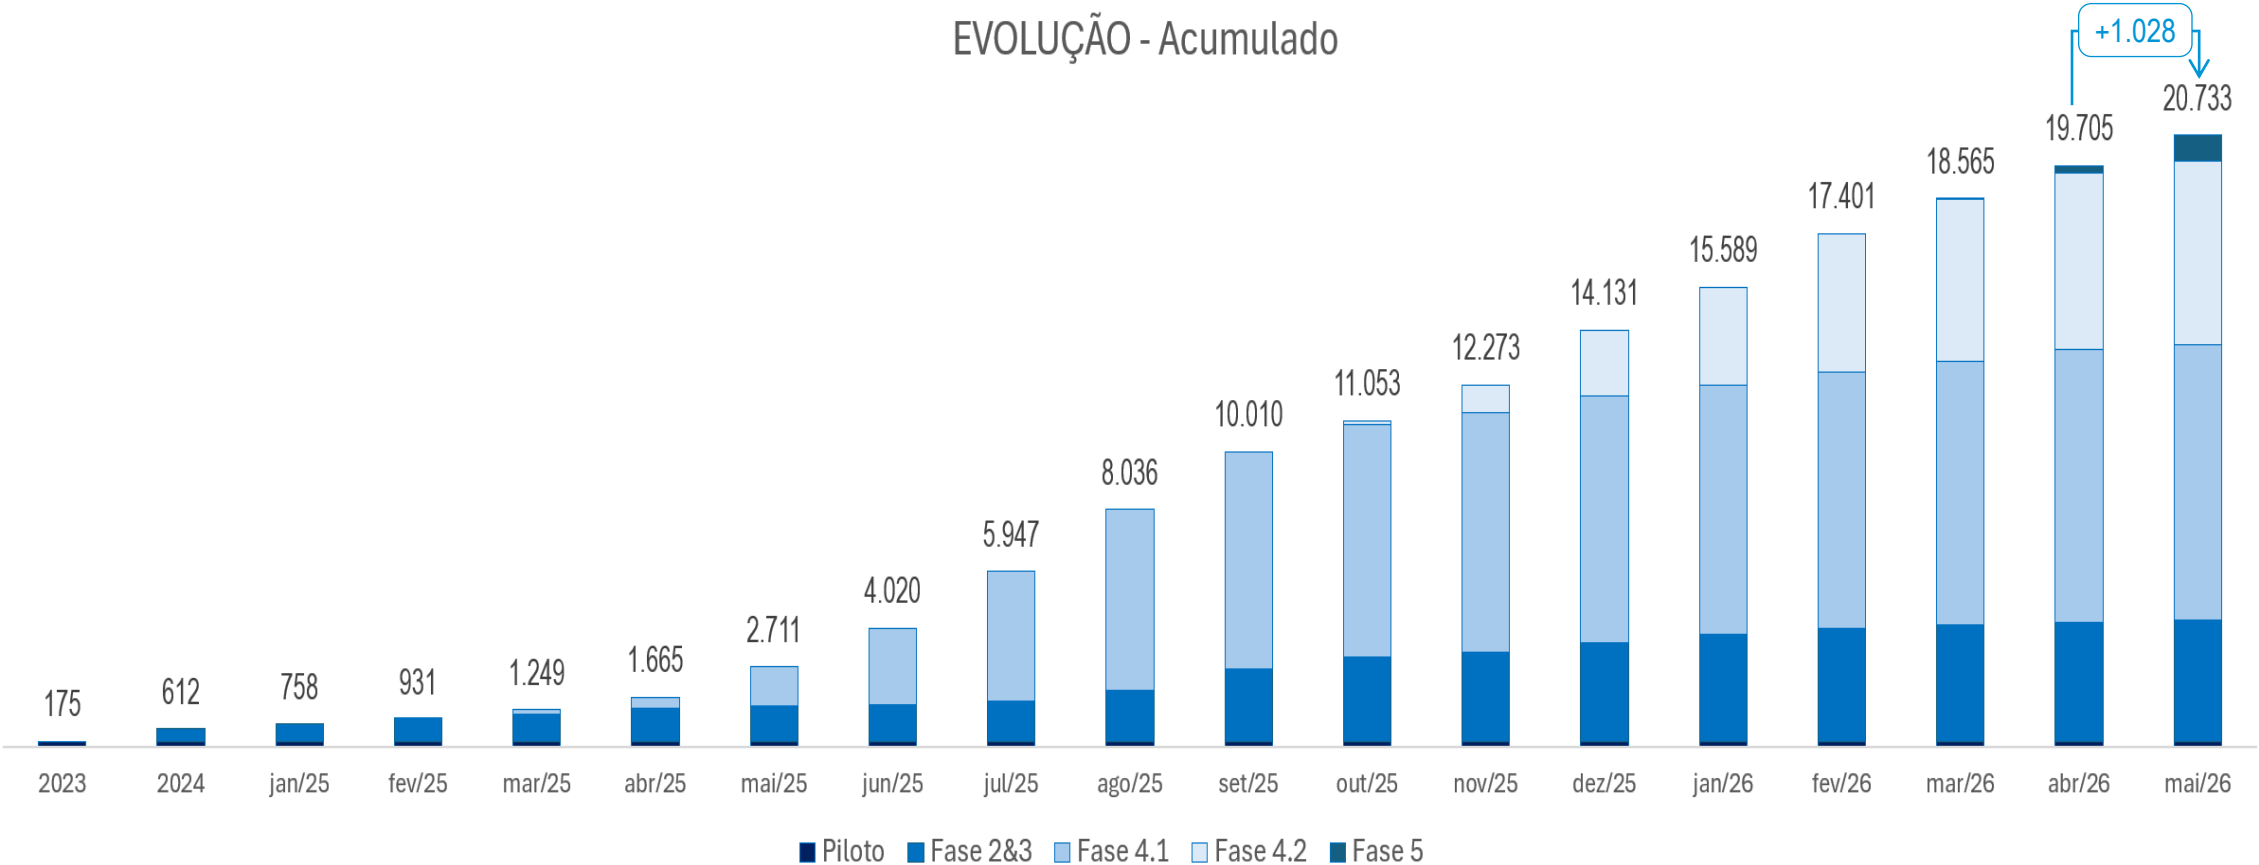

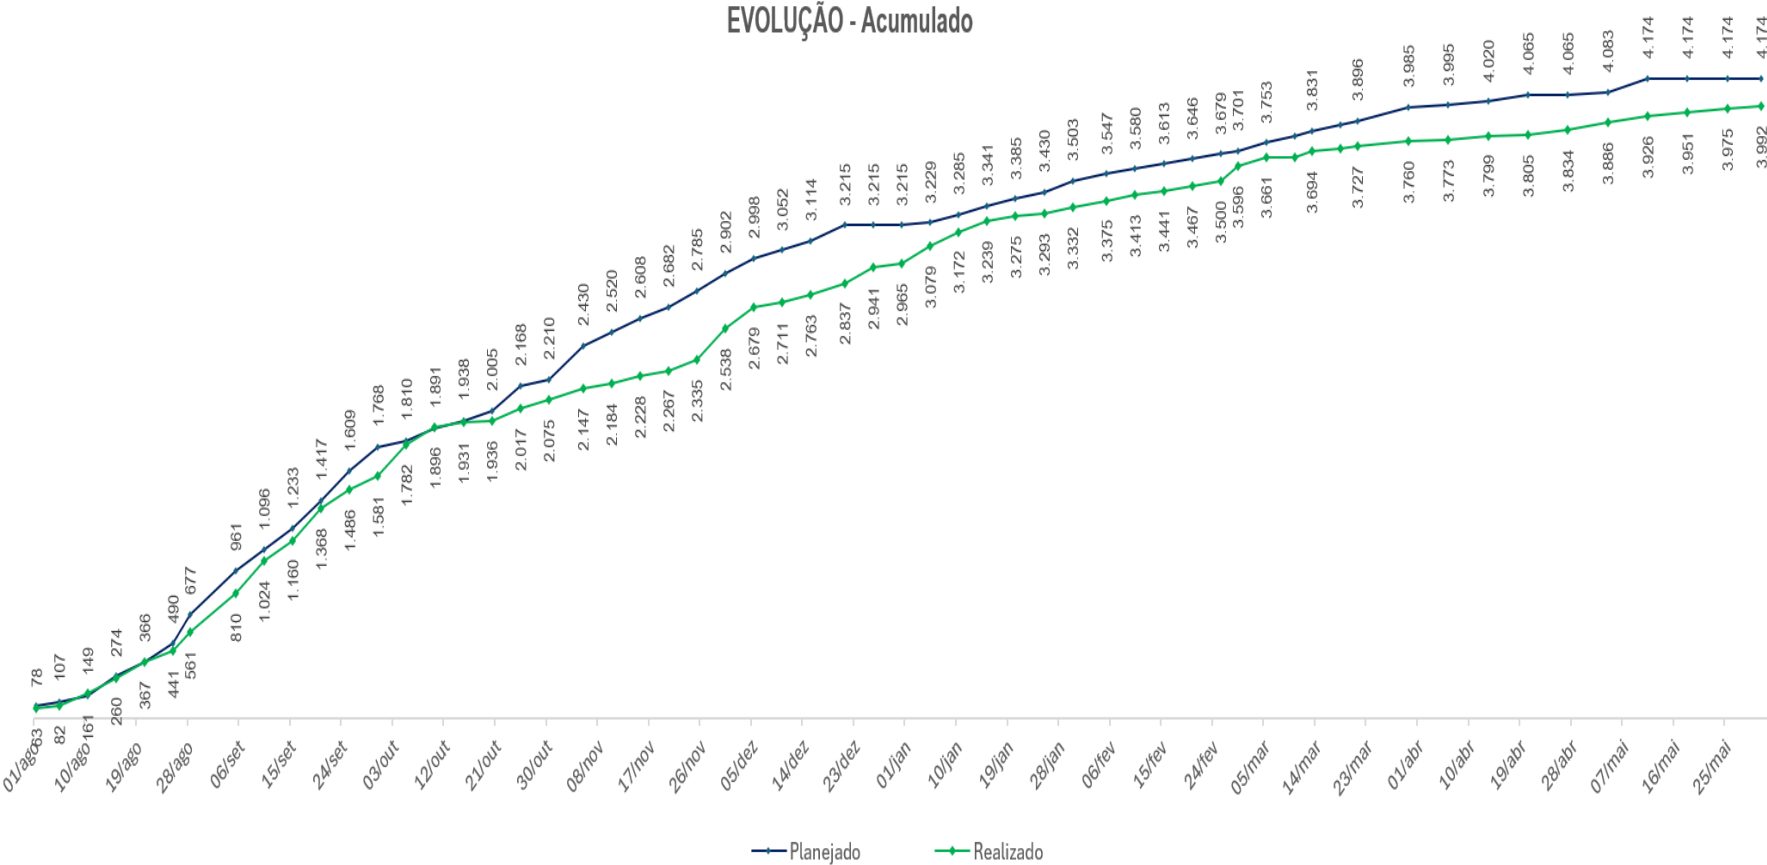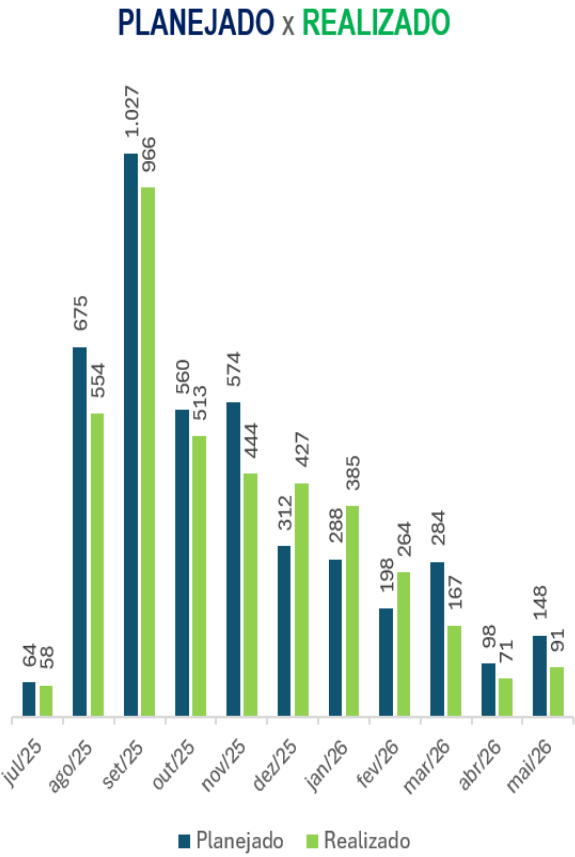


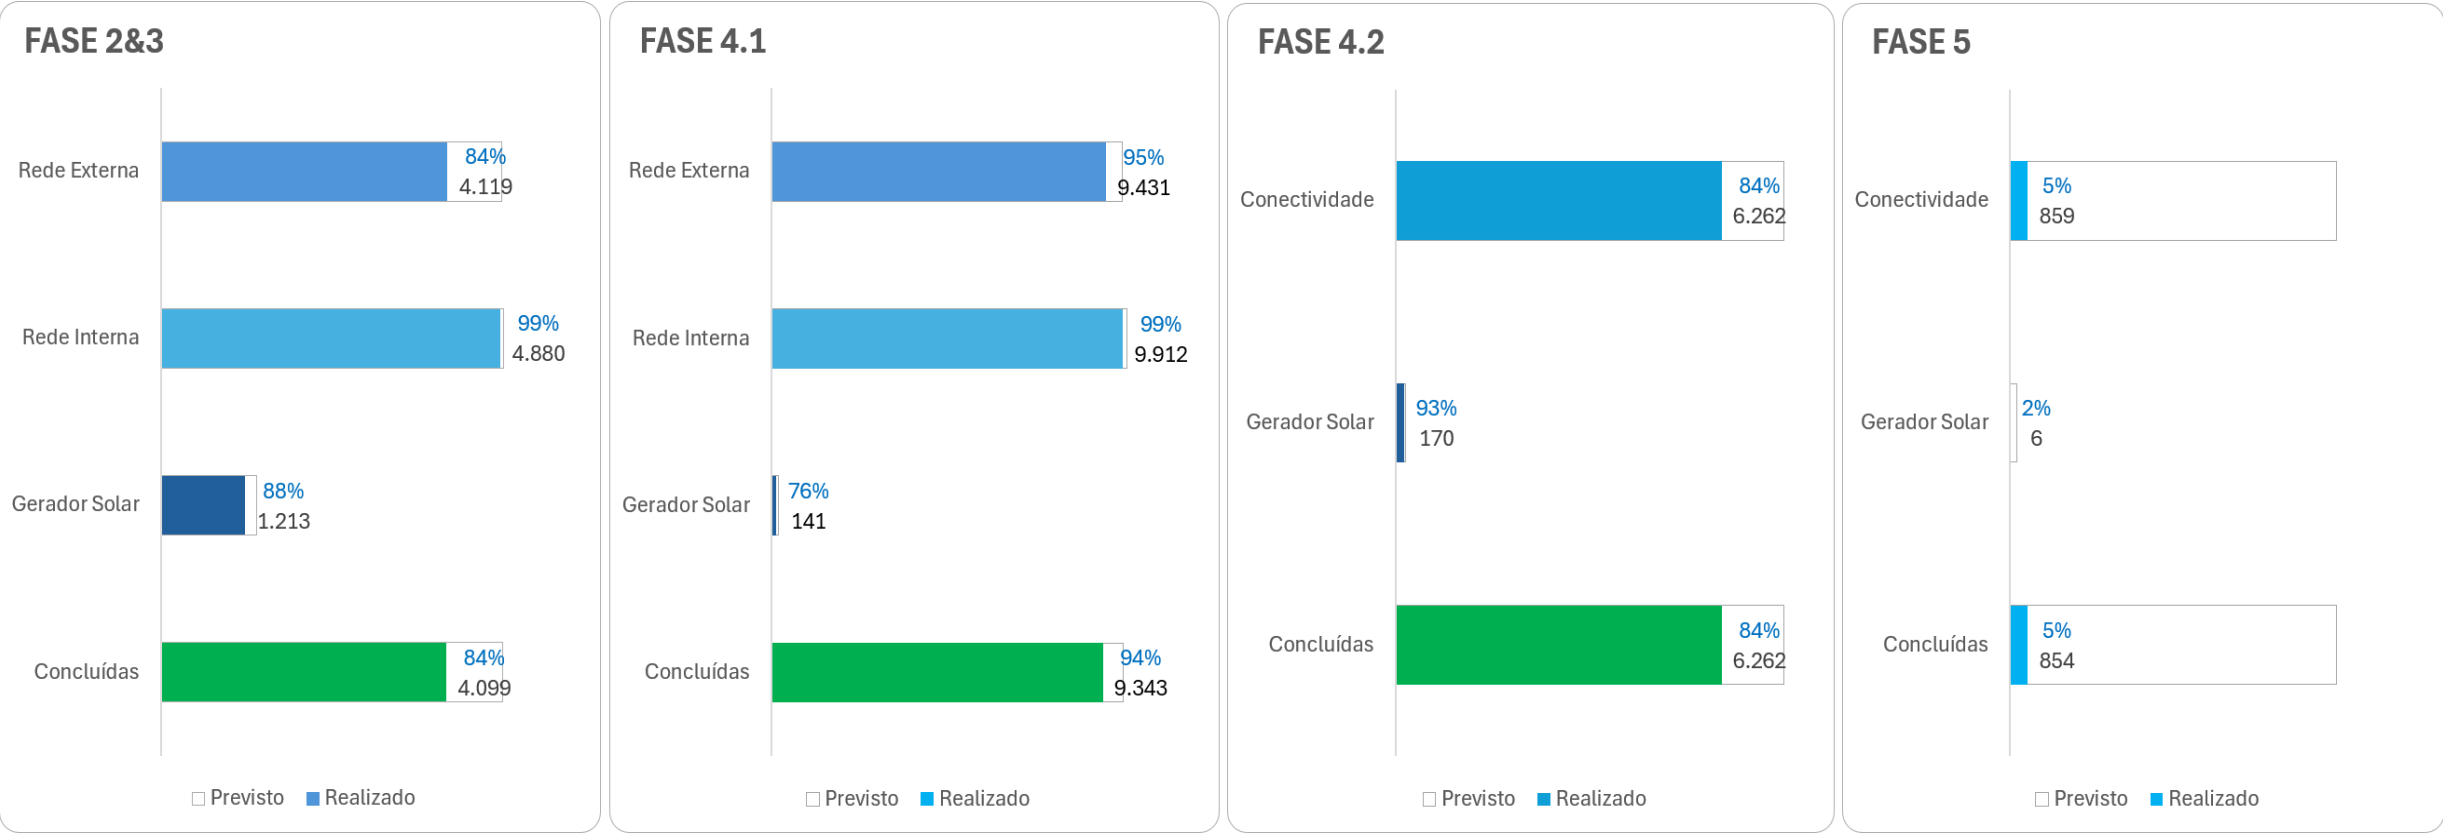

REFORECAST

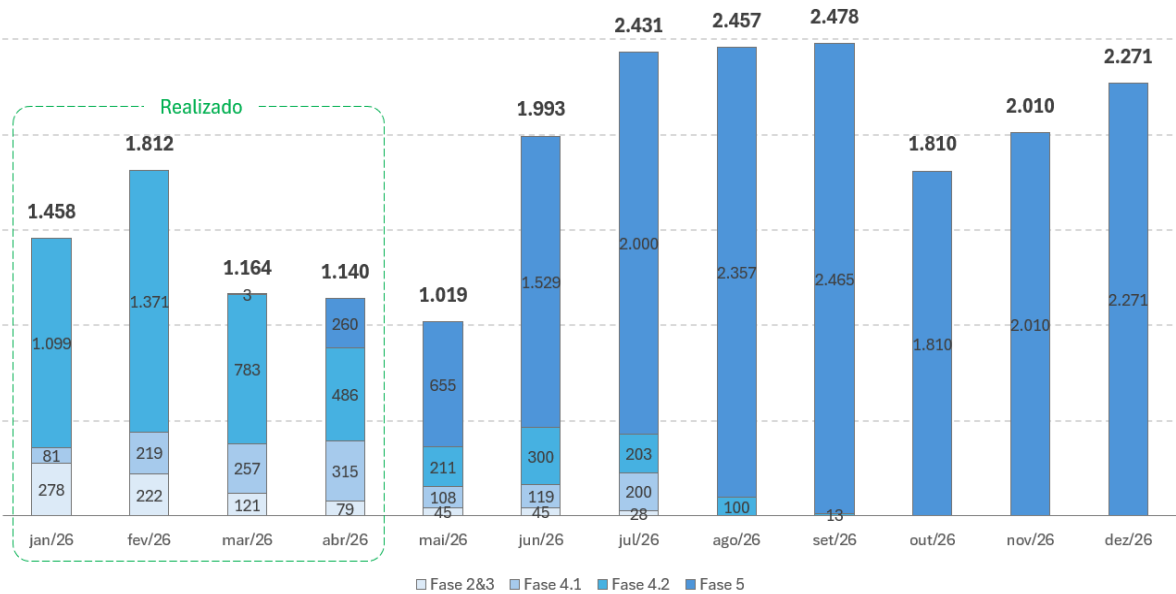

REALIZADO

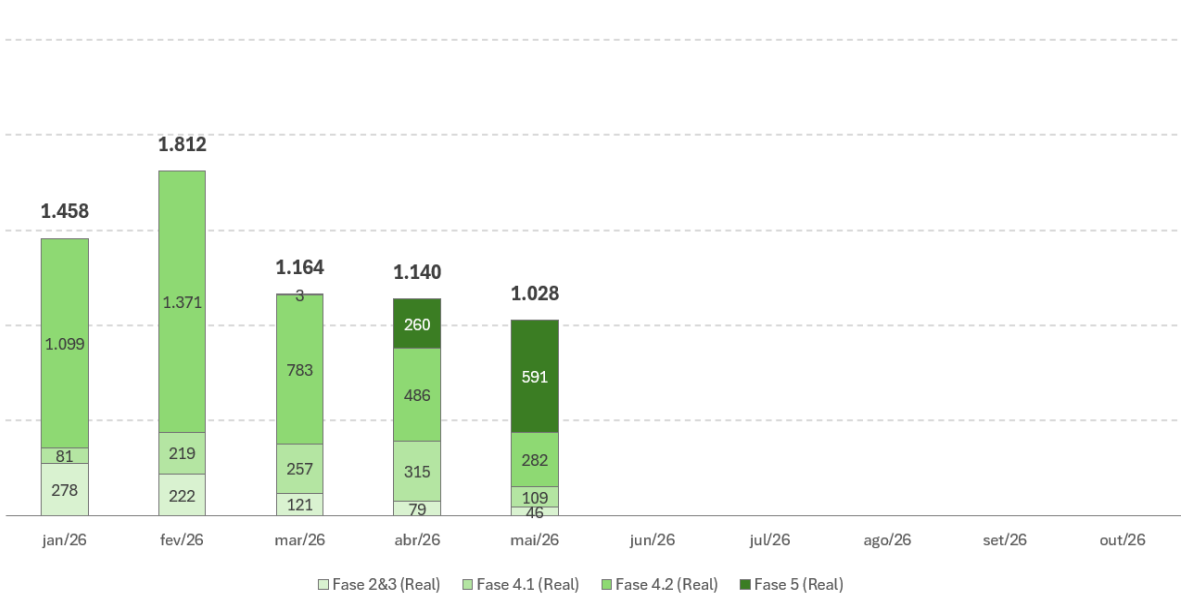

IMPEDIMENTOS		Fase 2&3	Fase 4.1	Fase 4.2	Fase 5
Canceladas	1.060	10	25	114	911
Sem energia	540	459	29	16	36
Obras	260	50	70	106	34
Validação MEC	72	1	17	28	26
RE outras políticas	31	4	27	0	0
Mud Endereço	18	9	9	0	0
Sem acesso	22	20	2	0	0
Total	2.003	553	179	264	1.007

Demanda Sat (requer nova contratação)	
Fase 2&3	649
Fase 4.1	73
Fase 4.2	262
Fase 5	19
Total	1.003




8.939
escolas




Fase 2 e 3	44
Fase 4.1	375
Fase 4.2	1.435
Fase 5	4.555
Não previsto	2.530

Migração Gesac 9k → Aprender Conectado (Planejado x Realizado)




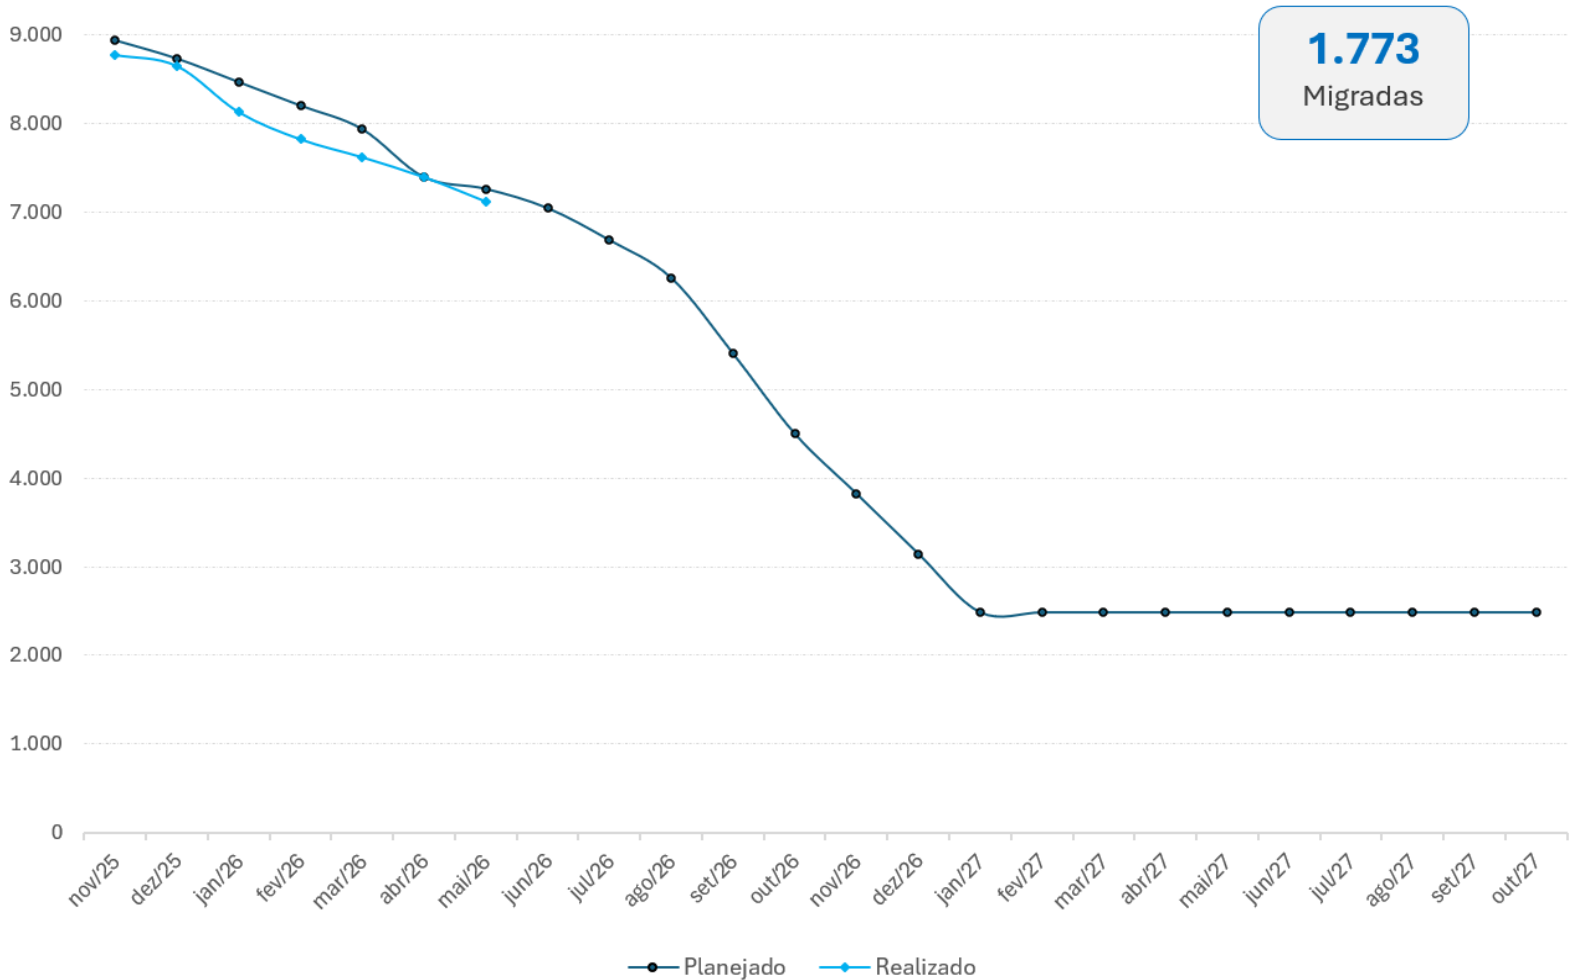


Elementos de Rede

Relação de dispositivos monitorados pelo Suporte Eace

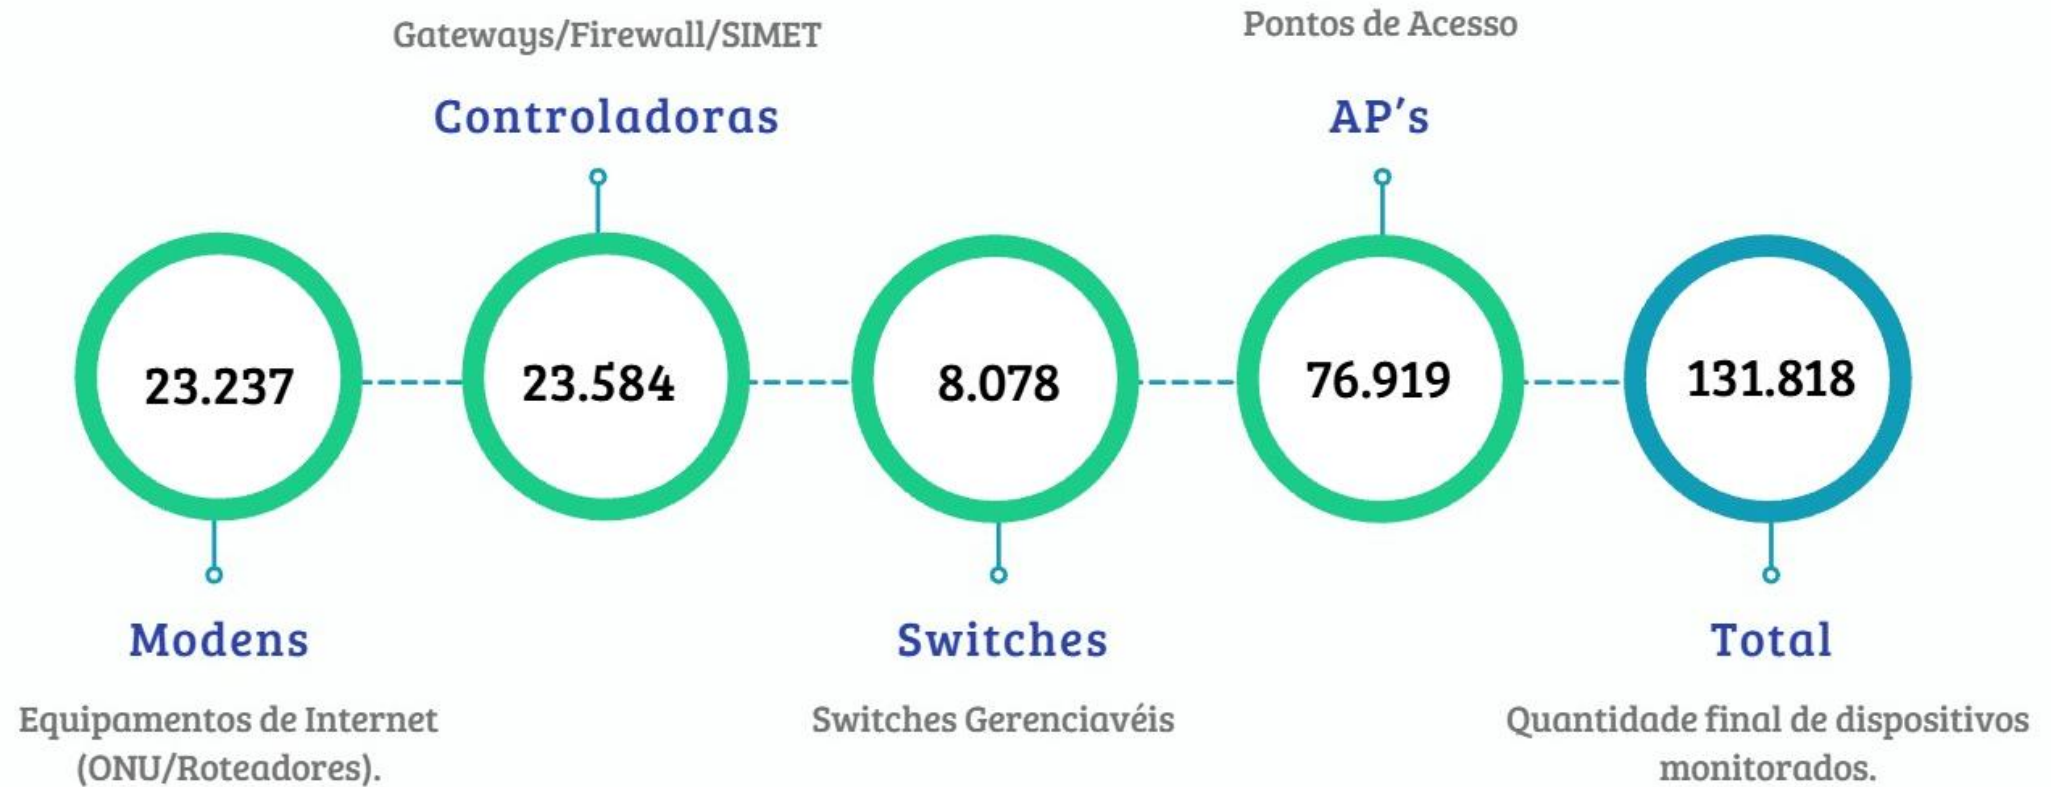

Suporte Eace







REPAROS



Backlog

1091







Chamados em acompanhamento

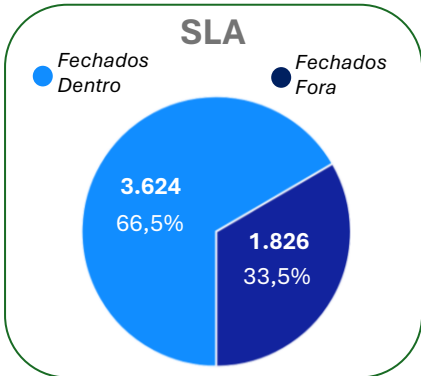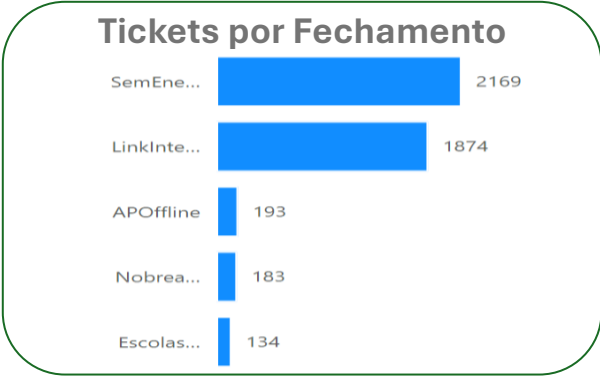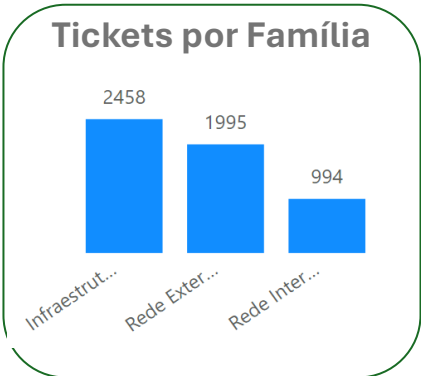

SIMET

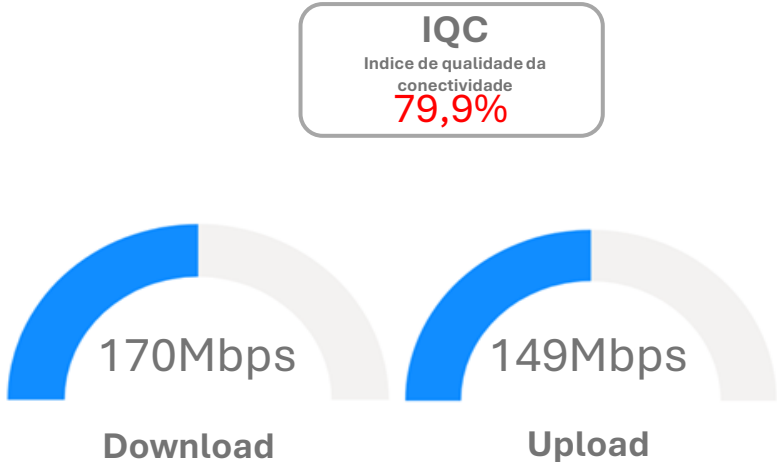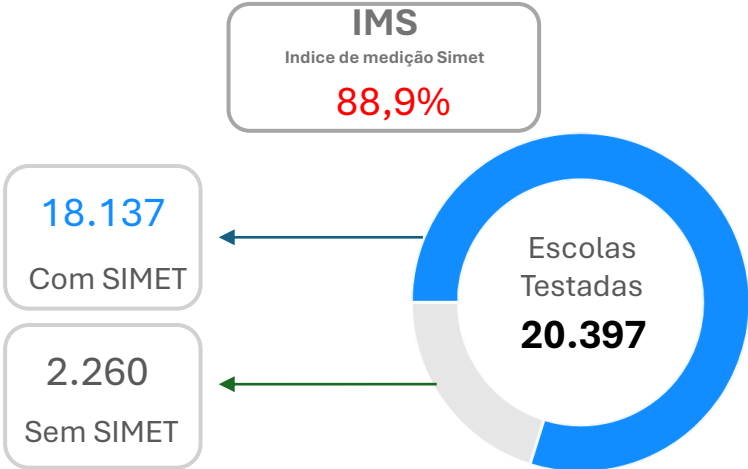

KPI - Suporte

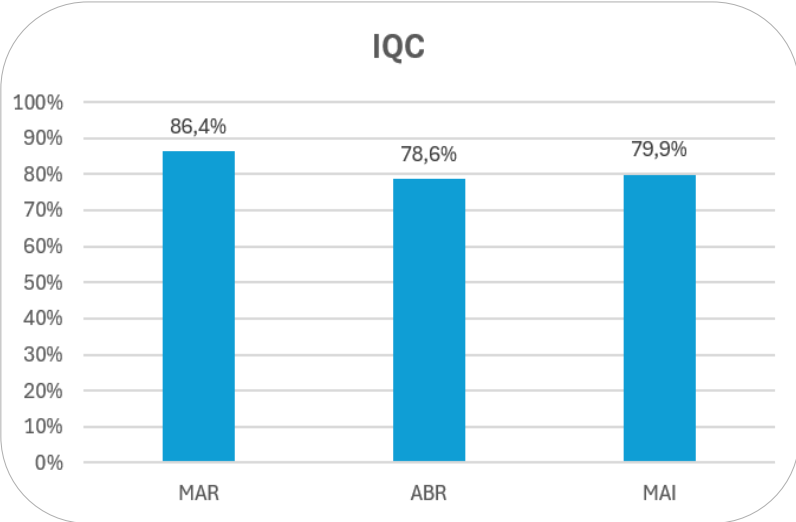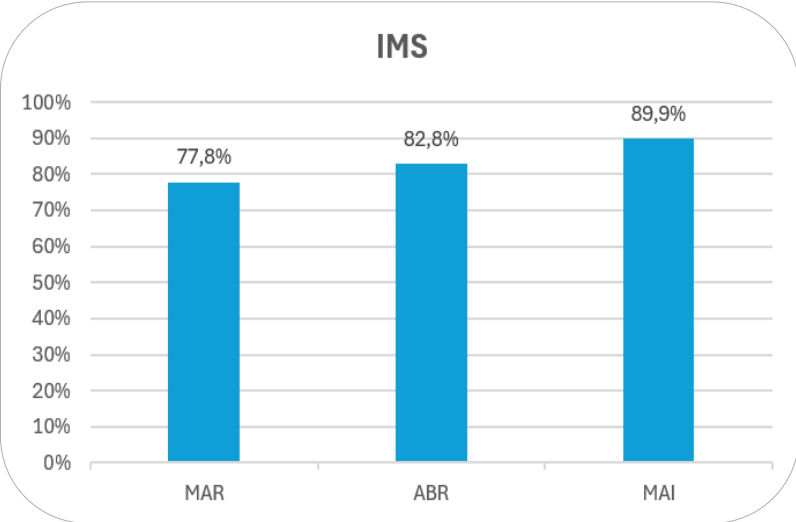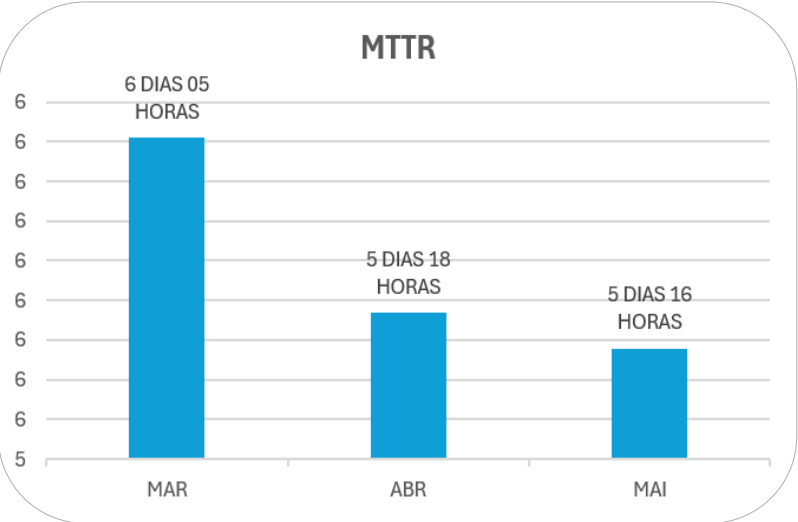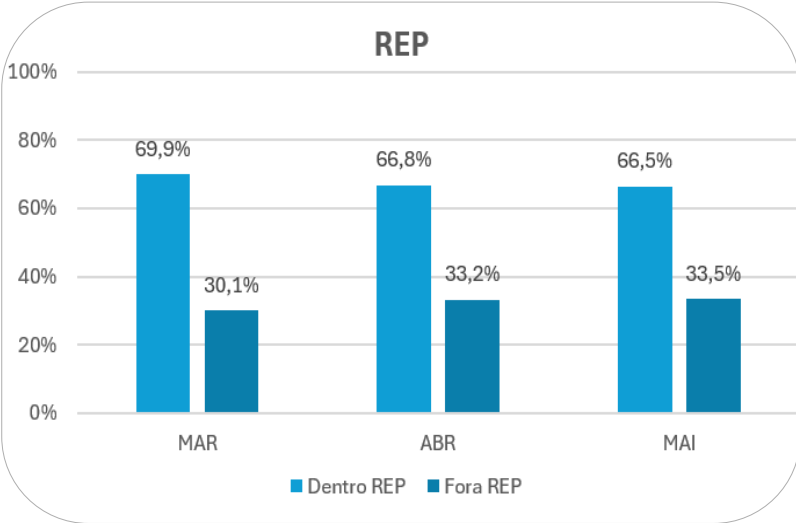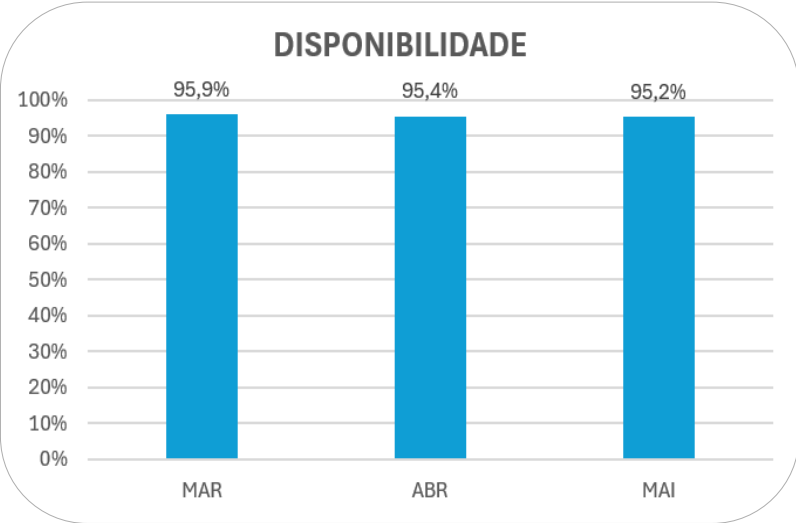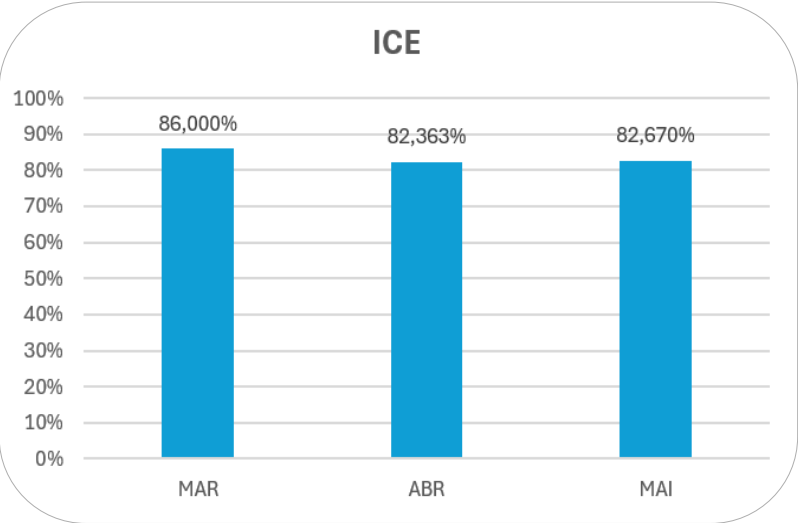

Obrigado!



Juntos,
ampliamos
futuros
