

Aprender  **CONECTADO**



**DA ESCOLA PARA O FUTURO.
DO BRASIL PARA O MUNDO.**

EACE em números

2025

3.954 km

de fibra óptica implantada

+44 mil

Access points Instalados

53%

Escolas concluídas

Rede Externa, Rede Interna e Gerador Solar
(Piloto, Fase 2&3 e Fase 4.1)

166 Mbps

Velocidade média contratada

+107

Escolas/dia
(última semana)

+172

Equipes
distribuídos em todas
estados do Brasil

189/194 Mbps

Download/Upload medida

EACE no Brasil



FONTE: DOP


+928 mil estudantes




Municípios
1.194
contemplados




Escolas rurais
6.443
escolas rurais



Escolas Indígenas
300
escolas em área
indígena



Média de
velocidade
189 Mbps
download
194 Mbps
upload




Energia Solar
5.286
kWh/dia
instalados


	NORTE	NORDESTE	CENTRO OESTE	SUL	SUDESTE	TOTAL
 REDE EXTERNA	2.066	4.949	171	758	1.163	9.107
 REDE INTERNA	5.849	5.505	267	792	1.341	13.754
 GERADOR SOLAR	1.215	26	2	-	-	1.243
 ESCOLAS CONCLUÍDAS	2.056	4.201	169	573	1.037	8.036

(*) Inclui Piloto, Fase 2&3 e Fase 4.1




9.107 Escolas conectadas

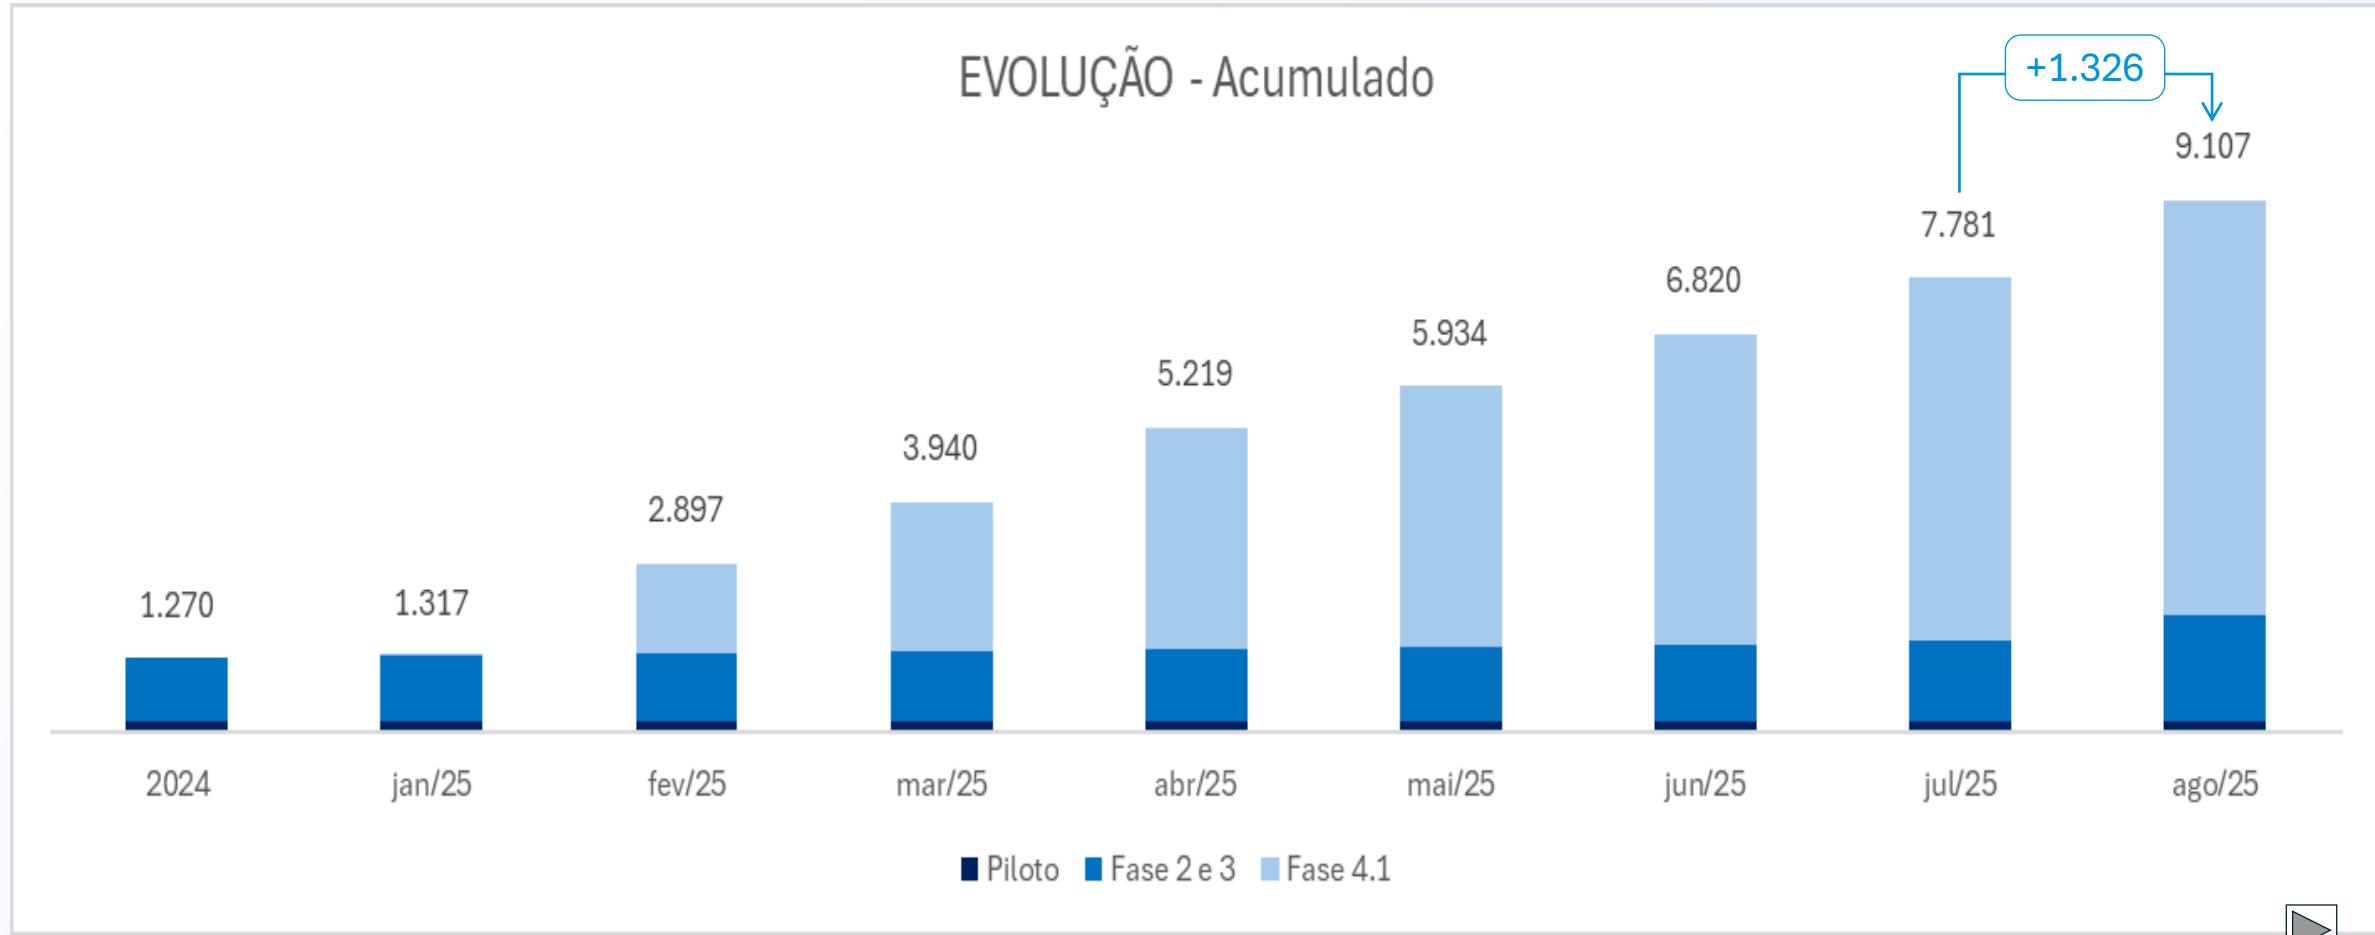

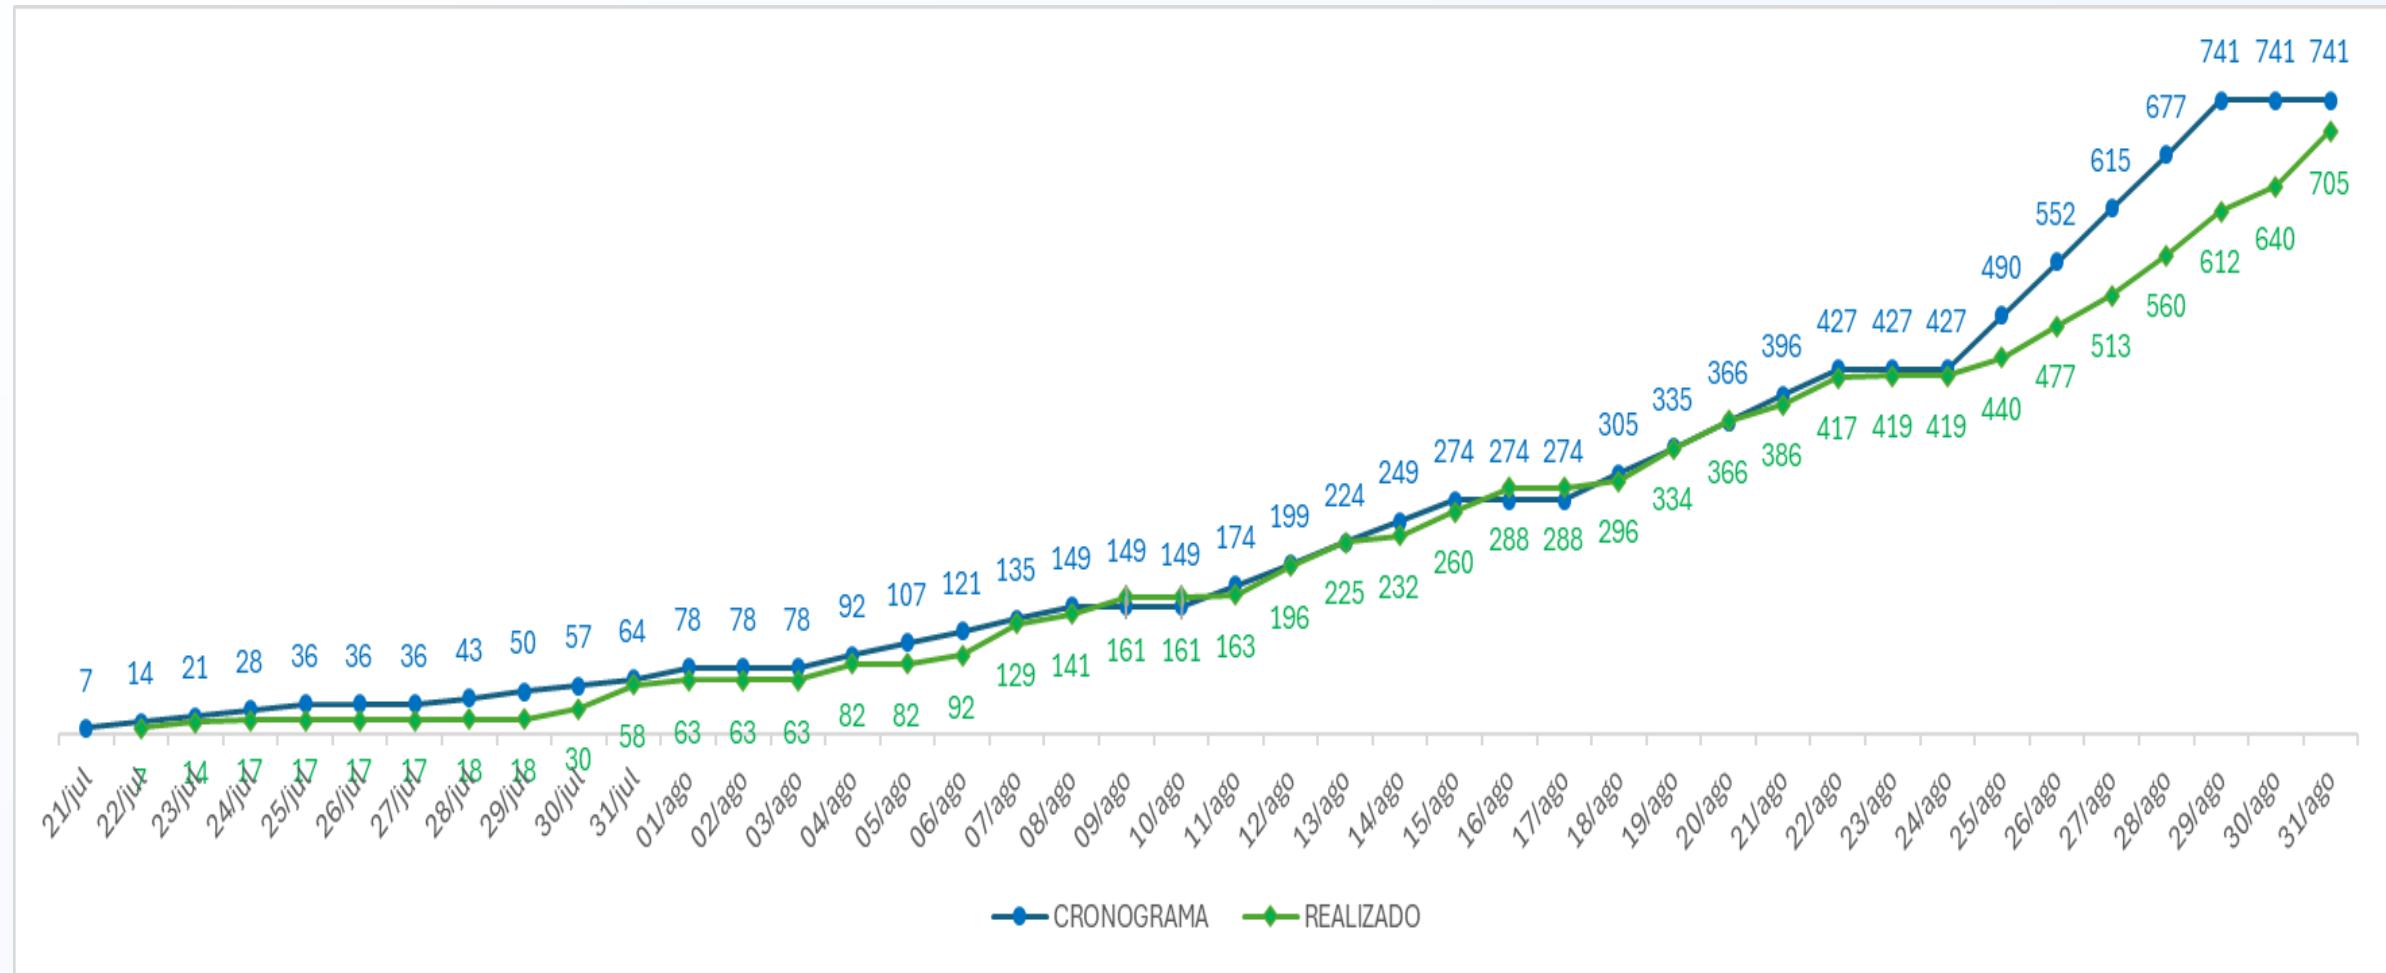


13.744 escolas com Wi-Fi Instalados

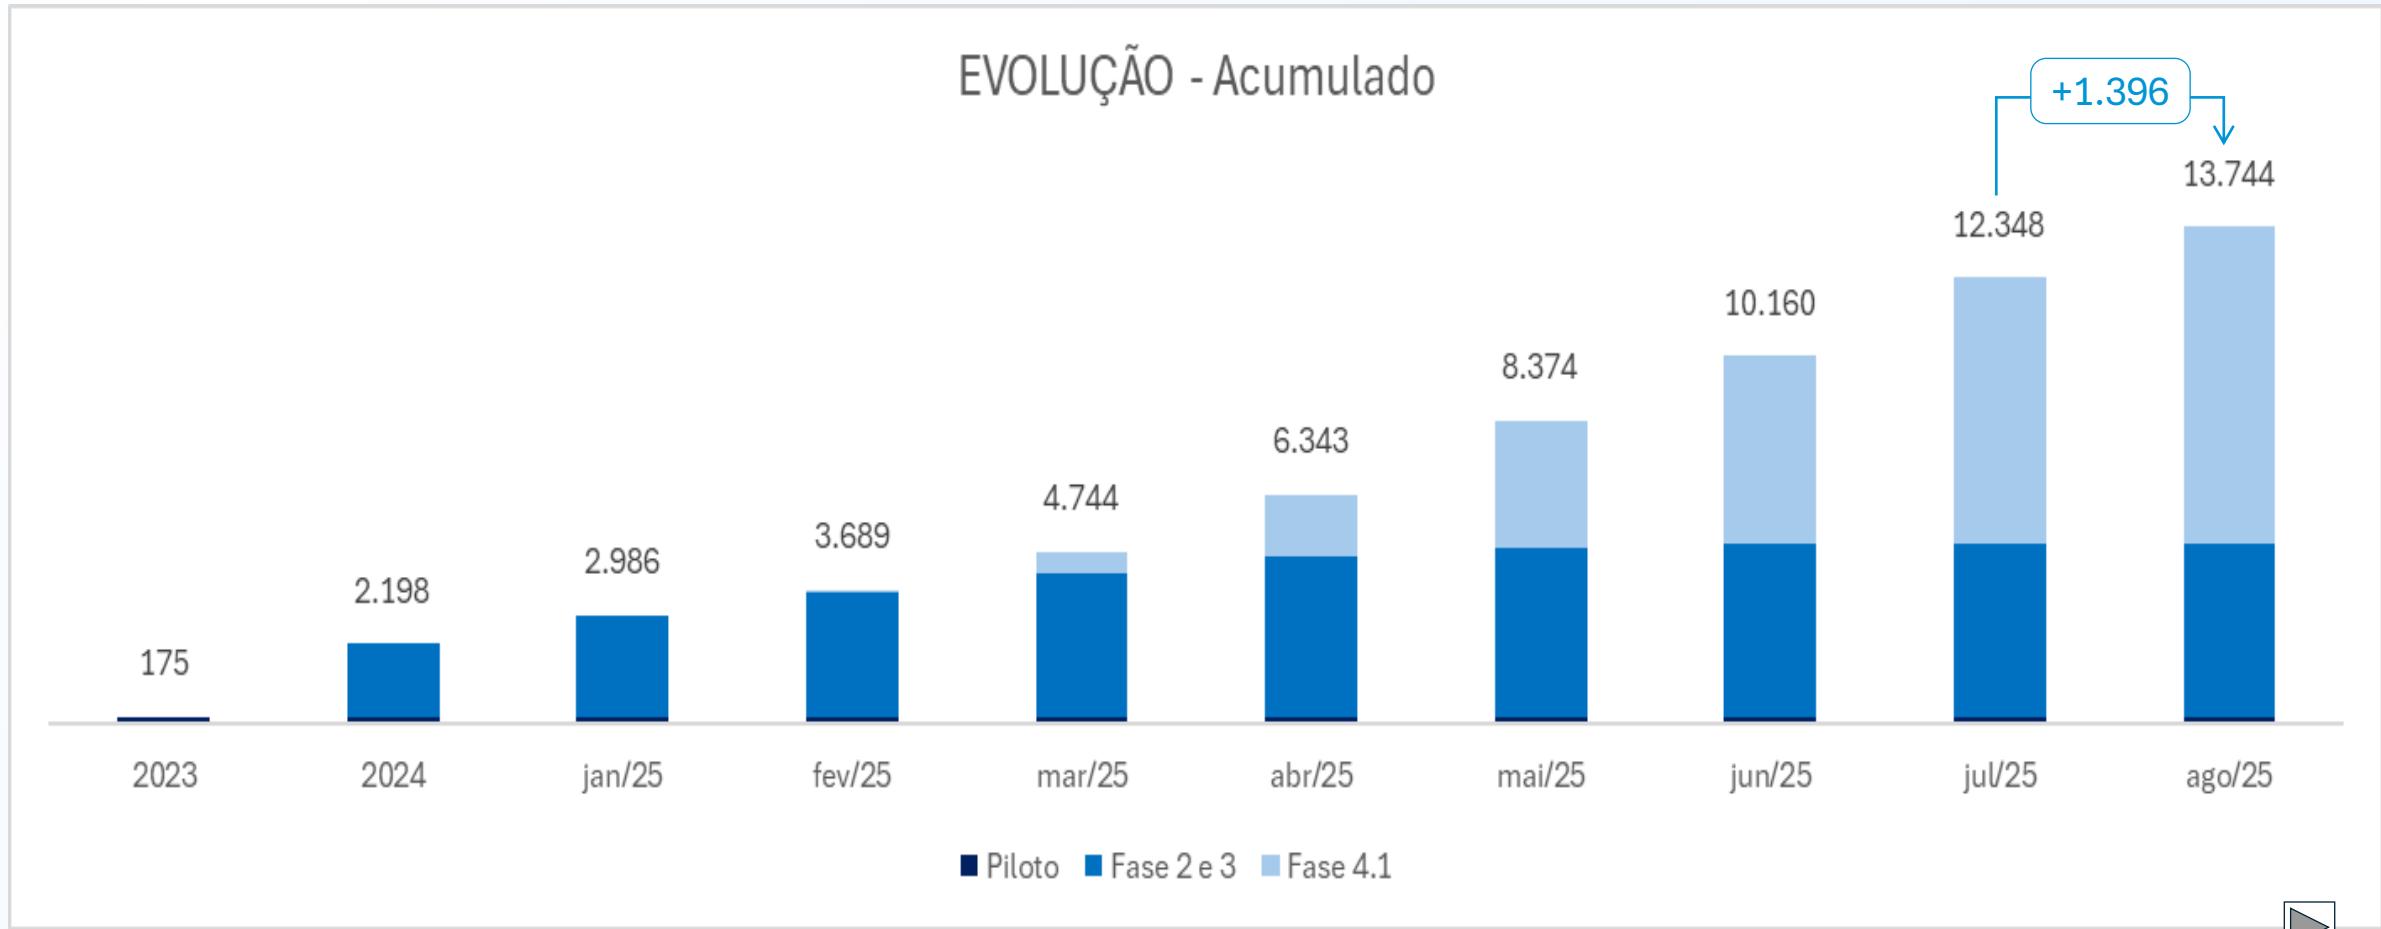




1.243 escolas com Gerador Solar Instalado

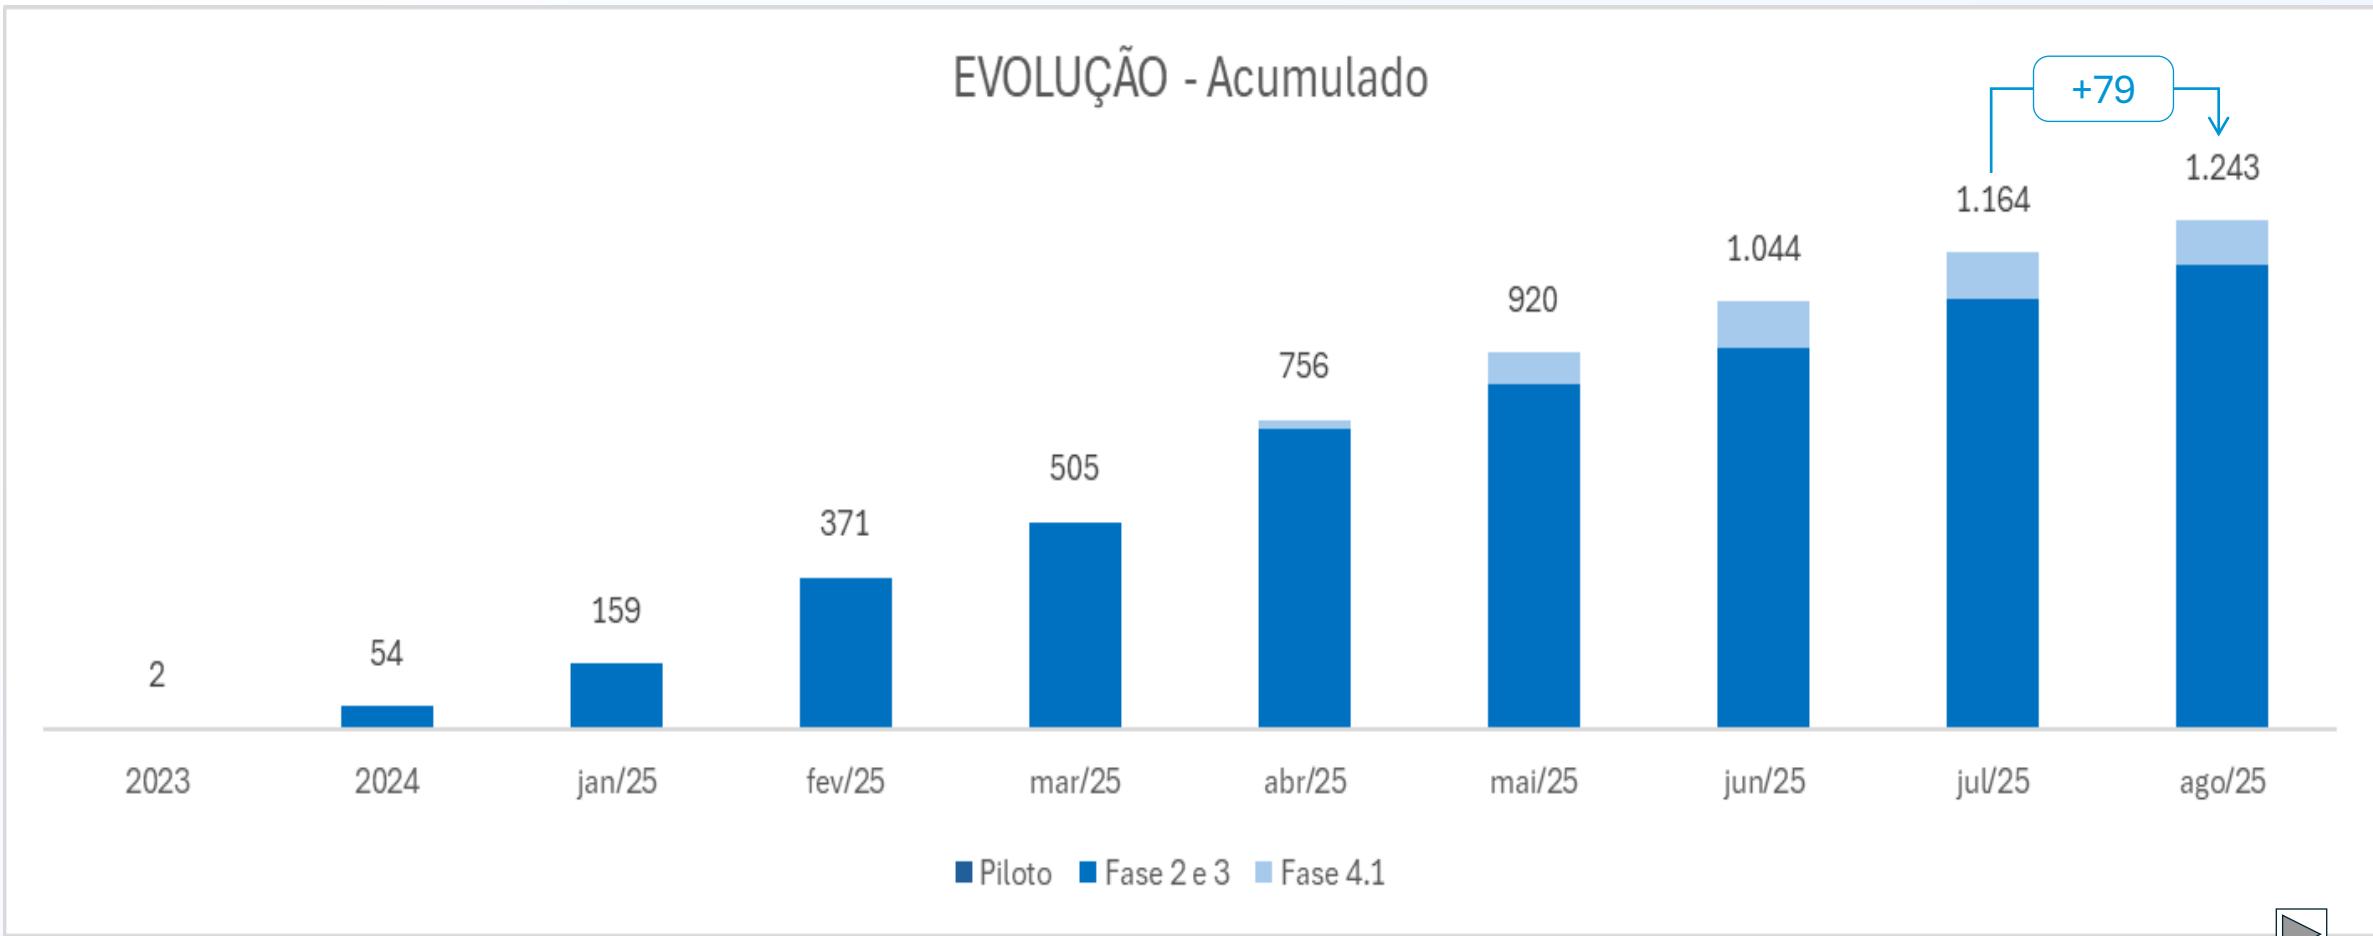




8.036 escolas concluídas

EVOLUÇÃO - Acumulado

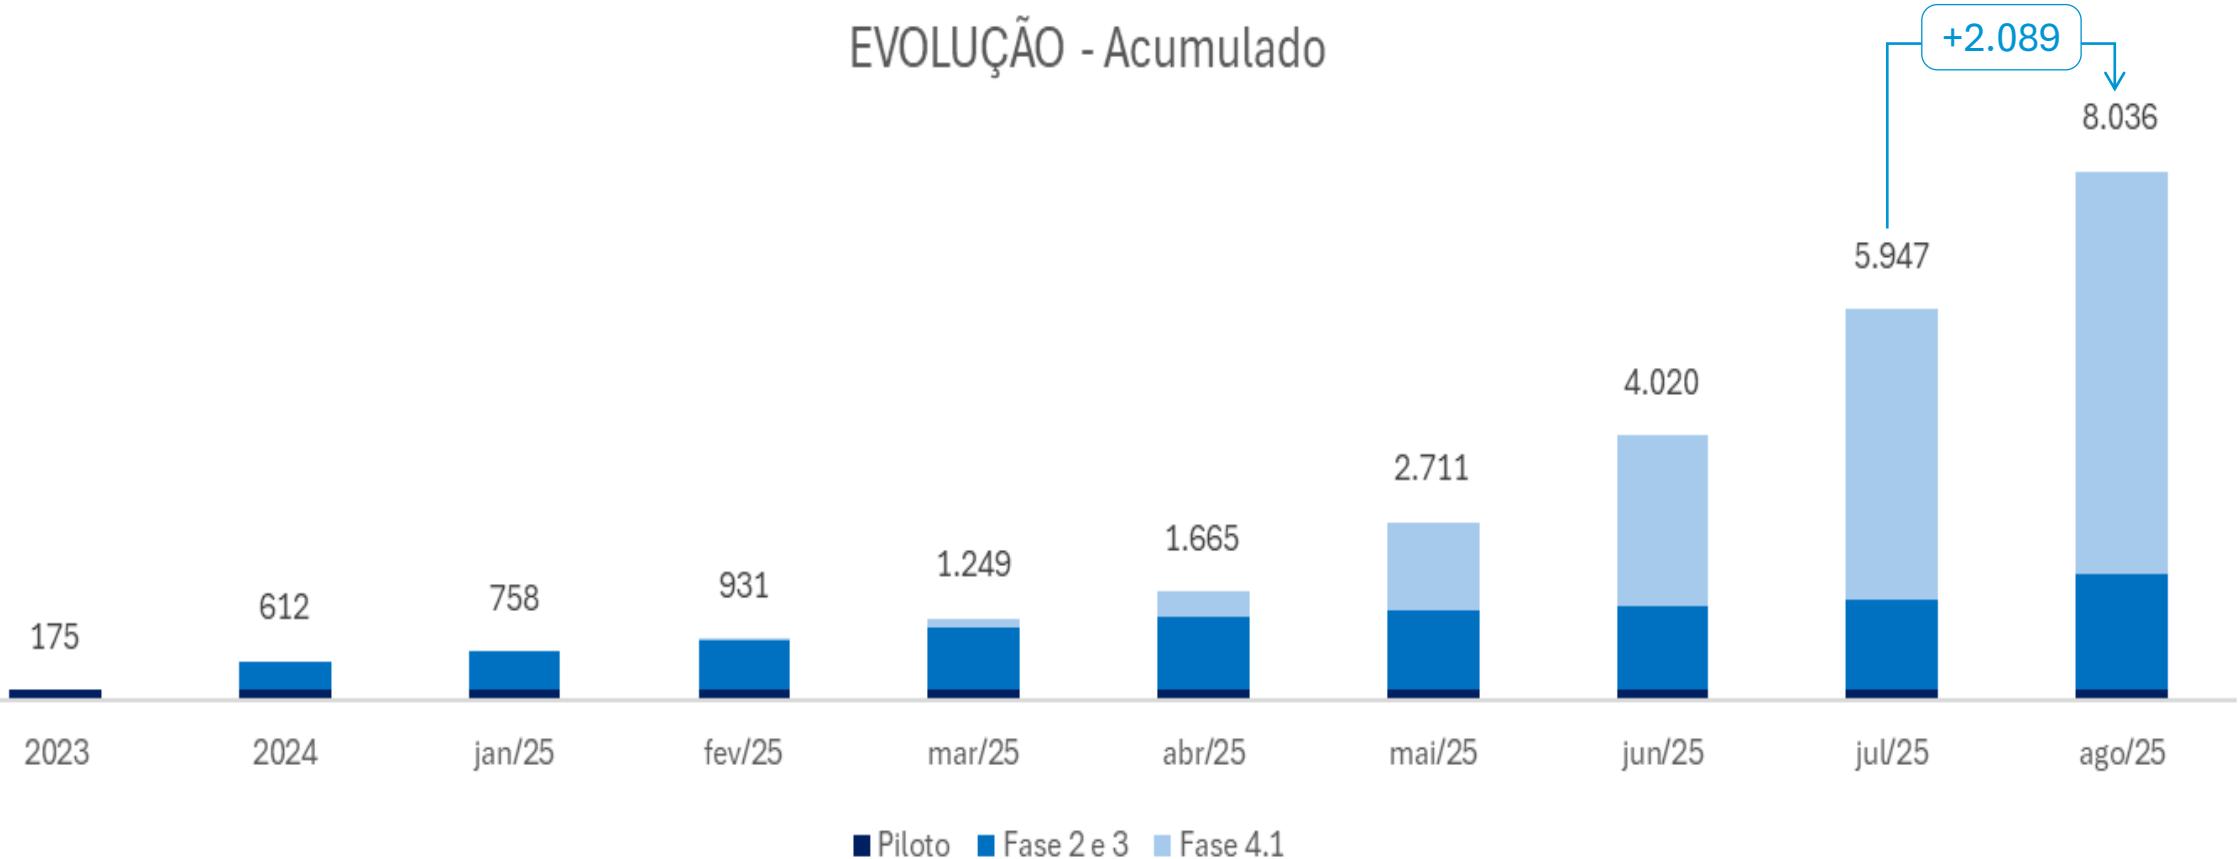


FASE 2&3

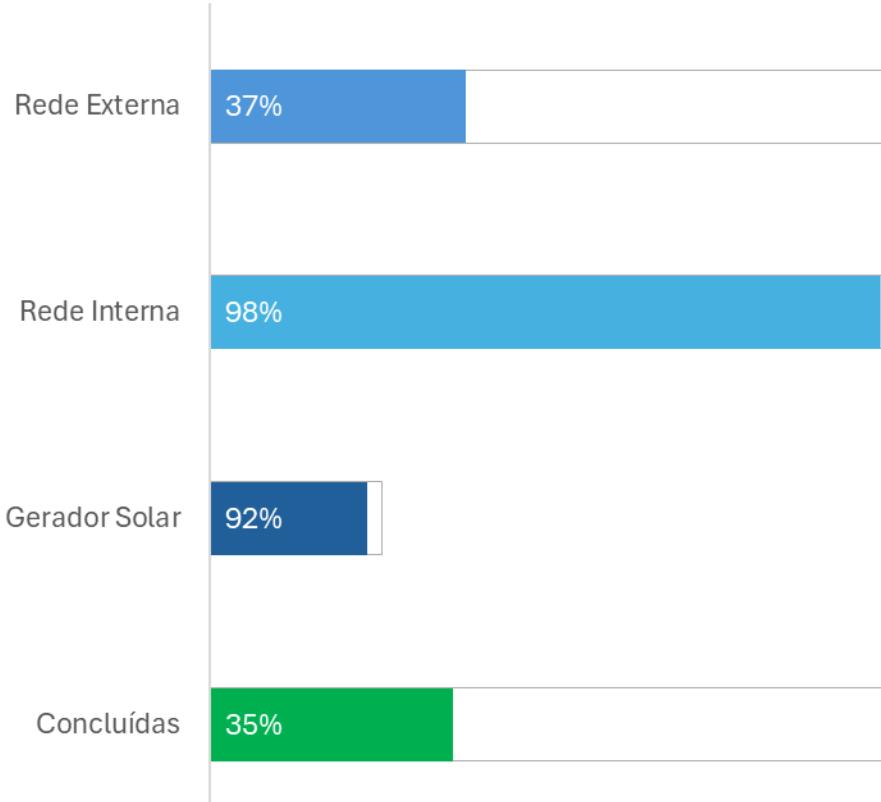

□ Previsto ■ Realizado

FASE 4.1

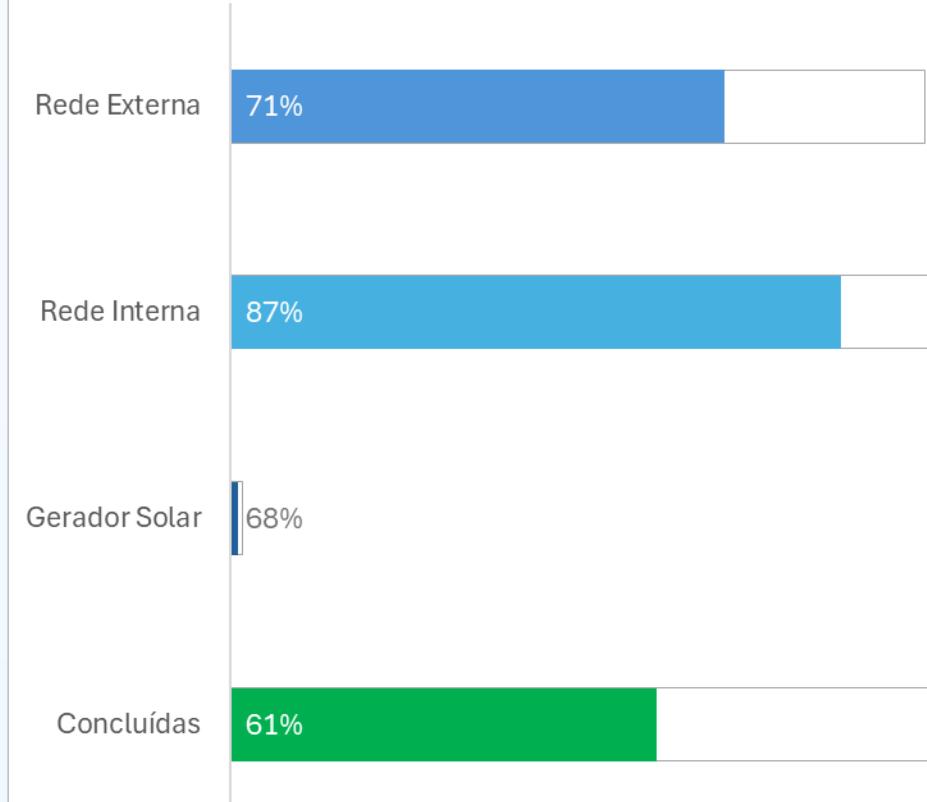

□ Previsto ■ Realizado

Obrigado!
